


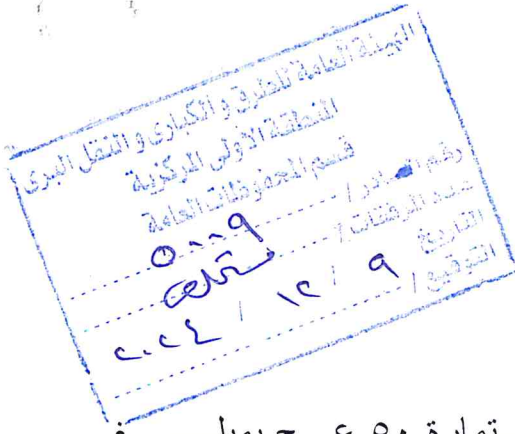

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ
(٤٨٥٦٨٧٧٢.٠٨) قيمة حساب فروق أسعار عن مستخلص
رقم (٢١) جارى (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية
اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦
كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار
الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح-
الفيوم) بالامر المباشر .


تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/١٧

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في سنة ٢٠١

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)

تاريخ التعاقد : 2022-10-11

تاريخ استلام الموقع : 2022-11-01

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																				01-Aug-2024				الي				31-Aug-2024			
رقم البند	بيان الأعمال	شهر المحاسبة	الكمية المنقذة بشهر المحاسبة	الفترة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاصة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات											
						حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار														
أعمال البر																															
1-44	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة	Aug-24	641.000	101.00	64,741.00	0%	0%	0%	0%	20%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	10.6%	6,880.56											
1-52	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	Feb-23	13.720	6,343.00	87,025.96	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	278.40	566.00	353.60	4.3%	3,784.77												
		Mar-23	9.150	6,343.00	58,038.45	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	280.70	622.00	367.70	4.8%	2,806.82												
		Nov-23	148.500	6,343.00	941,935.50	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	320.60	762.00	417.00	8.9%	83,530.09												
		Dec-23	74.100	6,343.00	470,016.30	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	336.10	762.00	417.00	10.0%	47,005.66												
		Jan-24	16.500	6,343.00	104,659.50	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	351.90	762.00	417.00	11.2%	11,675.52												
		Apr-24	2.400	6,343.00	15,223.20	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	368.60	1,079.10	480.40	13.8%	2,102.44												
		May-24	9.600	6,343.00	60,892.80	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	368.80	1,079.10	480.40	13.8%	8,418.66												
		Jul-24	57.700	6,343.00	365,991.10	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	393.90	1,079.10	541.50	17.0%	62,373.52												
		Aug-24	1741.330	6,343.00	11,045,256.19	0%	16%	0%	8%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	20.9%	2,302,990.22												
60-ج	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	Aug-24	11.000	50,976.00	560,736.00	50%	3%	0%	2%	636.80	218.90	566.00	353.60	1,596.20	446.00	1,079.10	541.50	79.5%	445,812.80												
61	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف	Aug-24	32.00	1,813.00	58,016.00	0%	35%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	41.6%	24,149.17												
62	بالمتر المكعب عمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	Aug-24	1904.000	3,325.00	6,330,800.00	0%	26%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	34.4%	2,175,439.81												
63-ج	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة ارتفاع حتى 12 م	Aug-24	84.000	4,418.00	371,112.00	0%	23%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	29.2%	108,273.76												
63-هـ	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة ارتفاع أعلى من 15 متر	Aug-24	816.000	4,821.00	3,933,936.00	0%	23%	0%	10%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	29.2%	1,147,745.29												
69	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالبر	Aug-24	858.000	30,205.00	25,915,890.00	68%	0%	0%	5%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	112.4%	29,138,915.66												
74	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد	Aug-24	327.000	63.00	20,601.00	0%	0%	0%	2%	431.80	218.90	566.00	353.60	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	23.7%	4,887.84												
إجمالي أعمال البر																															
أعمال الجزيرة																															
الحديد بجميع أنواعه																															
120-ب	بالمتر الطولي خرسانة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET	Aug-24	25.000	6,662.00	166,550.00	0%	18%	0%	13%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	25.582%	42,607.435												
121.000	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) اطوال حتى 12م بالجزيرة	Aug-24	4.000	30,730.00	122,920.00	68%	0%	0%	6%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	112.968%	138,860.113												
إجمالي أعمال الجزيرة																															
أعمال المجرى المائي																															
أعمال الخرسانة المسلحة																															
160	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العريات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage)	Aug-24	335.000	8,235.00	2,758,725.000	0%	13%	0%	13%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	20.40%	562,643.856												
الحديد بجميع أنواعه																															
164	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالنيل	Aug-24	117.000	31,279.00	3,659,643.000	68%	0%	0%	8%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	114.03%	4,178,115.022												
166	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجري النيل	Aug-24	66.000	101,639.00	6,708,174.000	70%	3%	0%	8%	431.800	218.900	566.000	353.600	1,128.90	446.00	1,079.10	541.50	120.37%	8,074,753.044												
إجمالي أعمال المجرى المائي																															
الإجمالي الكلي																															
48,568,772.08																															

تحريراً في سنة 2024

قراءة

ووقع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يقتد

مدير أعمال القطار السريع

مهندس/ أسماء علي

مدير المشروع الهيئة

مهندس /إبراهيم تكري

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات الهيئة


المنطقة الأولى


مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس / طارق يوسف الجزار

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أتممت من



[illegible]

مدير المكتب الفني (السعداء جروب)

م. محمود البنا

التوقيع /

