


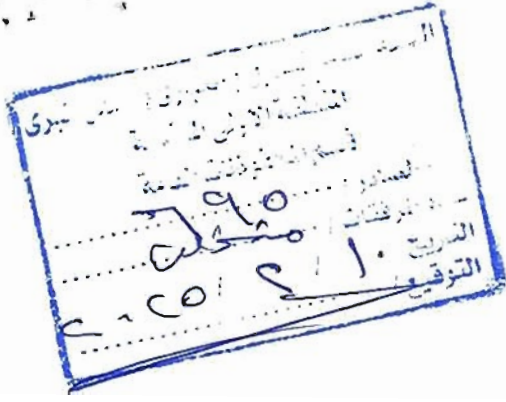

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٣) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى اعلى محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر) تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/٩

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



تأ

✓

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									تمت حتى الآن	جنيه	جنيه	
أولاً :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة	١٣٣٠	٤٠٠	م.ط	٤٨٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جاري	١٩٢٠٠٠	٠	١٩٢٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٢	١٤٨٠٠٠	بالعدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٤٨٠٠٠	٠	١٤٨٠٠٠	عدد (٥) مهندسين متواجدين
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٢٩٥٠	٤٧٢٠	م.ط	٢٩٢٢	٠,٠٠	٢٩٢٢,٠٠	جاري	١٣٧٩١٨٤٠	٠	١٣٧٩١٨٤٠	مكتب الاشراف متواجد
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٤٠٠٠	٩٠	م	٣٩٨٠	٠,٠٠	٣٩٨٠,٠٠	جاري	٣٥٨٢٠٠	٠	٣٥٨٢٠٠	عدد(١) مراقب متواجد
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٢٠٠	١٨٨٥	م	١٤٤	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٢٧١٤٤٠	٠	٢٧١٤٤٠	عدد(٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٣٦٠٠	٢٥٧٠	م	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٧٩٦٧٠٠٠	٠	٧٩٦٧٠٠٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم ٢ بزيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كجم/م ٣	٣٦٠٠	١٨٠	م	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٥٥٨٠٠٠	٠	٥٥٨٠٠٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	٩٠٠	٣٢٨٠	م	٨٦٠	٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد
١٧-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	٩٠٠	١٠٠	م	٨٤٢	٠,٠٠	٨٤٢,٠٠	جاري	٢٨٢٠٨٠٠	٠	٢٨٢٠٨٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	٩٠٠	٩٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٨٤٢٠٠	٠	٨٤٢٠٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	٩٠٠	٣٤٢٠	م	٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٠٠	جاري	٠	٠	٠	تم استبدال الاستراحة المنصوص عليها بالتعاقد طبقا لموافقة
١٨-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	٩٠٠	١٠٠	م	٢٣٨,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	جاري	١١٥٢٥٤٠	٠	١١٥٢٥٤٠	رئيس مجلس الادارة (مرفق صورة)
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبستاته	١٢٠٠٠	٣٥٣٠	م	٤١١٨,٠٠	٧٧١,٠٠	٤٨٨٩,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
١٩-أ	ارتفاع حتي ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	١٠٠	٣٥٣٠	م	٤١١٨,٠٠	١٥٣٥٠,٠٠	١٩٤٦٨,٠٠	جاري	١٧١٧٨١٧٠	٨٠٠٠٠	١٧١٧٨١٧٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٠	توريد وتشغيل وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٤٧٤٦	٤١٠٠٠	طن	٢٩٧٨	٠,٠٠	٢٩٧٨,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٢٠-أ	بطول ١٢ متر	٤٧٤٦	٤١٠٠٠	طن	٢٩٧٨	٠,٠٠	٢٩٧٨,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد	٢٠٦	١١٠٠٠٠	طن	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	١٢٢٠٢٨٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٢٢٠٢٨٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على النارد وجهين	٣٧٠٠	٥٥	م	٣٤٣٣	٠,٠٠	٣٤٣٣,٠٠	جاري	١٨٨٨١٥	٠	١٨٨٨١٥	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	١٢	٤٦٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٢٧٦٠٠٠	٠	٢٧٦٠٠٠	
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	١٢	١٦٨٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠	
تشوينات												
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	طن	١٩٤	٠,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٤٧٧٢٤٠٠	٣١٨١٦٠٠	٧٩٥٤٠٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد	١١٠٠٠٠	١١٠	طن	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	١٩٨٠٠٠	١٣٢٠٠٠	٣٣٠٠٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	١٢	٤٦٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	١٢	١٦٨٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٦٠٤٨٠٠	٤٠٣٢٠٠	١٠٠٨٠٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٢	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات	٠	١٠٠	م	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٢-أ	مسافة النقل لاتقل عن ٥٠ كم	٠	١٠٠	م	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
بنود مستحقة												
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	١٨٠٠٠	٥٩	م	٩٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٠	٠	٥٩٠٠٠٠	
١	مسافة النقل حتي ٢ كم	٤٩	٤٩	م	٩٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٤٩٠٠٠٠	٠	٤٩٠٠٠٠	
	قيمة المادة المحجيرية (شامل ٢٥% معامل دمك+١٢% استقطاعات)	٩	٩	م	٦٠٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٨ كم	٤٥	٤٥	م	٣٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جاري	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٣٢ كم	٠	٠	م	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
الإجمالي (فقط وقدره مائة ستة وثمانون مليوناً ومئتان اثنان وثلاثون الفا وثمانمائة وخمسة جنيها فقط لاغير...)												
خصم ٠,٥٠% طبقا لمحضر المفاوضات												
الاجمالي بعد الخصم												
السابق												
الصافي												

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك :

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروعات
مدير عام المالى والإداري
التوقيع: _____
التوقيع: _____

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/طارق يوسف الجزار

رُفْم ومقدار التصديق :

بند المیزانیہ :

بيـان المنصـرف من المـقـاولـة		قـيـمـة	
	جنية	قرش	
بيان الاعمال التى تمت الان	11.02.17	27.9.0	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابقة صرفه	11.09.15	09.12	
مستحق صرفه	22.07.11	18.00	
الاستقطاعات	جنية	قرش	
رسم دمغة اصى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
	0		
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في سنة ٢٠٠٠ رئيس المصلحة علامة

..... : امضاء

..... : امضاء

..... : امضاء

الكاتب المفوظ الختم ذو التاريخ

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from ASCE.

شویای

شيك

شیک

جل _____

اذن صرف

وادرج في كشف الحوالات رقم.....

.....

تسلمت التحويلة رقم و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتام

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ سنة ٢٠٠ المقبول :

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]
