


من بداية العمل حتى: 2023 / 11 / 30

كشف (10) جاري
المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات رقم العقد (2022/2021/543)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم احتساب 0.8 جنيه للكيلومتر للزيادة والنقصان .	17.00	م3	400,000	330,000	0,000	330,000	5,610,000		5,610,000	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (400-300) كجم /سم2	76.00	م3	100,000	73,200	0,000	73,200	5,563,200		5,563,200	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده
4	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك يزيد عن 5 سم زيادة 3.2 جنيه للسم كشط في حالة الزيادة او النقصان	16.00	م2	1,000,000	939,000	0,000	939,000	15,024,000		15,024,000	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده
	علاوة بند 2-1 لزيادة سمك القشط 1 سم	3.20	م2	200,000	117,000	0,000	117,000	374,400		374,400	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة بند 2-1 لزيادة سمك القشط 2 سم	6.40	م2	100,000	80,000	0,000	80,000	512,000		512,000	- الحد الادنى من المعدات متواجد
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع	60.00	م3	4,000	2300	0	2300	138,000		138,000	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة نقل العينات متواجده
6	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	5.00	م2	650,000	610,000	0,000	610,000	3,050,000		3,050,000	- يراعى تطبيق نصوص العقد
7	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	80.00	م3	30,000	21,000	0	21,000	1,680,000		1,680,000	- وثيقه التأمين شخصية ساريه حتي 2024/5/30 - وثيقه التأمين المقاولين ساريه حتي 2024/5/30
8	أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف مسافة نقل 2 كم يتم احتساب علاوة 1.2 لكل 1 كم بالزيادة والنقصان يتم زياده مبلغ 4.5 جنيه في حالة استخدام البلدوزر في التحجير	96.00	م3	850,000	801,000	0,000	801,000	76,896,000		76,896,000	
	علاوة 1.2 لكل 1 كم لتوريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات مسافة النقل 10 كم	9.60	م3	470,000	460,000	0,000	460,000	4,416,000		4,416,000	
	علاوة البند 1.2 لكل 1 كم لتوريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات مسافة النقل 65 كم	75.60	م3	380,000	331,000	0,000	331,000	25,023,600		25,023,600	
	الجمالي اعمال الطرق (ورقه 1)							138,287,200		138,287,200	

مدير عام مشروعات م/ محمد فياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ ابراهيم الحناوي م/ محمد حاتم	مكتب محرم باخوم م/ رجب سمير مكتب خالد قنديل م/ رجب سمير	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هانى محمد محمود طه"
----------------------------------	---	--	--

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرهاسبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

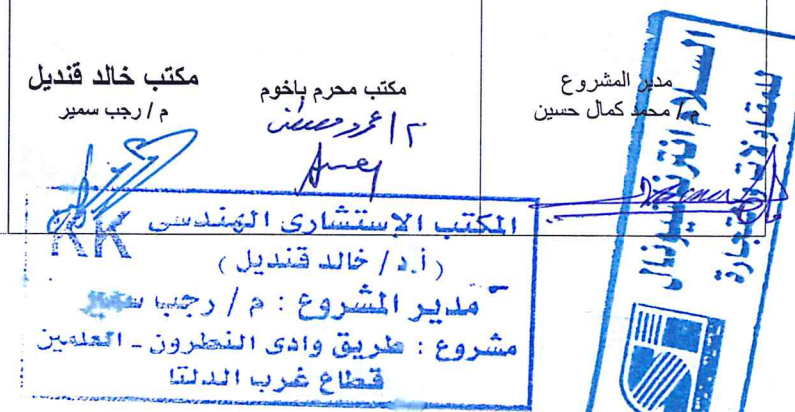

من بداية العمل حتى: 30 / 11 / 2023

كشف (10) جاري
المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات رقم العقد (2022/2021/543)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحده	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قروش	قروش	جنيه	قروش	جنيه		
أولاً: اعمال الطرق (ورقه 2)														
9	بالمتر المسطح تسوية اترية للجزر والاماكن التي يحددها المهندس المشرف	12.00	م2	700,000	560,000	0,000	560,000	6,720,000					6,720,000	
10	بالمتر المكعب توريد اترية للجزر والأماكن التي يحددها المهندس المشرف	60.00	م3	400,000	268,000	0,000	268,000	16,080,000					16,080,000	
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات - مسافة النقل 20 كم . - يتم احتساب علاوه 1 جنيه لكل 1 كم بالزياده او النقصان	248	م3	340,000	320,000	8,000	328,000	81,344,000					81,344,000	
	علاوه بند 5-1 مسافه نقل لطبقه الاساس مسافه 83 كم	63	م3	94,000	92,000	0,000	92,000	5,796,000					5,796,000	
	علاوه بند 5-1 مسافه نقل لطبقه الاساس مسافه 120كم	100	م3	246,000	228,000	8,000	236,000	23,600,000					23,600,000	
	المتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية	195	م2	135,000	116,000	8,000	124,000	24,180,000					24,180,000	
17	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل من (1,2 – 1.5) كجم ترش فوق طبقة الأساس	25	م2	750,001.52	711,000	0,000	711,000	17,775,000					17,775,000	
18	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل متوسط التطاير Rc3000 بمعدل 0.5 كجم ترش فوق طبقة الاسفلتية	8.35	م2	1,700,000	1,550,000	0,000	1,550,000	12,942,500					12,942,500	
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7 سم .	151.00	م2	155,000	152,000	0,000	152,000	22,952,000					22,952,000	
20	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم .	135.5	م2	1,015,000	1,003,000	0,000	1,003,000	135,906,500					135,906,500	
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم .	128.5	م2	1,011,800	995,000	0,000	995,000	127,857,500					127,857,500	
22	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع 90 سم	663	م . ط	3,500	2,500	400	2900	1,922,700					1,922,700	
اجمالي اعمال الطرق (ورقه 2)													477,076,200	

يعتمد،،، رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / هاني محمد محمود طه	أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهورها و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول تحريراً في: يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من	مدير عام مشروعات م / محمد فياض	مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم الحناوي م / محمد حاتم	مكتب خالد قنديل م / رجب سمير مكتب محرم باخوم م / محمد كمال حسين المكتب الاستشاري الهندسي (أ.د / خالد قنديل) مدير المشروع : م / رجب سمير مشروع : طريق وادي النطرون - العلمين قطاع غرب الدلتا	بمقاولات والتجارة شركة السلام انترناشيونال
---	---	--	--	---	---

كشف (10) جاري
المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات رقم العقد (2022/2021/543)

مدير المشروع م / محمد كمال حسين مكتب محرم باخوم م / رجب سمير المكتب للإستشارى الهندسى أ.د / خالد قنديل	مدير المشروع (الهيئة) م / محمد حاتم	مدير عام مشروعات م / محمد فياض	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من	بعمته،،، رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هانى محمد محمود طه"
---	---	--	---	---

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدیر عام مشروعات
م/ محمد فیاض

مدير المشروع (الهيئة)

م/ ابراهيم الخناوي

م/ محمد حاتم

مكتب خالد قنديل
م / رجب سمير

مكتب محرم باخوم
م / محمد كمال حسين

المكتب الإستشارى الهندسى
(أ.د / خالد قنديل)

مدير المشروع : م / رجب سمير

مشروع : طريق وادى النظرون - العليين
قطاع غرب الدلتا

المقاولة والتجارة
السلامة الشخصية

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم القطاع التاسع بطول 20 كم

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

كشف (10) جاري


المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات رقم العقد (2022/2021/543)

من بداية العمل حتى: 2023 / 11 / 30

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة	الوحده	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
انيا : اعمال الكباري (ورقه 1) ينود وكميات واسعار بعد المفاوضه														
بند رقم (1)	بالمتر الطولي اعمال جسات بالبر	355.00	م.ط	250.00	250.00	0.00	250.00	88750.00		0.00			88750.00	
بند رقم (3)	بالمتر المكعب تكسير خرساته عاديه و نقل المخلفات الي المقالب العموميه و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصنائه و الرسومات و المواصفات و عليمات المهندس المشرف	70.00	3م	120.00	117.00	0.00	117.00	8190.00		0.00			8190.00	
بند رقم (4)	بالمتر المكعب تكسير خرساته مسلحه و السعر يشمل كافه ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان تام و نقل المخلفات الي المقالب العموميه و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصنائه و الرسومات و المواصفات و عليمات المهندس المشرف مع تسليم الحديد التسليح للمالك	145.00	3م	160.00	153.00	0.00	153.00	22185.00		0.00			22185.00	
بند رقم (5)	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعماله يدويه فى ارض الموقع العام (رمليه او طينيه او ترابيه شديده التماسك) بالعمق المطلوب والقياس هندسى طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	85.00	3م	750.00	700.00	0.00	700.00	59500.00		0.00			59500.00	
بند رقم (6)	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبويه بالقواعد المسلحه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح لتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أى مياه تطهير أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب العمومية	85.00	3م	3850.00	3790.00	0.00	3790.00	322150.00		0.00			322150.00	
بند رقم (7)	بالمقطوعة نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دفنها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافه الاعمال والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمه للفك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعه	244,800.00	مقطوعيه	2.00	2.00	0.00	2.00	489600.00		0.00			489600.00	
بند رقم (8)	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر محفورة ومصبوبه بمواقعها قطر 100 سم بحموله تصميميه 320 طن ويتم تصميم الخلطة الخرسانيه مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد 28 يوم من الصب بالطبيعه عن 350كجم/سم2 ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 450كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات).	3,155.00	م.ط	800.00	780.00	0.00	780.00	2460900.00		0.00			2460900.00	
بند رقم (9)	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر محفورة ومصبوبه بمواقعها قطر 120 سم ويتم تصميم الخلطة الخرسانيه مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحه بعد 28 يوم من الصب بالطبيعه عن 350كجم/سم2 ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 450كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات).	4,280.00	م.ط	1200.00	1180.00	0.00	1180.00	5050400.00		0.00			5050400.00	
اجمالي اعمال الكباري ورقه (1)												8,501,675.00		

مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام مشروعات	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه يظهره وقدرهاسبق صرفها إلى المقاول : تحريراً في يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من		رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
م/ ابراهيم الحادوي م/ محمد حاتم	م/ محمد فياض			

مكتب محرم باخوم
م/ رجب سمير
مكتب خالد قنديل
م/ رجب سمير
مكتب محمد حاتم
م/ محمد حاتم
مكتب محمد فياض
م/ محمد فياض
مكتب هاني محمد محمود طه
م/ هاني محمد محمود طه



المقاول: شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات رقم العقد (2022/2021/543)

رقم البند	بيان الاعمال	الفنه	الوحده	الكميہ طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه					مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
ثانيا : اعمال الكباري (ورقه 2)													
بند رقم (10)	بالبعد عمل تجريه تحميل على ختروني عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمه بحمل 150% من الحمل التصميمي والفتة تشمل الاتواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والسعر يشمل ختروني التجربة الذي يصب خارج العمامات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ختروني قطر 1.0م بالبر)	145,000.00	عدد	1.00	0.00	1.00			145000.00	0.00		145000.00	
بند رقم (12)	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة اوتربة زلطية مودة من خارج الموقع حول الاساسات	186.00	م 3	1000	970.00	0.00	970.00		180420.00			180420.00	
بند رقم (13)	بالمتر المكعب نقل الاتربة الزائده الناتجه من الحفر الاستكشافي وحفر القواعد المسلحة وحفر الخوازيق واي مخلفات اخري الي المقالب العموميه والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ	85.00	م3	4400.00	4350.00	0.00	4350.00		369750.00			369750.00	
بند رقم (14)	خرسانه عادية للاساسات والبلاطات الانتقاليه مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يقل 300 كجم/م3 علي الا تقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي للخرسانه المسلحة 28 يوم من الصب بالطبيعه عن 250كجم/سم2	1,621.00	م3	300.00	261.00	0.00	261.00		423081.00	0.00		423081.00	
بند رقم 17- أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف ارتفاع حتي 6 م	2,906.00	م3	5280.00	3685.00	0.00	3685.00		10708610.00			10708610.00	
بند رقم 17-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف ارتفاع من 6 الي 9 م	3,106.00	م3	1250.00	1235.00	0.00	1235.00		3835910.00			3835910.00	
بند رقم 17- ج	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف ارتفاع من 9 الي 12 م	3,306.00	م3	865.00	864.00	0.00	864.00		2856384.00			2856384.00	
بند رقم 19-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتي 6 م	3,796.00	م3	860.00	853.00	0.00	853.00		3237988.00			3237988.00	
بند رقم 19 -ج	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع من 9 الي 12 م	4196.00	م3	2960.00	2959.00	0.00	2959.00		12415964.00			12415964.00	
بند رقم 19-د	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع اكبر من 12 م	4,396.00	م3	2970.00	2967.00	0.00	2967.00		13042932.00			13042932.00	
بند رقم (22)	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبري(المخدرات والأعمده وجداول تقريد الحديد المعتمده ومحمل على الفتة كراسي تثبيت الطبقات العلوية للتسليح والتخانات بين الأسياخ والأوتار وخلافة وعمل الاختبارات اللازمه ...الخ	27,000.00	طن	3970.00	3964.00	0.00	3964.00		107028000.00	0.00		107028000.00	
بند رقم (23)	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 52/36 أطول من 12م لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبري(المخدرات والأعمده والدعامات والأكتاف والحوالط والسائده والإنفاق والهايك العلويه) والفتة تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات واللودات وجداول تقريد الحديد المعتمده ومحمل على الفتة كراسي تثبيت الطبقات العلوية للتسليح والتخانات بين الأسياخ والأوتار وخلافة وعمل الاختبارات اللازمه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (حديد D مقاومة للزلازل)	27,500.00	طن	92.00	91.00	0.00	91.00		2502500.00	0.00		2502500.00	
بند رقم (24)	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البوبتومين على البازد بوجه تحضيرى ولالة أوجه للأساسات وجميع الأعمال المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسى طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	51.00	م2	3800.00	3650.00	0.00	3650.00		186150.00	0.00		186150.00	
بند رقم (25)	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات ثلاث أساس أكربك Anticarbonation ومواد مقاومه للأبخره والعوامل الجويه لعزل جسم الكوبري وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	100.00	م2	26500.00	20300.00	0.00	20300.00		2030000.00			2030000.00	
												158,962,689.000	
اجمالي اعمال الكباري (ورقه 2)													

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطر
عميد مهندس /
"هاتى محمد محمود طه"

ج و مضبوط و أن المبالغ المبيّنة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
..... ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

م/ محمد فياض

ابراهيم الحياوى

مکتب خالد قنديل
م / رجب سمير

مکتب محرم باخوم

مدير المشروع
م / محمد كمال حسين

المكتب الإستراتيجي للأمن القومي
(5/ خالد فتنديل)
ملاير المشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادي النطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا

المقاولة والتجارة
السلام الاقتصادي

10 اجمالي مستخلص جاري

مدیر عام مشروعات

..... يدفع للمقاو ل مبلغ

..... ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطر
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

يعتمد،،،

ملحق المشروع
محمد كمال حسين
(أ.د. / خالد السيد)
مدير المشروع : م / رجب السعيد
مشروع : طريق وادي النطرون - العلمين
قسم الدراسات والبحوث

السلامة التجارية
للمقاولات والتجارة
