


عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (القيوم/بني سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) المسافة من الكم 413+000 الى الكم 413+700 بطول 0.7 كم (بالأمر المباشر).													مستخلص جاري (2)		الهيئة العامة للطرق والكباري الإدارة المركزية (المنطقة السابعة) ، بأسسوط والمنيا.		المقد رقم : (2024/2023/496) بتاريخ 10/ 10/ 2023	
مع شركة السعيد للمقاولات والتوريدات العمومية													شاملة المدة من بداية العمل حتى 31 / 03 / 2024					
رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا لآخر محضر ملفوفة	الوحدة	كمية البند باخر مقايصة معتدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات						
										قرش / جنيه	قرش / جنيه							
أولا :- البنود طبقا لآخر محضر الملفوفة بتاريخ 2023-6-26																		
(أ) الأعمال المنفذة قبل 4/5/2023																		
9	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه للكيلومتر الزيادة	3م	٧٥,٠٠	١٠٥٦٩,٢٠	١٠٥٦٩,٢٠	١٠٥٦٩,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
9-4	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2	3م	٨٨,٠٠	١٢٥٤٥,٨٠	١٢٥٤٥,٨٠	١٢٥٤٥,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
9-6	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2	3م	٩٥,٠٠	٦٢٢٤,٠١	٦٢٢٤,٠١	٦٢٢٤,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
9-7	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم2	3م	١٠٠,٠٠	٩٢٠٤,٥٢	٩٢٠٤,٥٢	٩٢٠٤,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
(ب) الأعمال المنفذة قبل 4/5/2023																		
9	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه للكيلومتر الزيادة	3م	٨٨,٠٠	٢٤٢٩٦,٠٢	١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
9-6	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2 علاوة 1.9 جنيه /3م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	3م	٢,٢٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
9-8	ذات إجهاد (600-500) كجم/سم2 علاوة 2.2 جنيه /3م لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	3م	١٠٢,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
11	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 1.5 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زياده. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 . -علاوة زيادة سولار 1 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4 .	3م	٣٣,٠٠	٩٤٠٠,٠٠	٩٣٨٠,٠٠	٩٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								
11-1	علاوة زيادة سولار 1 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4 .	3م	١,٠٠	٩٤٠٠,٠٠	٩٣٨٠,٠٠	٩٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠								

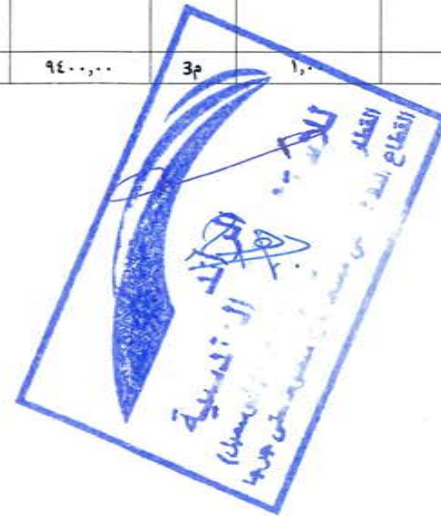

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه أسبوط

مهندس / مصطفى علي مسعود

12-13-14

U. S. A. /

1. Chlorophyll 12

[illegible]

عن الإشراف والاد
مدير المشروع
مكتب التخطيط
الرائد
١٦٨٠ ١٦٨٠
للإشراف
مكتب
للتخطيط
للتخطيط
مكتب
للتخطيط

عن استشاري المساحة (مكتب الدولة)
المكتب الفني
مدير المشروع
El Dawila For Surveying
والضريبة

الشركة المنفذة

شركة السعيد للمقاولات
