

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح حساب قيمة التعويض او الخصم (فروق الاسعار)
مشروع تنفيذ عملية استكمال اعمال توسعة الطريق من كم ٢٠٠+٤٤ حتي ٤٠٠+٤٧ بطول
٣,٢ كم شرق الطريق و المسافة من كم ٢٠٠+٤٤ الي كم ٢٠٠+٥٠ بطول ١ كم غرب الطريق
(اعمال اترية و اساس) ضمن اعمال تطوير و رفع كفاءة الصحراوي الغربي اسوان / ادفو بطول
٩٠ كم بالأمر المباشر

تنفيذ : مكتب صبحي للمقاولات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

- مستخلص ١

- استمارة ٥٠ ع. ح

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيي كرومر



Handwritten signature and initials.

مشروع : تنفيذ عملية استكمال اعمال توسعة الطريق من كم 44+200 حتي 47+400 بطول 3.2 كم شرق الطريق
والمسافة من كم 44+200 الي كم 50+200 بطول 1 كم غرب الطريق
(اعمال اتربة و اساس) ضمن اعمال تطوير و رفع كفاءة الصحراوي الغربي اسوان / ادفو بطول 90 كم بالامر
المباشر

نموذج حساب قيمة التعويضات او الخصم (لفروق الاسعار)

مستخلص جاري (1)

رقم العقد		فترة تنفيذ الأعمال من		٢٨ يوليه ٢٠٢٤		حتي		٨ أغسطس ٢٠٢٤		٧ يوليه ٢٠٢٤	
رقم العقد		العقد رقم (38 / 2024 / 2025)		٢٦ مارس ٢٠٢٢		فترة الحساب (من - الي)		٢٨ يوليه ٢٠٢٤		٨ أغسطس ٢٠٢٤	
رقم البند	بيان الأعمال	المؤشرات	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة الاجمالية	قيمة الاعمال	عناصر القابلة للتغيير	المعاملات (ك)	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي للمستخلص	نسبة الزيادة او الخصم	قيمة التعويض (زيادة او خصم)
2	توريد و فرش طبقة احلال في اماكن غير صالحة للتأسيس	م ³	177	5000.0	885000	سولار	25%	327.80	480.40	0.47	103987.5
3	حفر باستخدام البلدوز في جميع انواع التربة عدا الصخرية	م ³	20	20315.0	406300	سولار	20%	327.80	480.40	0.47	38192.2
5	طبقة اساس طبيعية ناتج مهزات	م ³	160	6876.0	1100160	سولار	20%	327.80	480.40	0.47	103415.04
6	طبقة اساس تكسية كارات	م ³	245	6161.0	1509445	سولار	15%	327.80	480.40	0.47	106415.8725
الاجمالي قبل الخصم											352010.6125
قيمة الخصم 1% من الاجمالي حسب التعاقد											3520.106125
الاجمالي العام لقيمة التعويض او الخصم (بعد خصم 1% طبقا للتعاقد) فقط ثلاثمائة وثمانية واربعون الف واربعمالة وتسعون جنيهاً وواحد وخمسون قرشاً لا غير											348490.51

رئيس الادارة المركزية
عبد يحيى كرومر

مدير المشروع
مهندس /
٤٩٨٦٧

مهندس المشروع

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

.....الهيئة العامة للطرق و الكباري

تحية طيبة و بعد.....

نَشْرَف ان نرفق لسيادتكم جدول المعاملات الخاصة بعملية استكمال اعمال توسعة الطريق

من كم ٢٠٠+٤٤ حتي ٤٧+٤٠٠ بطول ٣,٢ كم شرق الطريق و المسافة من كم ٢٠٠+٤٤ الي كم ٥٠+٢٠٠ بطول ١ كم غرب الطريق (اعمال اتربة و اساس) ضمن اعمال تطوير و رفع كفاءة الصحراوي الغربي اسوان / ادفو بطول ٩٠ كم بالأمر المباشر

نسبة المعاملات (ك - معاملات التكلفة المتغيرة)		
توصيف البند	سولار	بيتومين
طبقة تشريب (٣.٠ م. C)	%١٠	%٦٥
طبقة أسفلت رابطة ٦ سم	%١٠	%٥٥
طبقة لصق (٣.٠٠. RC)	%١٠	%٦٥
طبقة أسفلت سطحية ٥ سم	%١٠	%٥٥
إزالة المخلفات	%١٥	-
توريد وتحميل ونقل أتربة لتشكيل الجسروالأكتاف	%٢٠	-
توريد وفرش طبقة أساس ناتج فصل المهزات	%٢٠	-
توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير كسارات	%١٥	-
توريد وإضافة أسمنت	-	%٥
حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	%٢٠	-
طبقة إحلال	%٢٥	-
تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	%٢٠	-


نرجو من سيادتكم الموافقة و التنبيه لعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مدير عام الشركة

مهندس / فاروق محمد محمد

صبيحي أحمد حسب النبي



2022		
الشهر	سولار	أسفلت
يناير	323.70	487.10
فبراير	327.80	487.10
مارس	327.80	487.10
أبريل	332.00	490.50
مايو	332.00	566.00
يونيه	332.00	566.00
يوليو	353.60	566.00
أغسطس	353.60	566.00
سبتمبر	353.60	566.00
أكتوبر	353.60	566.00
نوفمبر	353.60	566.00
ديسمبر	353.60	566.00

2024		
الشهر	سولار	أسفلت
يناير	417.00	762.00
فبراير	417.00	762.00
مارس	480.40	762.00
أبريل	480.40	1,079.10
مايو		
يونيه		
يوليو		
أغسطس		
سبتمبر		
أكتوبر		
نوفمبر		
ديسمبر		

2023		
الشهر	سولار	أسفلت
يناير	353.60	566.00
فبراير	353.60	566.00
مارس	367.70	622.00
أبريل	367.70	622.00
مايو	371.30	622.00
يونيه	396.20	622.00
يوليو	396.20	622.00
أغسطس	396.20	622.00
سبتمبر	396.20	622.00
أكتوبر	396.20	683.60
نوفمبر	417.00	762.00
ديسمبر	417.00	762.00

الطلقات طبعاً : أو :
بموجب { المرفقة (فروق) الحسابات الخاصة (أ) حساب علية
لشركة التأمين في سنة الطريقه سكر م. ج. - كتر. ٤، اذ بطول ٢ كم فرق ان
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد ادارياً وصرف القيمة بواسطة
وسكر م. ج. - كتر. ٥، بطول ١ كم
} إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فنى :
شيك على الخارج صاحب الحق أو :
يسحب باسم { محتسب جهة التعاقد التـ " محمد احمد هـ البـنـغـيـر"
ويرسل اليه بالعنوان الاتى :

رقم : _____
الختم ذو التاريخ ١٥



كتب المراجعة

رئيس القسم

५.५ —————

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أ) بأن المبلغ مضاع بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الایرادات

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

وكيل الحسابات

مدیر اور رئیس الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲ بمبلغ



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٢ س ١٠٠٠٠ - ١٠١٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح - ا ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٤) صرف

(٤) قيد في سجل الشبهات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبهات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

شيد

الحوالات

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

شیت
(ذن صرف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة . . . وبعد

بخصوص مشروع الى مشروع عملية استكمال اعمال التوسعة الطريق من
الكم 44+200 الى الكم 47+400 بطول 3.2 كم شرق الطريق والمسافة من الكم
44+200 الى الكم 45+400 بطول 1 كم غرب الطريق (اعمال اترية واساس)
ضمن اعمال رفع وتطوير كفاءة طريق الصحراوي الغربى اسوان / ادفو بطول
90 كم "بالمر المباشر.

تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى ،

رقم العقد .: (38 / 2024 / 2025) المؤرخ فى 7 / 7 / 2024

نتشرف أن نرفق طيه :

مستخلص رقم (01) جارى و إستمارة 50 ع . ح الخاصة بالعملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عبد يحيى كرومر



2024

تحريرا فى :-

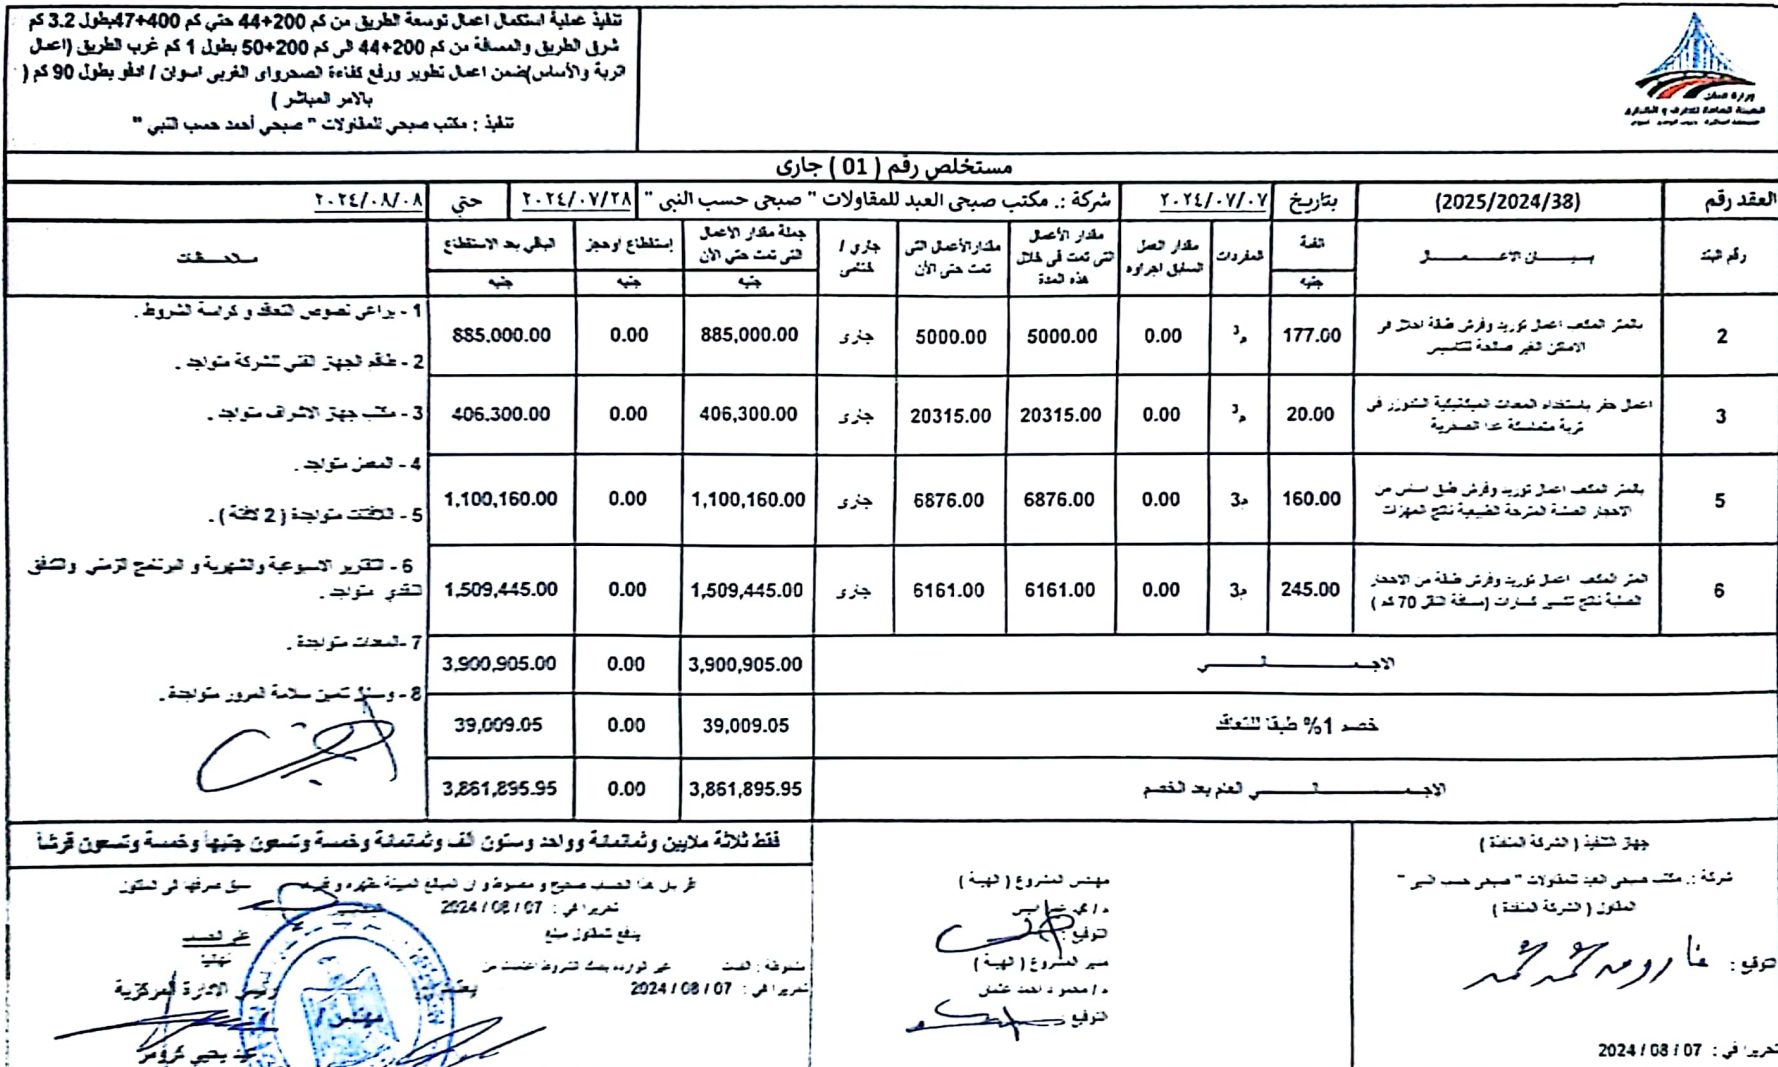

تفصيل مشروع الى مشروع عملية اكمال اعمال التوسعة الطريق من الكم 44+200 الى الكم 47+400 بطول 3.2 كم
 هرق الطريق والمضافة من الكم 44+200 الى الكم 45+400 بطول 1 كم تدرج الطريق (العمال اذرية واحاس) ضمن اعمال
 رقع وتطور كفاءة طريق السدرواي الغربي اسوان / اذرق بطول 90 كم بالامر الماهر "
 تفصيل : كم كم العبد للمجاوله "سبدي عصب النبي"

مستخلص جارى رقم (3)

بند رقم (2)

اعمال توريد وفرش طبقة احلال فى الاماكن الغير صالحة للتاسيس

بيان الاعمال	المفردات	اجمالى الكمية	ملاحظات
اعمال توريد وفرش طبقة احلال فى الاماكن الغير صالحة للتاسيس	3م	5000	
اجمالى الكمية المنفذة		5000	
الكمية السابق صرفها		0	
اجمالى الكمية المنفذة حاليا		5000	

مهندس الهيئة

عن الشركة

.....

تدفيت عملية امتحان اعمال التوسعة الطريق من الكم 44+200 الى الكم 47+400 بطول 3.2 كم خرق الطريق والمساواة
من الكم 44+200 الى الكم 45+400 بطول 1 كم تحريج الطريق (العمال اذرية واساس) ضمن اعمال رفع وتطوير كفاءة
طريق السعدواى الغربى اسوان / اذفو بطول 90 كم "بالمر المباخر"
تدفيت : مكتوب سبى العبد للمقاولات "سبى مصب البى"


مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (5)

المر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة ناتج المهزات والتدرج

بيان الاعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
المر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة ناتج المهزات والتدرج	3م	6876	
أجمالي الكمية المنفذة		6876	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		6876	

مهندس الهيئة



عن الشركة

صا. بوم. محمد محمد

تتضمن عملية استكمال اعمال التوسعة الطريق من الكم 200+44 الى الكم 400+47 بطول 3.2 كم هرق الطريق والمضافة من الكم 200+44 الى الكم 400+45 بطول 1 كم تربه الطريق (العمال ادرية واحاس) ضمن اعمال رفع وتطوير لحذاء طريق السمرواي الغربي اسوان / ادفو بطول 90 كم "بالمر الماهر"
تتضمن ، مكتبه سيمى العرب للمقاوله "سيمى حصه الديى"


مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (6)

المر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات

بيان الاعمال	المفردات	اجمالى الكمية	ملاحظات
المر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات	3م	6161	
اجمالى الكمية المنفذة		6161	
الكمية السابق صرفها		0	
اجمالى الكمية المنفذة حاليا		6161	

مهندس الهيئة



عن الشركة

