


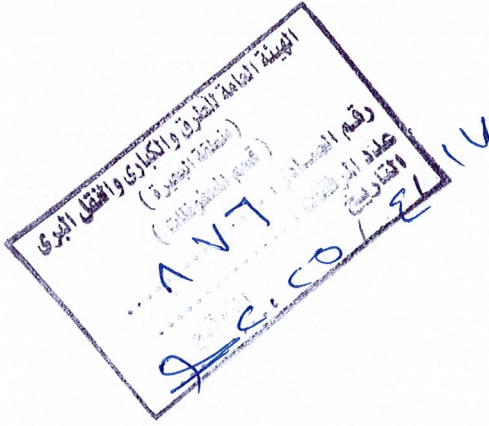

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٤) جاري لعملية أعمال إنشاء تنفيذ كوبري
علوي للسيارات عند تقاطع طريق الطبراني (اتجاه اسكندرية) مع مسار الخط الأول للقطار
الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

عقد رقم (٢٠٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

تنفيذ: الشركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

أ.م. أبو دقيقة

مهندس الهيئة

م/ أحمد الشاعر

أ.م. الشاعر

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس / مجدي عبد السلام

المرفقات ()

م	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والتعارضات	٣٦٦	١٢	م.ط	٣٦٥	٠	٣٦٥	جاري	٠,٩٨	٤٢٩٢		٤٢٩٢	
٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى سمك والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوى العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	٨	٦٥	م.٣	٧	٠	٧	جاري	٠,٩٨	٤٤٦		٤٤٦	
٦	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	٤٥٠	م.ط	١٤٥	٠	١٤٥	جاري	٠,٩٨	٦٣٩٤٥		٦٣٩٤٥	١. المعمل متواجد ٢. المهندسون متواجدون ٣. المكاتب متواجدة ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. ٥. المعدات متواجدة ٦. وثيقة التأمين متواجدة ٧. البرنامج الزمني متواجد ٨. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة ٩. لوحات المشروع متواجدة
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاولاش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحركات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	١	٢٧٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	٠,٩٨	٢٦٤٦٠٠		٢٦٤٦٠٠	
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاند عادي لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم² مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهوى العمل نهواً كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥٣	٥٣٣٠	م.ط	١٧٥٢	٠	١٧٥٢	جاري	٠,٩٨	٩١٥١٣٩٧		٩١٥١٣٩٧	
٩	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل بالبر قطر ١٢٠سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	١	٢٠٦٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	٠,٩٨	٢٠١٨٨٠		٢٠١٨٨٠	
١٠	المتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى أنواع التربة (عدا المتناسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم² بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤٥	٦٠	م.٣	٤٤٤	٠	٤٤٤	جاري	٠,٩٨	٢٦١٠٧		٢٦١٠٧	
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الإساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أى مياه تظهر فى أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٥٥	١٠٠	م.٣	١٨٥٣	٠	١٨٥٣	جاري	٠,٩٨	١٨١٥٩٤		١٨١٥٩٤	
١٢	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٥	١١٥	م.٣	١٩٣	٠	١٩٣	جاري	٠,٩٨	٢١٧٥١		٢١٧٥١	
١٣	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ٤٠ كم وعلوة ١ جنيه لكل كم زيادة.	٢٢١	١٦٠	م.٣	٢٢٠	٠	٢٢٠	جاري	٠,٩٨	٣٤٤٩٦		٣٤٤٩٦	
١٤	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاند عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم² و لا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٦٨	٢٠٦٠	م.٣	٦٧	٠	٦٧	جاري	٠,٩٨	١٣٥٢٦٠		١٣٥٢٦٠	
الإجمالي													

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
(البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس /
مجدي عبد السلام
٥٠٩٦٥

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريراً في/...../..... المحاسب /.....
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائياً
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/احمد ابودقيقة
التوقيع :

مدير إدارة المشروعات
م/ كارم إمام

الاستشاري الهيئة
مكتب النيل الهندسي الاستشاري
التوقيع :
مهندس الاستشاري /
التوقيع :
مدير المشروع /
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ محمد عبد الحليم
التوقيع :
م/ محمد عبد الحليم
التوقيع :
المكتب الفني
م/ محمد عبد الحليم
التوقيع :

الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
س.ت: ١٦٤١٩٠ ف.ض: ٧٣٤٠/٩٩٤

م	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
										١٠٠٨٥٧٦٨	٠	١٠٠٨٥٧٦٨	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاند عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	١٥٢٦	٢٨٠٠	م ^٣	١٥٢٥	٠	١٥٢٥	جاري	٠,٩٨	٤١٨٤٦٠٠		٤١٨٤٦٠٠	
١٥-أ	علاوة زيادة محتوى الي ٤٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم ^٢	١١٤٤	٢٤٠	م ^٣	١١٤٣	٠	١١٤٣	جاري	٠,٩٨	٢٦٨٨٣٤		٢٦٨٨٣٤	
١٥-ب	علاوة زيادة محتوى الي ٤٧٥ كجم/م ^٣ وإجهاد الي ٤٥٠ كجم/سم ^٢	٣٨٣	٢٧٠	م ^٣	٣٨٢	٠	٣٨٢	جاري	٠,٩٨	١٠١٠٧٧		١٠١٠٧٧	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم ^٣ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/سم ^٣ أسمنت بورتلاند عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مايمثالها للوصول للاجهاد المطلوب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.												
١٦-أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٤	٣٦٤٠	م ^٣	٣٣	٠	٣٣	جاري	٠,٩٨	١١٧٧١٨		١١٧٧١٨	
١٦-ب	ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٩٨	٣٧٤٠	م ^٣	٩٦	٠	٩٦	جاري	٠,٩٨	٣٥١٨٥٩		٣٥١٨٥٩	
١٦-ج	ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٢٦	٣٨٤٠	م ^٣	٢٤	٠	٢٤	جاري	٠,٩٨	٩٠٣١٧		٩٠٣١٧	
١٦-د	ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٦٥	٤٠٤٠	م ^٣	٦٣	٠	٦٣	جاري	٠,٩٨	٢٤٩٤٣٠		٢٤٩٤٣٠	
١٦-هـ	ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٦	٤١٤٠	م ^٣	٣٥	٠	٣٥	جاري	٠,٩٨	١٤٢٠٠٢		١٤٢٠٠٢	
١٦-و	ارتفاع حتى ١٣ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٢٦	٤٣٤٠	م ^٣	١٢٤	٠	١٢٤	جاري	٠,٩٨	٥٢٧٣٩٧		٥٢٧٣٩٧	
١٦-ز	ارتفاع حتى ١٤ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٤٤	٤٤٤٠	م ^٣	٤٣	١٥	٤٣	جاري	٠,٩٨	١٨٧١٠٢		١٨٧١٠٢	
١٦-ح	علاوة زيادة محتوى الي ٥٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد الي ٥٠٠ كجم/سم ^٢	٧٠	١٢٠	م ^٣	٦٩	٤	٦٩	جاري	٠,٩٨	٨١١٤		٨١١٤	
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعدة الكوبري و الهوامات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي وجهد كسر ٤٥٠ كجم /سم ^٣ ومحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم / م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح وان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مايمثالها للوصول للاجهاد المطلوب ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات للتصليية المعتمدة و البنـد بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.												
١٧-أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٠٤	٣٨٤٠	م ^٣	١٠٣	٠	١٠٣	جاري	٠,٩٨	٣٨٧٦١٠		٣٨٧٦١٠	
١٧-ب	ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٢٩	٣٩٤٠	م ^٣	١٢٨	٠	١٢٨	جاري	٠,٩٨	٤٩٤٢٣٤		٤٩٤٢٣٤	
١٧-ج	ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٥	٤٢٤٠	م ^٣	٣٤	٠	٣٤	جاري	٠,٩٨	١٤١٢٧٧		١٤١٢٧٧	
١٧-د	ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٥	٤٣٤٠	م ^٣	٣٤	٠	٣٤	جاري	٠,٩٨	١٤٤٦٠٩		١٤٤٦٠٩	
١٧-هـ	ارتفاع حتى ١٣ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٦٩	٤٥٤٠	م ^٣	٦٨	٠	٦٨	جاري	٠,٩٨	٣٠٢٥٤٦		٣٠٢٥٤٦	
١٧-و	علاوة زيادة محتوى الي ٥٠٠ كجم/م ^٣ وإجهاد الي ٥٠٠ كجم/سم ^٢	٥٩	١٢٠	م ^٣	٥٨	٠	٥٨	جاري	٠,٩٨	٦٨٢١		٦٨٢١	
	الإجمالي									١٧٧٩١٣١٢	٠	١٧٧٩١٣١٢	

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
(البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس/ مجدي عبد السلام
٥٠٩٢٥

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في/...../..... المحاسب /
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/ احمد ابودقيقة
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كرام إمام

الشركة المنفذة
م/ محمد جمال
مهندس الاستشاري / م/ محمد جمال
التوقيع :
مكتب الفني
م/ محمد جمال
التوقيع :
مدير المشروع /
التوقيع :

الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
ب.ض. ١٧٨١٩/ ٧٣٤١/ ٩٩٤/ ٢٧٠

م	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييسه	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
										جنيه	جنيه	جنيه	
										١٧٧٩١٣١٢	٠	١٧٧٩١٣١٢	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة FAIR FACE مسلحة لزوم القطاع الصندوقي شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستاتها حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٧	٣٩٩٠	م ^٣	٠	٢٥٦	٢٥٦	جاري	٠,٩٨	١٠٠١٠١١		١٠٠١٠١١	
١٨-ج	ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	٥٢٦	٤١٩٠	م ^٣	١٣٢	٣٩٣	٥٢٥	جاري	٠,٩٨	٢١٥٥٧٥٥		٢١٥٥٧٥٥	
١٨-د	ارتفاع حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	٢١٧	٤٢٩٠	م ^٣	٠	٢١٦	٢١٦	جاري	٠,٩٨	٩٠٨١٠٧		٩٠٨١٠٧	
١٨-هـ	ارتفاع حتى ١٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	٢٢٣	٤٣٩٠	م ^٣	٠	٢٢٢	٢٢٢	جاري	٠,٩٨	٩٥٥٠٨٨		٩٥٥٠٨٨	
١٨-و	ارتفاع حتى ١١ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	٤١٤	٤٤٩٠	م ^٣	٩٣	٣٢٠	٤١٣	جاري	٠,٩٨	١٨١٧٢٨٣		١٨١٧٢٨٣	
١٨-ز	ارتفاع حتى ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	١٩٠	٤٦٩٠	م ^٣	٩٠	٩٩	١٨٩	جاري	٠,٩٨	٨٦٨٦٨٢		٨٦٨٦٨٢	
١٨-ح	ارتفاع حتى ١٤ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	٢٨٠	٤٧٩٠	م ^٣	١٣٢	١٤٦	٢٧٨	جاري	٠,٩٨	١٣٠٤٩٨٨		١٣٠٤٩٨٨	
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٤	٥٣٠٠٠	طن	١٠٥٢	٥٤٨	١٦٠٠	جاري	٠,٩٨	٨٣١٠٤٠٠٠	١٨٩٥٨١٠	٨١٢٠٨١٩٠	حجز مبلغ ١٨٩٥٨١٠ حتى الانتهاء من الصب
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كبلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجهاد والكمرات العرضية لزوم الهيكل العلوي للكوبرى طبقاً لمواصفات المشروع والفئة تشمل توريد (الكابلات/الإكسسوارات/الأجربة/الأنكورز/الويدجز) اللازمة طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ونهواً كاملاً	٦٥	١١٥٥٠٠	طن	٠	٦٤	٦٤	جاري	٠,٩٨	٧٢٤٤١٦٠	١٨١١٠٤٠	٥٤٣٣١٢٠	حجز مبلغ ١٨١١٠٤٠ حتى الانتهاء من اعمال شد الكابلات
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهواً كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلي المقاول اعتماد المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهواً كاملاً والقياس الهندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٥٨٥	٦٠	م ^٢	١٥٨٤	٠	١٥٨٤	جاري	٠,٩٨	٩٣١٣٩		٩٣١٣٩	
٢٤	بالعد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح أسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموحدة EN 1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو أو ما يمثليها و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المعرضة لها الركائز و براعي بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترفع مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملتها لسعر الحموله الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الأشراف في المركز القومي للبحوث والفئة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. والسعر يشمل الاختبارات الغير متلفة فقط	١٢	٥٧٥٠٠	عدد	٤	٨	١٢	جاري	٠,٩٨	٦٧٦٢٠٠	٥٠٠٠٠	٦٢٦٢٠٠	حجز مبلغ ٥٠٠٠٠ حتى استكمال الاختبارات المطلوبة
٢٤-ب	بالعد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوايط	١٠	٢١٠٠٠٠	عدد	٨	٢	١٠	جاري	٠,٩٨	٢٠٥٨٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٠٠٨٠٠٠	حجز مبلغ ٥٠٠٠٠ حتى استكمال الاختبارات المطلوبة
٢٥	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات الفئة تشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٥٣٢	٦	م ^٢	٤٠٨	٠	٤٠٨	جاري	٠,٩٨	٢٣٩٩		٢٣٩٩	
٢٦	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتربة صلحة من خارج الموقع حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول المجري المائي والسعر يشمل إزالة اعمال الردم بعد الإنتهاء من الاعمال وتطهير المجري حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لمأكنية الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لإتمام العمل	١٥٧٥	١٠٥	م ^٣	١٥٦٥	٠	١٥٦٥	جاري	٠,٩٨	١٦١٠٣٩		١٦١٠٣٩	
٢٧	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور .	١	٥٠٠٠	مقطوعة	١	٠	١	جاري	٠,٩٨	٤٩٠٠٠		٤٩٠٠٠	
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	طن	٤٤٨	-٤٤٨	٠	جاري	٠,٠٠	٠		٠	
إجمالي الأعمال													
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جاري)													
القيمة الحالية للمستخلص (جاري)													
٢٠٤٨٨٧٩٤													
١١٦٣٨٣٣١٣													
٣٨٠٦٨٥٠													
١٢٠١٩٠١٦٣													
٨٥٨٩٤٥١٨													
٣٠٤٨٨٧٩٤													

مهندس
مجدى عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
التحجير - كفر الشيخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعقيدة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريراً في المحاسب /
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ علي الحساب / نهائياً
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ..

تحت إشراف مكتب من المنطقة
م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/احمد ابوبقيقة
التوقيع :

الاستشاري
مكتب النيل الهندسي الاستشاري
التوقيع :
مدير المشروع
التوقيع :

المكتب الفني
م/ احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
التوقيع :
الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
س.ت. ١٣٤١٩٠: ب.ض. ٢٢٤/٧٩٤/٢٠٢٠
