




الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)

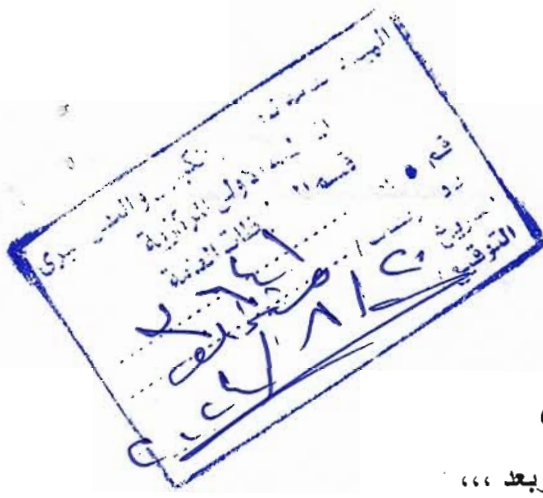

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى اعلى محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر) تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٨/١٨

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب محملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ





(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



۱۹۷۸

رئيس المصلحة

فى _____ سنة ٢٠١

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الامارات بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ ————— نسخة

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ ميلادي

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٣س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح : ح ») — امضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

اختتم ذو التاريخ (٣) شعب
شيف
رقم : إمضاء الكاتب الموثق :
أ. صيف

(٤) قيد في سجل

البيانات	تحت رقم :	إمضاء الكاتب المشرف :
التسليمات		

(5) أدرج في كشف الشبكات قسم : امضاء الكاتب الموثق :



عن عملية : عملية انشاء كوبري تقاطع محور سفنكس مع مسار القطار السريع
حتى : ٢٠٢٤ / ٨ / ٥

مستخلص رقم (٩) جاري
مع / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولا :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة	١٣٣٠	٤٠٠	م.ط	٤٨٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جاري	١٩٢٠٠٠	.	١٩٢٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٢	١٤٨٠٠٠	بالعدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٤٨٠٠٠	.	١٤٨٠٠٠	عدد (٥) مهندسين متواجدين
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣١٠٠	٤٧٢٠	م.ط	٢٩٢٢	٠,٠٠	٢٩٢٢,٠٠	جاري	١٣٧٩١٨٤٠	.	١٣٧٩١٨٤٠	مكتب الاشراف متواجد
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٤٠٠٠	٩٠	م	٣٩٨٠	٠,٠٠	٣٩٨٠,٠٠	جاري	٣٥٨٢٠٠	.	٣٥٨٢٠٠	عدد (١) مراقب متواجد
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٢٠٠	١٨٨٥	م	١٤٤	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٢٧١٤٤٠	.	٢٧١٤٤٠	عدد (٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٣١٠٠	٢٥٧٠	م	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٧٩٦٧٠٠٠	.	٧٩٦٧٠٠٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم ^٢ بزيادة محتوى الاسمنت من	٣١٠٠	١٨٠	م	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٥٥٨٠٠٠	.	٥٥٨٠٠٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	١١٢٥	٣٢٨٠	م	٨٥٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	جاري	.	.	.	تقرير (مبدئي - نصف شهري - شهري) متواجد
١٧-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	١١٢٥	٣٢٨٠	م	٨٣٢	٠,٠٠	٨٣٢,٠٠	جاري	٢٧٨٨٠٠٠	.	٢٧٨٨٠٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	١١٢٥	٩٠	م	٨٣٢	٠,٠٠	٨٣٢,٠٠	جاري	٨٣٢٠٠	.	٨٣٢٠٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	١٠٠٠	٣٤٢٠	م	٢٢٢,٠٠	٧٦,٠٠	٢٩٨,٠٠	جاري	.	.	.	تم استبدال الاستراحة المنصوص عليها بالتعاقد طبقا لموافقة
١٨-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	١٠٠٠	٣٤٢٠	م	١٢٣,٠٠	٧٦,٠٠	١٩٩,٠٠	جاري	١٠١٩١٦٠	.	١٠١٩١٦٠	رئيس مجلس الادارة (مرفق صورة)
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبساته	١٢٠٠٠	٣٥٣٠	م	٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٠٠	جاري	١٩٩٠٠	.	١٩٩٠٠	
١٩-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	١٢٠٠٠	٣٥٣٠	م	٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩٧٦,٠٠	جاري	٣٤٤٥٢٨٠	.	٣٤٤٥٢٨٠	
٢٠	توريد وتشغيل وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٤٠٠١	٤١٠٠٠	طن	٢٠١٠	٥٦,٠٠	٢٠٦٦,٠٠	جاري	.	.	.	
٢٠-أ	بطول ١٢ متر	٤٠٠١	٤١٠٠٠	طن	٢٠١٠	٥٦,٠٠	٢٠٦٦,٠٠	جاري	٨٤٧٠٦٠٠٠	.	٨٤٧٠٦٠٠٠	استقطاع لحين الشد والحقن والافساح
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	٢٠٠	١١٠٠٠٠	طن	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٨٨٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠	٨٨٠٠٠٠٠	
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٣٧٠٠	٥٥	م	١٤٢٦	٠,٠٠	١٤٢٦,٠٠	جاري	٧٨٤٣٠	.	٧٨٤٣٠	
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	١٢	٤٦٠٠٠	عدد	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠	.	١٣٨٠٠٠	
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	١٢	١٦٨٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	.	١٠٠٨٠٠٠	
تشوينات												
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	طن	٦٠٠	٥٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	جاري	٤٥١٠٠٠٠٠	١٨٠٤٠٠٠٠	٢٧٠٦٠٠٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	طن	١٠٣	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠	جاري	٣٣٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٩٨٠٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	١٢	٤٦٠٠٠	عدد	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠	٥٥٢٠٠	٨٢٨٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	١٦٨٠٠٠	١٦٨٠٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٤٠٣٢٠٠	٦٠٤٨٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٢	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات							جاري				
٣٢-أ	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم			م	٣٠٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	استقطاع لحين التشغيل
الإجمالي (فقط وقدره مائة ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمائة ثمانية وتسعون ألفاً وخمسون جنيهاً فقط لا غير...)												
									١٥٣٤٩٨٠٠٠,٠٠			
									٧٦٧٤٩٠,٢٥	خصم ٠,٥٠ % طبقا لمحضر المفاوضات		
									١٥٢٧٣٠٥٥٩,٧٥	الاجمالي بعد الخصم		
									١٣٥٧٥٢٣٥٧,٣٥	السابق		
									١٦٩٧٨٢٠٢,٤٠	الصافي		

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع:-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المال والاداري
التوقيع:-

مدير عام المشروعات
التوقيع:-

PEFA
Date: 2 / 2024
Project No.
Action By: /
مهندس المشروع
مدير المشروع
التوقيع:-

أقر بصفة ذلك :
مدير التنفيذ :-
التوقيع:-

بند المیزانیة :

تحريرا في	سنة ٢٠٠٠ رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف		امضاء :
بان المبالغ على بالامانة بتاريخ		امضاء :

رواج
 يعتمد - سحب شيك
 اذن صرف
 رئيس الحسابات
 بمبلغ
 تحريفي سنة ٢٠٠

- تسلمت التحويلة رقم وافر بأني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) ((واني تسملت المستحق لي بالتام
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

[illegible]

الباقى للمقاو

الجملة

الباقى للمقاو

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار
