


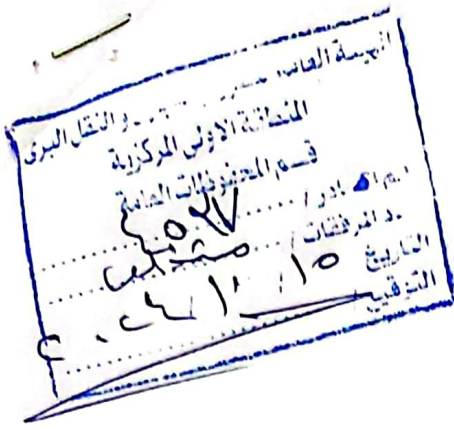

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة
الحواجز الخرسانية لتقاطع الاقليمي مع طريق الواحات (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / مكتب الرحمن للمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/١٠/٩

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف إبراهيم الجزار
مهندس /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

بالإحالة الى العقد رقم (١٣٩٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨

اعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية لتقاطع الاقليمى مع طريق الواحات (بالامر المباشر)


تنفيذ شركة / مكتب الرحمن للمقاولات

برجاء التكرم بالإحاطة بان العقد بعاليه يشمل على توريد عدد (٢٥) كارتونة ورق تصوير A4 ولا يوجد اى محملات اخرى .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/٩



يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف ابراهيم الجزار

مهندس /



مصلحة : | لهية السامو للفقه والسياسة

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

الطلبات طيه ، أو :

(c) 6, 6, 7

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج
يسحب باسم
صاحب الحق أو: صاحب الحق

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٥٠	٢٩
			
الجملة		٥٥٠	١٩

كتب المراجعة

رئيس القسم

شركة الملاحة البحرية

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرافقات	بيانات			نوع الخصم		
	م ٥ / ١ / ٢٩	بند	قسم	فرع	فصل	جنيه
	م ٥ / ١ / ٢٩					
	٢٠٢٩ / ٩ / ٢٩	إجمالي الأصل				٥٥٥ / ٩١
	بيانات الاستقطاعات	قرش		جنيه		
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				

المختتم ذو التاريخ

روبع

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الإيرادات بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لتدوين المطابع الأميرية ١٦٠٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٤ ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

شيد
إذن صرف

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۲۳) سحب

المختتم ذو التاريخ

الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۴) قید فی سجل

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۵) ادرج فی کشف

شيد

(۶) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠١

شیک
إذن صرف

مستخلص رقم (٢) جاري
اعمال تطوير و صيانة و رفع كفاءة الحواجز الخرسانية لتقاطع الاقليمي مع طريق الواحات (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة مكتب الرحمن للمقاولات

المنطقة الاولى المركزية

عقد رقم : ١٣٩٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ : ٩ / ٩ / ٢٠٢٤

عن المدة من بداية المشروع إلى ٩ / ٩ / ٢٠٢٤

البنء	الكميل	الفئة	الوحءة	الكمية	الكمية	الكمية	قيمة الاعمال	% نسبة	قيمة	جار أم	قيمة الأعمال	ملاحظات
١	٣٠٠	٥٥٠	م ط	٢١٠	٣٠	٢٤٠	١٣٢٠٠٠	% ٠	-	جار	١٣٢٠٠٠	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب و ترميم حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم المواصفات
٢	١٠٠	٧٥٠	م ط	٤٠	١٠	٥٠	٣٧٥٠٠	% ٠	-	جار	٣٧٥٠٠	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب و ترميم حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم
٣	٢٠٠	١٤٣	م ط	١١٠	١٠	١٢٠	١٧١٦٠	% ٠	-	جار	١٧١٦٠	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب برءورة من الخرسانة العادية بابعاء ٣٠×٣٠/٢٥ سم
٤	١٠٠	١٥٧	م ط	٤٥	-	٤٥	٧٠٦٥	% ٠	-	جار	٧٠٦٥	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم
٥	٦٠٠٠	٨٥	م ط	-	٥٧٠٠	٥٧٠٠	٤٨٤٥٠٠	% ٠	-	جار	٤٨٤٥٠٠	بالمتر الطولي توريد و دهان بماءة السافيتو للحواجز الخرسانية (نيوجيرسي)
٦	٢٥٠٠	٢٠	م ط	١٥٠٠	٦٠٠	٢١٠٠	٤٢٠٠٠	% ٠	-	جار	٤٢٠٠٠	بالمتر الطولي دهان برءورة بابعاء ٣٠×٢٥ سم طبقا للشروط و المواصفات
٧	٣٣٠٠	٦٥	م ط	١٥٠٠	٥٠	١٥٥٠	١٠٠٧٥٠	% ٠	-	جار	١٠٠٧٥٠	بالمتر المسطح توريد و دهان بماءة السافيتو للبلاطات الخرسانية بالجزيرة طبقا للشروط و المواصفات
٨	٣٠٠	٢٣	م ط	٢٥٠	-	٢٥٠	٥٧٥٠	% ٠	-	جار	٥٧٥٠	اعمال تحميل و نقل الاتربة المتراكمه حول الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) و نقلها الى المقالب العمومية
الاجمالي												
٨٢٦٧٢٥												



رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس المشروع منطقة الوادي الجديد

م / هاني محمد ابراهيم

مهندس المنطقة الأولى المركزية

م / امين محمد السيد

المقاول الشركة المنفذة

م / عزت قاروق محمود



الكميات المنفذة لشركة الرحمن للمقاولات قبل حدوث المسيل
بأعمال تطوير و صيانة و رفع كفاءة نقاط الاطريق الاقليمي و طريق الواحات

م	البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
1	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب و ترميم حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ يتم التنفيذ مع تكسير ونقل مخلفات الحاجز القديم الي المقالب العمومية طبقا للشروط و المواصفات	م/ط	250.00	
2	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب و ترميم حاجز خرساني (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ يتم التنفيذ مع تكسير ونقل مخلفات الحاجز القديم الي المقالب العمومية طبقا للشروط و المواصفات	م/ط	50.00	
3	بالمتر الطولي اعمال توريد و صب بردورة من الخرسانة العادية بابعاد ٣٠/٢٥*٣٠ سم تتكون من ٢٠,٨ م ^٣ سن + ٠,٤ م ^٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت مع تكسير التالف و نقل المخلفات الي المقالب العمومية طبقا للشروط و المواصفات	م/ط	120.00	
4	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم تتكون من ٢٠,٨ م ^٣ من سن الدولميت متخرج + ٠,٤ م ^٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمن بورتلاندي عادي و البند طبقا لاصول الصناعة مع كسير التالف و نقل المخلفات الي المقالب العمومية	م ^٢	47.53	
5	بالمتر الطولي توريد و دهان بمادة السافيتو للحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) مع نظافة السطح القديم طبقا للشروط و المواصفات	م/ط	5,822.15	
6	بالمتر الطولي دهان بردورة بابعاد ٣٠/٢٥ سم طبقا للشروط و المواصفات	م/ط	2,195.77	
7	بالمتر المسطح توريد و دهان بمادة السافيتو للبلاطات الخرسانية بالجزيرة طبقا للشروط و المواصفات	م ^٢	1,560.00	
8	اعمال تحميل و نقل الاتربة المتراكمة حول الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) و نقلها الي المقالب العمومية طبقا للشروط و المواصفات	م ^٣	252.00	

مهندس كسبة

١٣

مهندس الشركة
١٣
