


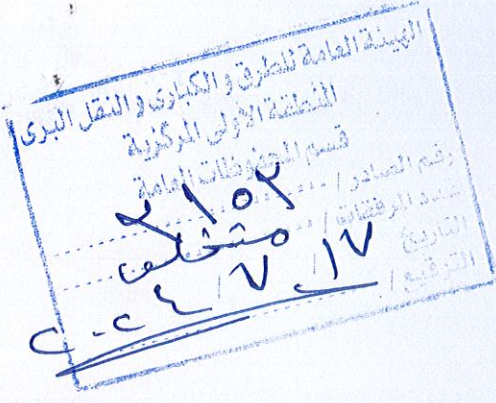

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٢) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٢٠	٢٠٢٤/١/١٥	١٧٩٥	مركزي
		الاجمالى	١٧٩٥	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٧/١٠

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع. ح
عدد (١) حصر أعمال
عدد (١) كشف المهندسين
عدد (١) كشف المعدات
عدد (٢) تجارب معمل الموقع
محضر مسافه/محضر محاجر

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ

مهندس /



س

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ايماء الي العقد (رقم العقد ٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر مستخلص رقم (٩)

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

نحيط سيادتكم علما بان كراسه الشروط الخاصه بالعملية عاليه متضمنه التزام المقاول بتزويد موقع الع مل بالاتي :-

- عدد (٣) اجهزه كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر A3 وعدد (٣) كراسي متحركه عدد (٦) علب HD (CD)
- عدد (٢) ماكينة تصوير A3 ماركة زير وكس أو HP او ما يماثلها
- عدد (٤) هارد ديسك (3TB) وعدد (٦) فلاشه ٣٢ GB
- عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان

وحسبما افاد المهندس المشرف علي العملية (بملاحظات المستخلص) بتواجد الاجهزه في موقع العملية فعليا .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٧/١٠

عدد المرفقات ()

عدد (١) العقد

عدد (١) شروط العقد

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /



س

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٢) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان
السكة الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٢٠	٢٠٢٤/١/١٥	١٧٩٥	مركزي
		الاجمالى	١٧٩٥	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



تحريراً فى : ٢٠٢٤/٧/١٠

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع. ح
عدد (١) حصر أعمال
عدد (١) كشف المهندسين
عدد (١) كشف المعدات
عدد (٢) تجارب معمل الموقع
محضر مسافه/محضر محاجر

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طبيخ

صورة مرسلة : السيد المهندس / مدير عام المعامل المركزية
تحية طيبة.. وبعد ،،،

رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طبيخ



س

18) ادرج هي كشف :
المسؤولية :
امضاء الكاتب المنوط :

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجرأوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اعمال الطرق												
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع	م ^٢	٥,٢٥	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير (المبدئي - النصف شهري - الشهري) متواجد بالموقع
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لمسافة نقل ٥٠٠ م	م ^٣	٢٤,٠٠	-	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد بالموقع
4	بالمتر المكعب تكشير وإزالة مباني أو خرسانية عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكشير خارج الموقع للمقالب العمومية	م ^٣	٨٢,٠٠	س/ك	٠,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٦٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	عدد (٥) مهندسون متواجدون بالموقع
5	بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكشير خارج الموقع لمسافة ١٠ كم	م ^٣	٦١,٠٠	س/ك	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٦١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مدير المشروع متواجد بالموقع
7	أ - بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر لاشمل قيمة المادة المحجرة والكرتات	م ^٣	٦٣,٠٠	[Signature]	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل متواجد بالموقع
	قيمة المادة المحجرة "طبقاً للمحضر"		١١٠,٣٢	[Signature]	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١١٠٣٢,٠٠	٠,٠٠	مكتب الاشراف متواجدة بالموقع
	مسافة النقل لاقل عن ٥٠ كم		١٣,٠٠	[Signature]	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة بالموقع
8	رسوم الكارتات	م ^٣	١٣,٠٠	[Signature]	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة بالموقع
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكشير كسارات		٣١٦,٨٠	[Signature]	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٣١٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة بالموقع
	مسافة النقل لاقل عن ٨٠ كم		١٥,٠٠	[Signature]	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	تعليمات الامن الصناعي متواجدة بالموقع
12	رسوم الكارتات	م ^٣	١٥,٠٠	[Signature]	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	متوافر عدد (٣) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الادارة بالموقع
	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعزل ١,٢ كجم/ م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس		٢٣,٠٠	[Signature]	٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٢٤٦١,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٨١٢١٣,٠٠	٠,٠٠	+ متواجد عدد (٣) كمبيوتر + عدد (٣) كرسي متحرك + طابعة ليزر CD عدد ٦ علبة
	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابططة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبیتومین الصلب، ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات		١٧٥,٢٠	[Signature]	٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٢٤٦١,٠٠	%٠,٠٠	جارى	٤٣١٦٧,٢٠	٠,٠٠	متواجد عدد ٢ ماكينة تصوير + ٤ هارد ديسك + عدد ٦ فلاشة ٢٢ جيجيا بالموقع
15	المقاول العام: ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات	مهندس المكتب الفني	مهندس/مصطفى جمال كامل	ایديکس الدولیة للهندسة والمقاولات مدير المشروع عضو الاتحاد الهندسى المصرى مهندس /نبلى اصلاح البيلى كوبرى اعلى شانتان اب النسر PJ-070	استشارى المالک: مكتد. عمرو عبدالرحمن	مدير المشروع	مهندس/وائل محمود احمد	المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى	مهندس/أمين محمد السيد	مدير عام الشؤون المالية استاذ/ مصطفى عبد الجواد رية	مدير عام المشروعات مهندسة/ جهاد محمد سعد	المحاسب/ التوقيع/ مهندس / نصر محمد نصر طيخ

مستخلص رقم (١٢) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات


شاملة المدة من ١/٢/٢٠٢٤ الى ٢٥/٦/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
39	بالمتر الطولي اعمال جسات بالير والبند شامل مما مجموعة طبقاً لاصول الصناعة	م.ط	٣٧٠,٠٠	٨٧١	٥٩٤,٠٠	٥٩٤,٠٠	٥٩٤,٠٠	%٠,٠٠	٢١٩٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٧٨,٠٠	
40	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعناية يدوية في ارض الموقع العام.	م.ط	٩٠,٠٠	٢٧٩١	١٤٢٩,٠٠	١٤٢٩,٠٠	١٤٢٩,٠٠	%٠,٠٠	١٢٨٦١,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٦١,٠٠	
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م.ط	٨٠,٠٠	١٣٩٩١	١٥٠٧,٠٠	١٥٠٧,٠٠	١٥٠٧,٠٠	%٠,٠٠	١٢٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٥٦,٠٠	
45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي الموقع .	عدد	١٤٨٠٠٠,٠٠	٤١	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	%٠,٠٠	٢٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٠٠٠,٠٠	
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمية ٣٢٠ طن .	م.ط	٣٤٢,٠٠	٢٧٩١	٢٨٣٧,٠٠	٢٨٣٧,٠٠	٢٨٣٧,٠٠	%٠,٠٠	٩٧٠٢٥٤,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٢٥٤,٠٠	
47	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	٤٥٣,٠٠	٢٢٧١	٣٦٦,٠٠	٣٦٦,٠٠	٣٦٦,٠٠	%٠,٠٠	١٦٥٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٧٩٨,٠٠	
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	٦٥٥,٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٥٨١,٠٠	١٥٨١,٠٠	١٥٨١,٠٠	%٠,٠٠	١٠٣٥٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥٥٥٥,٠٠	
50	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١٠٠ سم .	عدد	١٨٠٣٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	%٠,٠٠	١٨٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٠٠,٠٠	
51	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (ماعدا التماسكة وشديدة التماسك) بالعمق المطلوب	م.ط	٥٠,٠٠	٤٠٩٧١	٢٤٣٧,٠٠	٨٣,٠٠	٢٤٣٧,٠٠	%٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠٠	
54	بالمتر المكعب توريد و ردم برمل نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبري	م.ط	١٤٥,٠٠	٢٧٩١	٩٩٥,٠٠	٩٩٥,٠٠	٩٩٥,٠٠	%٠,٠٠	٢٩٢٣٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢٣٢,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١,٤٠ جنيه تزيد عن ١٠ كم طبقاً للمحضر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٤ (42.5 كم)	م.ط	٤٥,٥٠	٢٧٩١	٢٠١٦,٠٠	٢٠١٦,٠٠	٢٠١٦,٠٠	%٠,٠٠	٩١٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٢٨,٠٠	
56	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات البلاطات الانتقالية والمقاومة الميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	م.ط	١٧٦٥,٠٠	١٥٢١	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	%٠,٠٠	٦١٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٧٥,٠٠	
57	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة	م.ط	٢٤٨٠,٠٠	٢٧٩١	٥٣,٠٠	٥٣,٠٠	٥٣,٠٠	%٠,٠٠	٧٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤٠٠٠,٠٠	
58	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والكنايف فوق منسوب ظهر المخدات .	م.ط	٣١٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٩٤,٠٠	٨٩٤,٠٠	٨٩٤,٠٠	%٠,٠٠	٢٧٧١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧١٤٠,٠٠	
59	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري .	م.ط	٣٢٩,٠٠	٧٦٩١	٦٧٧,٠٠	٦٧٧,٠٠	٦٧٧,٠٠	%٠,٠٠	٢٢٢٧٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٧٣٣,٠٠	
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب لإرتفاع يزيد عن ٦ م	م.ط	٤١٠,٥٠	١٥٢١	٩٥٨,٠٠	٩٥٨,٠٠	٩٥٨,٠٠	%٠,٠٠	٣٩٣٢٥٩,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٢٥٩,٠٠	
63	بالمتر المكعب خرسانة لاسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكوبستات.	م.ط	٣٣٥,٠٠	٦٩١٧١	٥١٥٤,٠٠	٥١٥٤,٠٠	٥١٥٤,٠٠	%٠,٠٠	١٧٢٦٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٦٥٩,٠٠	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	م.ط	٢٩٧,٠٠	٤٧١	١٤٠,٠٠	١١٨,٠٠	١٤٠,٠٠	%٠,٠٠	٧٦٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٦٦٠,٠٠	
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٣ والايزيزد محتوي الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣	م.ط	٢٥٩,٠٠	١٤٧١	٧٥٧,٠٠	٧٥٧,٠٠	٧٥٧,٠٠	%٠,٠٠	١٩٦٠٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٦٣,٠٠	
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	٢٩٠٠٠,٠٠	٥٥٤١	٤٤٤٣,٠٠	٢٠٤,٠٠	٤٤٤٣,٠٠	%٠,٠٠	١٣٤٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٧٦٣,٠٠	
68	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهئ العمل	م.ط	٥٥,٠٠	١٤٧٧١	٦٥٤,٠٠	٦٥٤,٠٠	٦٥٤,٠٠	%٠,٠٠	٣٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٣٥٩٧,٠٠	
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لعزل جسم الكوبري	م.ط	١٠٥,٠٠	٢٥٢١	٢٢٩٧٢,٠٠	٤٧٠,٠٠	٢٢٥٠٢,٠٠	%٢٠,٠٠	١٩٢٩٦٤٨,٠٠	٤٨٢٤١٢,٠٠	١٩٢٩٦٤٨,٠٠	
70	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جوانب حمولة ٣٠٠ طن من التيوبيرين.	عدد	٣٣٠٠٠,٠٠	١٦٣,٠٠	١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	%٠,٠٠	٤٢٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٩٠٠٠٠,٠٠	
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك .	م.ط	٣٠٠,٠٠	١٥٢١	١١٠٦,٠٠	٢١٦,٠٠	١٣٢٢,٠٠	%٠,٠٠	٣٩٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٦٠,٠٠	

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني

مهندس / مصطفى جمال كامل



استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن

مدير المشروع



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس / أمين محمد السيد



المحاسب


مدير عام الشؤون المالية

استاذ / مصطفى عبد الجواد



مدير عام المشروعات

مهندسة / جهاد محمد سعد



التوقيع

للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طنبخ



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
101	بالعدد أعمال توريد وتركيب مخرج اذاره في الاسقف المعلقة الاسقف الخرسانة والبند يشمل توريد السلك والنويل ديكور واللمبات وكل مايلزم لنهيو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠	
102	بالمقطوعه اعمال ضبط لوحه الكهرباء و دق وتركيب الكتل العمومي للوحه الكهرباء العمومي للدور شامل توريد القواطع اللازمة وقواطع التكييفات و دفن الكابل الرئيسي وتوريد غطاء خشبي للوحه	مقطوعه	١٩٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	١٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠٠٠,٠٠٠	
103	بالعدد تركيب كشاف ١٢٠ سم توريد المالك والبند يشمل عمل مخرج الاتارة وتوريد السلك اللازم وايضا صيانة الكشاف المستعمل المورد من لمبات وترانس او لمبات على التيار المباشر وكل مايلزم لنهيو الاعمال	عدد	٨٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٦٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٠٠,٠٠٠	
104	بالعدد توريد وعمل مخرج تكييف لزوم غرف السادة الطباط من سلك ترموبلاستيك ٤ مم مناسب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	
105	بالمقطوعه اعمال مراجعة البرايير القديمة واعادة تشغيل الموجود و دفن الاسلاك اللازمه للتوصيل بند بديل بند رقم (٦) ف المقاييس الاصيله	مقطوعه	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	
106	بالعدد اعمال ترميم ابواب الغرف بتركيب اوجه دى اف جاهزه للوجهه والطير والبند يشمل توريد وتركيب الواجهه وترميم الباب نظرا لوجود كسور في الحلق والباب و ايضا توريد الاكسسوار الناقص من كالون واوكر محلى واعادة تركيب الابواب وعمل اطار في الوجهه الخارجى من سداب ٢*١ سم وتركيب ربيع عمود وبرور ف ابواب الحمامات	عدد	٨٧٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	١١٣١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣١٠,٠٠٠	
107	بالمقطوعه اعمال تنظيم و تسليك الالوميتل الخاص بالشبابيك بالمكان البند يشمل اى توريدات	عدد	٢٥٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	
108	بالعدد اعمال توريد وتركيب باب اكورديون لزوم الحمام الخاص بغرفة قائد الوحدة البند شامل التوريد و النقل ومصنعيه التركيب و التص على منسوب الباب و عمل معبره كونتر بمنسوب العتب للتثبيت	عدد	٦٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	
109	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب اسقف معلقة من البلاطات الجبسيه لزوم الطرقات والغرف مقلس ٦٠ * ٦٠ سم	م ٢	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	
110	بالمقطوعه توريد وتركيب الواح جبسيه لزوم مرمت الغرفة اسفل السلم و حمام قائد الوحدة	مقطوعه	١٢٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	
111	بالعدد اعمال توريد و دهان الابواب باللون المطلوب	عدد	٣٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٣٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠٠	
112	بالمقطوعه اعمال مرمت من مبنى و بياض و ضبط السوك وخلافه طبقا لتعليمات المهندس المشرف	مقطوعه	٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	
113	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب مبولة توريد المالك والبند يشمل تاسيس البند وتنظيمه دون توريد المبولة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	
114	بالمقطوعه اعمال توريد وتركيب قرصه رخام لزوم حوض الاوفيس مقاس ٠٠,٦٠ * ١,٢٧ م من رخام محلى شامل التشطيب وتركيب الوزره لغرفة قائد الوحدة وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات	مقطوعه	٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	
115	بالعدد اعمال تاسيس وتركيب دش لزوم الحمامات للعساكر بناء ع طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحائط البند شامل توريد الخلاط والسماعة	عدد	٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	
116	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات	عدد	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
117	بالعدد اعمال تشطيب حمام قائد الوحدة والبند يشمل توريد الاكسسوار الناقص و عمل الصيانة اللازمه للحمام وفك و تركيب السخان و خلاط الدش و عمل التوصيل اللازم من الوصلة الرئيسيه لضعف ضغط	عدد	٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠%	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	
118	بالعدد فك وتركيب جهاز التكييف من مكان خرج الوحدة ونقلها الى الوحدة واعادة شحنها وعمل الصيانة اللازمه	مقط											

إيديكس الدولي للمشاريع والمقاولات
عضو الاتحاد (مهندس / بيلي صلاح البيلي) ٢٠٠٦
كوبري اعلي خزان الو النمرس
بيلال
٢٠٠٦
PJ-070
