

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٦٣٣١٩٥٩١.٦٦٧)
فقط لا غير) قيمة حساب فروق أسعار تجميعي من مستخلص (١ الى ١٢)
البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبرى
اعلى طريق زويل من كم ٤٢٩+١٤٤ حتى كم ٩٣٨+١٤٥ ضمن اعمال مشروع الخط
الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العملين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/١٧



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

4

الأرقام القياسية لشهر الأساس (نوفمبر 2022)				
الحديد	أسمنت	بيتومين	سولار	التياب ومواسير والواح حديدية
٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨

عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعطي طريق زويل من المحطة (١٤٤,٤٢٩) إلى المحطة (١٤٥,٩٣٨)

الشركة المنفذة / إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

العدد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣



ملخص مستخلص فروق الأسعار

بيانات الأعمال بالمستخلص		نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر الأساس (تاريخ التعاقد)				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الكمية في مستخلص ١٢	شهر المحاسبة	إجمالي الكمية المنفذة	الوحدة	فئة البند	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت			بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
أعمال كباري البر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
أعمال الجسات والحفر والردم																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
L٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢٦٠٠,٠٠٠	٢٥٧٦,٠٠٠	أغسطس - ٢٠٢٣	٢٤٧٦,٠٠٠	م / ط	٨٠,٥٠٠	%٠	%٠	%٠	%٧	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	٣٠٠٠	٢٦٧٣	ما قبل التعاقد	٢٦٧٣,٠٠٠	م	١٠٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%٧	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٨٤٢٣٢٦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
٢٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعملية يدوية	٣٠٠٠	٢٦٧٣	ما قبل التعاقد	٢٦٧٣,٠٠٠	م	١٠٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
L٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات	١٩٥٠٠	١٨٩٩٨	ما قبل التعاقد	١٦٥٨٧,٣٨٥	م	٨٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				أكتوبر - ٢٠٢٣	٤١٠,٩٤٢	م	٨٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٠٦٦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				نوفمبر - ٢٠٢٣	٤٣٠,٢٥٢	م	٨٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٢٠٤٧٥١																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				مارس - ٢٠٢٤	١١٧٨,٣٦٠	م	٨٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٧٩٢٩٨٦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				ابريل - ٢٠٢٤	٣٩١,٠٦٢	م	٨٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لاختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠٠	٣٩٦٠	ما قبل التعاقد	١٦٣١,٠٢١	م	٥٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				ديسمبر - ٢٠٢٢	٣٥٦,٢١٢	م	٥٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				يناير - ٢٠٢٣	٦٩٦,٥٤١	م	٥٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				فبراير - ٢٠٢٣	٢٩٢,٤٤٠	م	٥٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٣٥٨٥٩٧٣																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				أبريل - ٢٠٢٣	٢١٢,٢٨٠	م	٥٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠٣٩٨٧٥٦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٤٢,٨٩٢	م	٥٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٧٩٢٩٨٦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				ديسمبر - ٢٠٢٣	٤٢٨,٦١٥	م	٥٠,٠٠٠	%٠	%٠	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠١٧٩٢٩٨٦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥	٤٢٨,٦١٥

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / ايهاب الحلواني

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / رضا فتحي

الإستشاري العام للمشروع

SYSTRA

لشركة الجوده

لشركة الجوده

لشركة الجوده

ت المراجعة طبقا لنفس

مدير المشروع م / محمد أبو الجود

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد



مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م/طارق يوسف ابراهيم الجزار



الارقام القياسية لشهر الاساس (نوفمبر 2022)				
الحديد	اسمنت	بيتومين	سولار	الادوية ومواسير والواح حديدية
٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨

ملخص مستخلص فروق الاسعار																					
بيانات الأعمال بالمتن										نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة											
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الكمية في مستخلص ١٢	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة اجمالي الكمية المنفذة	الوحدة	فئة البند	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	الأرقام القياسية في شهر الاساس (تاريخ التعاقد)				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
												الحديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
أعمال الخرسانات																					
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية	٦٥٠	٦٥٠	٢٠٥,٤٥٥	٤٤٤,٥٤٥	٣م	١٨٥٧,٠٠	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المراجعة الطبية

الإستشاري العام للمشروع SYSTRA

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / ايهاب الحلواني

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / رضا فتحي

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية



مدير عام الشؤون المالية والإدارية / مصطفى عبد الجواد

مدير المشروع م / محمد أبو الجود

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

م/ طارق يوسف ابراهيم الجزار



الأرقام القياسية لشهر الأساس (نوفمبر 2022)				
الحديد	أسمنت	بيتومين	سولار	التأبيد ومواسير والنواحي الحديثة
٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٦٩٨,٨



عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلى طريق زويل من المحطة (١٤٤,٤٢٩) إلى المحطة (١٤٥,٩٣٨)

الشركة المنفذة / إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ١٣

ملخص مستخلص فروق الأسعار


بيانات الأعمال بالمتسـخـر																					
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الكمية في مستخلص ١٢	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة إجمالي الكمية المنفذة	الوحدة	فئة البند	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر الأساس (تاريخ التعاقد)				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار		
٤٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد (ارتفاع أقل من 9 م)	٤٣٤٠	٤٣٤٠	أغسطس - ٢٠٢٣	٢٧٦,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧٥٥٦٥٩	٦٧٩٣٣,٣٨٢ م.ج
				سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٤٥,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٩٢٧٣٢٤	٩٠٢٠٦,٦٦٤ م.ج
				أكتوبر - ٢٠٢٣	٣٤٥,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤١٧٠٤١٨	١٢٨٥١٣,١٠١ م.ج
				نوفمبر - ٢٠٢٣	١٣٨,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٥٧٧٠٨٨٧	٧١١٣٢,٨٧٦ م.ج
				ديسمبر - ٢٠٢٣	١٣٨,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦٦٨٨٤٠٩	٨٢٤٤٢,٣٩٦ م.ج
				يناير - ٢٠٢٤	٥٥٢,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٧٦٢٣٦٨٩	٣٧٥٨٨٣,٢٣٥ م.ج
				فبراير - ٢٠٢٤	٧٥٩,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٧٦٢٣٦٨٩	٥١٦٨٣٩,٤٤٩ م.ج
				مارس - ٢٠٢٤	١١٠٤,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,١٠٤٠٥٢٣١	١٠٢٦٠٥٢,٣٣١ م.ج
				أبريل - ٢٠٢٤	٣٤٥,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٦	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٠٤٠٥٢٣١	٣٢٠٦٤١,٣٥٤ م.ج
				مايو - ٢٠٢٤	٣٣٨,٠٠٠	م³	٨٩٣٢,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٠٤١٧٠٧٠	٣١٤٤٩٣,٠٠٨ م.ج
٤٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد 3 (ارتفاع أكبر من 9 م)	٢٢٠٨	٣٥٠٠	أكتوبر - ٢٠٢٣	٢٧٦,٠٠٠	م³	٩٤٣٦,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤١٧٠٤١٨	١٠٨٦١١,٦٩٩ م.ج
				نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٤٥,٠٠٠	م³	٩٤٣٦,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٥٧٧٠٨٨٧	١٨٧٨٦٦,٦٠٩ م.ج
				ديسمبر - ٢٠٢٣	٥٥٢,٠٠٠	م³	٩٤٣٦,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٦٦٨٨٤٠٩	٣٤٨٣٧٧,٢٧٠ م.ج
				يناير - ٢٠٢٤	٤٨٣,٠٠٠	م³	٩٤٣٦,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٧٦٢٣٦٨٩	٣٤٧٤٥٦,٣٢٩ م.ج
				فبراير - ٢٠٢٤	٤١٤,٠٠٠	م³	٩٤٣٦,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٧٦٢٣٦٨٩	٢٩٧٨١٩,٧١١ م.ج
				مارس - ٢٠٢٤	١٣٨,٠٠٠	م³	٩٤٣٦,٠٠	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,١٠٤٠٥٢٣١	١٣٥٤٩٣,٥٨٨ م.ج
٤٥١	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة	٦٨	١٠٠٠	مارس - ٢٠٢٤	٢,٥٠٠	م³	٥٤٠٨,٠٠	%٠	%١٨	%٠	%١٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١٢٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤	٠,١٢٤٨٦٢٧٧	١٦٨٨,١٤٥ م.ج
				مايو - ٢٠٢٤	٦٥,٥٠٠	م³	٥٤٠٨,٠٠	%٠	%١٨	%٠	%١٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	١١٢٨,٩	٣٦٨,٨	١٠٧٩,١	٤٨٠,٤	٠,١٢٥٠٠٤٨٤	٤٤٢٧٩,٧١٤ م.ج

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب بالذني م / إيهاب الحلواني

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / رضا فتحي



الإستشاري العام للمشروع
SYSTRA

شيفت إيرض

باجير

ت. براجير - شيفت إيرض


مدير المشروع م / محمد أبو الجود

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ / مصطفى عبد الجواد



رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية



ملخص مستخلص فروق الأسعار																																	
بيانات الأعمال بالمستحاض																		نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر الأساس (تاريخ التعاقد)				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				نسبة العلو أو الخصم		قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الكمية في مستخلص	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة	الوحدة	فئة البند	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد جميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	الحديد جميع انواعه	أسمنت	بيتومين	سولار														
الحديد بجميع أنواعه																																	
٥٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار	٧٣٩٣	١٠٠١١	٢٨٧٣,٤١٦	ما قبل التعاقد	٤٥١٩,٥٨٤	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					ديسمبر - ٢٠٢٢	١٠٢,٠٣٧	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					يناير - ٢٠٢٣	٤٣,٦٩٢	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					فبراير - ٢٠٢٣	٧٣,١٣٠	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					مارس - ٢٠٢٣	٤٢,٤٥٥	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					أبريل - ٢٠٢٣	١٠,٩٢٣	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					يونيو - ٢٠٢٣	١٠,٦٨٣	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					يوليو - ٢٠٢٣	٩٥,٠٩٠	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					أغسطس - ٢٠٢٣	١٩٤,١٦٨	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					سبتمبر - ٢٠٢٣	٨٨,٩٤٤	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					أكتوبر - ٢٠٢٣	٢٠٨,٢٣٢	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					نوفمبر - ٢٠٢٣	١٣٦,٥٣٧	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					ديسمبر - ٢٠٢٣	٢٤٦,٥٧٩	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					يناير - ٢٠٢٤	٣٢١,١٤١	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					فبراير - ٢٠٢٤	٣٢١,٤٧٨	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					مارس - ٢٠٢٤	٤٢٣,٩٦٠	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					ابريل - ٢٠٢٤	١٨٧,١٨٥	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					مايو - ٢٠٢٤	-٣٦٧,١٨٣	طن	٤١٤٩٣,٠٠	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠														
					٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق و اختبار حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطوي للكوبري بالنير Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	٢٦٤	٥٠٠	أغسطس - ٢٠٢٣	١٤,٥٠٠	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠	%٣	%٠	%٥	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠										
									سبتمبر - ٢٠٢٣	٢١,٧٥٠	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠	%٣	%٠	%٥																	
أكتوبر - ٢٠٢٣	٢٩,٠٠٠	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠					%٣	%٠	%٥																						
نوفمبر - ٢٠٢٣	٢٥,٣٧٥	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠					%٣	%٠	%٥																						
ديسمبر - ٢٠٢٣	٣٦,٢٥٠	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠					%٣	%٠	%٥																						
يناير - ٢٠٢٤	٤٣,٥٠٥	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠					%٣	%٠	%٥																						
فبراير - ٢٠٢٤	٣٢,٦٦٥	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠					%٣	%٠	%٥																						
مارس - ٢٠٢٤	٣٢,٦٧٠	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠					%٣	%٠	%٥																						
ابريل - ٢٠٢٤	٩,٠٧٥	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠					%٣	%٠	%٥																						
مايو - ٢٠٢٤	١٩,٢١٠	طن	١٢١٨٧,٠٠٠	%٧٠					%٣	%٠	%٥																						
أعمال العزل																																	
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد	١٠٤٥٧	١٢٥٠٠	ما قبل التعاقد					٨٩٤٥,٧٩٢	م٢	٦٤,٠٠	%٠	%٢٥	%٠	%٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠											
				ديسمبر - ٢٠٢٢					٥٨١,١٠٦	م٢	٦٤,٠٠	%٠	%٢٥	%٠	%٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠											
				يناير - ٢٠٢٣					١٧٧,٨٤٠	م٢	٦٤,٠٠	%٠	%٢٥	%٠	%٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠											
				أبريل - ٢٠٢٣					٢٢١,٣٥٠	م٢	٦٤,٠٠	%٠	%٢٥	%٠	%٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠											
				أغسطس - ٢٠٢٣					٥٣٠,٩١٢	م٢	٦٤,٠٠	%٠	%٢٥	%٠	%٢	٤٥٤,٥	٢٥٣,٤	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٠,٠	٠,٠	٠,٠											
الإجمالي بالجنه																																	
١٦٣٣١٩٥٩١,٦٦٧ م.ج																																	

الإستشاري العام للمشروع
SYSTRA

مهندس المكتب الفني م / ايهاب الحلواني

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / رضا فتحي

بسم الله الرحمن الرحيم

مدير المشروع م / محمد أبو الجود

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

الهَيْئَةُ الْعَامَّةُ لِلطَّرْقِ وَالْكِبَارِي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م/ طارق يوسف ابراهيم الجزار

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلى طريق زويل من المحطة (١٤٤,٤٢٩) إلى المحطة (١٤٥,٩٣٨)
تنفيذ شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المستحق عنها فروق الاسعار	كميات ما قبل التعاقد	ديسمبر ٢٠٢٢	يناير ٢٠٢٣	فبراير ٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	أبريل ٢٠٢٣	مايو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣	أغسطس ٢٠٢٣	سبتمبر ٢٠٢٣	أكتوبر ٢٠٢٣	نوفمبر ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٣	يناير ٢٠٢٤	فبراير ٢٠٢٤	مارس ٢٠٢٤	أبريل ٢٠٢٤	مايو ٢٠٢٤
اولا : اعمال كباري البر																						
اعمال الجسات والحفر والرد																						
١-٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ^٢	م / ط	٢٥٧٦,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية	م ^٣	٢٦٧٣,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات	م ^٣	١٨٩٩٨,٠٠	١٦٥٨٧,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩١,٠٦	١١٧٨,٣٦
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلابة حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٣٩٦,٠٠٠	١٦٣١,٠٢	٣٥٦,٢١	٦٩٦,٥٤	٢٩٢,٤٤	٠,٠٠	٢١٢,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢,٨٩	٤٢٨,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
أعمال الخوازيق																						
١-٣٧	بالمتر الطولي اعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة .	م / ط	١٥٨٢٧,٠٠	١٣٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,٠٠	٥٥٦,٠٠
١-٤٢	تجربة التحميل	عدد	٣,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١-٤٤	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" علي طول الخاوازيق قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	عدد	٥٤,٠٠	٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠
أعمال الخرسانات																						
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات ويدات الكر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية	م ^٣	٦٥٠,٠٠	٤٤٤,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٨	١١,٧٨	٠,٠٠	٢٤,٦٥	١٠,٨٦
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات	م ^٣	١٤٤٣٤,٠٠	١١٧٠٧,٥٧	٧٧٦,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢,٥٦	٧٩,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦,٨٠	٢٢٦,٥٦	٦٣٣,٦٠	٦١١,٢٠
٤٧-ب	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم ²	م ^٣	١٤٦٨,٠٠	٢١٩,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٣٨	٣١٨,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤,٨٠	٤٣٧,٠٠	٢٦٢,٢٠	٠,٠٠
٤٧-ج	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم ²	م ^٣	٤٧٠,٦٠٠	١٧٤٥,٩٢	٣٩,٨٠	٥٢٤,٤٠	١٨٦,٨٣	٢٦٨,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦,٨٣	٩٣,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١-٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد (ارتفاع أقل من 9 م)	م ^٣	٤٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١-٤٨-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد 3 (ارتفاع اكبر من 9 م)	م ^٣	٢٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١-٥١	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م ³	م / ط	٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الحديد بجميع أنواعه																						
٥٣	بالطن توريد وتربيط ورض حديد تسليح B500DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار	طن	٧٣٩٣,٠٠	٤٥١٩,٥٨	١٠٢,٠٤	٤٣,٦٩	٧٣,١٣	٤٢,٤٦	١٠,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٦٨	٩٥,٠٩	١٩٤,١٧	٨٨,٩٤	٢٠,٨٣	١٣٦,٥٤	٢٤٦,٥٨	٣٢١,١٤	٣٢١,٤٨	٤٢٣,٩٦
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبرLow Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	طن	٢٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٢١
أعمال العزل																						
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد	م ²	١٠٤٥٧,٠٠	٨٩٤٥,٧٩	٥٨١,١١	١٧٧,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

الـ ذـيـنـة العـامـة لـلـطـرق والـكـلـيـة لـلـمـشـرـوع

الإستشاري العام للمشروع
SYSTRA

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / ايهاب الحلواني

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / رضا فتحي

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م/طارق يوسف إبراهيم الخزان



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبد الجواد

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع م / محمد أبو الجود

تمت المراجعة طبقاً لجدول تسليمات
المستخلصات الإيجابية للمراجعة والملاحظات
الاصحاحية لعام للمشروع
محمد أبو الجود

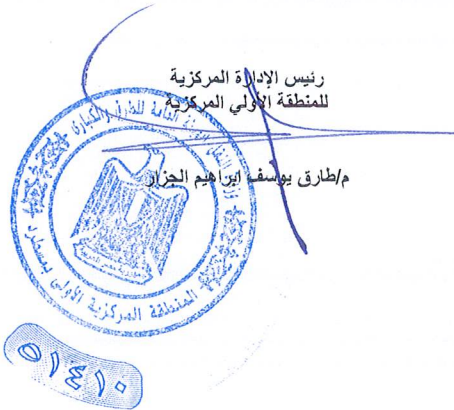

Handwritten signature and date 01/04/2024.

