


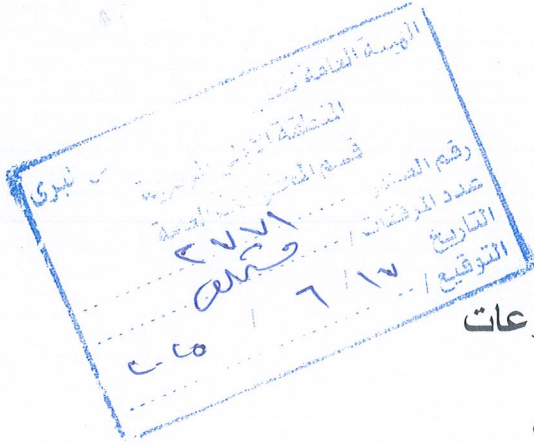

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٧) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبري
اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزة بالامر المباشر
تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات وكذا تقارير المعامل وبيانها كالاتى :

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٦/١٦

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع. ح

عدد (١) حصر أعمال

عدد (١) كشف المهندسين

عدد (١) كشف المعدات

خطاب المحملات

التوقيع /
مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد بابو النمرس بمحافظه الجيزه
بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

نحيط سيادتكم علما بان كراسه الشروط الخاصه بالعملية عاليه متضمنه التزام المقاول
بتزويد موقع الع مل بالاتي :-

- عدد (٣) اجهزه كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر A3 وعدد (٣)
كراسي متحركه عدد (٦) علب HD (CD)
- عدد (٢) ماكينة تصوير A3 ماركة زير وكس أو HP او ما يماثلها
- عدد (٤) هارد ديسك (3TB) وعدد (٦) فلاشه ٣٢ GB
- عدد (٣) سيارة ملاكي سيدان

وحسبما افاد المهندس المشرف علي العملية (بملاحظات المستخلص) بتواجد الاجهزه
في موقع العملية فعليا .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٦/١٦
عدد المرفقات ()

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)



١٧

مصلحة: الهيئة العامة للظروف والكبارى

قسم: المبلغ المستحق إلى: شركة إبيك الدولية للخدمات والمطاول

الطلبات طيه ، أو : } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة


{ إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

شركة إبيك الدولية للخدمات والمطاول

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	٨٠٧٦١٤٦٩٤		
			
	٨٠٧٦١٤٦٩٤		

رقم :

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

الإدارة العامة


الختم ذو التاريخ

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	٨٠٧٦١٤٦٩٤	قسم فرع فصل بند
	٨٠٧٦١٤٦٩٤	إجمالى الأصل
	٨٠٧٦١٤٦٩٤	بيانات الاستقطاعات
	٨٠٧٦١٤٦٩٤	قرش جنيه
	٨٠٧٦١٤٦٩٤	إضافى دمغة توقيع
	٨٠٧٦١٤٦٩٤	عادى قرش جنيه
	٨٠٧٦١٤٦٩٤	رسم الدمغة
	٨٠٧٦١٤٦٩٤	صافى القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



رواجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات : بتاريخ : الإمضاء :

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رواجع فى سنة ٢٠١

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفى الشطب

(د)

(٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد فى سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :


(٥) أدرج فى كشف : الشيكات : إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت : الشيك : إمضاء الكاتب المنوط :

فى سنة ٢٠١

مستخلص رقم (١٧) جاري
أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

شاملة المدة من ٢٤/٤/٢٠٢٥ الى ٢٠/٦/٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أعمال الطرق													
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع	م ^٢	٥,٢٥	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	المعمل متواجد بالموقع
2	بالمتر المكعب اصصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية لمسافة نقل ٥٠٠م	م ^٣	٢٤,٠٠	١٧٧٧٥,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٣٨٥,٠٠	١٨١٦٠,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٣٥٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥٨٤٠,٠٠	التقارير (المبني - النصف شهري - الشهري) متواجد بالموقع
4	بالمتر المكعب تكشير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكشير خارج الموقع للمقابل العمومية	م ^٣	٨٦,٠٠	٨٤,٠٠	١٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٦٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٦٨٨٨,٠٠	البرنامج الزمني متواجد بالموقع
5	بالمتر المكعب اعمال تكشير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكشير خارج الموقع لمسافة ١٠ كم	م ^٣	٦١,٠٠	١٥٣٧,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٧,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٩٣٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٩٣٧٥٧,٠٠	عدد (٥) مهندسون متواجدون بالموقع
7	بالمتر المكعب اصصال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر العمل قيمة المادة المحجورة والكارتات	م ^٣	١١٠,٢٢	٢٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٨٥,٠٠	١٠٦٧,٠٠	١٦١٥٢,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٠١٧٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٠١٧٥٧٦,٠٠	مكاتب الاشراف متواجدة بالموقع
	قيمة المادة المحجورة "طبقا للمحضر"							جارى	%٠,٠٠	١٠١٧٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٠١٧٥٧٦,٠٠	المعدات متواجدة بالموقع
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٠ كم							جارى	%٠,٠٠	١٧٨١٨٨٨,٦٤	٠,٠٠	١٧٨١٨٨٨,٦٤	لوحات المشروع متواجدة بالموقع
8	بالمتر المكعب اصصال توريد وتشغيل رمال نظيفة أو أتربة مطابقة للمواصفات والسعر العمل قيمة المادة المحجورة والكارتات	م ^٣	٣١٦,٨٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٣٤٨٦,٠٠	١١٣٩,٠٠	٤٦٢٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	١٤٦٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٥٢٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة بالموقع
	مسافة النقل لا تقل عن ٨٠ كم							جارى	%٠,٠٠	١١٥٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥٦٢٥,٠٠	متوافر عدد (٣) سيارة متواجدة تراجع بمعرفة الادارة بالموقع
12	بالمتر المسطح اصصال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس	م ^٢	٣٣,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	٩٦٩٦,٠٠	١٢١٥٧,٠٠	جارى	%٥,٠٠	٤٠١١٨١,٠٠	٢٠٠٥٩,٠٥	٣٨١١٢١,٩٥	تعليمات الامن الصناعي متواجدة بالموقع
13	بالمتر المسطح اصصال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام محكمها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ٢%	م ^٢	١١,٤٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١١,٠٠	٢٠١١,٠٠	جارى	%٥,٠٠	٢٢٩٢٥٤,٠٠	١١٤٦٢,٧٠	٢١٧٧٩١,٣٠	متواجد عدد (٣) كمبيوتر + عدد (٣) كرسي متحرك + طابعة ليزر + عدد (٦) عبة C.D. بالموقع
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن تسلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات	م ^٢	١٧٥,٢٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٤٦١,٠٠	١٩٧٥١,٠٠	٢٢٢١٢,٠٠	جارى	%٥,٠٠	٣٨٩١٥٤٢,٤٠	١٩٤٥٧٧,١٢	٣٦٩٦٩٦٥,٢٨	متواجد عدد (٢) ماكينة تصوير + (٤) هارد ديسك + عدد (٦) فلاش ٣٢ جيجا بالموقع
	كارتات وموازين	م ^٢	٣,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢١٢,٠٠	٢٢٢١٢,٠٠	جارى	%٥,٠٠	٦٦٦٣٦,٠٠	٣٣٣١,٨٠	٦٣٣٠٤,٢٠	متوافر عدد (١) مراقب بالموقع
16	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقول على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ٢%	م ^٢	١٦٨,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٥٥,٠٠	١٠٠٥٥,٠٠	جارى	%٥,٠٠	١٦٨٩٢٤٠,٠٠	٨٤٤٦٢,٠٠	١٦٠٤٧٧٨,٠٠	
	كارتات وموازين	م ^٢	٣,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٥٥,٠٠	١٠٠٥٥,٠٠	جارى	%٥,٠٠	٣٠١٦٥,٠٠	١٥٠٨,٢٥	٢٨٦٥٦,٧٥	
19	بالمتر الطولى توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بابعاد ٣٠/٣٠*٥٠ سم	م.ط	١٣٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٦٩٢,٠٠	٨٨٧,٠٠	١٥٧٩,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٢١١٥٨٦,٠٠	٠,٠٠	٢١١٥٨٦,٠٠	
20	بالمتر الطولى توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بابعاد ١٥/١١*١٠*٣٠ سم	م.ط	١٢٨,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٨٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٢٠,٠٠	
23	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانة طبقا للعيانة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم/م ^٢ مقاس ٦٠*٢٠*١٠٠ مم	م ^٢	١٧٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٢٤١,٠٠	جارى	%٠,٠٠	٤٠٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٧٠,٠٠	

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع / أمين محمد السيد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندسة / جهاد محمد سعد

التوقيع /

استشارى المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن

مدير المشروع

مهندس / وائل محمود احمد

المقاول العام: ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني

مهندس / أحمد مزروق

مهندس / مصطفى جمال كامل

عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ٩٩٢٦

مدير المشروع

كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس

مهندس / بيلي صلاح البيلي

PJ-070

يعتمد

للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية

التوقيع /

مهندس / عماد محمد حسين

المحاسب /

مدير عام الشؤون المالية

استاذ / مصطفى عبد الجواد

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنبيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الإسقاط (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبيه)	إسقاط أو حجز (بالجنبيه)	الباقى بعد الإسقاط	ملاحظات
اعمال الكبارى													
39	بالمتر المولي اعمال جسات بانير واسبان	م.ط	370,000	594,000	594,000	0,000	594,000	جارى	0,000%	219780,000	0,000	219780,000	
40	بالمتر المكعب حفر استكشافى بماله يدوية فى ارض الموقع العام.	م3	90,000	300,000	1999,000	0,000	1999,000	جارى	0,000%	179910,000	0,000	179910,000	
41	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م3	80,000	170,000	1007,000	0,000	1007,000	جارى	0,000%	120560,000	0,000	120560,000	
45	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي الموقع .	عدد	148000,000	4,000	3,000	1,000	4,000	جارى	0,000%	592000,000	0,000	592000,000	
46	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بحمولة تصميمية 320 طن .	م.ط	298,000	298,000	298,000	0,000	298,000	جارى	0,000%	101916000,000	0,000	101916000,000	
47	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	4030,000	363,000	363,000	0,000	363,000	جارى	0,000%	1644390,000	0,000	1644390,000	
48	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 150 سم بحمولة تصميمية طبقاً للرسومات.	م.ط	600,000	1785,000	1785,000	0,000	1785,000	جارى	0,000%	116917000,000	0,000	116917000,000	
49	بالطن توريد ودق قيسونات ثابتة (غلاف معدني) من اسفل منسوب قاع الترع حتى منسوب اسفل مخدة الخوازيق	طن	34000,000	1,000	0,000	1,000	1,000	جارى	0,000%	34000,000	0,000	34000,000	
50	بالعدد توريد حديد تسليح على حروق سير سمن قطر 100 سم .	عدد	180300,000	1,000	1,000	0,000	1,000	جارى	0,000%	180300,000	0,000	180300,000	
51	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (ماعدا المتماسكة وشديدة التماسك) بالعمق المطلوب	م3	50,000	400,000	3169,000	0,000	3169,000	جارى	0,000%	108400,000	0,000	108400,000	
54	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات وحول جسم الكوبرى	م3	140,000	3129,000	2424,000	0,000	2424,000	جارى	0,000%	301480,000	0,000	301480,000	
56	علاوة مسافة النقل 1,40 جنيه تزيد عن 10 كم طبقاً للمحضر بتاريخ 24/1/2024 (42.5 كم)	م3	40,000	3129,000	2424,000	0,000	2424,000	جارى	0,000%	110292,000	0,000	110292,000	
57	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 250كجم/سم3 ولا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3	م3	1760,000	200,000	190,000	12,000	207,000	جارى	0,000%	360300,000	0,000	360300,000	
58	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات، رصينية و حديد التسليح المدفونة	م3	2480,000	800,000	800,000	0,000	800,000	جارى	0,000%	1984000,000	0,000	1984000,000	
59	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات .	م3	310,000	1064,000	1020,000	0,000	1020,000	جارى	0,000%	317700,000	0,000	317700,000	
60	في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنية	م3	100,000	500,000	60,09	0,000	60,09	جارى	0,000%	6009,000	0,000	6009,000	
63	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى .	م3	3290,000	700,000	677,000	0,000	677,000	جارى	0,000%	2227330,000	0,000	2227330,000	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب لإرتفاع يزيد عن 6 م	م3	4100,000	1300,000	1277,000	0,000	1277,000	جارى	0,000%	0242080,000	0,000	0242080,000	
65	بالمتر المكعب خرسانة لاسقف اعلى خوازيق Slab on Pile والكوستات.	م3	3300,000	6100,000	6043,000	7,000	6050,000	جارى	0,000%	20267000,000	0,000	20267000,000	
66	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواظ السادة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	م3	2970,000	600,000	001,000	0,000	001,000	جارى	0,000%	1487970,000	0,000	1487970,000	
67	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب اجهاد 40 كجم/سم2 والايزيد محتوى الاسمنت عن 400 كجم /م3	م3	2090,000	1000,000	1000,000	0,000	1000,000	جارى	0,000%	2090000,000	0,000	2090000,000	
المحاسب/ ياعتمد للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية التوقيع/ مهندس / عماد محمد حسين المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى مدير المشروع/ أمين محمد السيد التوقيع/ مدير عام المشروعات مهندسة/ جهاد محمد سعد التوقيع/ استشارى المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن													

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستهـتـاق	ملاحظات
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠٠/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الإنشائية لخط ترابي .	طن	٢٩٠٠٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠	٥٥٩٠,٠٠	٧,٠٠	٥٥٩٧,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٦٢٣١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٣١٣٠٠٠,٠٠	
67	الطن: توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية	طن	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٤,٧٩	٠,٠٠	٢٤,٧٩	جاري	%٠,٠٠	١٢٣٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٩٥٠٠,٠٠	
68	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البوليثومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للاساسات وجميع الاجزاء المنفونة و السمر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل	م ^٢	٥٥,٠٠	٢٩٩٨,٠٠	١٧٣٢,٠٠	٤٠٥,٠٠	٢١٣٧,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١١٧٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	١١٧٥٣٥,٠٠	
69	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للكرينة ذات اساس اكريليك Anticarbonation لغزل جسم الكوبري	م ^٢	١٠٥,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٢٨٣٩١,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٣٠٩١١,٠٠	جاري	%٢٠,٠٠	٣٢٤٠٦٥٥,٠٠	٦٤٩١٣١,٠٠	٢٥٩٦٥٢٤,٠٠	
70	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جوانات حمولة ٣٠٠ طن من النيوبرين.	عدد	٢٤٠٠٠,٠٠	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٥٣٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٤٦٠٠٠,٠٠	
73	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة لاحتلال بتربيه من السن والرمل بنسبه (١:٢) على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك .	م ^٣	٣٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠	
74	بالعدد تجريبية تحميل استاتيكي للكوبري قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة والمداخل وفقا للرسومات المرفقة	عدد	١١٠٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠٠,٠٠	
76	بالطن توريد وتركيب طبقة واحدة من الواح الصاج المجلقن المدهون علي الساخن	طن	٣٩٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	١,٠٤	٠,٠٠	١,٠٤	جاري	%٠,٠٠	٤٠٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٦٠,٠٠	

77	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود انارة الطرق فردي بار تفاعل ١٠ قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن	عدد	٢٥٠٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٣,٠٠	٥١,٠٠	جاری	%٠,٠٠	١٢٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٥٠٠٠,٠٠
79	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤ × ٢٥ مم من الألومنيوم XLPE/STA ٢م داخل ماسورة PVC 2.5 بوصة	م.ط	٤٢٥,٠٠	٢١٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	٥٩٨,٠٠	١٢٣٨,٠٠	جاری	%٠,٠٠	٥٢٦١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٦١٥٠,٠٠
80	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١ × ١٦ مم EARTH من الالومنيوم	م.ط	٥٠,٠٠	٢١٠,٠٠٠	٦٦٥,٠٠٠	٥٧٣,٠٠	١٢٣٨,٠٠	جاری	%٠,٠٠	٦١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٠٠,٠٠
81	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات لأعمدة الانارة	عدد	٩٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٣,٠٠	٥١,٠٠	جاری	%٠,٠٠	٤٥٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩٠٠٠,٠٠
85	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار عدايات PVC قطر ٣ بوصة	م.ط	٢٦٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جاری	%٠,٠٠	٣١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠٠,٠٠

90	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة توفير الاضائة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية لولا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعة	٥٠٠٠٠,٠٠	٧,٠٠	٤,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠
----	--	--------	----------	------	------	------	------	------	-------	----------	------	----------

1	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري .	طن	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	%٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
---	---	----	----------	------	------	------	------	--------	------	------	------

91	بالمتر المسطح أعمال دهانات حوائط بيوية البلاستيك على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC او باكين و تقدم العينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد و الفئة تشمل كل مايلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول والشروط والمواصفات و	٢م	✓	٧٠,٠٠	✓	٩٤٣,٠٠	✓	٩٤٢,٥٢	٠,٠٠	٩٤٢,٥٢	جارى	٠,٠٠%	٦٥٩٧٦,٤٠	٠,٠٠	٦٥٩٧٦,٤٠
----	--	----	---	-------	---	--------	---	--------	------	--------	------	-------	----------	------	----------

مهندس / عماد محمد حسين

PJ-070

لتوقيع

مهندسة / جهاد محمد سعد

التوقيع

استاذ / مصطفى عبد الجواد

32

10/10/2020

SECRET

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
93	اعمال توريد وتركيب حوض حمام غسيل ايدي من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس (0.60 م * ٠.٤٥ م) علي ان يكون من اجود الانواع (دورافيت او كليوباترا) او مايمثلها و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التغليف و الصنف حتي اقرب سينون ارضي او جاليتراب او صود صرف و فك القديم ان وجد وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢٠٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
94	اعمال توريد وتركيب حوض مطبخ فتحة واحدة من الاسمنتسبيس فرز اول مقاس (١ * ١.45 م) من اجود الانواع و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التغليف بالمياه و الصرف حتي اقرب جاليتراب او سيفون ارضية و اسفلت من البلاستيك سويسة قطر ٢ بوصة و فك الحوض القديم وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	
95	اعمال توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢ " من اجود الانواع و الفنة تشمل التوريد و التركيب وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	١٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
96	بالمتر المسطح اعمال ازاله سيراميك الارضيات و الحوائط و الفنة تشمل التكسير ونقل المخالفات خارج الموقع الي المقالب العمومية و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة	٢م	٥٠,٠٠	١٢٠,١٢	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
97	اعمال توريد وتركيب سيراميك ارضيات مقاس (30 * 30 سم) فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع و الفنة تشمل التوريد و التركيب وسقاية الحمامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و عمل وزرة من البلاط بكامل الدائر و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٢م	٤٥٠,٠٠	٧٢,٠٠	٧١,٧٠	٠,٠٠	٧١,٧٠	جاري	%٠,٠٠	١٧٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٢٥,٠٠	
98	اعمال توريد وتركيب سيراميك حوائط باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع و الفنة تشمل التوريد و التركيب وسقاية للحمامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٢م	٢٧٥,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	
99	باكجم توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للابواب و الفنة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و التثبيت و الدهان بوجهين بريمر و وجهين ببيوة الاكية باللون المطلوب وكذلك الكرائين باللون المطلوب و المفصلات مخرطة و الخردوات و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	باكجم	٣٦,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
100	اصال دهان وجه نظافة للفرقة السفلية و تركيب وحدة اضاءة و دهان السقف الصاج و سد فتحات و دهان المدخل وحوائط السلم	مقطوعة	٨٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	
101	بالعدد اعمال توريد وتركيب مخرج انارة في الاسقف المعلقة الاسقف الخرسانة والبند يشمل توريد السلك والدويل ديكور والمبات وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
102	بالمقطوعة اعمال ضبط لوحة الكهرباء و دق وتركيب الكثيل العمومي للوحة الكهرباء العمومية للدور شامل توريد القواطع اللازمة وقواطع التكتيفات و دفن الكابل الرئيسي و توريد غطاء حسيبي للوحة	مقطوعة	١٩٠٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	
103	بالعدد تركيب كشاف ٢٢٠ سم توريد السلك والبند يشمل عمل مخرج انارة وتوريد السلك اللازم وايضا حرفة الكشف المستعمل المورد من ل.د.د. وترانس او لمبات على التيار الملائم وكل مايلزم لنهو الاعمال	عدد	٨٠٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	
104	بالعدد توريد وعمل مخرج حثيف لزوم غرف السادة الطباط من سلك ترموبلاستيك ٤ مم مناسب وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	
105	بالمقطوعة اعمال مراجعة البرايز القديمة واعادة تشغيل الموجود و دفن الاسلاك اللازمة للتوصيل بد بديل بند رقم (٦) ف المقاييس الاصلية	مقطوعة	١٥٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	
106	بالعدد اعمال ترميم الابواب المعرف بتركيب اوجه ام دي اف جاهزة للوجهة والظهر والبند يشمل توريد وتركيب اوجه ترميم الباب نظرا لوجود كسور في الحلق والباب وايضا توريد الاكسوار الناقص من كالون واوكر محلى واعادة تركيب الابواب وعمل اطار في الوجهة الخارجى من سداب ٢*١ سم و تركيب ربع صود ووبرو ف ابواب الحمامات	عدد	٨٧٠,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	جاري	%٠,٠٠	١١٣١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣١٠,٠٠	
107	بالمقطوعة اعمال تنظيط و تسليك الالوميتال الخاص بالشبابيك بالمكان البند لاشمل اى توريدات	عدد	٢٥٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	
108	بالعدد اعمال توريد وتركيب باب اكورديون لزوم الحمام الخاص بغرفة قائد الوحدة البند شامل التوريد و النقل ومصنعية التركيب و القص على منسوب الباب و عمل معبرة كونتر بمنسوب العتب للتثبيت	عدد	٦٠٠,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	
109	بالمتر المسطح اعمال توريد وتركيب اسقف معلقة من البلاطات الجبسية لزوم الطراقات والغرف مقاس ٦٠ * ٦٠ سم	٢م	١٠٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	%٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	
1													

مستخلص رقم (١٧) جاري
أعمال تنفيذ كوبري النشاء كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس - بمحافظة الجيزة
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات

شاملة المدة من ٢٠٢٥/٤/٢٤ الى ٢٠٢٥/٦/٠٢

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
113	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب مبولة توريد المالك والبند يشمل تاسيس البند وتشطيبه دون توريد المبولة طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	
114	بالمقطوعة اعمال توريد وتركيب قرصة رخام لزوم حوض الاوقيس مقاس ٠,٦٠ * ٢٧ م من رخام محلى شامل التشطيب وتركيب الوزره لغرفة قائد الوحدة وكل ملازم طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠,٠٠٠	
115	بالعدد اعمال تاسيس وتركيب دش لزوم الحمامات للعساكر بناء ع طلب قائد الوحدة تاسيس خارج الحائط البند شامل توريد الخلط والسماعة	عدد	٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	
116	بالعدد اعمال تاسيس و تركيب سخان كهرباء توريد المالك بالحمامات	عدد	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
117	بالعدد اعمال تشطيب حمام قائد الوحدة والبند يشمل توريد الاكسسوار الناقص و عمل الصيانة اللازمة للحمام و قنطرة تركيب السخان و خلط الدش و عمل التوصيل اللازم من الوصلة الرئيسية لضغط المياه	عدد	٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	
118	بالعدد فك وتركيب جهاز التكيف من مكان خرج الوحدة ونقلها الى الوحدة و اعادة شحنها و عمل الصيانة اللازمة	مقطوعة	٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	
119	بالمقطوعة اعمال فك الابواب الخشبية والالومنيال و وحنث الارض و المراوح لنقلهم الى المخازن الخاصة بهم وفك و اعادة تركيب الكولدير و عمل التوصيلات اللازمة وتوريد وتركيب سخان كهرباء جديدماركة فريش ٤٠ لتر	مقطوعة	١٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	
120	بالمقطوعة اعمال فك وتركيب الكولدير و عمل التوصيلات اللازمة وتوريد وتركيب سخان كهرباء جديدماركة فريش ٤٠ لتر	مقطوعة	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
الاجمالي (بالجنيه)													
الاجمالي العام بالجنية													
٢٥٠٥٩٢٧١٧,٤٤													
٩٦٤٥٣١,٩٢													
٢٤٩٦٢٨١٨٥,٥٢													
٢٤٩٦٢٨١٨٥,٥٢													

يعتمد ،،،،، للمنطقة الأولى المركزية رئيس الإدارة المركزية التوقيع مهندس / عماد محمد حسين	التحاسب / مدير عام الشؤون المالية استاذ / مصطفى عبد الجواد	المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع / أيمن محمد السيد التوقيع مدير عام المشروعات مهندسة / جهاد محمد سعد التوقيع	استشاري المالك: مكتب د. عمرو عبدالرحمن مدير المشروع مهندس / وائل محمود احمد	المقاول العام: ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات المكتب الفني مهندس / أحمد مرزوق مهندس / مصطفى جمال كامل ايدكس الدولية للهندسة والمقاولات كوبري اعلي مزلقان ابو النمرس مدير المشروع مهندس / د. صلاح السيد PJ-070
--	---	---	--	--

