

الهيئة العامة
للحرق والكهرباء
S.A.M.P.E.A. AUTHORITY
FOR ELECTRICITY
AND WATER



المحافظ: المهندس / يحيى سعودي

اصحاب رقع حواءه طريق رقم ١٤١ بني ماضي / خميس / ميلين
موسى / ثنا / اهناسيا (القطاع الأول) مركز ناصر محافظة بني
بخصوص :- سويف بطول ٢,١ كم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية
حياة كريمة

تنفيذ :- شركة قذاف للطرق والانشاءات

عقد رقم :- العقد رقم (١٢٢٦) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تخيه طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٢) عن العمليه عاليه من اصل وثلاثه

صور و باقي المرفقات

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في:- ٢٠٢٥/٠٢/١٩

مرفقات: (١)

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد عراقي حسين

سليمان



(استمارة رقم ٥٠ « ج . ح »)

جمهورية مصر العربية
استمارة الاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: **البنك الأهلي المصري**

قسم: **المصارف**

المبلغ المستحق إلى: **مصرف قذافي للمزاول والاختصاصات**

تؤرجح: **الطلاب طيه ، أو : الأكاديمية المصرفية**

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ أذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
صاحب الحق أو :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير	رقم	التاريخ	قرشه	جنيشه

رقم: _____
التاريخ ذو التاريخ

كتب البراجعة
رئيس الإدارة المركزية
أحمد محمد أحمد

تقيد في السجل برقم: _____
الاعتماد الإداري ونوع الحسم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الحسم	رقم	قرشه	جنيشه	إجمالي الأصل	قرشه	جنيشه	صافي القيمة المطرب صرفها

علامة _____
في _____ سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات

التعم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج ح » برقم: _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
٢٠٢٢
يتم سحب شيك
أذن صرف

وكيل الحسابات
مدير أو رئيس الحسابات
في _____ سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لتفتيش الطابع البريدية ٢٠٢٣-٢٠٢٢
رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ح »)
إمضاءات موظفي الشطب

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ح »)
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط :
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط :
تحت رقم : _____
رقم : _____
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط :
رقم : _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢٢

امال رفع كفاءة طريق رقم ٢٤٣ بني ماضي / قمبش / منيل موسى / ننا / اهناسيا (القطاع الأول) مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ٢,١ كم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة قذاف للطرق والانشاءات

مستخلص رقم (٢) جاري
قيمة العقد ٥,٩٠٢,٠٠٠.٠٠
قيمة المقايسة ٠.٠٠
المعدلة
قيمة امر الاسناد ٦,١٤١,٣٠٠.٠٠

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
(GARBLT)



المنطقة السادسة - بني سويف

" إدارة المشروعات "

من ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ الى ٢٠٢٤/٠٤/٢٨

العقد رقم (١٢٢٦) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي سبق صرفها	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سبك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٤,٠٠٠.٠٠	١٣٦.٥٠	م٣	١,٨٠٠.٠٠	٩٥٠.٠٠	٢,٧٥٠.٠٠	٢٤٥,٧٠٠.٠٠	٣٧٥,٣٧٥.٠٠	جاري	٣٧٥,٣٧٥.٠٠	١,٨٧٦.٨٨	٣٧٣,٤٩٨.١٣	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع	١,٠٠٠.٠٠	٦٩.٠٠	م٣	١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	٦٩,٠٠٠.٠٠	٦٩,٠٠٠.٠٠	جاري	٦٩,٠٠٠.٠٠	٣٤٥.٠٠	٦٨,٦٥٥.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات	٥,٥٠٠.٠٠	٣٠٦.٠٠	م٣	٥,٥٠٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٥,٤٠٠.٠٠	١,٥٣٠,٠٠٠.٠٠	١,٦٥٢,٤٠٠.٠٠	جاري	١,٦٥٢,٤٠٠.٠٠	٨,٢٦٢.٠٠	١,٦٤٤,١٣٨.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين الاسفلت السائل سريع التطاير MC30	١٧,٠٠٠.٠٠	٣١.٥٠	م٢	١٧,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٧,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٨,٠٠٠.٠٠	جاري	٣٧٨,٠٠٠.٠٠	١,٨٩٠.٠٠	٣٧٦,١١٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٦ سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٧,٠٠٠.٠٠	١٨٠.٥٠	م٢	١٧,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٧,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٧	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبنيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٨	٨- وسائل النقل غير متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
١٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة													
الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد														
١	اعمال توريد الاتربة	٤,٠٠٠.٠٠	١٣.٠٠	م٣	١,٨٠٠.٠٠	٩٥٠.٠٠	٢,٧٥٠.٠٠	٢٣,٤٠٠.٠٠	٣٥,٧٥٠.٠٠	جاري	٣٥,٧٥٠.٠٠	١٧٨.٧٥	٣٥,٥٧١.٢٥	
٢	اعمال توريد الأساس	٥,٥٠٠.٠٠	٢٥.٠٠	م٣	٥,٥٠٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٥,٤٠٠.٠٠	١٢٥,٠٠٠.٠٠	١٣٥,٠٠٠.٠٠	جاري	١٢٥,٠٠٠.٠٠	٦٧٥.٠٠	١٢٤,٣٢٥.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٣.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط مليونان و ستمائة و اثنان و ثلاثون الفا و مائتان و سبعة و تسعون جنيه مصري و ٣٨ قرش لا غير														
١,٨٩٣,٤٤٥.٠٠ ٢,٦٤٥,٥٢٥.٠٠ ١٣,٢٢٧.٦٣ ٢,٦٣٢,٢٩٧.٣٨ خصم ٠.٠٠٠٥ من اجمالي الاعمال طبقاً لقائمة الكميات بالعقد														

تحريراً في :- ١٩/٠٢/٢٠٢٥

استشاري المشروع : د. محمد

روجع فوجد على صحة ..

سبق صرفها الي المقاول ١٨٩٣٤٤٥.٠٠

أثر بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها

المحاسب /

المقاول : احمد محمد رشاد محمد

مهندس المشروع :

أقر بصحة ذلك ..

مدير لمشروع :

على الحساب نهائياً

يدفع للمقاول مبلغ ٢,٦٣٢,٢٩٧.٣٨

غير الوارده بصفت الشروط اعتمدت من

ملاحظة : الفواتير



مدير المشروع /

مدير مشروع /

مدير مشروع /

استخلص رقم (٢) جاري
 قيمة العقد ٥,٩٠٢,٠٠٠.٠٠
 قيمة المقايضة ٠.٠٠
 المعدلة
 قيمة امر الاسناد ٦,١٤١,٣٠٠.٠٠

مستخلص رقم (٢) جاري
 قيمة العقد ٥,٩٠٢,٠٠٠.٠٠
 قيمة المقايضة ٠.٠٠
 المعدلة
 قيمة امر الاسناد ٦,١٤١,٣٠٠.٠٠

الهيئة العامة
 للطرق والكباري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS, BRIDGES
 (GARBLT)



المنطقة السادسة - بنى سويف

"إدارة المشروعات"

من ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ الي ٢٠٢٤/٠٤/٢٨

العقد رقم (١٢٢٦) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري / انتهى	قيمة الاعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
									جنية	جنية	جنية	جنية	
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٤,٠٠٠.٠٠	١٣٦.٥٠	م	١,٨٠٠.٠٠	٩٥٠.٠٠	٢,٧٥٠.٠٠	جاري	٢٤٥,٧٠٠.٠٠	٣٧٥,٣٧٥.٠٠	١,٨٧٦.٨٨	٣٧٣,٤٩٨.١٣	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع	١,٠٠٠.٠٠	٦٩.٠٠	م	١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	جاري	٦٩,٠٠٠.٠٠	٦٩,٠٠٠.٠٠	٣٤٥.٠٠	٦٨,٦٥٥.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات	٥,٥٠٠.٠٠	٣٠٦.٠٠	م	٥,٠٠٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٥,٤٠٠.٠٠	جاري	١,٥٣٠,٠٠٠.٠٠	١,٦٥٢,٤٠٠.٠٠	٨,٢٦٢.٠٠	١,٦٤٤,١٣٨.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين الاسفلت السائل سريع التطاير MC30	١٧,٠٠٠.٠٠	٣١.٥٠	م	٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٣٧٨,٠٠٠.٠٠	١,٨٩٠.٠٠	٣٧٦,١١٠.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٦ سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٧,٠٠٠.٠٠	١٨٠.٥٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٧	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
٨	٨- وسائل النقل غير متواجدة	٠.٠٠	٠.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
١٠	الكارتات موازين طبقا للاحقة و شروط التعاقد												١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة
١	اعمال توريد الاتربة	٤,٠٠٠.٠٠	١٣.٠٠	م	١,٨٠٠.٠٠	٩٥٠.٠٠	٢,٧٥٠.٠٠	جاري	٢٣,٤٠٠.٠٠	٣٥,٧٥٠.٠٠	١٧٨.٧٥	٣٥,٥٧١.٢٥	
٢	اعمال توريد الأساس	٥,٥٠٠.٠٠	٢٥.٠٠	م	٥,٠٠٠.٠٠	٤٠٠.٠٠	٥,٤٠٠.٠٠	جاري	١٢٥,٠٠٠.٠٠	١٣٥,٠٠٠.٠٠	٦٧٥.٠٠	١٣٤,٣٢٥.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	٣.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	٠.٠٠	١.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
فقط مليونان و ستمائة وثمان و ثلاثون الفاً و مائتان و سبعة و تسعون جنية مصري و ٣٨ قرش لا غير													
خصم ٠.٠٠٠.٠٠ من اجمالي الاعمال طبقاً لقائمة الكميات بالعقد													
٢,٦٣٢,٢٩٧.٣٨													
١٣,٢٢٧.٦٣													
٢,٦٤٥,٥٢٥.٠٠													
١,٨٩٣,٤٤٥.٠٠													

تحريراً في: ١٩/٠٢/٢٠٢٥

استشاري المشروع:

روجع فوجد على صحة ..

سبق صرفها الى المقاول ١٨٩٣٤٤٥.٠٠

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدرها

المحاسب /

المقاول: احمد محمد رشاد حمر

مهندس المشروع:

أقر بصحة ذلك ..

مدير المشروع:



على الحساب نهائياً

٢,٦٣٢,٢٩٧.٣٨ يدفع للمقاول مبلغ

غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: الفئات

مدير الشؤون المالية

مدير المشروع

مدير المشروع



الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة للهندسة المدنية والاساسات
مديرية المخططات الهندسية
مكتب المخططات الهندسية

المخططات الهندسية - مبنى سويديك

"ادارة المشاورات"

رقم العقد
رقم المقايضة
المعدلة

قيمة امر الاسناد

العقد رقم (١٢٢٦) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ الى ٢٠٢٤/٠٤/٢٨

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	كمية	كمية	التي تمت الى الان	التي مقدار الاعمال	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي سبق صرفها	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	استقطاع او عجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سنك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٣٦,٥٠	م	١,٨٠٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	٢٤٥,٧٠٠,٠٠٠	٢٧٥,٢٧٥,٠٠٠	١,٨٧٦,٨٨	جاري	٢٧٣,٤٩٨,١٣	١,٨٧٦,٨٨	١,٨٧٦,٨٨	٢٧٣,٤٩٨,١٣	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المنطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	م	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	جاري	٦٨,٦٥٥,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٦٨,٦٥٥,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات	٥,٥٠٠,٠٠٠	٣٠٦,٠٠	م	٥,٥٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٥٢,٤٠٠,٠٠٠	٨,٢٦٢,٠٠٠	جاري	١,٦٤٤,١٣٨,٠٠٠	٨,٢٦٢,٠٠٠	٨,٢٦٢,٠٠٠	١,٦٤٤,١٣٨,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين الاسفلت السائل سريع التظاير MC30	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	م	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٩٠,٠٠٠	جاري	٣٧٦,١١٠,٠٠٠	١,٨٩٠,٠٠٠	١,٨٩٠,٠٠٠	٣٧٦,١١٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٦ سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٧,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٥٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذير به متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذير به متواجدة
٧	٧- البرنامج الرسمى و برنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- البرنامج الرسمى و برنامج التدفقات النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٨	٨- وسائل النقل غير متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨- وسائل النقل غير متواجدة
١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة																
الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد																
١	اعمال توريد الاتربة	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠	م	١,٨٠٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	٢٣,٤٠٠,٠٠٠	٢٥,٧٥٠,٠٠٠	١٧٨,٧٥	جاري	٢٥,٥٧١,٢٥	١٧٨,٧٥	١٧٨,٧٥	٢٥,٥٧١,٢٥	١
٢	اعمال توريد الاساس	٥,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	م	٥,٥٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠	جاري	١٣٤,٣٢٥,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠	١٣٤,٣٢٥,٠٠٠	٢
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٣,٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط مليونان و ستمائة و اثنان و ثلاثون الفاً و مائتان و سبعة و تسعون جنيه مصري و ٣٨ قرش لا غير																
١,٨٩٣,٤٤٥,٠٠٠ ٢,٦٤٥,٥٢٥,٠٠٠ ١٣,٢٢٧,٦٣ ٢,٦٣٢,٢٩٧,٣٨ ٠,٠٠٠٥ خصم من اجمالي الاعمال طبقاً لقائمة الكميات بالعقد																

تحريراً في: ١٩/٠٢/٢٠٢٥

استشاري المشروع: د. محمد

روجع فوجد على صحة ..

سبق صرفها الى المقاول ١٨٩٣٤٤٥,٠٠٠

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها


المحاسب /

المقاول: احمد محمد رشاد محمد

مهندس المشروع:

اقر بصحة ذلك ..

مدير المشروع:

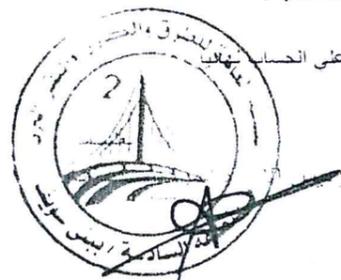

يدفع للمقاول مبلغ ٢,٦٣٢,٢٩٧,٣٨

غير ان وردت بعض اسرار وطبقات من

ملاحظة:

مدير المشروع

مدير المشروع

العقد رقم (١٢٢٦) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من ٢٠٢٤/٠٤/٢٨ الى ٢٠٢٤/٠٣/٢٠

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي سبق صرفها	قيمة الاعمال التي تمت الى الان	استقطاع او عبر	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٢٦,٥٠	م	١,٨٠٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	جاري	٢٤٥,٧٠٠,٠٠٠	٢٧٥,٢٧٥,٠٠٠	١,٨٧٦,٨٨	٢٧٢,٤٩٨,١٢	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠	م	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٦٨,٦٥٥,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين خارج الموقع
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسرات	٥,٥٠٠,٠٠٠	٣٠,٦٠٠	م	٥,٥٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	جاري	١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٥٢,٤٠٠,٠٠٠	٨,٢٦٢,٠٠٠	١,٦٤٤,١٣٨,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين الاسفلت المسائل سريع التطاير MC30	١٧,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٥٠	م	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٧٨,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٩٠,٠٠٠	٢٧٦,١١٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٦ سم ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	١٧,٠٠٠,٠٠٠	١٨٠,٥٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	٦- وسائل تأمين و سلامه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٧	٧- البرنامج الزمني و برنامج التسليمات النقدية و تقرير ضبط الجودة و التقارير الميدانية و التاميم و التجهيز متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٨	٨- وسائل النقل غير متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد												١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة
١	اعمال توريد الاتربة	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠	م	١,٨٠٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	جاري	٢٣,٤٠٠,٠٠٠	٢٥,٧٥٠,٠٠٠	١٧٨,٧٥	٢٥,٥٧١,٢٥	
٢	اعمال توريد الأساس	٥,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	م	٥,٥٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	جاري	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٧٥,٠٠٠	١٢٤,٣٢٥,٠٠٠	
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٣,٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٠,٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط مليونان و ستمائة و اثنان و ثلاثون الفاً و مائتان و سبعة و تسعون جنية مصري و ٣٨ قرش لا غير													
خصم ٠,٠٠٠ من اجمالي الاعمال طبقاً لقائمة الكميات بالعقد ٢,٦٣٢,٢٩٧,٣٨ ١٣,٢٢٧,٦٣ ٢,٦٤٥,٥٢٥,٠٠ ١,٨٩٣,٤٤٥,٠٠													

تحريراً في: ١٩/٠٢/٢٠٢٥

استشاري المشروع: د. نوري

روجع فوجد على صحة ..

سبق صرفها الى المقاول ١٨٩٣:٤٥٠,٠٠

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

المحاسب /

المقاول: احمد محمد رشاد محمد

مهندس المشروع:


أقر بصحة ذلك ..

مدير المشروع:

يدفع للمقاول مبلغ ٢,٦٣٢,٢٩٧,٣٨

غير المودع بصفتك استشاري

ملاحظة: الحساب



مدير المشروع

مدير المشروع
