

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جاري رقم "٧" لعملية عدد "١" كوبرى دوران
للخلف عند ٢٤+٨٠٠ ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون العلمين تنفيذ شركة يونى بيلد
للصناعة والمقاولات تعاقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩١٩ .

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريرا في / /

مدير عام المشروعات

م/ كارم إمام

مهندس العملية

م/ احمد سامي

رئيس الاداره المركزيه
للمنطقه الثالثه عشر لمنطقه البحيره
م/ مجدى عبد السلام عامر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بشأن : عملية عدد "١" كوبرى دوران للخلف عند ٢٤+٨٠٠ ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون العلمين
تنفيذ شركة : يوني بيلد للصناعة و المقاولات

تعاقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦

بالإحالة إلى مستخلص جارى (٧) نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بالأتى:

١. تجهيزات الموقع متواجده .
 ٢. المكاتب متواجده ومجهزه .
 ٣. متطلبات الإنشاء متواجده .
 ٤. أحجزه المساحة متواجده .
 ٥. التنظيمات المرورية متواجده .
 ٦. اجراءات الامن والسلامه متواجده .
 ٧. اللوحات متواجده .
 ٨. تقارير الإنشاء متواجده .
 ٩. الجدول الزمنى متواجد .
 ١٠. المهندسين متواجدين وكذلك المراقبون .
 ١١. السيارة غير متواجده .
- وعليه يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بالازم .

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر منطقة البحيره

م / مجدى عبد السلام عامر

تحرير في / /

مصلحة : الهيئة العامة للغمر والكهرباء
قسم : المحاسبة العامة
المبلغ المستحق إلى : شركة يوتى بيلد للصناعة والتجارة

بموجب : الطلبات طيه ، أوفى : ٥٠٧

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : أ. صرف الكنتري
شيك على البنك المركزي فى : أ. صرف الكنتري

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة يوتى بيلد للصناعة والتجارة
يسحب باسم : شركة يوتى بيلد للصناعة والتجارة
ويرسل إليه بالعنوان الآتى : والحسابات

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيته
		٤٩٨٧٦٠٠
		٤٩٨٧٦٠٠
	الجملة	

رقم :

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠٢

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	بند	قرش
	٤٩٨٧٦٠٠	
	٤٩٨٧٦٠٠	
	إجمالي الأصل	
	بيانات الاستقطاعات	
	عادي	قرش
	إضافي	قرش
	دمغة توقيع	قرش
	رسم الدمغة	
	صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ



روجع



علامة

فى سنة ٢٠٢

٥٠٩٢٥

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب _____ شيك _____ إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات _____ وكيل الحسابات _____

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢-٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب _____

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ الختم ذو التاريخ _____

(٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____ الشيكات _____

(٥) أ. : _____ الشكايات _____ الشكايات _____

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (7) جاري

عملية : انشاء كوبري دوران 2 طريق وادي النطرون - العلمين

رقم البند وبيانه : (13)	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والقدمات السفليه للمبول والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.
-------------------------	--

تنفيذ شركة : يوتي بيلد للصناعة والمقاولات

الكمية بالمقايضة المعدله 398 م3 مقدار العمل السابق 118.634 م3

بيان الاعمال بالمقايضة	الايصاد	الكمية	الاجمالي (م3)
بالمتر المكعب خرسانة عادية للقدمات السفليه للمبول الجانبيه راسب محور 7	قطاع دوران محور 7	36.486	0.2
نهايه محور 7	0.5	7.44	0.2
الاجمالي			4.3926
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	123.03		
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	115		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	5.00		
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	120.00		

المكتب الفني (شركة يوتي بيلد) المكتب الاستشاري (محرر-باخوم) يعكس مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

التوقيع /

م / محمد شعبان

م / فؤاد محمد

التوقيع /

م / أحمد سامي

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (7) جاري

عملية : انشاء كوبرى دوران 2 طريق وادي النطرون - العلمين

رقم البند وبيانه : (25)	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنه ذات اساس اكثريك مانعة للتآكلية لعزل جسم الكوبرى ونتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد
-------------------------	---

تنفيذ شركة : يوتي بيلد للصناعة والمقاولات

الكمية بالمقايضة المعدله

2م 10000

مقدار العمل السابق

2م 3966.96

بيان الاعمال بالمقايضة	الإيراد	الكمية	الإجمالي
بالمتر المسطح دهانات مضاده للكربنه للقطاعات الواردة بالحصر المرفق	مسطح (2م)	1	3887.17
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه	7854.13		3887.17
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	3850.00		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	3800.00		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	7650.00		

المكتب الفنى (شركة يوتي بيلد) / المكتب الاستشاري (محرر-باخوم) / مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

التوقيع /

م / محمد شعبان

م / فؤاد محمد

م / احمد سامي

١٢

المواصفات : خصائص المواد المتعارفة

ملاحظات

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الكمية (2)	كمية (3)	كمية (4)	كمية (5)	كمية (6)	كمية (7)	كمية (8)
25	بمتر المربع ثوبية وحمل دهانات مطهرة، كثرته ذات أساس الفلوريك مضافة لتقليل عزل جسم الفلوريك ونتاج اعداد الشرائط المتضمنة وحمل كل ما يازم لنمو العمل نهواً فضلاً والية شمل ما يجمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات قبل التوربه									
1	فريم 4-3-2-1 (4 : 3)	محور	2م	27.05	1	0.65				
2	فريم 5 محور (4 : 5)	فاج الكبره	2م	28.99	1	0.65				
3	فريم 6 محور (5 : 4)	فاج الكبره	2م	27.01	1	0.65				
4	فريم 7 محور (5 : 4)	فاج الكبره	2م	27.04	1	0.65				
5	فريم 8 محور (5 : 4)	فاج الكبره	2م	27.07	1	0.65				
الإجمالي / 2م										140.60

الكميات محور 3 : 1

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الكمية (2)	كمية (3)	كمية (4)	كمية (5)	كمية (6)	كمية (7)	كمية (8)
25	بمتر المربع ثوبية وحمل دهانات مطهرة، كثرته ذات أساس الفلوريك مضافة لتقليل عزل جسم الفلوريك ونتاج اعداد الشرائط المتضمنة وحمل كل ما يازم لنمو العمل نهواً فضلاً والية شمل ما يجمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات قبل التوربه									
1	فريسات اطي القطاع المتساوي	2م	OUTER BARRIER	79.02	1	2.57				
			INNER BARRIER	62.73	1	2.57				
الإجمالي / 2م										364.58

الكميات محور 7 : 5

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الكمية (2)	كمية (3)	كمية (4)	كمية (5)	كمية (6)	كمية (7)	كمية (8)
25	بمتر المربع ثوبية وحمل دهانات مطهرة، كثرته ذات أساس الفلوريك مضافة لتقليل عزل جسم الفلوريك ونتاج اعداد الشرائط المتضمنة وحمل كل ما يازم لنمو العمل نهواً فضلاً والية شمل ما يجمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات قبل التوربه									
1	فريسات اطي القطاع المتساوي	2م	OUTER BARRIER	76.60	1	2.57				
			INNER BARRIER	62.55	1	2.57				
الإجمالي / 2م										357.89

الكميات محور 5 : 3

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الكمية (2)	كمية (3)	كمية (4)	كمية (5)	كمية (6)	كمية (7)	كمية (8)
25	بمتر المربع ثوبية وحمل دهانات مطهرة، كثرته ذات أساس الفلوريك مضافة لتقليل عزل جسم الفلوريك ونتاج اعداد الشرائط المتضمنة وحمل كل ما يازم لنمو العمل نهواً فضلاً والية شمل ما يجمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات قبل التوربه									
1	فريسات اطي القطاع المتساوي	2م	OUTER BARRIER	62.56	1	2.57				
			INNER BARRIER	63.17	1	2.57				
الإجمالي / 2م										323.35

الكميات القطاع المتساوي محور 7 : 4

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الكمية (2)	كمية (3)	كمية (4)	كمية (5)	كمية (6)	كمية (7)	كمية (8)
25	بمتر المربع ثوبية وحمل دهانات مطهرة، كثرته ذات أساس الفلوريك مضافة لتقليل عزل جسم الفلوريك ونتاج اعداد الشرائط المتضمنة وحمل كل ما يازم لنمو العمل نهواً فضلاً والية شمل ما يجمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات قبل التوربه									
1	الكميات القطاع المتساوي محور 7 & 1	2م	محور 1	5.30	2	2.57				
			محور 7	5.30	2	2.57				
الإجمالي / 2م										54.53

الكميات اطي الرصبات

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الكمية (2)	كمية (3)	كمية (4)	كمية (5)	كمية (6)	كمية (7)	كمية (8)
25	بمتر المربع ثوبية وحمل دهانات مطهرة، كثرته ذات أساس الفلوريك مضافة لتقليل عزل جسم الفلوريك ونتاج اعداد الشرائط المتضمنة وحمل كل ما يازم لنمو العمل نهواً فضلاً والية شمل ما يجمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات قبل التوربه									
1	فريسات اطي الرصبات باربع 90 سم	2م	TOTAL LENGTH	1230	1	2.01				
الإجمالي / 2م										2468.61

البلاطة الخشبية للكميرات + الكميرات الرابطة محور 3 : 5

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الكمية (2)	كمية (3)	كمية (4)	كمية (5)	كمية (6)	كمية (7)	كمية (8)
25	بمتر المربع ثوبية وحمل دهانات مطهرة، كثرته ذات أساس الفلوريك مضافة لتقليل عزل جسم الفلوريك ونتاج اعداد الشرائط المتضمنة وحمل كل ما يازم لنمو العمل نهواً فضلاً والية شمل ما يجمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات قبل التوربه									
1	البلاطة الخشبية للكميرات	2م	SEC 1-1	26.06	1					
			SEC 1-2	1.24	1					
			SEC 1-3	26.04	1					
			SEC 1-4	48.57	1					
2	المساكنات البيئية للكميرات محور 4 : 3	2م	SEC 2-1	7.59	1					
			SEC 2-2	7.42	1					
			SEC 2-3	7.48	1					
3	المساكنات البيئية للكميرات محور 5 : 4	2م	SEC 3-1	7.45	1					
			SEC 3-2	7.40	1					
			SEC 3-3	7.40	1					
الإجمالي / 2م										146.65

رقم	البيان	الوحدة	الكمية	الكمية (2)	كمية (3)	كمية (4)	كمية (5)	كمية (6)	كمية (7)	كمية (8)
4	الكميرات الرابطة محور 3	2م	1	2.46	1	1.050				
			2	2.45	1	1.050				
			3	2.46	1	1.050				
5	الكميرات الرابطة محور 4	2م	4	2.46	2	1.050				
			5	2.45	2	1.050				
			6	2.46	2	1.050				
			7	2.46	1	1.050				
7	الكميرات الرابطة محور 4	2م	8	2.45	1	1.050				
			9	2.46	1	1.050				
الإجمالي / 2م										30.95
الإجمالي / 2م+1										177.61

3887.17

الإجمالي الكلي / 2م

المكتب الفني (شركة بولي بينا) المكتب الاستشاري (محمود - باخوما) مجلس الهيئة العامة للطرق البرية

التوقيع / التوقيع / التوقيع /

م / أحمد محمد م / محمد كمال علام م / أحمد الشاذلي

بيان الاعمال بالمستخلص رقم جاري : (7)
عملية : انشاء كوبرى دوران 2 طريق وادي النطرون - العلمين

رقم البند وبيانه : (27)	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint تسمح بالحركة من (±2.5سم) (اذا لزم الامر) بابعاد (10سم عمق * 40سم عرض) طبقا للحسابات المقدمة من المقاول والمعمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
-------------------------	--

تنفيذ شركة : يوني بيلد للصناعة والمقاولات

الكمية بالمقايضة

90م.ط

مقدار العمل السابق

0 م.ط

بيان الاعمال بالمقايضة	العدد	الايبعاد طول	الاجمال (م ط)
بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint محاور 1 و 3 و 5 و 7	5	12.52	62.6
اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه		62.6	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		60	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		60	

المكتب الفني (شركة يوني بيلد) المهندس الاستشاري (مصر - باخوم) يصرح مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع /

م / احمد شعبان

م / فؤاد محمد

م / احمد سامي

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (7) جاري
عملية : انشاء كوبرى دوران 2 طريق وادي النطرون - العلمين

رقم البند وبيانه : (34)	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التظاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكا وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
-------------------------	---

تنفيذ شركة : يوني بيلد للصناعة والمقاولات

الكمية بالمقاييس 2م 25500 مقدار العمل السابق 2م 11393.67

الاجمالى (طن)	العدد	المسطح 2م	العدد	بيان الاعمال بالمقاييس
11173.07	1	11173.07	-	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش RC3000
11173.07				الاجمالى
		22566.74		اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه
		11050.00		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
		10900.00		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
		21950.00		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

المكتب الفنى (شركة يوني بيلد) المكتب الاستشاري (محرم-باخوم) يعتمد مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

التوقيع /

م / محمد شعبان


م / فؤاد محمد

م / أحمد سامي

شركة يوني بيلد للصناعة والمقاولات
800+24 مشروع إنشاء كوبرى دوران

حصر بند RC

$l=921.48 \text{ m}$
 $A=11173.07 \text{ m}^2$

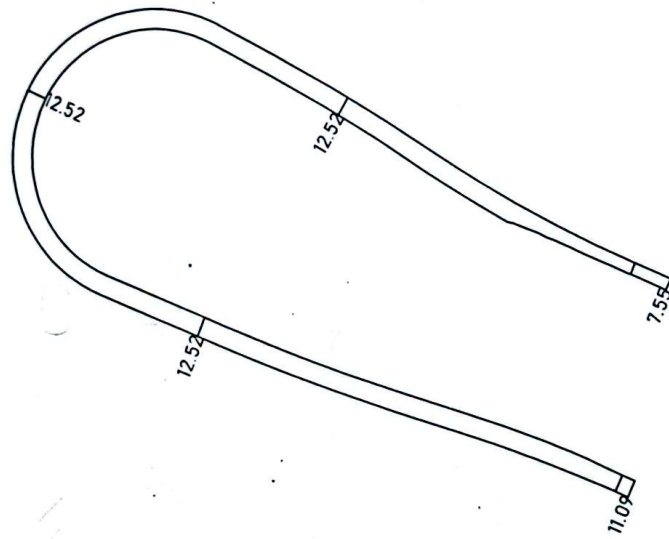

مهندس المكتب الإستشارى

مهندس الهيئة العامة للطرق

مهندس الشركة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (7) جاري
عملية : انشاء كوبرى دوران 2 طريق وادي النطرون - العلمين

رقم البند وبيانه : (36)	البنود المستحددة	رابعا
	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخاروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجوزة لمخازن منطقة وادي النطرون والتي اقترنها المناطق المشرفة).	

تنفيذ شركة : يوني بيلد للصناعة والمقاولات

الكمية بالمقاييس

2م 0

مقدار العمل السابق

2م 13000

الاجمالى (طن)	العدد	المسطح 2م	العدد	بيان الاعمال بالمقاييس
11173.07	1	11173.07	-	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم
11173.07				
				اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه
		0.00		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
		10600.00		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
		10600.00		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

المكتب الفنى (شركة يوني بيلد) المكتب الاستشاري (محرم-باخوم) مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م / احمد سامى

م / محمد شعبان

م / فؤاد محمد


م / احمد سامى

شركة يوني بيلد للصناعة والمقاولات
800+24 مشروع إنشاء كوبرى دوران

حصر بند أسفلات سطحه

$l=921.48 \text{ m}$

$A=11173.07 \text{ m}^2$

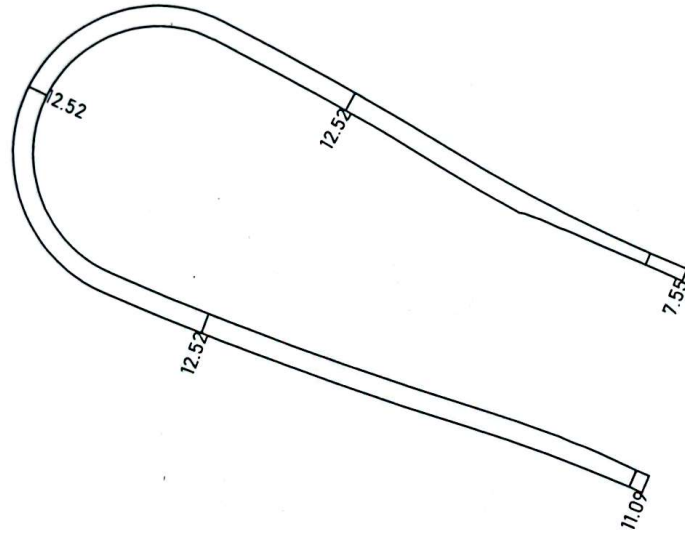

مهندس المكتب الإستشارى

مهندس الهيئة العامه للطرق

مهندس الشركة

تنفيذ: شركة بوني بيلد للصناعة والمقاولات

المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (6) جارى
عملية : انشاء كوبرى دوران 2 طريق وادي النطرون - العلمين

رقم البند وبيانه : (38)	بالمقر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 3م 0.8 سن دولوميت متدرج 3م 0.4 رمل حرش 250+ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومقسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأحراج والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² وتنظيف السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
-------------------------	--

تنفيذ شركة : بوني بيلد للصناعة والمقاولات

الكمية بالمقاييس

مقدار العمل السابق 2م 14400

2م 6365.47

الاجمالى (طن)	العدد	المسطح 2م	العدد	بيان الاعمال بالمقاييس
406.32	1	406.32	-	بالمقر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية
406.32				اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه
		6771.79		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
		6170.00		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
		550.00		اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى
		6720.00		

المكتب الفني (شركة بوني بيلد) مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

التوقيع /


التوقيع /

م / محمد شعبان

م / فؤاد محمد

م / احمد سامى

حصر الميول والقذمات المتبقية بكوبري الدوران 2
طريق وادي النظرون العلمي من محطة 24+800

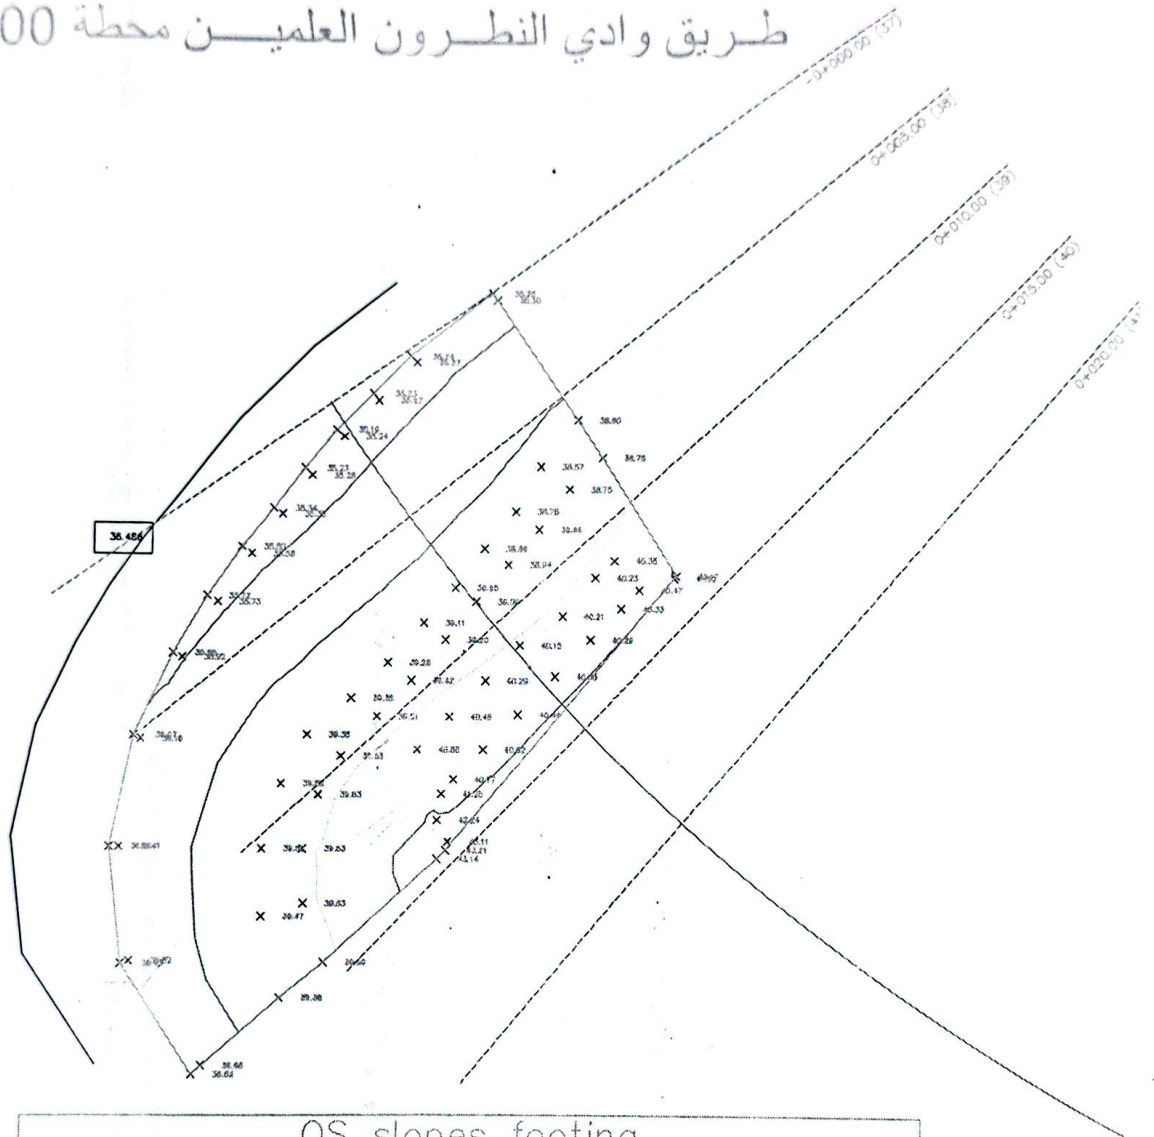

QS slopes footing				
Count	Layer	length	width	area M2
1	اجمالي المسطح	36.486	10.927	398.690
1	ابعاد القذمة (مسطح الخصم)	36.486	0.500	18.243
1	الاجمالي (صافي المسطح)			380.447
1	مكعب خرسانة القذمة : طمع ٤٨	36.486	0.500	0.200
	اجمالي		3.648	m3

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس المفاوض

[Signature]

[Signature]

[Signature]

مهندس الهيئة

يعتد

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : ()

عملية : إنشاء كوبري دوران 2 طريق وادي النطرون - العلمين

رقم البند وبيانه : (1)	الأعمال الكهربائية .
	<p>بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن بطريقة العمر على الساخن بارتفاع 9 متر ذراع بطول 1 متر على ان تكون الاعمده ملحمة طوليا ومسلو به بقطر 3 / 8 بوصة وبسلك 4 مم وسلك فلنشة العمود 15 مم ويتحمل شدة الرياح في حدود 140 كم / ساعه ومجهزه لتزريب صندوق البطاريه ووحدة التحكم والكشاف ومحمل على البند الخليه الشمسيه على ان تكون متعدد او احادية التيار بطاريه بنظام high silicon solar cell efficiency poly التحويل الطاقة الشمسيه الى طاقة كهربيه وعلى ان يكون التيار 10 امبير وبدرجة حمايه ip66 والبطاريه تعمل على جهد 12 فولت تيار مستمر وتيار الشحن لا يقل عن 20 امبير ومحمل على البند كشاف من نوع ليد الالومنيوم المسبوك والغطاء من الزجاج وبدرجة حمايه لا تقل عن 4000 ك ولا يقل وقدرة الكشاف لا تقل عن 80 وات طراز شوارع والعاكس شديد اللمعان ودرجه حرارة اللون 4000 ك ومحمل على العمر الافتراضي عن 50000 وبضمان 3 سنوات على ان تكون جميع المكونات من اجود الانواع ومحمل على البند القاعد الخرسانيه شامله الجوانب بقطر 24 مم وبطول 85 سم وابعاد القاعده 120*60 سم</p>

تنفيذ شركة : يوني بيلد للصناعة والمقاولات

الكمية بالمقاييسه

عدد 48

مقدار العمل السابق

عدد 0

بيان الاعمال بالمقاييسه	العدد	الاجمالي
بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن بطريقة العمر على الساخن بارتفاع 9 متر	45	45
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه		45
اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص السابق	0	0
الكمية المدرجه بالمستخلص خلال مدة	40	40
اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي	40	40

المكتب الفني (شركة يوني بيلد)

المكتب الاستشاري (محرم-باخوم)

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م / احمد سامي

م / محمد شعبان

م / فؤاد محمد

م / احمد سامي

القاهرة فى : 01 / 04 / 2024م

شهادة

تشهد الشركة العالمية للصلب " إنكوستيل "

بأن الأعمدة المسلمة لشركة / يونى بيلد

* تم تصنيعها بمصانع الشركة العالمية للصلب - إنكوستيل من خام الحديد (235 JR)

* الأعمدة مجلفنة بطريقة الغمر على الساخن بمصنع الجلفنة بالشركة

وذلك طبقاً للمواصفات الآتية :

(DIN 50976 & ISO1461 & ASTM A 153)

..وبياتها..

ملاحظات	البيان	العدد	ام تسليم
فقط خمسة واربعون لاغير	عامود 9 م/ 4مم بذراع والقاعدة مجلفن	45	2024/02

وهذه شهادة منا بذلك دون أدنى مسئولية على الشركة فيما يتعلق بحقوق الغير

أ / مدير التخطيط والجودة



H. Office: 58 Gamat Al Dowel Al Arabia St. -
Al Mohandiseen - Giza

Tel.: 3353104 / 3374571 / 7611983 / 7615581

Fax: 0020 2 7607739

FACTORY -Km 28 Cairo Alex.Desert Road
Industrial Zone - Giza

Tel.: 5390080 / 5390081 / 5390084 / 5390438

Fax: 0020 2 5390083

الإدارة : 58 ش جامعه الدول العربية - المهندسين - جيزة

تليفون : 615581 / 7611983 / 3374571 / 335310

فاكس : 7607739

المصانع : الكيلو 28 مصر إسكندرية الصحراوى -
المنطقة الصناعية - أبو رواش - جيزة

تليفون : 5390438/ 5390084/ 5390081/ 5390080

فاكس : 00202 5390083

[illegible]

رأيت المأمور الممر إليه المنطقة الثانية عشر بنجاحه و نظر الشيخ

مدير ابرار والمفوضات بمديرية الادعاء الشرقي والجنوبي

الاستشاري العام
المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - بالمرم)

مختبرية المغلفات / يلزم بطلب التصاريح والمطابقات

المجلد الثالث

مجلس / السيد سفيان

الشركة المسجلة / يولي بيلد المصنعة والمطويات

[illegible]

رئيس الادارة المركزية للمخطوطات الشاذلية عشر بالبحر و كلر الشيع

مفتبر | دار القامشتر | عات بالمهلبه العامه للطرق والكبارى

مختار المقترحات العامة للطرق والكبارى

المختصون الاستشاريون العرب والمسلمون

شركة العطله / يونس بيلد للصناعه والمطاولات

شركة العطله / يونس بيلد للصناعه والمطاولات

[illegible]

رئيس الادارة العامة للمنطقة الشرقية
الرياض

مدير إداري والمختبر وعملت بالمهنية العامة للطرق والكباري

عبد المصطفى بن أبي القاسم الطبري والكبير

الاستقرار العام
المهندسون الاستشاريون العرب (مهندسون استشاريون)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

مستخلص رقم (7) جاري من بدأ العمل حتى تاريخ 2 / 6 / 2024

وزارة النقل
مينة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

جمال، الصلحه الثالثه

مهندس / وليد هشام محمد عبدالله

CS CamScanner



رقم : (919 - 2022 - 2023)

فني المراجعة بكتب
فني المنطقة
م | محمد نصار

429

مهندس / کارم امام

المستشاري العام
مهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)

Scanned with
CS CamScanner
