

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيـد : / / ٢٠٢٥

التاريخ : / / ٢٠٢٥



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري سيارات كفر بولين (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٢

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص رقم (٧) جاري عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات

التوقيع ()

مهندس / مجدي عبد السلام

رئيس الإدارة المركزيّة

١٢

عاد



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
القيد : / / ٢٠٢٥
التاريخ : / / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري كفر بولين (أعلى الرياح البحري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ١٠٠٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بالإحالة إلى مستخلص (٧) جاري

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي :

- ١- تجهيزات الموقع
- ٢- مكاتب جهاز الإشراف و الإستشاري
- ٣- يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات
- ٤- معمل الموقع
- ٥- أجهزة المساحة
- ٦- المعدات ومهندسين المشروع
- ٧- لوحات المشروع
- ٨- البرنامج الزمني
- ٩- وثيقة التأمين
- ١٠- وسائل تأمين وسلام المرور

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

عاد

(التوقيع)

مهندس / مجدي عبد السلام ع

رئيس الإدارة المركزيّة

				
مشروع كوبرى ابوالخاوي - (اعلي الرياح البحري)				
بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 27/3/2025				
رقم البند	البند	الوحدة	الاجمالي	الكمية المنصرفة بالمستخلص الجارى
5	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.	م3	١٠٠,٠٠٠ ✓	١٠٠,٠٠٠
7	بالمتر الطول هدم و تكسير بردورات بأى نوع و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.	م. ط	٥٠٠,٠٠٠ ✓	٣٠٠,٠٠٠
10	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق و ردم ودمك دقشوم خالية من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد القلوية والعضوية والاصداق لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقا ومواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقا واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م3	٥,٣٩٩,٧٩٤ ✓	٤,١١٤,٦٥٤
17	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السليخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٤,٨٥٤,٥٣٦ ✓	١٩٦,٥٣٦
28	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقا لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	٣,٦٥٣,٥٧٠ ✓	٣,٦٥٣,٥٧٠
35	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية وكافة العناصر الإنشائية المغونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم2 بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	٢,٤٢٢,١٠٠ ✓	٥٦٧,٠٠٠
	أ. علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى 400 كجم/م3 وزيادة اجهاد إلى 350 كجم/سم2	م3	٢,٤٢٢,١٠٠ ✓	٥٦٧,٠٠٠
36 ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم2 و محتوى الأسمنت 450 كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	١٧٤,٧٩٤ ✓	١٧٤,٧٩٤
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكّل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٣,٢١٤,٦٢٦ ✓	١٤٧,٠٠٦
51	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكبريك مانعه للتفادية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد.	م2	٤,٩٠٧,٢١٠ ✓	٣١٨,٥٧٠
71	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الإمتصاص عن 10 % وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م3	—	—
	د- مسافة النقل لا تقل عن 200 كم .	م3	٩٩٩,٧٥٣ ✓	٩٩٩,٧٥٣
تشوينات	بالطن تشوينات وتوريد صلب مشغول 52 كهربيائى للأجزاء المعدنية بالمجرى المائى	طن	٥٥٢,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت





  		مشروع كوبرى ابو الخاوى	
			5
		27/3/2025	
بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية و نقل المخلفات إلى المقابل العمومية و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.			
بند	الإجمالي بالمتر المكعب		
النيوجيرسي والادمه	100		
الإجمالي	100		

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بنتا

الشركة المنفذة

بتروجت

بتروجت

مشروع كوبرى ابوالخاوى

بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.

5	رقم البند			
القطاع	المساحة	الطول	الاجمالي بالمتر المكعب	
sec(1-1)	0.3	222	67	
sec(2-2)	0.15	222	33	
الاجمالي			100	

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

11/11/2018

الشركة المنفذة

بتروجت

11/11/2018

مشروع كوبرى ابوالخاوي

		7	رقم البند
2025-02-28			
بالمتر الطولى هدم و تكسير بردورات باى نوع و نقل المخلفات إلى المقابل العمومية و نهو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.			
النوع	الاجمالي		
بردورات	200		
بردورات	300		
الاجمالي	500		

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

١٣٤٤ هـ

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كوبرى ابو الخاوي

بالمتر الطولى هدم و تكسير بدورات بأى نوع و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهو العمل نهو كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.

7	رقم البند	
النوع	الطول	
بردورات	300	
الاجمالي	300	

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

1000000

الشركة المنفذة

بیتوجت

J. V. Evans

المجلد الثاني - الجزء الثاني

الحمد لله الذي هدانا لهذا

100

الموجود محور A09 في منطقة النزاع)

ج العمل في تصنيع وتركيب الكمر

يقيم العمل بها (تم تنفيذ الأعمدة والياسان)

جاري العمل بها

TANGENT PILES

جاري العمل بها

كابل القراسل الدولي
بعوق عدد ٤٦ خازوق

عدد آء خازوق

اعمال نزع الملكية

Siirrytään

5, (b) (i)

Handwritten signature: *[Signature]*

  		
مشروع كوبرى ابوالخاوي		
	10	رقم البند
27/3/2025		
بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك دقشوم خالية من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد القلوية والعضوية والاصدااف لاجمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقا والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقا واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		
النوع	الاجمالي	
السابق	1285.14	
الحالى	4114.654	
الاجمالي	5399.794	

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



Your Company Name

123 Main Street

Suite #321

City, State 01234

Surface Report

Client: Client
Company

Project Name:
C:\Users\AHMEDD~1\AppData\Local\Temp\Drawing2_1_11570_2aede305.sv\$

Project
Description:

Report Date: 4/23/2025 12:40:23 PM

Prepared by:
Preparer

Linear Units: meter	Area Units: squareMeter	Volume Units: cubicMeter
---------------------	-------------------------	--------------------------

Surface: A4 ل A1 كويري ابوالخاوي حصر ردم الدهشوم من

Description: Description

Area 2D: 2471.773

Area 3D: 2472.225

Elevation Max: 1.877

Elevation Min: 1.469

Number of Points: 632

Number of Triangles: 1126

Volume Surface: A4 ل A1 كويري ابوالخاوي حصر ردم الدهشوم من

Description: Description

Volume Cut: 0.000

Volume Fill: 4114.654

Volume Total: 4114.654

Compare Surface: نقشوم

Base Surface: ارض طبيعيه


المكتب الاستشارات

م. ر. م. م. م.

يتوجهت

Cut/Fill Summary					
Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill
M4 Jbl Pbl	1.000	1.000	2471.77sq.m	0.00 Cu. M.	4114.65 Cu. M.
Totals			2471.77sq.m	0.00 Cu. M.	4114.65 Cu. M.

353

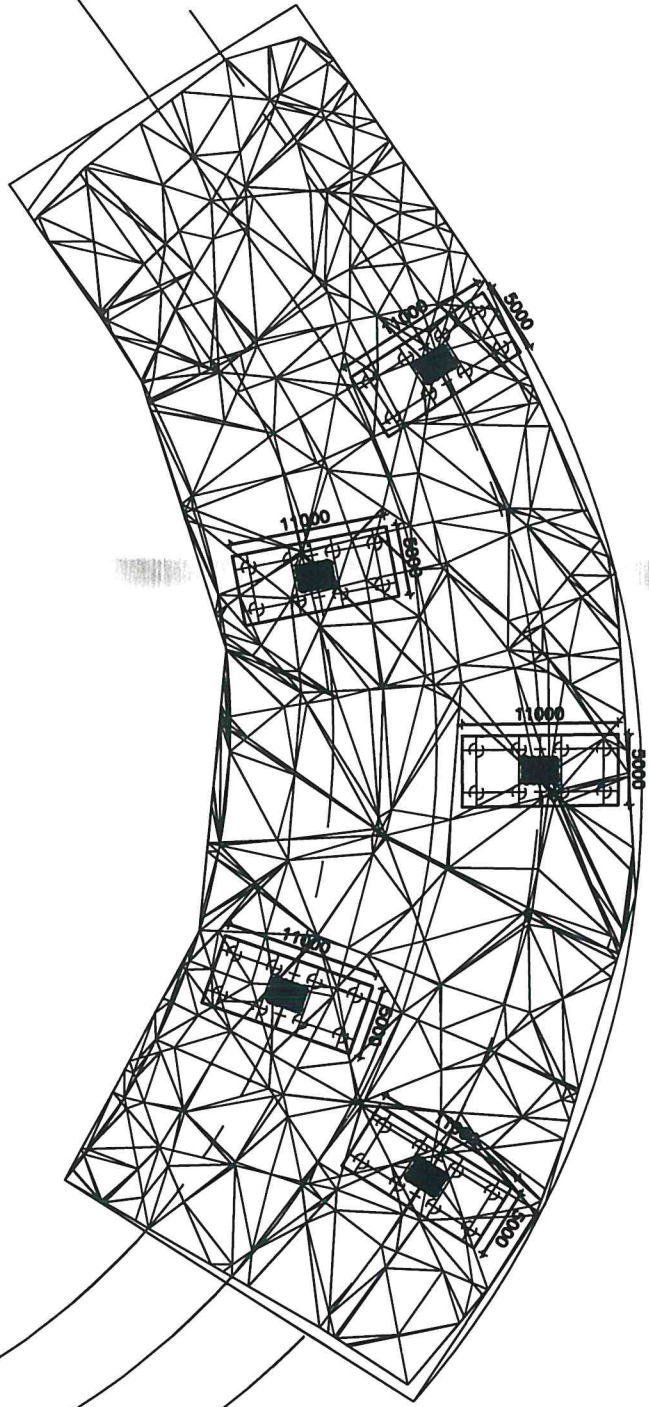

المساحة المخصصة
للجسر



مشروع كوبري ابوالخارى - (أعلى الرياح البحري)

١٧

رقم البند

2/28/2025

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

المحور	عدد الخوازيق المصنوبه	الطول	القطر	مجموع اطوال الخوازيق
A4	8	31	1	248.000
A5	8	31	1	248.000
A08	16	27	1	432.000
B02	2	31	1	62.000
B02 WATER	4	28.35	1	113.400
B03	2	27.35	1	54.700
B03 WATER	3	25.35	1	76.050
B04	2	27.5	1	55.000
B04 WATER	4	25.35	1	101.400
B05	2	29.3	1	58.600
B05 WATER	3	27.25	1	81.750
B06	2	29.2	1	58.400
B06 WATER	4	27.3	1	109.200
B07	4	29.8	1	119.200
C2	6	29	1	174.000
C3	5	29	1	145.000
C4	6	29	1	174.000
C5	4	29	1	116.000
A9	12	28	1	336.000
A10	16	28	1	448.000
A11	7	28	1	196.000
A11	7	28	1	196.000
A12	12	25	1	300.000
A13	14	27	1	378.000
A14	14	27	1	378.000
A15-1	1	35.446	1	35.446
A15-2	1	35.272	1	35.272
A15-3	1	35.098	1	35.098
A15-4	1	30.414	1	30.414
A15-5	1	30.24	1	30.240
A15-6	1	30.066	1	30.066
اجمالى الكمية بالمتر الطولى				4854.536

الكمية الجديدة بمستخلص 7
م 196.536

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقابل العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

17	رقم البند				
محور (A15)					
المحور	عدد الخوازيق المصبوبه	الطول(م)	القطر	مجموع اطوال الخوازيق(م)	ملاحظات
A15-1	1	35.446	1	35.446	
A15-2	1	35.272	1	35.272	
A15-3	1	35.098	1	35.098	
A15-4	1	30.414	1	30.414	
A15-5	1	30.24	1	30.24	
A15-6	1	30.066	1	30.066	
الاجمالى			196.536		

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبرى ابوالخاوي - (أعلي الرياح البحيري)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28	رقم البند				
27/3/2025					
المحور		كمية الحفر الفعليه بالمتر المكعب			
A9		577.17			
A10		658.53			
A11		613.58			
A12		577.13			
A13		613.58			
A14		613.58			
الاجمالي للقواعد		3653.57			

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى ابوالخاوي - (أعلي الرياح البحيري)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقابل العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28	رقم البند			
محور A9				
المحور	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الحفر الفعلية بالمتر المكعب
A9	23.752	9	2.7	577.17
الاجمالي	577.17			

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى ابوالخاوي - (أعلي الرياح البحيري)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقابل العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28	رقم البند			
محور A10				
المحور	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الحفر الفعلية بالمتر المكعب
A10	27.1	9	2.7	658.53
الاجمالي	658.53			

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى ابوالخاوي - (أعلى الرياح البحري)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28	رقم البند				
محور A11					
المحور	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الحفر الفعليه بالمتر المكعب	
A11	25.25	9	2.7	1	613.58
الاجمالي	613.58				


المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى بولين - (أعلي الرياح البحيري)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقابل العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28

رقم البند

محور A12

المحور	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الحفر الفعلية بالمتر المكعب
A12	23.75	9	2.7	577.13
الاجمالي	577.13			

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى ابوالخاوي - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقابل العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28	رقم البند				
محور A13					
المحور	الطول	العرض	الارتفاع	كمية الحفر الفعلية بالمتر المكعب	
A13	25.25	9	2.7	613.58	
الاجمالي	613.58				


المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع كوبرى بولين - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

28 رقم البند

محور A14

كمية الحفر الفعليه بالمتر المكعب	الارتفاع	العرض	الطول	المحور
613.58	2.7	9	25.25	A14
613.58				الاجمالي


المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت





مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

٣٥

رقم البند

27/3/2025

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى

المحور	عدد القواعد فى المحور	الكمية (م ³)	ملاحظات
B02	1	88	
B03	1	88.2	
B04	1	88	
B05	1	88.2	
B06	1	88	
B07	1	45	
A08	2	220	
C2	1	88	
C3	1	88.2	
C4	1	88	
C5	1	45	
A4	1	126.5	
A5	1	115.5	
A9	2	168	
A10	2	231	
A11	2	199.5	
A12	2	168	كمية جديدة في مستخلص جاري 7 3م 567
A13	2	199.5	
A14	2	199.5	
اجمالى الكمية بالمتر المكعب		2422.10	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٥

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

٢٧

مشروع ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

رقم البند 35

محور (A12)



المحور	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	عدد القواعد فى المحور	الكمية مسلحه (م ³)
A12	8	5	2.1	2	168

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت

مشروع ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

رقم البند 35

محور (A13)

المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد فى المحور	الكمية مسلحة(م ³)
A13	11	5	2.1	1	115.5
	8	5	2.1	1	84
الاجمالي				199.5	

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت




مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

35

رقم البند

محور (A14)

المحور	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	عدد القواعد فى المحور	الكمية مسلحة (م ³)
A14	11	5	2.1	1	115.5
	8	5	2.1	1	84
الاجمالي			199.5		

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

بتروجت




  شركة تنمية النفط والغاز و المعادن شركة تنمية النفط والغاز و المعادن			
مشروع كوبرى ابوالخاوى على الرياح البحري			
رقم البند	ب-36		
27/3/2025			
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن تكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب للقياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم² و محتوى الأسمنت 450 كجم/م³ 3 أسمنت بورتلاند عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. ب-ارتفاع اعلي من 6-9 م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات			
ملاحظات	الكمية مسلحه	عدد الاعمدة على المحور	المحور
	8.126	1	B2
	13.054	1	B3
	3.630	1	B4
	5.000	1	B5
	12.424	1	B6
	7.020	2	A8
	83.158	4	TAG(A8-B2-B4)
	5.241	1	C2
	7.760	1	C3
	10.905	1	C4
	20.790	1	TAG(C2)
	5.087	1	A4
	20.790	1	TAG (A4)
	9.203	1	A5
	20.790	1	TAG (A5)
كمية جديدة في مستخلص جاري 7 3م 174.794	39.729	2	A9
	41.579	2	TAG (A9)
	51.907	2	A10
	41.579	2	TAG (A10)
	407.768	اجمالى الكمية بالمتر المكعب	

عن المكتب الاستشارى
م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة
م/ حمادة محمد كامل



بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم² و محتوى الأسمنت 450 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

ب-ارتفاع اعلي من 6-9 م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات

36-ب	رقم البند			
مشروع كوبرى ابوالخاوى على الرياح البحيرى				
محور (A09)				
المحور	مساحة القطاع	الارتفاع	عدد الاعمدة على المحور	الكميه مسلحه
A09	4.808	3.945	1	18.968
A09	4.808	4.318	1	20.761
الاجمالى		39.729		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



					
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم² و محتوى الأسمنت 450 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. ب-ارتفاع اعلي من 6-9 م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات					
36-ب	رقم البند				
مشروع كوبرى ابوالخاوى على الرياح البحيرى					
COLUMN TAG AXE(A9)					
المحور	مساحة القطاع (م ²)	الارتفاع (م)	عدد اعمدة التاج	الكمية مسلحه	
Sec(1-1)	4.864	0.5	2	4.864	
Sec(2-2)	5.011	0.5	2	5.011	
Sec(3-3)	5.253	0.5	2	5.253	
Sec(4-4)	5.614	0.5	2	5.614	
Sec(5-5)	6.101	0.5	2	6.101	
Sec(6-6)	6.701	0.5	2	6.701	
Sec(7-7)	7.505	0.5	2	7.505	
Sec(8-8)	5.3	0.05	2	0.530	
اجمالى الكمية بالمتر المكعب				41.579	


عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم² و محتوى الأسمنت 450 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

ب-ارتفاع اعلي من 6-9 م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات

36-ب	رقم البند			
مشروع كوبرى ابوالخاوى على الرياح البحيرى				
محور (A10)				
المحور	مساحة القطاع	الارتفاع	عدد الاعمدة على المحور	الكميه مسلحه
A10	4.808	5.086	1	24.453
A10	4.808	5.71	1	27.454
الاجمالى		51.907		

عن المكتب الاستشارى


م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



				
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم² و محتوى الأسمنت 450 كجم/م³ أسمنت بورتلاند عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. ب-ارتفاع اعلي من 6-9 م من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات او البلاطات				
ب-36	رقم البند			
مشروع كوبرى ابوالخاوى على الرياح البحيرى				
COLUMN TAG AXE(A10)				
المحور	مساحة القطاع (م ²)	الارتفاع(م)	عدد اعمدة التاج	الكمية مسلحه
Sec(1-1)	4.864	0.5	2	4.864
Sec(2-2)	5.011	0.5	2	5.011
Sec(3-3)	5.253	0.5	2	5.253
Sec(4-4)	5.614	0.5	2	5.614
Sec(5-5)	6.101	0.5	2	6.101
Sec(6-6)	6.701	0.5	2	6.701
Sec(7-7)	7.505	0.5	2	7.505
Sec(8-8)	5.3	0.05	2	0.530
اجمالى الكمية بالمتر المكعب				41.579


عن المكتب الاستشارى



م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل





مشروع كوبرى ابوالخاوى

43

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 27/03/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	اجمالى الوزن (طن)	عدد	البند
بها كمية جديدة في مستخلص جاري 7 25.912 طن	1827.509	1	الخوازيق
بها كمية جديدة في مستخلص جاري 7 121.094 طن	447.997	1	حديد القواعد والاعمدة
	145.189	1	حديد الهامات
	19.531	1	حديد الاعمدة المونو
	509.740	1	SOP
	264.660	1	BOX
	3214.626		اجمالى الكمية بالطن

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

ETROJET إتروجيت PENTA Engineering Consultants المشروعات العامة للطرق و الكيماوى و النقل البرى				
مشروع كوبرى ابوالخاوى				
رقم البند		43		
بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتي 28/2/2025				
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الحطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل				
ملاحظات	الوزن الكلى (بالطن)	وزن الخازوق (كجم)	عدد الخوازيق	المحور
	996.185			ما سبق
	16.976	2122	8	A4
	21.795	2724.32	8	A5
	37.790	2361.8736	16	A08
	28.279	4713.189	6	C2
	19.779	3955.737	5	C3
	28.279	4713.189	6	C4
	15.823	3955.737	4	C5
	11.860	5929.986	2	C6
	5.328	5328.436	1	C7
	5.715	5715.268	1	C7 WAT
	5.328	5328.436	1	C8
	5.715	5715.268	1	C8 WAT
	3.362	3362.204	1	C9
	3.721	3721.172	1	C9 WAT
	5.328	5328.436	1	C10
	5.715	5715.268	1	C10 WAT
	5.328	5328.436	1	C11
	5.715	5715.268	1	C11 WAT
	3.991	3990.716	1	C12
	4.350	4349.684	1	C12 WAT
	8.699	4349.684	2	C13
	13.014	6506.82876	2	C14
	13.014	6506.82876	2	C15
	13.014	6506.82876	2	C16
	13.014	6506.82876	2	C17
	13.014	6506.82876	2	C18
	13.014	6506.82876	2	C19
	13.014	6506.82876	2	C20
	13.014	6506.82876	2	C21
	13.014	6506.82876	2	C22
	214.153	5948.688	36	خوازيق لسند خلف C22
	30.668	2555.647868	12	A9
	47.644	2977.720508	16	A10
	38.058	2718.42	14	A11
	27.987	2332.22	12	A12
	40.451	2889.36	14	A13
	40.451	2889.36	14	A14
كمية جديدة في مستخلص جاري 7 طن 25.912	4.363	4363.48	1	A15-1
	4.346	4346.21	1	A15-2
	4.328	4327.96	1	A15-3
	4.309	4309.31	1	A15-4
	4.292	4291.67	1	A15-5
	4.274	4273.78	1	A15-6
اجمالى الكمية بالطن		1827.509		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حماده محمد كامل

مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحيري)

٤٣

رقم البند

27/3/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـى العمل نهوً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	اجمالى وزن القواعد (بالطن)	وزن القاعدة (كجم)	عدد القواعد	المحور
	8.448	2112.074	4	TAG(A8-B2-B4)
	15.724	15723.582	1	B02
	11.853	11853.398	1	B03
	13.840	13839.623	1	B04
	10.540	10540.183	1	B05
	12.283	12283.082	1	B06
	7.515	7515.484	1	B07
	0.365	364.942	1	PEDESTAL B7
	38.520	38520.302	2	A08
	15.300	15300.091	1	C2
	10.972	10972.071	1	C3
	12.194	12193.654	1	C4
	7.507	7506.752	1	C5
	0.365	364.942	1	PEDESTAL C5
	2.112	2112.074	1	TAG (C2)
	21.039	21038.821	1	A4
	21.672	21671.819	1	A5
	2.112	2112.074	1	TAG (A4)
	2.112	2112.074	1	TAG (A5)
	38.994	38993.770	1	A09
	58.708	58707.810	1	A10
	14.729	14729.350	1	A11-2
الكمية الجديدة بمستخلص 7 طن 121.094	22.467	22467.240	1	A11-1
	15.950	15949.660	1	A12-L
	15.329	15329.010	1	A12-R
	33.674	33673.580	2	A13
	33.674	33673.580	2	A14
	447.997			الاجمالى بالطن

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل





					
مشروع كوبري ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلا التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل					
65	رقم البند				
محور(A15)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32	12 m	22	12	1668.74
2	25	12m	22	12	1018.52
3	25	11.786	22	11.786	1000.35
4	10		2	12	21.36
			1	10.6	
5	10		29	12	215.20
			1	0.62	
6	10		23	12	172.20
			1	2.97	
7	10		23	12	175.35
			1	8.07	
8	16		21	2.765	91.76
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4363.48
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.36

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية




الشركة المنفذة
بتروجت



					
مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلا التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهوـاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليقات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل					
65	رقم البند				
محور (2 A15)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32		22	12	1668.74
2	25		22	12	1018.52
3	25		22	11.612	985.59
4	10		2	12	21.36
			1	10.6	
5	10		29	12	215.20
			1	0.62	
6	10		23	12	172.20
			1	2.97	
7	10		23	12	172.84
			1	3.42	
8	16		21	2.765	91.76
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4346.21
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.35

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية


الشركة المنفذة
بتروجت


					
مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلا التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهوآ كاملاً طبقاً لاصول الصنـاعـه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل					
65	رقم البند				
محور(3 A15)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32	12 m	22	12	1668.74
2	25	12m	22	12	1018.52
3	25	11.438	22	11.438	970.82
4	10		2	12	21.36
			1	10.6	
5	10		29	12	215.20
			1	0.62	
6	10		23	12	172.20
			1	2.97	
7	10		23	12	169.36
			1	10.37	
8	16		21	2.765	91.76
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4327.96
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.33

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



					
مشروع كوبري ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر شمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصل الى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل					
65	رقم البند				
محور(4 15A)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32	12 m	22	12	1668.74
2	25	12m	22	12	1018.52
3	25	11.254	22	11.254	955.20
4	10		2	12	21.36
			1	10.6	
5	10		29	12	215.20
			1	0.62	
6	10		23	12	172.20
			1	2.97	
7	10		23	12	166.33
			1	5.45	
8	16		21	2.765	91.76
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4309.31
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.31


المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

مراد محمد علي

الشركة المنفذة

بتروجت

					
مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلا التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل					
65	رقم البند				
محور(5 15A)					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32	12 m	22	12	1668.74
2	25	12m	22	12	1018.52
3	25	11.080	22	11.08	940.43
4	10		2	12	21.36
			1	10.6	
5	10		29	12	215.20
			1	0.62	
6	10		23	12	172.20
			1	2.97	
7	10		23	12	163.46
			1	0.8	
8	16		21	2.765	91.76
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4291.67
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.29

المكتب الاستشارى


مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



					
مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)					
بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلا التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل					
65	رقم البند				
محور(6) A15					
BAR MARK	BAR TYPE	SYMBOL(mm)	NUMBER QTY	LENGTH(m)	TOTAL WEIGHT(Kg)
1	32		22	12	1668.74
2	25		22	12	1018.52
3	25		22	10.906	925.66
4	10		2	12	21.36
			1	10.6	
5	10		29	12	215.20
			1	0.62	
6	10		23	12	172.20
			1	2.97	
7	10		21	12	160.34
			1	7.75	
8	16		21	2.765	91.76
اجمالى وزن الخازوق (كجم)					4273.78
اجمالى وزن الخازوق بالطن					4.27

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة

بتروجت



مشروع ابوالخاوى - (أعلى الرياح البحري)

رقم البند

٤٣

27/3/2025

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناغة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	اجمالى وزن القواعد (بالطن)	وزن القاعدة (كجم)	عدد القواعد	المحور
	8.448	2112.074	4	TAG(A8-B2-B4)
	15.724	15723.582	1	B02
	11.853	11853.398	1	B03
	13.840	13839.623	1	B04
	10.540	10540.183	1	B05
	12.283	12283.082	1	B06
	7.515	7515.484	1	B07
	0.365	364.942	1	PEDESTAL B7
	38.520	38520.302	2	A08
	15.300	15300.091	1	C2
	10.972	10972.071	1	C3
	12.194	12193.654	1	C4
	7.507	7506.752	1	C5
	0.365	364.942	1	PEDESTAL C5
	2.112	2112.074	1	TAG (C2)
	21.039	21038.821	1	A4
	21.672	21671.819	1	A5
	2.112	2112.074	1	TAG (A4)
	2.112	2112.074	1	TAG (A5)
	38.994	38993.770	1	A09
	58.708	58707.810	1	A10
	14.729	14729.350	1	A11-2
الكمية الجديدة بمستخلص 7	22.467	22467.240	1	A11-1
الكمية الجديدة بمستخلص 7	15.950	15949.660	1	A12-L
الكمية الجديدة بمستخلص 7	15.329	15329.010	1	A12-R
الكمية الجديدة بمستخلص 7	33.674	33673.580	2	A13
الكمية الجديدة بمستخلص 7	33.674	33673.580	2	A14

447.997

الاجمالى بالطن

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل








مشروع إيو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـو كاملاً طبقاً لاصول الصنـاعـه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43		رقم البند					
AXE A11							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		12000	50	3788.010	10.2%	
2	Q32		8490	110	3598.650	9.7%	
3	Q32		10800	30	2045.520	5.5%	
4	Q18		8490	110	1474.010	4.0%	
5	Q18		6000	50	599.270	1.6%	
6	Q16		9760	50	974.820	2.6%	
7	Q16		12000	14	265.160	0.7%	
8	Q32		5000	35	1104.840	3.0%	
9	Q32		7000	35	1546.770	4.2%	
10	Q32		8700	35	1922.410	5.2%	
11	Q32		6700	35	1480.480	4.0%	
12	Q32		9400	32	267.040	0.7%	
13	Q16		5536	14	122.330	0.3%	


عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



14	Q12		10100	32	286.940	0.8%	
15	Q12		5700	80	404.820	1.1%	
16	Q32		7400	35	1635.160	4.4%	
17	Q32		9400	35	2077.190	5.6%	
18	Q12		4200-5500	290	1248.710	3.4%	
19	Q16		10620-12000	58	1035.340	2.8%	
20	Q12		4200	825	3076.280	8.3%	
21	Q12		5500	660	3222.770	8.7%	
22	Q12		2000	272	483.090	1.3%	
25	Q16		10620	165	2765.720	7.4%	
26	Q12		2000-2200	232	432.570	1.2%	
27	Q12		5499-7500	232	1338.690	3.6%	
اجمالى الكمية (كجم)					37196.590		
اجمالى الكمية بالطن عدد (2) قاعدة مسلحة					37.197		

عن المكتب الاستشارى




م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



20	Q12		4200	330	1230.510	7.7%
21	Q12		5500	264	1289.110	8.1%
22	Q12		2000	40	71.040	0.4%
25	Q16		10620	66	1106.290	6.9%
26	Q12		2000-2200	116	216.290	1.4%
27	Q12		5500-7500	116	669.410	4.2%
اجمالى الكمية (كجم)				15949.660		
اجمالى الكمية بالطن عدد (1) قاعدة مسلحة				15.950		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل









عن المكتب الاستشارى



م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



20	Q12		4200	305	1137.290	7.4%
21	Q12		5500	244	1191.450	7.7%
22	Q12		2000	20	35.520	0.2%
25	Q16		10620	61	1022.480	6.6%
26	Q12		2000-2200	116	216.290	1.4%
27	Q12		5500-7500	116	669.410	4.3%
اجمالى الكمية (كجم)				15392.010		
اجمالى الكمية بالطن عدد (1) قاعدة مسلحة				15.392		

عن المكتب الاستشارى






م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



13	Q16		5536	14	122.330	0.4%	
14	Q12		7700	32	218.760	0.6%	
15	Q12		5700	80	404.820	1.2%	
16	Q32		5000	40	1262.670	3.7%	
17	Q32		7000	40	1767.840	5.2%	
18	Q12		4200-5500	290	1248.710	3.7%	
19	Q16		10620-12000	58	1035.340	3.1%	
20	Q12		4200	635	2367.800	7.0%	
21	Q12		5500	508	2480.550	7.4%	
22	Q12		2000	120	213.130	0.6%	
25	Q16		10620	127	2128.770	6.3%	
26	Q12		2000-2200	232	432.570	1.3%	
27	Q12		5499-7500	232	1338.690	4.0%	
اجمالى الكمية (كجم)					33673.580		
اجمالى الكمية بالطن عدد (2) قاعدة مسلحة					33.674		



عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

م/ مصطفى

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

14	Q12		7700	32	218.760	0.6%	
15	Q12		5700	80	404.820	1.2%	
16	Q32		5000	40	1262.670	3.7%	
17	Q32		7000	40	1767.840	5.2%	
18	Q12		4200-5500	290	1248.710	3.7%	
19	Q16		10620-12000	58	1035.340	3.1%	
20	Q12		4200	635	2367.800	7.0%	
21	Q12		5500	508	2480.550	7.4%	
22	Q12		2000	120	213.130	0.6%	
25	Q16		10620	127	2128.770	6.3%	
26	Q12		2000-2200	232	432.570	1.3%	
27	Q12		5499-7500	232	1338.690	4.0%	
اجمالى الكمية (كجم)					33673.580		
اجمالى الكمية بالطن عدد (2) قاعدة مسلحة					33.674		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل





مشروع كوبري ابو الخاوي

51

رقم البند

27/3/2025

بالقرع المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس إكسبريك مانعة للتآكل لاجزاء جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتجهيز العمل نهواً كاملاً وأبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخدمات قبل التوريد

ابو الخاوي

النوع

المساحة الفعلية

البلاطات

4233.3

المحاور

673.91

الاجمالي

4907.21

بها كمية جديدة في مستخلص جاري 7

المكتب الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

عضو

الشركة المنفذة

بثروت

بثروت

  المشروع رقم 51 رقم البند			
27/3/2025			
بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكثريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد			
محاور ابو الخاوي			
المحور	المساحة الفعلية		
B7	52.47		
B8	24.01		
B9	27.70		
B10	38.65		
B11	15.77		
B12	12.93		
B13	26.4		
C5	53.58		
C6	25.32		
C7	20.5		
C8	15.67		
C9	27.50		
C10	7.46		
C11	4.67		
C12	2.71		
C2	121.01	الكمية الجديدة بمستخلص جاري 7 م 318.57	
C3	109.52		
C4	88.04		
الاجمالي	673.91		

المكتب الاستشارى

الشركة المنفذة

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



بتروجت



مشروع كوبري أبو الخاوي


بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور C2				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
35.2	2	8	2.2	قواعد
22	2	5	2.2	
14.82	4	1.09	3.4	
48.99		3.55	3.45	تاج
121.01			الاجمالي	

المكتب الاستشاري
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتداد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور C3				
المساحة الفعلية	عدد القطاعات	الطول	العرض	القطاع
50.4	4	7	1.8	قواعد
23.12	4	1.7	3.4	اعمده
12	2	3	2	هامات
24	2	6	2	
109.52				الاجمالي

المكتب الاستشاري
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت



مشروع كوبري أبو الخاوي

بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعه للنفاذية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد

51	رقم البند			
محور C4				
القطاع	العرض	الطول	عدد القطاعات	المساحه الفعلية
قواعد	2.2	8	2	35.2
	2.2	5	2	22
اعمده	3.4	2.27	4	30.84
الاجمالي	88.04			

المكتب الاستشاري
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية



الشركة المنفذة
بتروجت





مشروع كوبرى كفر أبو الخاوي

رقم البند	71	
27/3/2025		

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الانكسار بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الإمتصاص عن 10 % وقدردا على طفتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتغلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

البند	الاجمالي	
د- مسافة النقل لا تقل عن 180 كم.	999.753	
الاجمالي	999.753	

المكتب الاستشاري

مكتب بيتا للاستشارات الهندسية

27/3/2025

الشركة المنفذة

بتروجت

27/3/2025

Your Company Name

123 Main Street

Suite #321

City, State 01234

Surface Report

Project Name: C:\Users\Ahmed Darag\Desktop\مصطفى جمال\New folder\New folder\سن متدرج كوبري ابو الخاوي.dwg

Report Date: 4/25/2025 3:08:13 PM

Client: Client Company

Project Description:

Prepared by: Preparer

Linear Units: meter	Area Units: squareMeter	Volume Units: cubicMeter
---------------------	-------------------------	--------------------------

منطقه وقفات اوناش وتجميع كميرات رقم 1 كوبري ابو الخاوي (سن متدرج)

Description: Description

Area 2D: 3794.670

Area 3D: 3796.003

Elevation Max: 0.563

Elevation Min: 0.035

Number of Points: 915

Number of Triangles: 1671

Volume Surface: منطقه وقفات اوناش وتجميع كميرات رقم 1 كوبري ابو الخاوي (سن متدرج)

Description: Description

Volume Cut: 0.000

Volume Fill: 999.753


Volume Total: 999.753

Compare Surface: بعد الردم

Base Surface: قبل الردم

المكتب الاستشارات
مصطفى جمال

مراجعة

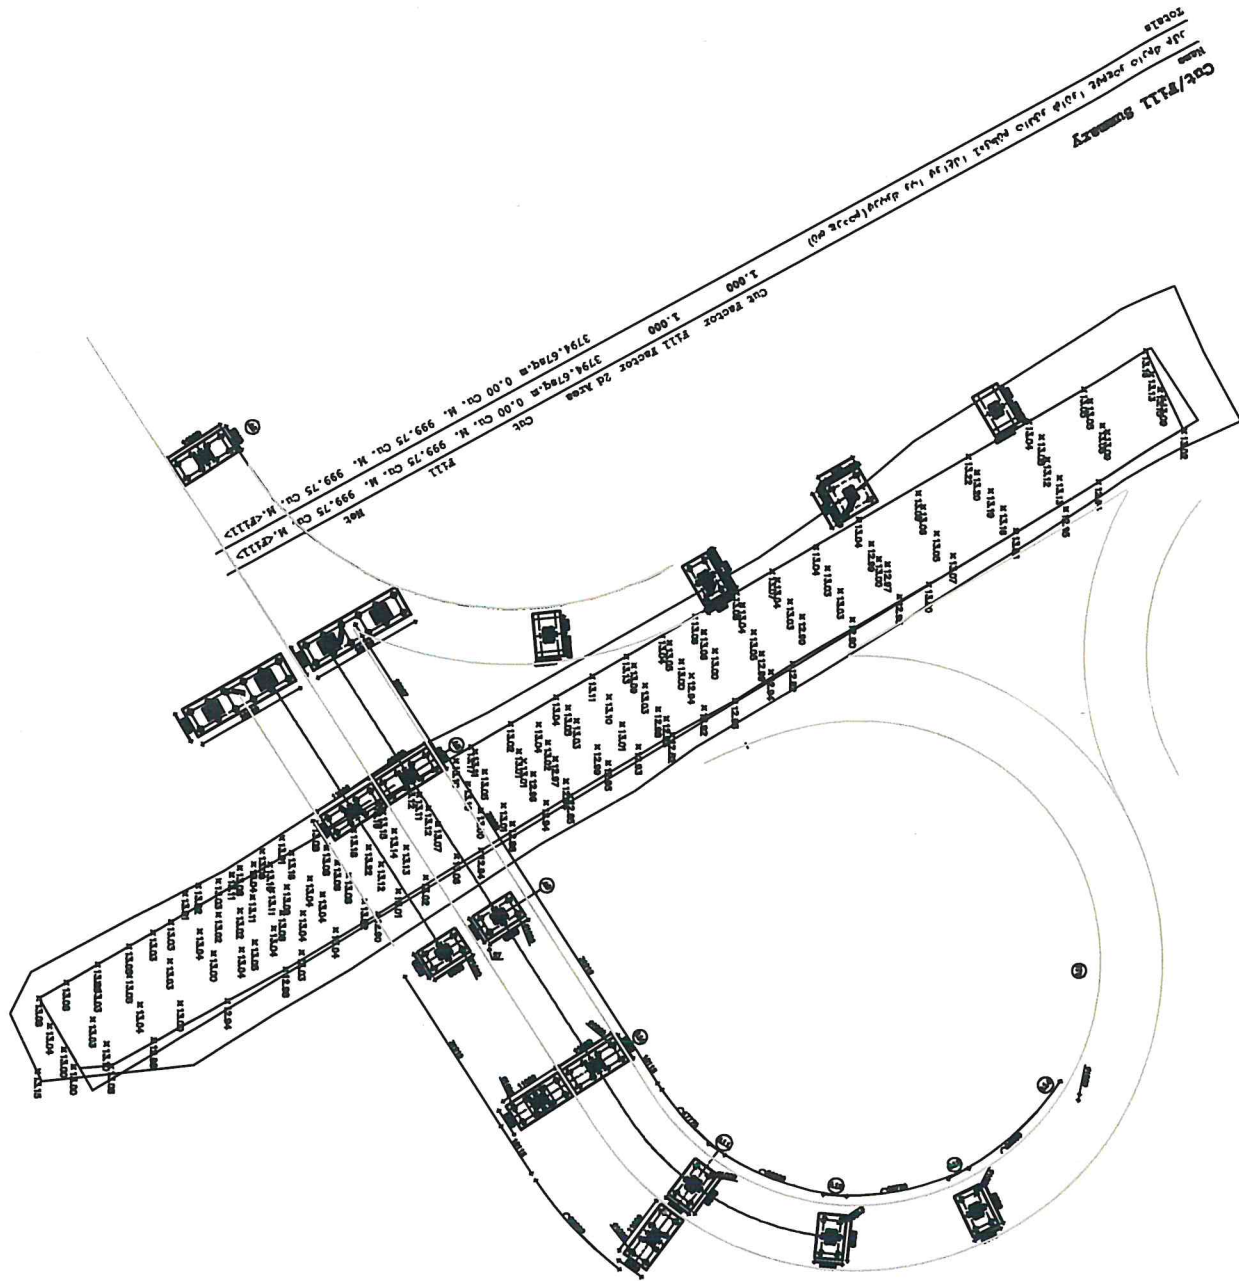Cut/Fill Summary

Station 1+000 to 1+900

Station 1+000 to 1+900

Station 1+000 to 1+900

توقيع

امضاء المهندس

محضر تشوينات

مشروع : كباري الرياح البحيري (كوبري بولين و كوبري ابو الخاوي)

تنفيذ شركة بتروجيت

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٢/١١ بحضور كلا من السادة :

١. مهندس / محمد عماد (مدير المشروع بهيئة الطرق و الكباري)
٢. مهندس / مصطفى فتحي عزام (مكتب بنتا للاستشارات الهندسية)
٣. مهندس / محمد حسن سويد (مدير مشروع بشركة بتروجيت)

بالحضور للموقع و معاينة التشوينات اقر السيد المهندس المشرف بوجود كمية (٥٥٢) طن حديد كمر مخفي ١٣ ص.١٣

كوبري ابو الخاوي وقد تم الاتي :

١- أفاد مهندس الشركة بأن هذه الكميات موردة بمعرفة الشركة ومن مواردها الذاتية وتحت مسؤوليتها .

٢- أفاد مهندس الشركة بأن التشوينات المذكورة تحت حراسة الشركة و في عهدها .

وأقفل المحضر علي ذلك ،،،،

وقد تحرر محضر منا بذلك ،،،،

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

ع.ع.ع.

١٣

١٣

محضر مسافة نقل طبقة أساس

التاريخ: 2025/ /

اسم المشروع : أعمال إنشاء كوبري ابو الخاوي أعلي الرياح البحيري
قام استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري بقياس النقل من المحجر الي الموقع والعكس

لشركة : بتروجت

وبحضور كلا من:-

1- مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري :

2- مهندس الشركة المنفذة :

وكانت الاحداثيات كالتالي:

المسافة	الشرق (E)	الشمال (N)	اسم المحجر
192 KM	30° 1' 36.84"	30° 39' 56.23"	كسارة البدر

ملاحظات:-

في حالة تغيير المصدر يتم قياس واعتماد مسافة النقل الجديدة

مهندس الهيئة
عاد

مهندس الاستشاري
مستط

مهندس الشركة
مستط

محضر مسافة نقل طبقة أساس

التاريخ: 2025/ /

اسم المشروع : أعمال إنشاء كوبري كفر بولين أعلى الرياح البحري



مهندس الهيئة

عبد

مهندس الاستشاري

مصطفى

مهندس الشركة

محمد



مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من 1/3/2025 وحتى تاريخ 27/03/2025

مستخلص جارى رقم (7)

العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أ- أعمال البر													
٣	بالمتر المسطح تقطيع وإزالة الأشجار شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات و تعليمات المهندس المشرف.	2م	٣٥,٧٠١	٦	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب إزالة تعديلات عشوائية (كاللاكشاك المصنوعة من الاخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل مايلزم لنهو الاعمال كاملة مع نقل ناتج الازالة لمسافة 500 متر طبقا لتعليمات المهندس المشرف	3م	٢٠١	٣٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٢,٠٠٠	٧١	١٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	١٤,٠٥٨	٠,٠٠٠	١٤,٠٥٨,٠٠٠		١٤,٠٥٨,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٥٠٠	١٤٦	١٣٧,٤٧٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٧٠	٢٠,٠٧١	٠,٠٠٠	٢٠,٠٧٠,٦٢		٢٠,٠٧٠,٦٢	
٧	بالمتر الطولي هدم وتكسير بردورات بأى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١,٠٠٠	١٦	٢٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣,٢٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠		٨,٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعة	٤	٥٠,٢٥٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٥٠,٧٥٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٧٥٠,٠٠٠		١٥٠,٧٥٠,٠٠٠	
٩	بالعدد فك وإزالة اعمدة انارة وتسليمه للاماكن التي تحددها الهيئة والبند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١,٤٠٧	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٧,٠٣٥	٠,٠٠٠	٧,٠٣٥,٠٠٠		٧,٠٣٥,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق ورمدم ودمك دقشوم خالية من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد القلوية والعضوية والاصداق لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقا والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقا واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3م	١٠,٠٠٠	٢٠١	٢,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	٥٤٢,٧٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٢,٧٠٠,٠٠٠		٥٤٢,٧٠٠,٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي اعمال الرقع المساحى للمرافق والمعتبرات .	م.ط	١,٠٠٠	١١	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١,٥٤٠	٠,٠٠٠	١,٥٤٠,٠٠٠		١,٥٤٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي اعمال حفر ورفع كابلات الكهرباء والفنه تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحواط السانده والسعر شامل إعادة الردم وإعادة الشئ لأصله وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	٢٤٢	٢٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٣	بالطن أعمال فك ونقل الهياكل المعدنية المختلفة مثل اللوحات الاعلانية والاعمدة الحاملة لها وأعمدة الأتارة والمظلات وخلافه بمختلف الأوزان والارتفاعات وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأوتاش والمعدات وتربلات مجهزة للنقل لزوم أعمال الفك والنقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتحميل باستخدام ارشادات مرورية وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٠	٢,٠١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	سليم ختم مبلغ ١٥٩,٤٠٠ نظير الخضارات المحيطة بعمل المنطقة
١٤	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٠٠٠	٣٥٢	١,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٤٢٢,٤٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢,٤٠٠,٠٠٠		٤٢٢,٤٠٠,٠٠٠	١٣ صابر م
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة و يشمل فك ونقل الماكينة بالملحقات إلى خارج الموقع والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	عدد	٤	٢٤٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠		٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠	المعمل متواجد
١٦	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة و يشمل فك ونقل الماكينة بالملحقات والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	عدد	٤	٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنى عن 450 كجم/م 3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم 2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	١,٥٠٠	٢,٢٠٠	١,٢٢٢,٦٨٠	٠,٠٠٠	١,٢٢٢,٦٨٠	٣,٩١٥,٧٧٦	٠,٠٠٠	٣,٩١٥,٧٧٦,٠٠٠		٣,٩١٥,٧٧٦,٠٠٠	٢/سعار المكاتب متواجدة

عن إستشارى الهيئة :

عن الشركة المنفذة :

عن الهيئة :

م/ مصطفى فتحى عزام

د.م/ حمادة محمد كامل

م/ محمد عماد
مدير المشروع

مهندسة المشروع م/صابرين النحراوى

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام

م / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية



مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من 1/3/2025 وحتى تاريخ 27/03/2025

مستخلص جارى رقم (7)

العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٦,٨٠٠	٤,٢٠٠	٤,٧٧٩,٥٤٠	٨٤٥,٥٢٠	٥,٦٢٥,٠٦٠	٢٠,٠٧٤,٠٦٨	٣,٥٥١,١٨٤,٠٠٠	٢٣,٦٢٥,٢٥٢,٠٠٠		٢٣,٦٢٥,٢٥٢,٠٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات مع على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٢,٤٩٠	١,٩٥٠	١,٠٦٢,٢٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦٢,٢٠٠	٢٠,٠٧١,٢٩٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٧١,٢٩٠,٠٠٠		٢٠,٠٧١,٢٩٠,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور (متواجدة)
٢٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل والالواح المعدنية والمؤقتة وأجهزة القياس والسعر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقا للرسومات ونهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) "والسعر لا يشمل خازوق التجربة"	عدد	١	١٨٠,٩٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠		١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الإساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٥,٠٠٠	٨٦	٠,٠٠٠	٢,٤٥٨,٤٠٠	٢,٤٥٨,٤٠٠	٠	٢١١,٤٢٢,٤٠٠	٢١١,٤٢٢,٤٠٠		٢١١,٤٢٢,٤٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م	١,٠٠٠	٨٦	٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٦,٣٦٤	٠,٠٠٠	٦,٣٦٤,٠٠٠		٦,٣٦٤,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بترابية صالحة الموردة بمعرفة المقاول وصولا لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذها داخل ميول التربة والبند يشمل إزالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتظهر التربة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لمالكية الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٣٠,١٧٧	٩١	٢٥,٣٥٣,٦٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٣٥٣,٦٠٠	٢,٣٠٧,١٧٨	٠,٠٠٠	٢,٣٠٧,١٧٧,٦٠٠		٢,٣٠٧,١٧٧,٦٠٠	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط 3م0.4 رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم /سم ² ولا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م ³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	3م	٤٥٠	١,٥٥٠	٥١,٤٧٠	٠,٠٠٠	٥١,٤٧٠	٧٩,٧٧٩	٠,٠٠٠	٧٩,٧٧٩,٥٠٠		٧٩,٧٧٩,٥٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم ² بعد 28 يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقامم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	٤,٠٠٠	٢,٢٥٠	١,٠٦٨,٩٠٠	٥٩٠,٤٠٠	١,٦٥٩,٣٠٠	٢,٤٠٥,٠٢٥	١,٣٢٨,٤٠٠,٠٠٠	٢,٧٢٣,٤٢٥,٠٠٠		٢,٧٢٣,٤٢٥,٠٠٠	
	علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى 400 كجم / م ³ وزيادة اجهاد الى 350 كجم / سم ²	3م	٤,٠٠٠	٦٥	١,٠٦٨,٩٠٠	٥٩٠,٤٠٠	١,٦٥٩,٣٠٠	٦٩,٤٧٩	٢٨,٣٧٦,٠٠٠	١٠٧,٨٥٤,٥٠٠		١٠٧,٨٥٤,٥٠٠	
٣٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم ² ومحتوى الأسمنت 450 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	١,٠٠٠	٢,٧٧٥	٢٦٩,٩١٠	٠,٠٠٠	٢٦٩,٩١٠	٧٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٩,٠٠٠,٢٥٠		٧٤٩,٠٠٠,٢٥٠	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	3م	٨٠٠	٢,٩٨٠	٠,٠٠٠	٨٦,٤٠٩	٨٦,٤٠٩	٠	٢٥٧,٤٩٨,٨٢	٢٥٧,٤٩٨,٨٢		٢٥٧,٤٩٨,٨٢	
	ب - ارتفاع من 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	3م	٨٠٠	٢,٩٨٠	٠,٠٠٠	٨٦,٤٠٩	٨٦,٤٠٩	٠	٢٥٧,٤٩٨,٨٢	٢٥٧,٤٩٨,٨٢		٢٥٧,٤٩٨,٨٢	
٣٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري والهوامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم ² ومحتوى اسمنت لا يقل عن 500 كجم/ م ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والمعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٠٠٠	٢,٨٧٥	٨٠٨,٣٩٠	٠,٠٠٠	٨٠٨,٣٩٠	٢,٣٢٤,١٢١	٠,٠٠٠	٢,٣٢٤,١٢١,٢٥٠		٢,٣٢٤,١٢١,٢٥٠	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	3م	٥٠٠	٣,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
	ب - ارتفاع من 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	3م	٥٠٠	٣,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	

مدير إدارة المشروعات :

عن الهيئة :

عن إستشارى الهيئة :

عن الشركة المنفذة :

رئيس الإدارة المركزية

م / مجدى عبد السلام عامر

م / كارم امام

مدير المشروع :

م / محمد عماد

م / مصطفى فتحى عزام

د.م / حمادة محمد كامل

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من 1/3/2025 وحتى تاريخ 27/03/2025

مستخلص جارى رقم (7)

العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كبة البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والانسدادات ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم2 محتوى أسمنتى 450 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح اعطى ومعالجته والسعر لادخل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	3م	٤,٠٠٠	٢,٠٥٠	٦٤٧,٦٠٩	٠,٠٠٠	٦٤٧,٦٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	أ- ارتفاع حتى 6 متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	3م	٤,٠٠٠	٢,٠٥٠	٦٤٧,٦٠٩	٠,٠٠٠	٦٤٧,٦٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	ب- ارتفاع من 6 - 9 متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	3م	٤,٢٠٠	٢,٠٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	ج- ارتفاع من 9 - 12 متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	3م	٦٥٠	٢,٠٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	د- علاوة زيادة محتوى أسمنتى إلى 500 كجم/سم2 وزيادة إجهاد إلى 500 كجم/سم2 + إضافات خاصة طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري.	3م	٨,٨٥٠	٦٥	٦٤٧,٦٠٩	٠,٠٠٠	٦٤٧,٦٠٩	٤٢,٠٩٥	٠,٠٠٠	٤٢,٠٩٥	٠,٠٠٠	٤٢,٠٩٥	
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 450 كجم / سم 2 محتوى أسمنتى 450 كجم/البند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقفيل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الإجهاد ولا حديد التسليح.	3م	٢,٠٠٠	٣,٧١٩	١٥٧,٨٥٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٨٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٧,٠٤٤,١٥	٠,٠٠٠	٥٨٧,٠٤٤,١٥	
	أ- علاوة زيادة محتوى أسمنتى إلى 500 كجم/سم2 وزيادة إجهاد إلى 500 كجم/سم2 + إضافات خاصة طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري.	3م	٢,٠٠٠	٦٥	١٥٧,٨٥٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٨٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٢٦٠,٢٥	٠,٠٠٠	١٠,٢٦٠,٢٥	
٤١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى إجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى أسمنت 450 كجم/سم3 والسعر لا يشمل حديد التسليح.	3م	٢,٢٠٠	٢,٩٧٠	٩٤٥,٩٨٠	٢٥٧,٢٧٠	١,٢٠٣,٢٥٠	٢,٨٠٩,٥٦١	٧٦٤,٠٩١,٩٠	٣,٥٧٣,٦٥٢,٥٠	٠,٠٠٠	٣,٥٧٣,٦٥٢,٥٠	
	أ- علاوة زيادة محتوى أسمنتى إلى 500 كجم/سم2 وزيادة إجهاد إلى 500 كجم/سم2 + إضافات خاصة طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري.	3م	٢,٢٠٠	٦٥	٩٤٥,٩٨٠	٢٥٧,٢٧٠	١,٢٠٣,٢٥٠	٦١,٤٨٩	٠,٠٠٠	٧٨,٢١١,٢٥	٠,٠٠٠	٧٨,٢١١,٢٥	
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد بـرسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وتجميع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٦,١٢١	٢٦,٥٠٠	٢,٤٠٩,٩٣٦	٤٥٤,٣٥٨	٢,٨٦٠,٢٩٤	٦٣,٧٥٧,٣٠٤	١٢,٠٤٠,٤٨٧,٠٠	٧٥,٧٩٧,٧٩١,٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٧٩٧,٧٩١,٠٠	
٥١	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس إكليريك مانعه للتآكلية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف علي أن يتم إعتماد الخامات قبل التوريد	2م	٢٤,٠٠٠	١٠١	٢,٦٧٥,١٦٠	١,٣٢٠,٧١٨	٣,٩٩٥,٨٧٨	٢٧٠,١٩١	٠,٠٠٠	٤٠٣,٥٨٣,٦٨	٠,٠٠٠	٤٠٣,٥٨٣,٦٨	
أ- اعمال المجرى المائى													
٥٣	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢٠	١,٢٥٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح اعمال دسمة لقواعد المجرى المائى والهيكى العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى والبر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفلية (دسمة) والبند يشمل مما جميعه اعمال توريد ودق القيسونات المؤقتة وتركيب وادماج الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية وفق القيسونات والكمر ونقلها خارج المجرى المائى	2م	٣٠٠	٢,٨٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠,٠٠	
٥٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بالمجرى المائى طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/سم3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدرة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهوا العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل سداد التسيانج أو القيسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أنه تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٥٣٠	٥,٧٥٠	٥٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	٢,٠٤٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٤٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٤٧,٥٠٠,٠٠	
٥٩	بالطن توريد وتركيب قيسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة واختبارات المعاملات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى والفئة تشمل توريد دهان مقاوم للتآكل والتآكل بالهواء والمعالجة ضد الصدأ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف	طن	٣٩٠	٣١,٠٠٠	٢٨٨,٨٣٠	٠,٠٠٠	٢٨٨,٨٣٠	٨,٩٥٣,٧٣٠	٠,٠٠٠	٨,٩٥٣,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٥٣,٧٣٠,٠٠	
٦٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البواعيد الخرسانية بالمجرى المائى جهد 350 كجم/سم2 محتوى أسمنتى لا يقل عن 300 كجم/سم2 والفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة بالكوبرى والمجرى المائى وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	3م	٣٠٠	٢,٥٩٥	٢٨٠,٨٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٨٠٠	٧٢٨,٦٧٦	٠,٠٠٠	٧٢٨,٦٧٦,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٨,٦٧٦,٠٠	

عن الهيئة :

م/ مصطفى فتحي عزام

عن الهيئة :

م/ محمد عماد

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام



رئيس الإدارة المركزية

م / مجدى عبد السلام عامر

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

مستخلص جاری رقم (7)

من 1/3/2025 وحتى تاريخ 27/03/2025

عن الشركة المنفذة :

د.م / حمادة محمد كامل

م/ مصطفى فتحي عزام

عن الهيئة :

م/ صابر بن النحراوى
مدير المشروع :
م/ محمد عماد

مدير إدارة المشروعات :

م / كرام امام

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م / مجدى عبدالسلام عامر
