

عملية اعمال (القطاع الثاني) من تطوير كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي بطول ١٠كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة الهنا للمقاولات المتكامله - محمد اشرف مسعود علي - العقد رقم (١٨١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (١ جاري) خلال الفترة ٠٤ / ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣

الامر الاسناد		٢٠٢٣ / ٠١ / ١١								
تاريخ التعاقد		٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٦								
بيانات التعاقد		المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الكمية خلال المدة المنفذه بالشهر	نسبه التعويض بناء علي امر الاسناد	قيمة التعويض	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فئة							الكمية
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات	م٢	٥.٢٥	٥٠٠٠	٢٦٢٥٠	٢١	٠.٧٢٤	٣٦٧.٧٠	١.٤٤	٢٧٣.٧٢
			٥.٢٥	٥٠٠٠	٢٦٢٥٠	٨	٠.٢٧٦	٣٧١.٣٠	١.٩٨	١٤٣.٣٨
٣	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربه المتماسكه عدا التربه الصخرية	م٣	٢٠	١٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢١	٠.٧٢٤	٣٦٧.٧٠	١.١٤٦	١٦٥.٩٧
			٢٠	١٠٠٠	٢٠٠٠٠	٨	٠.٢٧٦	٣٧١.٣٠	٢.٠٩	١١٥.٣١
٤	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم ومطابق للمواصفات	م٣	١١٤	١٣٩٤	١٥٨٩١٦	٢١	٠.٧٢٤	٣٦٧.٧٠	١.١٤٦	١٣١٨.٧٨
			١١٤	١٣٩٤	١٥٨٩١٦	٨	٠.٢٧٦	٣٧١.٣٠	٢.٠٩	٩١٦.٢٣
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م٣	٣٥٦	٢٨٧٠	١٣٧٧٧٢٠	٢١	٠.٧٢٤	٣٦٧.٧٠	٢.٠٣	٢٠٢٥٢.٤٨
			٣٥٦	٢٨٧٠	١٣٧٧٧٢٠	٨	٠.٢٧٦	٣٧١.٣٠	٣.٠٦	١١٦٢٩.٨٦
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب (برم) باستخدام الاسفلت المسائل متوسط التطاير M.C.O	م٢	٢٧.٥	٢٢٨٠	٦٢٧٠٠	٢١	٠.٧٢٤	٩١٣.٦٠	٦.٣	٢٨٦٠.٤٢
			٢٧.٥	٢٢٨٠	٦٢٧٠٠	٨	٠.٢٧٦	٩١٣.٦٠	٦.٧٨	١١٧٢.٧١
٧	اعمال توريد وفرش طبقة من الرابطه سمك ٦ سم	م٢	١٤٦	٢٢٨٠	٣٣٢٨٨٠	٢١	٠.٧٢٤	٢٨٠.٧٠	٥.٢٧	١٢٧٠٣.٣٩
			١٤٦	٢٢٨٠	٣٣٢٨٨٠	٨	٠.٢٧٦	٢٧٧.٥٠	٥.٨٤	٥٣٦٢.٨١
٨	اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانه الاسمنتية المسلحه بسمك ٢٨ سم	م٢	٦٧٠	١٩٠٠	١٢٧٣٠٠٠	٢١	٠.٧٢٤	٣٦٧.٧٠	٢.٨٣	٢٦٠٨٧.٧٢
			٦٧٠	١٩٠٠	١٢٧٣٠٠٠	٨	٠.٢٧٦	٣٧١.٣٠	٤.٦٨	١٦٤٣٤.٨٧
إجمالي										
٩٩٤٣٧.٦٦										

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة

م/ محمد عبد الرزاق حبيب

مستشاري المشروع

المركز المصري للاستشارات الهندسية

م/ ايهاب ابراهيم محمد

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/ محمد الشرف


يعتقد،،،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م/ احمد عراف حسين



مدير المشروع بالمنطقة
م/ محمد عبد الرزاق حبيب

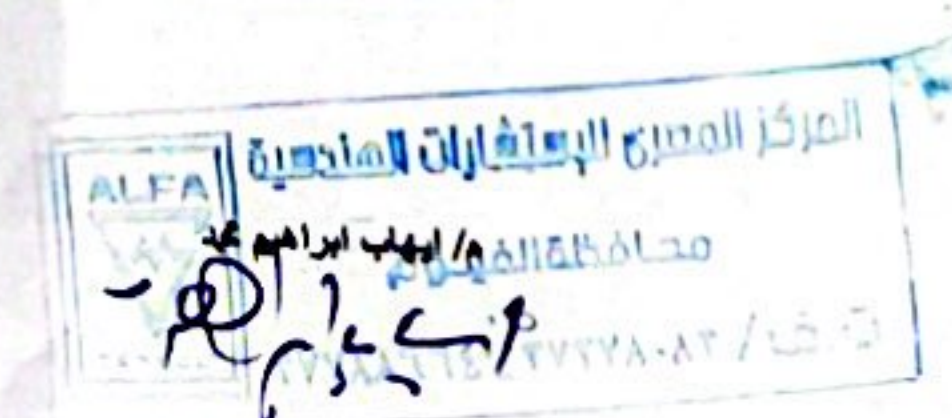

٢٠٢٣ / ٠١ / ١١

الامر الاسناد

٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٦

تاريخ التعاقد

بيانات التعاقد													
رقم	بيان البند	الوحدة	فئة	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الكمية خلال المدة المنقذة بالشهر	نسبة التعويض بناء على امر الاسناد	قيمة التعويض		
				الكمية	قيمة الأعمال								
١	اعمال توريد وتشغيل اتره صالحه للردم و مطابق للمواصفات	٢م	١١٤	١	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	٣٧١.٣٠	٢.٠٩	٠.٤٨			
			١١٤	١	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	٣٩٦.٢٠	٣.٨٤	١.١٥			
			١١٤	١	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	٣٩٦.٢٠	٤.١٤	١.٢٨			
			١١٤	١	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	٣٩٦.٢٠	٧.٧٤	٢.٣٢			
			١١٤	١	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	٣٧١.٣٠	٢.٠٣	١٨٩.٥٥			
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكمارات مسافه ١٦٠ كم	٢م	٣٥٦	١٣٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	٣٩٦.٢٠	٤.٥٧	٥٥٦.٥٨			
			٣٥٦	١٣٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	٣٩٦.٢٠	٥.٤٢	٦٨٢.١٠			
			٣٥٦	١٣٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	٣٩٦.٢٠	٩	١٠٩٦.١١			
			٣٥٦	١٣٠	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	٩١٣.٦٠	٦.٧٨	٤٥.١٤			
			٢٧.٥	١٢٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	٩١٣.٦٠	٧.٤٧	٦٤.٨٧			
٦	اعمال انشاء طبقة تضريب (برم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٢م	٢٧.٥	١٢٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	٩١٣.٦٠	٧.٧٨	٦٩.٨٢			
			٢٧.٥	١٢٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	٩١٣.٦٠	٨.٨٨	٧٧.١٢			
			١٤٦	١٢٠	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	٢٧٧.٥٠	٥.٨٤	٢٠.٦.٤٣			
			١٤٦	١٢٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	٢٧٣.٨٠	٦.٧٧	٣١٢.١٣			
			١٤٦	١٢٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	٢٧٣.٦٠	٧.١٨	٣٤٢.٠٧			
٧	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك ٦ سم	٢م	١٤٦	١٢٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	٢٧٩.٩٠	٩.٤٥	٤٣٥.٦٩			
			٦٧٠	١٠٠	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	٣٧١.٣٠	٤.٦٨	٦٣٢.٦٢			
			٦٧٠	١٠٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	٣٩٦.٢٠	١٠.١٦	١٧٩١.٣٧			
			٦٧٠	١٠٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	٣٩٦.٢٠	١٠.٨٣	١٩٧٣.١٥			
			٦٧٠	١٠٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	٣٩٦.٢٠	١٢.٧٦	٢٢٤٩.٧٩			
١٢	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانى اجهاد ٢٥٠	٢م	١٤٢	٥٠	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	٢٧٧.٥٠	٦.٣٥	٩٠.٩٦			
			١٤٢	٥٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	٢٧٣.٨٠	١٤.١١	٢٦٣.٦٣			
			١٤٢	٥٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	٢٧٣.٦٠	١٥.٠٧	٢٩٠.٩٦			
			١٤٢	٥٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	٢٧٩.٩٠	١٦.١٧	٣٠٢.١٢			
			١٧٠	٥٠	مايو	٢٣	٠.٢٠٢	٣٧١.٣٠	٦.٣٥	١٠٨.٩٠			
١٢	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانى اجهاد ٢٥٠	٢م	١٧٠	٥٠	يونيه	٣٠	٠.٢٦٣	٣٩٦.٢٠	١٤.١١	٣١٥.٦٢			
			١٧٠	٥٠	يوليو	٣١	٠.٢٧٢	٣٩٦.٢٠	١٥.٠٧	٣٤٨.٣٣			
			١٧٠	٥٠	اغسطس	٣٠	٠.٢٦٣	٣٩٦.٢٠	١٦.١٧	٣٦١.٧٠			
			إجمالي										
			الاجمالي										
خصم ٠.٥ %													
الاجمالي													

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام تنفيذ وصيوة
م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع بالمنطقة
م/ محمد عبد القادر حبيب

م/ محمد عبد القادر حبيب
م/ محمد عبد القادر حبيب

استشاري المشروع

م/ محمد عبد القادر حبيب
م/ محمد عبد القادر حبيب
م/ محمد عبد القادر حبيب

شركة المنفذ
مدير المشروع

م/ محمد الشرف



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الساسية ببني سويف

م/ احمد عبد الحميد حسين
