

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم ١٤٤+٠٠٠ الى الكم ١٤٦+٠٠٠ بطول ٢ كم عقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٣٥٦) اتجاه بني سويف (بالأمر المباشر).

الشركة المنفذة: محمد ذكي لادارة المشروعات

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه مستخلص جاري (٣).

(٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٣٥٦)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللائم.

مرفقات:

- ١- استمارة ٥٠ ع.ح
- ٢- اصل المستخلص
- ٣- اصل بيان الاعمال
- ٤- اصل حصر اعمال
- ٥- صورة محضر مسافة النقل
- ٦- صور ريكوستات
- ٧- صور تجارب معملية
- ٨- اصل برنامج زمني
- ٩- اصل محضر استلام الموقع
- ١٠- اصل المقايضة المعدلة

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس
سوقي

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف



السيد المهندس / طارق الجزار

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة المصلحة العامة للمصارف والمصارف
قسم : المصارف
المبلغ المستحق إلى مصرف مصر لإدارة المصارف
بموجب : الطلبات طيه ، أو : الكمون
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : الذم على المصرف المركزي
شيك على البنك المركزي في : الذم على المصرف المركزي
شيك على الخارج : الذم على المصرف المركزي
يسحب باسم : الذم على المصرف المركزي
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٧-٦٢, ٦٢	
الجملة		٧-٦٢, ٦٢	

رقم :
الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة العامة
كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة العامة
رئيس المصلحة العامة

رؤج

رئيس المصلحة العامة
رئيس المصلحة العامة

رئيس المصلحة العامة

رئيس المصلحة العامة
رئيس المصلحة العامة

علامة

سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات : بتاريخ :
الإمضاء :
الإمضاء :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رؤج في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

عملية : استناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمين)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 144+000 إلى الكم 146+000 بطول 2 كم اتجاه بني سويف (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 25 / 9 / 2023

تنفيذ : شركة محمد ذكي لإدارة المشروعات

مستخلص جاري (3)

العقد رقم : (1356 / 2022 / 2023)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية البند طبقاً لآخر مقايضة	مقدار العمل السابق إجماله	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
أولاً :- الأعمال المنفذة طبقاً لمحضرة مقايضة بتاريخ 26/6/2023										
1	بالمتر المسطح أصال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين. مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0,3 جنيه لكل 1 كم									
1-1	مسافة نقل حتى 500 م	3م	8159.75	73308.66	73308.66-	0.00	جاري	0.00	0.00	
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشطيبها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب 2 متر (أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب 2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكاف (نسبة تحمل كالفوننيا حتى 20%) ورشها بالمياه الصلبة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بآلة لرسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يصبح مستثلاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 ابتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السور 1.6 جنيه / 3م - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارت ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجورة.									يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (الميدنى - الإيسوى - الشهرى) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
1-3	لمسافة النقل حتى 2 كم .	3م	411.55	37040.00	37040.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
2-3	علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-15 = 13 كم) قبل تاريخ 4/5/2023 .	3م	359.00	32310.00	32310.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	معدات الموقع متواجدة.
3-3	علاوة زيادة السور 1.6 جنيه / 3م	3م	55.00	4950.00	4950.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	
4-3	رسوم الكرات والموزن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	3م	359.00	32310.00	32310.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	
5-3	قيمة المواد المحجورة لأثره بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	3م	359.00	32310.00	32310.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	مكتب الاشراف متواجد
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحريراً في / سنة 2024

يعتمد

سبق صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف


(الاستشاري العام)

استشاري الهيئة

المكتب الفني /

استشاري المساحة (سيرفنجينج سيستمز)

الشركة المنفذة



الاسم / مظهرى شعبان
التوقيع / مظهرى شعبان

الاسم / محمد
التوقيع / محمد

الاسم / محمد
التوقيع / محمد

الاسم / محمد
التوقيع / محمد

الاسم / محمد
التوقيع / محمد

الاسم / محمد
التوقيع / محمد

الاسم / محمد
التوقيع / محمد

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربى السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع من الكم 144+000 إلى الكم 146+000 بطول 2 كم اتجاه بنى سوف (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (1356 / 2022 / 2023) مستخلص جاري (3) تنفيذ : شركة محمد ذكى لإدارة المشروعات عن المدة من بداية العمل حتى 25 / 9 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايضة	مقدار العمل السابق إجراده	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
تاليا :- الأعمال المنفذة طبقا لمحضرة مفاوضات يوليو 2024											
1	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 600 متر و يتم احتساب علاوة 3. جنيه لكل 1 كم										
1-1	لمسافة نقل 600 م خلال شهر يناير 2023	11.00	م3	81700	0	72540	72540	797940.00	0.00	797940.00	
2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات السوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر (أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب 2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف إنسية تحمل كاليقوتيا حتى 620% وريتها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بانه إرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من 85% الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للمطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيار ايرت ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، والبند لا يشمل القيمة المحجيرة.										يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (الميدنى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة لوحات المشروع متواجدة
2-1	لمسافة نقل 2 كم خلال شهر يناير 2023	60.00	م3	32500.00	0.00	29350.00	29350.00	1761000.00	0.00	1761000.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
2-2	لمسافة نقل 2 كم خلال شهر مايو 2023	67.20	م3	2000.00	0.00	1800.00	1800.00	120960.00	0.00	120960.00	
2-3	لمسافة نقل 2 كم خلال شهر يونيو 2023	68.20	م3	3000.00	0.00	2700.00	2700.00	184140.00	0.00	184140.00	معدات الموقع متواجدة.
2-4	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-15 = 13 كم)	19.50	م3	32500.00	0.00	29350.00	29350.00	572325.00	0.00	572325.00	
2-5	رسوم الكراتن والموزين طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	13.00	م3	32500.00	0.00	29350.00	29350.00	381550.00	0.00	381550.00	
2-6	قيمة المواد المحجيرة للأترية بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	32500.00	0.00	29350.00	29350.00	1314880.00	0.00	1314880.00	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
0.00											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
5132795.00											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
5125731.36											
ماسبق صرفه											
7063.64											
اجمالى قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (3)											

الهيئة العامة للمطرق والكبارى

تحريرا في / سنة 2024

يعتمد

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره و قدره مدير عام المشروعات مهندس الاشراف (systra) الاستشارى العام استشارى الهيئة المكتب الفنى استشارى المنطقة (ميرفيح سيسيوز)

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بنى سوف)

المقاول تحريرا في / سنة 2024 (الحساب)

الاسم / مهندس سيبان التوقيع /



الاسم / التوقيع /

الاسم / التوقيع /

الاسم / التوقيع /

الاسم / التوقيع /

الاسم / التوقيع /

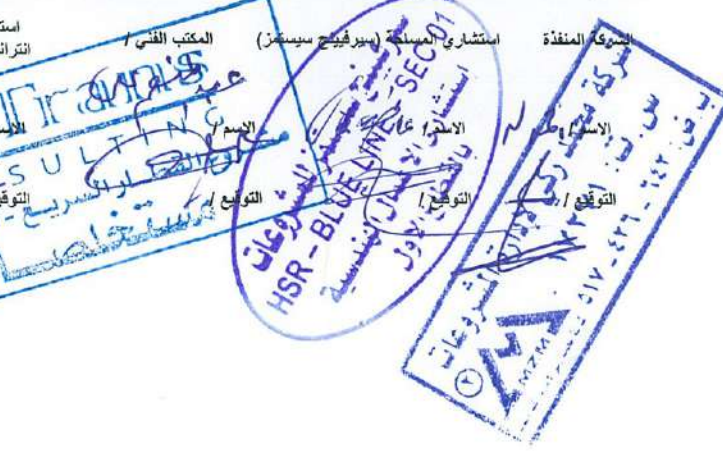

عملية : استناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروعات إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمين)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 144+000 إلى الكم 146+000 بطول 2 كم اتجاه بني سويف (بالأمر المباشر)

تقني : شركة محمد ذكي لإدارة المشروعات
عن المدة من بداية العمل حتى 25 / 9 / 2023

مستخلص جاري (3)

العقد رقم : (1356 / 2022 / 2023)

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايمة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
أولاً : الأعمال المنفذة طبقا لمحضرة مقاضاه بتاريخ 26/6/2023												
1	بالمقر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقلب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0,3 جنيه لكل 1 كم											
1-1	مسافة نقل حتى 500 م											
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أرتبة معابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر (أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب 2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف إنسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20% ورشها بالمياه الأسيوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بآلة إرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء يجمع مختلفاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 إبتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه /م ³ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيار اريت ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، والبند لا يشمل الغيمة المحجورة.											يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (الميدنى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
1-3	لمسافة النقل حتى 2 كم .		3م	60.00		37040.00-	37040.00	جاري	0.00	0.00	0.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
2-3	علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل الممتدة 2-15 = 13 كم) قبل تاريخ 4/5/2023 .		3م	18.20		32310.00-	32310.00	جاري	0.00	0.00	0.00	معدات الموقع متواجدة.
3-3	علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه /م ³		3م	1.60		4950.00-	4950.00	جاري	0.00	0.00	0.00	مكتب الاشراف متواجد
4-3	رسوم الكارتات والموازين طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لإسعار الطرق .		3م	13.00		32310.00-	32310.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
5-3	قيمة المواد المحجورة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات		3م	44.80		32310.00-	32310.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريراً في / سنة 2024

يعتمد ،،،،

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف


(الاستشاري العام)

استشاري الهيئة

المكتب الفني /

استشاري المناقصة (مستشار ميسمتر)

الشركة المنفذة



الاسم / محمد شهاب
التوقيع /

الاسم / محمد شهاب
التوقيع /

الاسم / محمد شهاب
التوقيع /

الاسم / محمد شهاب
التوقيع /



عملية : استناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربى السريى (أكتوبر - أوسمىل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع من الكم 144+000 إلى الكم 146+000 بطول 2 كم اتجاه بنى سويف (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 2023 / 9 / 25

تنفيذ : شركة محمد ذكى لإدارة المشروعات

مستخلص جارى (3)

العقد رقم : (2023 / 2022 / 1356)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايمة	مقدار العمل السابق إجرءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
تأثير : الأعمال المنفذة طبقا لمحضرة مقاضيه بوايو 2024											
1	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يعيق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 600 متر و يتم احتساب علاوة 3. جنيه لكل 1 كم										
1-1	لمسافة نقل 600 م خلال شهر يناير 2023	11.00	3م	81700	0	72640	72640	797940.00	0.00	797940.00	
2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى متسوب 2- متر (أسفل متسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من متسوب 2- متر) من متسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف إنسية تحمل كالبورتيا حتى 20% ووشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بانه إرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيار وت نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجيرة.										براعى تطبيقى نصوص التعاقد مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمنى متواجد التقارير (الميدنى - الإيسوى - الشهرى) متواجدة لوحات المشروع متواجدة
2-1	لمسافة نقل 2 كم خلال شهر يناير 2023	60.00	3م	32500.00	0.00	29350.00	29350.00	1761000.00	0.00	1761000.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
2-2	لمسافة نقل 2 كم خلال شهر مايو 2023	67.20	3م	2000.00	0.00	1800.00	1800.00	120960.00	0.00	120960.00	
2-3	لمسافة نقل 2 كم خلال شهر يونيو 2023	68.20	3م	3000.00	0.00	2700.00	2700.00	184140.00	0.00	184140.00	محطات الموقع متواجدة.
2-4	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-15 = 13 كم)	19.50	3م	32500.00	0.00	29350.00	29350.00	572325.00	0.00	572325.00	
2-5	رسوم الكرات والموزين طبقا للعادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	13.00	3م	32500.00	0.00	29350.00	29350.00	381550.00	0.00	381550.00	
2-6	قيمة المواد المحجيرة للأترية بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	3م	32500.00	0.00	29350.00	29350.00	1314880.00	0.00	1314880.00	
	اجمالى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							5132795.00	0.00	5132795.00	مكتب الإشراف متواجد
	اجمالى قيمة الاستقطاعات							0.00			
	اجمالى قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات							5132795.00			
	ماسبق صرفه							5125731.36			
	اجمالى قيمة الأعمال خلال فترة المستخلص رقم (3)							7063.64			

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحريرا فى / سنة 2024

يعتمد

سيق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

مدير عام المشروعات

مهندس الاشراف

(الاستشارى العام
(systra)

استشارى الهيئة
لترانس)

المكتب الفنى /

استشارى المساحة (سيرفيس سيمستز)

استشارى التنفيذ



المقاول تحريراً فى / سنة 2024 (المحاسب)
الاسم / مصطفى شعبان
التوقيع /

الاسم / محمد
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

