

بخصوص :- عملية اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بور
سعيد مركز ابشواى محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة نجم الشمال للمقاولات المتكاملة (محمود محمد سليمان)

عقد رقم :- العقد رقم (٤٣٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (ختامي) عن العمله عاليه من اصل و صوره
و باقي المرفقات
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أ.ف.ي: ٢٠٢٤/٠٨/٢٨

مرفقات: ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
صورة تجارب معمل
عدد (٧) شهادات
اصل المقاييسه النهائيه
اصل محضر التقييم
اصل محضر الاستلام الابتدائي
خطاب المحملات

T

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

بخصوص :-
مصلحة اعمال تراكيب التراكيب منطقة ابو جوشو شارع بور
سعد مركز البشواي محافظة القابون (بالامر المباشري)

تنفيذ :- شركة نجم الشمال للمقاولات المتكاملة (محمود محمد سليمان)

عقد رقم :- العقد رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

- باتيحه الى الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشؤون المالية و الادارية بخصوص
استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
تشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبة بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- لا يوجد عماله محمله على هذا العقد .
 - ٢- لا يوجد سيارة محمله على هذا العقد .
 - ٣- يوجد محملات في هذا العقد و تم توريد الادوات المكتبيه اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامه لمركز
المعلوما بالهينه .
 - ٤- لا يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالفتبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٨
ملاحظات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار ه

شركة نجم الشمال للمطويات المتكاملة (مصرف مصر ملحق)

قرارہ امور العمل طبعاً الحقد، ۳-۲۱/۱-۳

المقرر: أحمد بن محمد بن سليمان

نسيم الشمال للدراسات

طارة، يوسف، جزار

عملية اتصال تركيب الترتولك منطقة ابو جنشو شارع بور سعيد مركز ابيشرا في محافظة الفيوم (

بالامر المباشر)

شركة نجم الشمال للمقاولات المتكاملة (محمود محمد سليمان)

العقد رقم (٤٣٨) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٣) خلافي)

١,٩٨٩,١٦٠,٠٠٠

اسم العمل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

بلد المبررالية :

قيمة امر الاستاذ

حسب الاصول

مستحقة	٠,٠٠٠
٥ ٪ الترخيص	٠,٠٠٠
رسم القيمة	٢,٢٢٢,٨١
القيمة	٠,٠٠٠
١٥ ٪ مستحقة للوزارة	٠,٠٠٠
١٤ ٪ ضريبة	٨٤٥,٤٩
الاجرة	٠,٠٠٠
قسم سياتج (القطار و طرقة سيدة الالف و ربه سياتج)	٢,٤٥٤,٣٢
القيمة	٢,٤٥٤,٣٢

لغير

بيان المتسرف من الممول	قيمة الاصل	قيمة	قيمة
بيان الاصل الذي تستلزم	١,٩٨٩,٢١٤,٠٠٣		
قسم مخفر للتعليم	٧,٤٥٤,٧٣		
مستحق	٠,٠٠٠		
مستحق	١,٨٨٥,٠٩٠,١٩		
مستحق	٨٦,٢٩٩,١١		
مستحق	٢,٢٠٢,٢٣		
مستحق	٨٣,٤٩٥,٨٨		
مستحق	٤,١٢٧,١٠		
مستحق	٢,٩٧١,٥١		

يراعى على تصرف :
يراعى تطبيق القوانين المتعلقة بالترتيب والاعتماد والاعتماد والاعتماد
مستحق

مستحق



المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بور سعيد مركز ابشواى
محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة نجم الشمال للمقاولات المتكامله (محمود محمد سليمان)
عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق



بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالى	الموقع
						من الى
2	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	م ٢	٨,٠٩٠	٤٠٥,١٩	٨,٤٩٥,١٩	
3	اعمال رفع و تعليه اغطيه مطابق الصرف و غرف التفشيش	م ٣	٤٠	٢	٤٢	
4	اعمال توريد و تركيب بردورة اسمنتية (وسط)	م ٣	٦,٥٤٠	٤,٦٢	٦,٥٤٤,٦٢	
5	دهان البردورة بابعاد ١٠ * ٣٠ سم	م ٣	.	٢٢٥,٢٧	٢٢٥,٢٧	
6	توريد و صب قدمه من اخرساته العاديه اسفل البردورات بابعاد ١٠ * ٣٠ سم	م ٣	١,٥٥٠	٢,٦٢	١,٥٥٢,٦٢	
7	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى اجهاد ٤٥٠ كجم اسم ٢ مقاس ٨٠٠ * ٢٠٠ * ١٠٠ مم	م. ط	٦,٥٤٠	٣٤٤,٦٩	٦,٨٨٤,٦٩	
	بند مستحدث					
8	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى اجهاد ٢٥٠ كجم اسم ٢ مقاس ٦٠٠ * ٢٠٠ * ١٠٠ مم	م. ط	١,٥٥٠	٦٠,٥٠	١,٦١٠,٥٠	

مهندس الشركة
و مهندس

مهندس الاستشاري

مهندس المشروع

مدير عام التنفيذ و الصيانه



ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

رئيس المصلحة

فی ————— سنہ ۲۰۲

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ : الإمضاء :

في _____ سنة ٢٠٢٠ ميلادي

في _____ سنة ٢٠٢٠ ميلادي

وكيل الحسابات

مضامات موظفی الشطب

شیک

144

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبدالحميد منجد

الشركة المنفذة: نجم الشمال للمقاولات المتكاملة محمود محمد سليمان

اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ايشواي محافظة الفيوم

حصر الانترلوك جهد ٥٠ سمك ٨ سم

الشارع	طول	متوسط العرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
<u>منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد</u>				
شارع ١	22.5	2.86	64.30	
شارع ٢	26.45	2.59	68.40	
شارع ٣	37	2.99	110.50	
شارع ٤	15.99	1.75	28.00	
شارع ٥	29.4	2.46	72.19	
شارع ٦	33.3	2.24	74.56	
شارع ٧	69.4	4.71	326.70	
شارع ٨	68	6.48	440.80	
شارع ٩	120	6.50	780.40	
شارع ١٠	9	4.21	37.86	
شارع ١١	19	3.89	73.90	
شارع ١٢	16.48	3.58	58.93	
شارع ١٣	16.5	5.06	83.50	
شارع ١٤	40.13	5.08	204.04	
شارع ١٥	25.25	9.21	232.60	
شارع ١٦	22.99	3.69	84.80	
شارع ١٧	122.4	6.99	855.80	هـ
شارع ١٨	31.9	5.22	166.40	
شارع ١٩	87	4.59	399.70	
شارع ٢٠	49.9	5.12	255.44	

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبد الحميد منجد

الشركة المنفذة: نجم الشمال للمقاولات المتكاملة محمود محمد سليمان


أعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظة الفيوم

حصر الانترلوك جهد ٤٥٠ سمك ٨ سم

الشارع	طول	متوسط العرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
شارع ٢١	142	5.54	787.30	
شارع ٢٢	64	5.84	373.64	
شارع ٢٣	20	3.20	64.06	
شارع ٢٤	37.68	5.61	211.32	
شارع ٢٥	35.6	5.39	191.85	
شارع ٢٦	114	5.11	582.30	
شارع ٢٧	56	4.56	255.40	
اجمالي مساحة الانترلوك			6,884.69	

مهندس الاستشاري /

مهندس المشروع /



اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظة الفيوم

حصر اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمخلفات للانترلوك اجهاد ٥٠

الشارع	طول	متوسط العرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
منطقة ابو جشو شارع بورسعيد				
شارع ١	22.5	2.86	64.30	
شارع ٢	26.45	2.59	68.40	
شارع ٣	37	2.99	110.50	
شارع ٤	15.99	1.75	28.00	
شارع ٥	29.4	2.46	72.19	
شارع ٦	33.3	2.24	74.56	
شارع ٧	69.4	4.71	326.70	
شارع ٨	68	6.48	440.80	
شارع ٩	120	6.50	780.40	
شارع ١٠	9	4.21	37.86	
شارع ١١	19	3.89	73.90	
شارع ١٢	16.48	3.58	58.93	
شارع ١٣	16.5	5.06	83.50	
شارع ١٤	40.13	5.08	204.04	
شارع ١٥	25.25	9.21	232.60	
شارع ١٦	22.99	3.69	84.80	
شارع ١٧	122.4	6.99	855.80	٥
شارع ١٨	31.9	5.22	166.40	
شارع ١٩	87	4.59	399.70	
شارع ٢٠	49.9	5.12	255.44	
شارع ٢١	142	5.54	787.30	

وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبد الحميد منجد

الشركة المنفذة: نجم الشمال للمقاولات المتكاملة محمود محمد سليمان

اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جشو شارع بورسعيد مركز ابشواى محافظة الفيوم


حصر اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمخلفات للانترلوك اجهاد ٤٥٠

الشارع	طول	متوسط العرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
شارع ٢٢	64	5.84	373.64	
شارع ٢٣	20	3.20	64.06	
شارع ٢٤	37.68	5.61	211.32	
شارع ٢٥	35.6	5.39	191.85	
شارع ٢٦	114	5.11	582.30	
شارع ٢٧	56	4.56	255.40	
اجمالي مساحة الانترلوك			6,884.69	

مهندس الاستشاري /



مهندس المشروع /



وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبد الحميد منجد

الشركة المنفذة: نجم الشمال للمقاولات المتكاملة محمود محمد سليمان



اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنبو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظة الفيوم

حصر اعمال تطهير الموقع من المخلفات والاشجار للانترلوك اجهاد ٢٥٠

ملاحظات	اجمالي المساحة	متوسط العرض	طول	الشارع
	697.00	5.99	116.3	شارع ١
	400.00	6.78	59	شارع ٢
	196.20	6.65	29.5	شارع ٣
	244.60	6.37	38.4	شارع ٤
	72.70	5.59	13	شارع ٥
	1,610.50	اجمالي مساحة الانترلوك		

مهندس الاستشاري /

مهندس المشروع /



وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى: بيت الخيره للاستشارات د/ عبدالحميد منجد

الشركة المنفذه: نجم الشمال للمقاولات المتكامله محمود محمد سليمان

اعمال تركيب انترلوك منطقه ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواى محافظه الفيوم


حصر اعمال دهانات

بالمتر الطولي اعمال دهانات بر دورة بابعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات	٥٦٨٥.٢٨ متر طولي
--	------------------

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د/ عبدالحميد منجد



الشركة المنفذة: نجم الشمال للمقاولات المتكاملة محمود محمد سليمان

اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظة الفيوم

حصر أعمال تعلية اغطية المطابق

بالعدد ٢٤ مطبق	بالعدد رفع وتعلية اغطية مطابق الصرف للوصول للمناسيب النهائية للطرق والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات
----------------	---

مهندس الاستشاري



وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د/ عبدالحميد منجد



الشركة المنفذة: نجم الشمال للمقاولات المتكاملة محمود محمد سليمان

اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظه الفيوم


حصر أعمال صب قدمه من الخرسانه العادية

بالمتر الطولي صب قدمه من الخرسانه العادية اسفل البردورة بابعاد ١٠*٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات	٧٠.٦٢ متر طولي
---	----------------

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د/ عبد الحميد منجد

الشركة المنفذة: نجم الشمال للمقاولات المتكاملة محمود محمد سليمان

اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظه الفيوم
حصر اعمال توريد وتركيب بردوره اسمنتية وسط

بالمتر الطولي توريد وتركيب بردوره اسمنتية وسط بابعاد ٥٠*٣٠*١٥ / ١١ سم	٧٠.٦٢ متر طولي
--	----------------

مهندس الاستشاري
د. عبد الحميد منجد
١٩/٨/٢٠٢٢
مستشار في مقاولات الفيوم

مهندس الشركة
٣٣٥٨ / ٢٠٢٢
١٢/٢٥ / ٢٠٢٢
١٢/٢٥ / ٢٠٢٢

نجم الشمال للمقاولات
إدارة / محمود محمد سليمان
ب.ت. ٢٥٥٤ / ب.ف. ١١٩ / ٩٢٢ / ٢٠٢٢

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٣٣)
تحريرا فى / ٠٢٣/

المشروع : طريق ابو جنشو ابشواي الفيوم

تقليد شركة : نجم الشمال

نوع العينة : عدد ١ عينة اترية

نوع الاختبار : التدرج اللدونة / تصنيف التربة / أقصى كثافة جافة / نسبة المياه الملائمة / نسبة تحمل كاليفورنيا / الانفتاح

أحضرت العينة بمعرفة م / احمد يعقوب (مندوب الشركة)

تنبية هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ابو جنشو	المواصفات
سعة المنخل		
"٢ ٢/١	١٠٠	
"٢	١٠٠	
"٢ ٢/١	٩٦	
"١	٨٣	
"٤/٣	٧٤	
"٨/٣	٦٣	
رقم ٤	٥٢	
رقم ١٠	٥٠ -	
رقم ٤٠	٣١ -	
رقم ٢٠٠	٤٤٠	
حد السيونة	-	
حد اللدونة	عديمة	
مجال اللدونة	-	
تصنيف التربة	١١ - ب	
أقصى كثافة جافة طن / م ^٣	١,٩٥	
نسبة المياه الملائمة %	١٠,١٨	
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٣٩	لا يقل عن ٢٠%
نسبة الانفتاح %	٠	

ملاحظات : العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعية والصلاحية
التكاليف

قيمة الاعمال ١٢٥٥ + ١٥٠

ض م ٢٣٥.٧٥

٢٤٢.٣١ ا.م

٢١٠٤
٢٠٠٢

الاحمال ١٩٧٣.٠٦

المسئلة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAART)



تقرير رقم (١٥٣)
تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/١

المشروع : شارع ابو حنشو مركز اشواي
تطلب شركة : نعم العمل
نوع العينة : عدد ٣ عينة رمل اسفل الانرلوك
نوع الاختبار : الشدج
أحضرت العينة بمعرفة م/ احمد يعقوب ومضات

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة		رقم 1		رقم 2		رقم 3	
سعة العنقل		ب غ	ق غ	ب غ	ق غ	ب غ	ق غ
رقم 4		٩٩	٩٩	١٠٠	١٠٠	٩٩	٩٩
رقم ٨		٩٦	٩٦	٩٧	٩٦	٩٦	٩٦
رقم ١٦		٨٣	٨٣	٨٤	٨٤	٨٥	٨٤
رقم ٣٠		٤٣	٤٣	٤٥	٤٤	٤٤	٤٣
رقم ٥٠		١٣	١٥	١٦	١٤	١٥	١٦
رقم ١٠٠		٢	٤.٦	٢	٤.٨٠	٣	٤.٩٠
رقم ٢٠٠		٦٠	٣	٢	١	١	٤

التكاليف : فحة الاعمال ١٥٠ + ٩٠٠

١٥٧.٥٠ % ١٥ م

١٦٩.٥٥ % ١٤ ص

١٣٧٦.٥٥ الاحمال

١٥٣
٤٢



تقرير رقم : (٤٩٤)

المشروع: شارع ابو حنشو
شركة: نجم الشمال
نوع العينة: عدد ١٢ بلاطة انتلوك
الاختبار: تحديد جهد الكسر
احضرت العينة بمعرفة م / احمد يعقوب

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

بيانات الأعمال	جهد الكسر كجم/سم ^٢	ملاحظات
عدد ٦ عينات انتلوك رمادي	٤٤٨	تاريخ لعب
	٤٢٢	٢١١٥
	٣٨٩	تاريخ كسر
	٤٤١	تاريخ زرعها بالميل
	٤٣٢	
عدد ٦ عينات انتلوك احمر	٣٨٩	
	٢٩٢	حالة من
	٤٠٢	حالة
	٣٥٧	حالة
	٣٦٣	حالة
	٤٨٠	بالخط ب
	٤٥٤	

١٦٠ + ١٥٦٠

التكاليف قيمة الاعمال

٢٣٤

م ١٥٠ %

٢٧٢.١٦

م ١٤ %

٢٢١٦.١٦

١٦
٢٣٤
٢٧٢.١٦
٢٢١٦.١٦

تقرير رقم)

الهيئة العامة للمطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GABLT)



المشروع : امتداد ش - نكي لغوس - شارع الدوامة
شركة : نجم الشمال للمقاولات والتوريدات
نوع البعثة : عدد : عينة م ٦
الاختبار : تدرج - لدونة - CBR
احضرت العينة

تتبعه هام (العينات مسؤولة من احضرها)

رقم العينة	ش ركي لغوس ك ٢٠٠	ش لدونة ك ٣٠٠	لواصلات
سعة المنفل			
"٢	٩٧	٦٨	١٠٠
"١ ٢/١	٩٣	٦٦	١٠٠-٧٠
"١	٨٧	٦٠	٨٥-٥٥
"٤/٣	٨٠	٥٤	٨٠-٥٠
"٨/٣	٦٧	٤٥	٧٠-٤٠
رقم ٤	٥٧	٣٦	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٤٣	٣٣	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	٢٦	١٦	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	١٥	١١	١٥-٥
حد السيولة	-	-	لا تزيد عن ٣٠%
حد اللدونة	عديم	عديم	
مجال اللدونة	-	-	لا تزيد عن ٨%
أقصى كثافة حالة طن / م ٣	١٩٩	٢٠٢	
نسبة المياه الملائمة %	٧	٨	
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٤٥	٤٠	لا يقل عن ٨٠%
نسبة الانتفاخ %	-	-	

ملاحظة : العينات خلطت من مواد من اقربية

مدير عام الصيانة

مهندس /

محمد مصطفى عبد الجواد

الاختبار	المسعر
تحضير العينة	٢x٦٠
تدرج طشن	٢x١٦٥
تدرج ناعم	٢x١٥٠
اللدونة	٢x١٣٠
بروكتود	٢x٤٥٠
مسي لبراز	٢x٥٠٠
قيمة الاعمال	٣٠٦٠
م ١٥١٠ %	٤٥٩
م ١٤ %	٤٩٢ و ٦٦
اجمالي	٤٠١١ و ٦٦



تقرير رقم ١

المشروع : طريق ابو جنتشو ابشواي الفيوم
تنفيذ شركة : نجم الشمال
نوع العينة : عدد ١٢ انترلوك
نوع الاختبار : جهد الكسر

احضرت العينات بمعرفة م / احمد يعقوب (مهندس الشركة)
تتبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

بيانات الأعمال	جهد الكسر كجم/سم ^٢	المواصفات
عدد ٦ انترلوك رمادي	٣٤٩	الصب ٢١٩
	٤٦٣	الكسر ٢١٥
	٤٦٣	
	٤٨٠	كما جاز بالخطاب
	٤٩٠	
	٤٩٠	
عدد ٦ انترلوك احمر	٤٩٠	الصب ٢١٠
	٤٩٠	الكسر ٢١٥
	٤٩٠	
	٤٩٠	الكسر بياض
	٤٩٠	دخولها بمعمل
	٤٩٠	

التكاليف قيمة الأعمال : ١٥٦٠

م، ١٤ % ٢٣٤

ض، ١٤ % ٢٥١.١٦

٢٠٤٥.١٦

٧١٢٨
٢٠٢٧

شهادة

تشهد المنطقة السادسة ببني سويف للطرق والكباري بخصوص عملية : اكمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو
شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظة الفيوم تنفيذ نجم الشمال للمقاولات المتكامله والرصف والطرق والتوريدات
(محمود محمد سليمان)

باته تم خصم قيم التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات
الجارية والختامية للعملية

وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
م ا حسام الدين حسن

مهندس المشروع

الاستشاري



شهادة

تشهد المنطقة السادسة ببني سويف للطرق والكباري بخصوص عملية : أعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظه الفيوم تنفيذ نجم الشمال للمقاولات المتكامله والرصف والطرق والتوريدات (محمود محمد سليمان)

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي للعملية عالية وان الكميات المدونه طبقا للحصر الفعلي علي الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد

وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
م | حسام الدين حسن

مهندس المشروع

الاستشاري

رئيس الادارة المركزية



كشف خاص بأعمال المقاولين

- ١- اسم العملية : أعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظة الفيوم
- ٢- الشركة المنفذه : نجم الشمال للمقاولات المتكاملة والرصف والطرق والتوريدات (محمود محمد سليمان)
- ٣- قيمة العملية طبقا للعقد: ١٩٨٩١٦٠
- ٤- قيمة العملية طبقا للختامي ١٩٨٩١٦٠
- ٥- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد ١٩/٢٦/٢٠٢٣
- ٦- تاريخ نهو الاعمال طبقا للختامي ١٤/٣/٢٠٢٤

مدير عام التنفيذ والصيانة
م ١ حسام الدين حسن

مهندس المشروع

الاستشاري

رئيس الادارة المركزية
مهندس
طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة ببني سويف للطرق والكباري بخصوص
اسم العملية : اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظة الفيوم
الشركة المنفذه : تنفيذ نجم الشمال للمقاولات المتكاملة والرصف والطرق والتوريدات (محمود محمد سليمان)
تقرير بشأن الموق النهائي للعلمية عاليه للختامي
قيمة العملية طبقا للعقد : ١٩٨٩١٦٠
مدة العلمية طبقا للعقد : ٦ اشهر
تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/١٠/١٤
تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٤/١٤/٣
قيمة العملية طبقا لآخر مقاييسه معتمده : ١٩٨٩١٦٠
قيمة العملية طبقا للمستخلص الختامي : ١٩٨٩١٦٠
النسبة الفعلية لما تم تجاوزه : ١٠٠ %

مدير عام التنفيذ والصيانة
م ا حسام الدين حسن

مهندس المشروع

الاستشاري



شهادة

تشهد المنطقة السادسة ببني سويف للطرق والكباري بخصوص عملية : اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو
شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظة الفيوم تنفيذ نجم الشمال للمقاولات المتكامله والرصف والطرق والتوريدات
(محمود محمد سليمان)

بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا للعقد

وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
م | حسام الدين حسن

مهندس المشروع

الاستشاري

رئيس الادارة المركزية
مهندس طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة ببني سويف للطرق والكباري بخصوص عملية : اكمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظه الفيوم تنفيذ نجم الشمال للمقاولات المتكامله والرصف والطرق والتوريدات (محمود محمد سليمان)

١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقرره لكافة المواد لبند الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحدده بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات

٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٤

٣ - يتم عمل مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخرى مستحقة

٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط والخصوصية للعملية طبقا للمواصفات

وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
م | حسام الدين حسن

مهندس المشروع

الاستشاري



شهادة

تشهد المنطقة السادسة ببني سويف للطرق والكباري بخصوص
 اسم العملية : اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي محافظة الفيوم
 الشركة المنفذه : نجم الشمال للمقاولات المتكامله والرصف والطرق والتوريدات (محمود محمد سليمان)
 كشف بأسماء الساده القانمين علي التنفيذ من قبل الشركة للمشروع

م	الاسم	الوظيفة	التقرير
١	محمود محمد سليمان	مدير عام الشركة	ممتاز
٢	م/ احمد يعقوب رمضان	المدير التنفيذي	ممتاز
٣	م/ محمود علي رياض	مهندس موقع	ممتاز
٤	م/ عبد التواب ربيع	مهندس موقع ومساحه	ممتاز

مدير عام التنفيذ والصيانة
 م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع

الاستشاري



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل البري

المنطقة السادسة بنى سوريف


مقاييس ختامية (شركة نجم الشمال للمقاولات المتكاملة محمود محمد سليمان)

اسم العملية :- اعمال تركيب انترلوك منطقة ابو جنشوى شارع بورسعيد مركز ابشواى محافظة الفيوم

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	سعر التكلفة
١	بالمتر المصطحح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمخلفات والمزروعات والتخلص منها بالقائبات العمومية تمهيدا لاجل الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٨٤٩٥.١٩	٦	٥٠٩٧١.١٤
٣	بالمتر الطولي اعمال وتوريد وتركيب برودة اسمعيتية (وسط) بابعاد ٥٠٠٣٠٠١٥/١١.٥ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكية تتكون من ٨ م ^٣ من تلويميت لا يزيد اثير بهد للحبيبات عن ١.٥ مم + ١.٠ مم ٣ م رمل + ٢٥٠٠ كجم اسمعيت ويتم تركيب البرودة على فرشته من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمقاييس التصميمية وبحد لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البردوره والمسر يشمل التسوية اسفل البردورات ولا يشمل الفرشه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والتبند بجمعية مستعملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	١٠٧.٦٢	١٣٥	١٤٥٢٨.٧
٤	بالمتر الطولي توريد وصب لدمية من الخرسانة العادية اسفل البردورات بابعاد ١٠٠٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٧٠.٦٢	٤٦	٣٢٤٨.٥٢
٥	بالمتر المصطحح توريد وتركيب وحبات من الانترلوك الخرساني طبقا للهيئة المعتمدة واجبعاد ٤٥٠ كجم /سم ^٢ وبالبون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسك ٤٠ في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتنشيط ونهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م ^٢	٦٨٨٤.٦٩	٢١٩	١٥٠٧٧٤.٧
٦	بالمتر المصطحح توريد وتركيب وحبات من الانترلوك الخرساني طبقا للهيئة المعتمدة واجبعاد ٢٥٠ كجم /سم ^٢ وبالبون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسك ٤٠ في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتنشيط ونهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م ^٢	١٦١٠.٥	١٧٩	٢٨٨٢٧٩.٥
٧	بالعدد رفع وتعليه اغشيه مطابق الصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة المطابقة طبقا للمواصفات واصول الصناعة	بالعدد	٤٢	٥٢٥	٢٢٠.٥
٨	بالمتر الطولي دمن برودة بابعاد ١٠٠٣٠ سم طبقا للشروط والمواصفات	م. ط	٥٦٨٥.٢٧٩	١٨	١٠٢٣٣٥.٠٢٢
الاجمالي					١٩٨٩١٦٠



مهندس الهيئة
مدير عام التنفيذ والصيانة
د/حسام الدين حسن

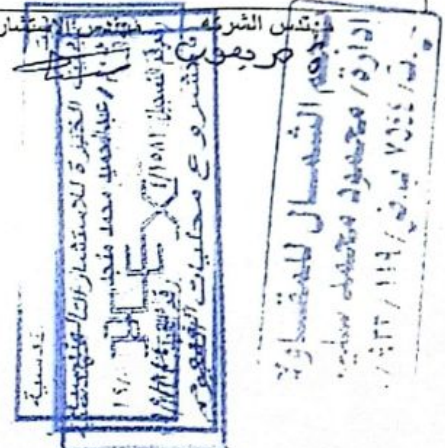

محضر تقييم

عملية / اعمال تركيب انترلوك شارع بورسعيد منطقة ابو جنشو مركز ابشواى

تنفيذ / شركة نجم الشمال للمقاولات
إشراف / المنطقة السادسة ببنى سويف


بناء على أمر الإسناد الصادر للشركة المذكورة والمدرجة بالخطه الاستثمارية محافظة الفيوم للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ فقد
اجتمعت اللجنة المشكله لعمل تقييم للعملية عاليه و بعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى تم حساب الخصومات المالية و
بياتها كالأتى :

اجمالى الخصم طبقا لنتائج العينات =	0.00	جنيه
خصم التقييم الظاهرى =	7454.73	جنيه
ليكون القيمة الاجمالية للخصومات =	7454.73	جنيه

رئيس لجنة الاستلام الابتدائى




مهندس المشروع



الاستشارى

مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسيه



بيت الخبرة للاستشارات الهندسيه
م.ع. عبد الحليم محمد منجد
شارع ١٥٠٠
بنى سويف / ١٥٠٠
ت. ٠٩٦٤ / ٤٢٣٠


الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة المسجلة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للإستشارات د / عبدالحميد منجد	عملية / أعمال تركيب أنترلوك شارع بورسعيد منطقة أبو جنشو مركز ابشواي	محافظة الفيوم مدينة ابشواي خطة محليات ٢٠٢١/٢٠٢٢
---	---	---

شركة نجم الشمال للمقاولات

تقديم إختيارات الانترلوك اجهاد ٤٥٠

عينة ١		الأجراء :- لا يوجد خصم	
سم	٤٥٠	اجهاد الكسر المطلوب =	الاجهاد
%	٠,٠٠	نسبة التقص =	١
م	٢٢٣٧,٥٠	المساحة =	اجهاد الكسر المتوسط =
جنيه مصري	٢١٩,٠٠	سعر المتر =	٤٩٠,٠٠ سم
جنيه مصري			
الخصم المقابل =		الأجراء :- لا يوجد خصم	
سم	٤٥٠	اجهاد الكسر المطلوب =	الاجهاد
%	٠,٠٠	نسبة التقص =	١
م	٢٢٣٧,٥٠	المساحة =	اجهاد الكسر المتوسط =
جنيه مصري	٢١٩,٠٠	سعر المتر =	٤٥٥,٨٠ سم
جنيه مصري			
الخصم المقابل =		الأجراء :- لا يوجد خصم	
سم	٤٥٠	اجهاد الكسر المطلوب =	عينة الاستلام
%	٠,٠٠	نسبة التقص =	الاجهاد
م	٢٢٣٧,٥٠	المساحة =	١
جنيه مصري	٢١٩,٠٠	سعر المتر =	اجهاد الكسر المتوسط =
جنيه مصري			٤٨٠,٠٠ سم
الخصم المقابل =		الأجراء :- لا يوجد خصم	
سم	٤٥٠	اجهاد الكسر المطلوب =	الاجهاد
%	٠,٠٠	نسبة التقص =	١
م	٢٢٣٧,٥٠	المساحة =	اجهاد الكسر المتوسط =
جنيه مصري	٢١٩,٠٠	سعر المتر =	٤٧٥,٠٠ سم
جنيه مصري			
الخصم المقابل =		الأجراء :- لا يوجد خصم	
سم	٤٥٠	اجهاد الكسر المطلوب =	الاجهاد
%	٠,٠٠	نسبة التقص =	١
م	٢٢٣٧,٥٠	المساحة =	اجهاد الكسر المتوسط =
جنيه مصري	٢١٩,٠٠	سعر المتر =	٤٧٥,٠٠ سم
جنيه مصري			
الخصم المقابل =		الأجراء :- لا يوجد خصم	

جنيه مصري	٠,٠٠	إجمالي الخصم لطبقة الانترلوك
-----------	------	------------------------------



الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة المصاحبة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للإستشارات د / عبد الحميد منجد	عملية / أعمال تركيب انترلوك شارع بورسعيد منطقة ابو جنشو مركز ابشواي	محافظة الفيوم مدينة ابشواي خطة محليات ٢٠٢١/٢٠٢٢
---	---	---

شركة نجم الشمال للمقاولات

تقييم إختبارات الانترلوك اجهاد ٢٥٠

عينة ١					
سم	٢٥٠	اجهاد الكسر المطلوب =	الاجهاد		
%	١٠٠	نسبة النقص =	٤٢٠,١٠	1	اجهاد الكسر المتوسط =
					لا يوجد خصم
					الأجراء :-
سم	٨٠٥,٢٥	المساحة =			
جنيه مصري	١٧٩,٠٠	سعر المتر =			
					الخصم للمقابل =
جنيه مصري					
سم	٢٥٠	اجهاد الكسر المطلوب =	الرمادي		
%	١٠٠	نسبة النقص =	٤٢٠,١٠	1	اجهاد الكسر المتوسط =
					لا يوجد خصم
					الأجراء :-
سم	٨٠٥,٢٥	المساحة =			
جنيه مصري	١٧٩,٠٠	سعر المتر =			
					الخصم للمقابل =
جنيه مصري					

جنيه مصري	٠,٠٠	إجمالي الخصم لطبقة الانترلوك
-----------	------	------------------------------

جنيه مصري
١٩/٨/٢٠٢٢
رسم الكسر
مستطبات العمل

الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للإستشارات د/ عبدالحاميد منجد	عملية / اعمال تركيب انترلوك شارع بورسعيد منطقة ابو جنشو مركز ابشواى	محافظة الفيوم
		مدينة ابشواى
		خطة محليات ٢٠٢٢/٢٠٢١

شركة نجم الشمال للمقاولات

اجمالى خصم تقييم الاختبارات

اجمالى خصم تقييم اختبارات الانترلوك ٤٥٠ =	0.00	جنيه مصرى
اجمالى خصم تقييم اختبارات الانترلوك ٢٥٠ =	0.00	جنيه مصرى

اجمالى الخصم	-	جنيه مصرى
--------------	---	-----------

محضر استلام ابتدائي

اسم العملية / اعمال تركيب انترلوك شارع بورسعيد منطقة ابو جنشو مركز ابشواى بمحافظة الفيوم .

بالامر المباشر عقد رقم (٤٣٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

الشركة المنفذة / نجم الشمال للمقاولات العامة والتوريدات واعمال الرصف والطرق (محمود محمد سليمان)

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٤ م وبناء على قرار السيد الدكتور / محافظ الفيوم رقم (٤٢٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٧ م بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٣\٢٠٢٤ .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسمائهم :

- | | |
|--|---|
| ١ - السيد المهندس / عاطف سعد توفيق | مهندس عن مديرية الطرق والنقل بالفيوم (رئيسا) |
| ٢ - السيد المهندس / عادل صلاح عبدالحميد | وكيل مديرية الاسكان والمرافق بالفيوم (عضوا) |
| ٣ - السيد المهندس / فرحات محمد عبدالبر | ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (عضوا) |
| ٤ - السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالعزيز | مندوب استشارى الهيئة العامة للطرق والكبارى (عضوا) |
| ٥ - السيد المهندس / | ممثل عن وزارة التنمية المحلية (عضوا) |
| ٦ - السيد المهندس / ايها بن ملوان حسين | مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة ابشواى (عضوا) |
| ٧ - السيد المهندس / بسمة مصطفى ابراهيم | ممثل عن معمل الهيئة العامة للطرق والكبارى (عضوا) |
| ٨ - السيد المهندس / عبدالله احمد عبدالله | وكيل ادارة الصيانة بمديرية الطرق (عضوا) |
| ٩ - السيد المهندس / أحمد يعقوب رمضان | مهندس الشركة المنفذه (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع علي ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال في الموقع ظاهريا علي الطبيعة لتحديد أماكن العينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتي :-

ملاحظة اللجنة على الاعمال :

- أولا : اعمال الانترلوك لجميع الشوارع مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء بعض المناسيب وسوء المصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي مسطحات الانترلوك
- ثانيا: اعمال البردورة مقبولة بصفة عامة فيماعدا ما تلاحظ من سوء مصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١ % من اجمالي الكميات المنفذه
- ثالثا : اعمال الدهانات مقبولة بصفة عامة فيماعدا ما تلاحظ من سوء مصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١ % من اجمالي الكميات المنفذه

وعليه توصي اللجنة بالاتى :

- ١- خصم نسبة ٧ % من النسبة ٥ % سابقه الذكر من البند الخاص بالانترلوك . (اولا)
- ٢- خصم نسبة ١ % من اجمالي الكميات المنفذه . (ثانيا)
- ٣- خصم نسبة ١ % من اجمالي الكميات المنفذه . (ثالثا)
- ٤- مرفق طيه كشف خاص بنتائج الاختبارات .
- ٥- علي الشركة المنفذه ترميم أماكن أخذ العينات فوراً تحت إشراف الجهة المشرفة.
- ٦- علي مندوب المعامل موافاة اللجنة بالنتائج التي يتم اخذها (مرفق طيه تقييم الاعمال).

- ٧- موافاة اللجنة بالتجارب المعملية التي تمت اثناء التنفيذ .
٨- علي الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص)اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن اعمال رد الشي لاصلنه لاعمال المرافق حتي يتم مراعاتها اثناء التسليم النهائي

وعلية ترى اللجنة انه لامانع من الاستلام الابتدائي للاعمال المذكورة .

وعلي ذالك جري التوقيع ،،

اللجنة :

٨-
٦-
٤-
٢-

٩-
٧-
٥-
٣-
١-



المنطقة السادسة - بني سويف

ت / ٨٢٢٣٢٢٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية اعمال تركيب انترلوك منطقه ابو جنشو
بخصوص :- شارع بور سعيد مركز ابشواى محافظة الفيوم
بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة نجم الشمال للمقاولات المتكامله (محمود محمد
سليمان)

عقد رقم :- العقد رقم (٤٣٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

السيد الاستاذ المحاسب / رئيس الادارة المركزيه لشئون الماليه و الاداريه

تحية طيبه ... وبعد

بالاحاله الي العمليه بعاليه نتشرف افاده سيادتكم بالاتى :

بان الاعمال المسنده الي المقاول المذكور لا توجد عليها اتاوه محاجر و هذا للعلم و اتخاذ اللازم

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في :- ٢٠٢٤/١١/١٩
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /


احمد عراقي حسين



تفيد الإدارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة :	" شركة نجم الشمال للمقاولات المتكاملة (محمود محمد سليمان) "
رقم العقد :	(٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٣٨)
العملية :	أعمال تركيب انترلوك منطقة أبو جنشو شارع بورسعيد مركز ابشواي بمحافظة الفيوم.
المحاملات :	- عدد (١٠) كرتونة ورق A4

ملاحظات:

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



صبره طيبه ج. ص





السيد المهندس/ رئيس لجنة المحملات
السيد المهندس/ مدير عام المركبات
تحية طيبة وبعد

بخصوص المشروعات الآتية :

م	المشروع	الشركة	رقم العقد
١	اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع العلمين / فوكة (مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطلاقات الاساس والحمايات والخرسانات) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٣,١٠٠ الى الكم ٤٧٣,٢٤٠ بطول ٠,١٤٠ كم.	مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٠٣)
٢	اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة / مطروح (مرحلة تشكيل الحور وطلاقات التأسيس خرسانة الميول لتنفيذ المسافة من الكم ٥٥٧,٥٠٠ الى الكم ٥٥٧,٦٠٠ بطول ٠,١٠٠ كم.	مكتب محذى بخيت متى بنيامين	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤١)
٣	اعمال رصف طريق الشوبك بؤرة الزينى حتى عزبة امين وانشاء حوائط خرسانية مركز سنورس بطول ٢,٦ كم بمحطة الغيوم .	الفصلي للتجارة والمقاولات	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦١٤)
٤	اعمال تركيب انترلوك متعلقة ابو حنشو شارع بورسعيد مركز اشواى محافظة الغيوم بالامر المباشر.	نجم الشمال للمقاولات المتكاملة (محمود محمد سليمان)	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٣٨)
٥	اعمال الجسر الترابي للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائي السريع (الغيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الخامس (قوص - ارمنت) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٦٧,٧٨٧ الى الكم ٦٦٨,٧٨٧ بطول ١ كم (اعمال تطهير - حفر - ردم) بالامر المباشر.	المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامة	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٠٧)
٦	اسناد اعمال الحمايات لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) قطاع شرق النيل المسافة من الكم ٩٠,٢٤٠ حتى كم ٩١,٤٨٠ بطول ١,٢٤ كم بالامر المباشر.	اولاد الشريف للمقاولات	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣٤)
٧	استكمال اعمال الجسر الترابي للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من كم ٤٤٦,٦٠٠ الى كم ٤٤٧,١٠٠ بطول ٠,٥٠٠ كم بالامر المباشر.	مكتب صن رايز للمقاولات العمومية	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٠٤)

يرجى العلم بالاحاطة بان العمليات عاليه لا يوجد بها سيارة محملة.
برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً الم ١٠٠١/١/٥

رئيس الادارة المركزية

ليجوت الطرق

مهندس /

"حسام بدر الدين"

٣١ مل ٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية "" أعمال تركيب انترلوك منطقة أبو جنشو شارع بور سعيد مركز ابشواى بمحافظة
الفيوم "" عقد رقم (٤٣٨)

(مستخلص ٢ جاري) تنفيذ شركة نجم الشمال للمقاولات المتكامل .

طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط)
طبقاً لخطاب الاداره المركزيه لبحوث الطرق .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

١٨
٢٠٢١
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة
Eng

١٨
٢٠٢١

١٨
٢٠٢١
