



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

ادارة المشروعات

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
كشف (١٠) جاري

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم
القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

من ندادة العمل حة: ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣

المقاول: شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٠)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قروش	جنيه	قروش	جنيه
	أعمال الطرق										
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية والبرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة) ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة(لمسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	17.00	متر مكعب	٦٦٨,٩٢٨,٠	٢٢٦,٥٠٠	٠,٠	٢٢٦,٥٠٠,٠			٣,٨٥٠,٥٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم /سم ٢	76.00	متر مكعب	٦٥,٠٠٠,٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠	٤٥,٠٠٠,٠			٣,٤٢٠,٠٠٠,٠	
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم /سم ٢	65.50	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠	١٣,٠٠٠	٠,٠	١٣,٠٠٠,٠			٨٥١,٥٠٠,٠	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم /سم ٢	54.00	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠	١٥,٠٠٠	٠,٠	١٥,٠٠٠,٠			٨١٠,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل - زياده ٣,٢ جنيه للسهم كشط في حالة الزيادة او النقصان	16.00	متر مسطح	٦٠٥,٠٠٠,٠	٥٩١,٠٠٠	٠,٠	٥٩١,٠٠٠,٠			٩,٤٥٦,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٦ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	3.20	متر مسطح	١٥٩,٩٩٨,٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠	١٥٧,٠٠٠,٠			٥٠٢,٤٠٠,٠	
4	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٧ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	6.40	متر مسطح	٣٤,٧٤٣,٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠	٢٥,٠٠٠,٠			١٦٠,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٤سم	12.80	متر مسطح	١٤٨,٠٠٠,٠	١٤٥,٠٠٠	٠,٠	١٤٥,٠٠٠,٠			١,٨٥٦,٠٠٠,٠	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٣سم	9.60	متر مسطح	٥,٢٦٩,٠	٥,٠٠٠	٠,٠	٥,٠٠٠,٠			٤٨,٠٠٠,٠	
5	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحال	60.00	متر مكعب	٢٠,٠٠٠,٠	١٤,٠٠٠	٠,٠	١٤,٠٠٠,٠			٨٤٠,٠٠٠,٠	
6	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5.00	متر مسطح	٤٠٠,٠٠٠,٠	٣٥٤,٠٠٠	٠,٠	٣٥٤,٠٠٠,٠			١,٧٧٠,٠٠٠,٠	
7	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضقة مع دوش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	80.00	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠	١٠,٠٠٠	٠,٠	١٠,٠٠٠,٠			٨٠٠,٠٠٠,٠	

مدير عام المشروعات

مدبر المشروع (الهيئة)

مکتبہ اسلامیہ قندھار

طير المشتري

: تحريراً في

تحريراً في :

يدفع للمقابل مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الهاردة بصك الشروط أعتمدت من

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ - 1 ✓

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

بالا

ہاں

6

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
كشف (١٠) جاري

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

من بداية العمل حتى: ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣

المقاول: شركه المتحدة للمقاولات ورصف الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٠)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	أعمال الطرق												
8	أعمال توريد وتشغيل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (ط٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٦,٠٠	متر مكعب	٨٠٠,٠٠٠,٠	٣٩٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠	٤٠٤,٠٠٠,٠					٣٨,٧٨٤,٠٠٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اترية مسافة النقل ٦٣ كم	٧٣,٢٠	متر مكعب	٢٢,٠٠٠,٠	١٩,١٥٠	٠,٠	١٩,١٥٠,٠					١,٤٠١,٧٨٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اترية مسافة النقل ٩٣ كم	١٠٩,٢٠	متر مكعب	٣٠,٠٠٠,٠	٢٥,٣٠٠	٠,٠	٢٥,٣٠٠,٠					٢,٧٦٢,٧٦٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اترية مسافة النقل ٧ كم	٦,٠٠	متر مكعب	٣٤٠,٠٠٠,٠	٩٥,٠٠٠	٠,٠	٩٥,٠٠٠,٠					٥٧٠,٠٠٠,٠	
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اترية مسافة النقل ١٧ كم	١٨,٠٠	متر مكعب	٤٠٨,٠٠٠,٠	٢٢٠,٥٠٠	١٠,٠٠٠,٠	٢٣٠,٥٠٠,٠					٤,١٤٩,٠٠٠,٠	
9	بالمتر المسطح تسوية أترية الجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	١٢,٠٠	متر مسطح	٢٧٠,٠٠٠,٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠	٢٢٠,٠٠٠,٠					٢,٦٤٠,٠٠٠,٠	
10	بالمتر المكعب أعمال توريد أترية للجزر في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد الا بعد تسوية الجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . (السعر يشمل المادة المحجرية و التي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون)	٦٠,٠٠	متر مكعب	٤٠٠,٠٠٠,٠	١٠٣,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠	١٢٨,٠٠٠,٠					٧,٦٨٠,٠٠٠,٠	
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة(95% من الكثافة المعملية)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٨,٠٠	متر مكعب	٧٠٠,٠٠٠,٠	٣٢٥,٥٠٠	٢٥,٠٠٠,٠	٣٢٨,٠٠٠,٠					٨١,٣٤٤,٠٠٠,٠	
	علاوه ١ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٧١ كم	٥١,٠٠	متر مكعب	٧٠٠,٠٠٠,٠	٣٢٥,٥٠٠	٢٥,٠٠٠,٠	٣٢٨,٠٠٠,٠					١٦,٧٢٨,٠٠٠,٠	
16	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج+٢٠٠,٤ رمل حرس+٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل الزيادة في قيمة المادة المحجرية لمحاجر منطقة وادي النطرون والتي اقترتها المناطق المشرفه)	١٩٥,٠٠	متر مسطح	٢٠٠,٠٠٠,٠	١٦,٠٠٠	٩,٥٠٠,٠	٢٥,٥٠٠,٠					٤,٩٧٢,٥٠٠,٠	

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

مكتب أ.د/ خالد قنديل

مكتب المشروع
الشركة المتحدة للمقاولات
ورصف الطرق

: تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات

.....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

: تحريراً في

يعتمد ”

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

عميد مهندس

هاني محمد محمود طه

مهندس /إبراهيم الخناري

مهندس /محمد فتاح



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

ادارة المشروعات

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
كشف (١٠) جاري

المقاول: شركه المتحده للمقاولات ورصف الطرق رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٠)

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم
القطاع الثامن بطول ١٤٤٠٠ كم

تنفيذ : الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

من بداية العمل حتى: ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
أعمال الطرق													
17	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30بمعدل من (١,٢ – ١,٥ كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥,٠٠	متر مسطح	٨٥٠,٠٠٠,٠	٦٥٤,٥٠٠	١٤,٥٠٠,٠	٦٦٩,٠٠٠,٠	١٦,٧٢٥,٠٠٠,٠				١٦,٧٢٥,٠٠٠,٠	
18	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	٨,٣٥	متر مسطح	١,٧٠٠,٠٠٠,٠	١,٠٤٩,٠٠٠	٤٦,٠٠٠,٠	١,٠٩٥,٠٠٠,٠	٩,١٤٣,٢٥٠,٠				٩,١٤٣,٢٥٠,٠	
19	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. (السعر يشمل زيادة المادة المحجيرة والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون)	١٥١,٠٠	متر مسطح	٦٠,٣٥٥,٠	٣٢,٠٠٠,٠	١٧,٥٠٠,٠	٤٩,٥٠٠,٠	٧,٤٧٤,٥٠٠,٠				٧,٤٧٤,٥٠٠,٠	
20	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٣٥,٥٠	متر مسطح	١,١٠٠,٠٠٠,٠	٦٤١,٥٠٠	٢٦,٠٠٠,٠	٦٦٧,٥٠٠,٠	٩,٠٤٦,٢٥٠,٠				٩,٠٤٦,٢٥٠,٠	
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفته تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخروط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١٢٨,٥٠	متر مسطح	٩٩٥,٠٠٠,٠	٦٥٥,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠	٦٨١,٠٠٠,٠	٨٧,٥٠٨,٥٠٠,٠				٨٧,٥٠٨,٥٠٠,٠	
22	المتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE يحتوي أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠كجم/م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ و الفته تشمل فرشة من الخرسانه العادية سمل ١٠ سم و عرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير 10ø١٦ م.ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . (السعر يشمل المادة المحجيرة و التي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون)	٦٦٢,٠٠	متر طولي	٥٠,٠٠٠,٠	٤,٠٠٠	٨٠٠,٠	٤,٨٠٠,٠	٣,١٨٢,٤٠٠,٠				٣,١٨٢,٤٠٠,٠	
23	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة الفاير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات علي ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE يحتوي أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ و الفته تشمل فرشة من الخرسانه العادية سمل ١٠ سم و عرض ٦٠ سم باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير(١٦ø٦) م.ط و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . -السعر يشمل زيادة المادة المحجيرة والتي اقترتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون	٤٧٨,٠٠	متر طولي	٦٧,٠٠٠,٠	٣,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠	٦,٥٠٠,٠	٣,١٠٧,٠٠٠,٠				٣,١٠٧,٠٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الاتربه	١٣,٠٠	متر مكعب	٨٠٠,٠٠٠,٠	٣٩٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠	٤٠٤,٠٠٠,٠	٥,٢٥٢,٠٠٠,٠				٥,٢٥٢,٠٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال طبقه الاساس	٢٥,٠٠	متر مكعب	٧٠٠,٠٠٠,٠	٣٢٥,٥٠٠	٢,٥٠٠,٠	٣٢٨,٠٠٠,٠	٨,٢٠٠,٠٠٠,٠				٨,٢٠٠,٠٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الطبقة الاسفلتية الرابطه ٧سم	٣,٠٠	متر مسطح	٦٠,٣٥٥,٠	٣٢,٠٠٠,٠	١٧,٥٠٠,٠	٤٩,٥٠٠,٠	١٤٨,٥٠٠,٠				١٤٨,٥٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الطبقة الاسفلتية الرابطه ٦سم	٣,٠٠	متر مسطح	١,١٠٠,٠٠٠,٠	٦٤١,٥٠٠	٢٦,٠٠٠,٠	٦٦٧,٥٠٠,٠	٢,٠٠٢,٥٠٠,٠				٢,٠٠٢,٥٠٠,٠	
	رسوم الكارته والموازن طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الطبقة الاسفلتية السطحيه ٥سم	٣,٠٠	متر مسطح	٩٩٥,٠٠٠,٠	٦٤٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠	٦٧٢,٠٠٠,٠	٢,٠١٦,٠٠٠,٠				٢,٠١٦,٠٠٠,٠	
إجمالي الأعمال (فقط اربعمائة وعشرون مليون ستمائة واثنان الفا ثلاثمائة واربعون جنيها فقط لا غير) ٤٢٠,٦٠٢,٣٤٠,٠٠٠													

إجمالي الأعمال (فقط اربعمائة وعشرون مليون ستمائة واثنان الفا ثلاثمائة واربعون جنيها فقط لا غير)

يعتمد ""

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا


يدفع للمقاول مبلغ

تحريراً في

مهندس/محمد فياض

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً في

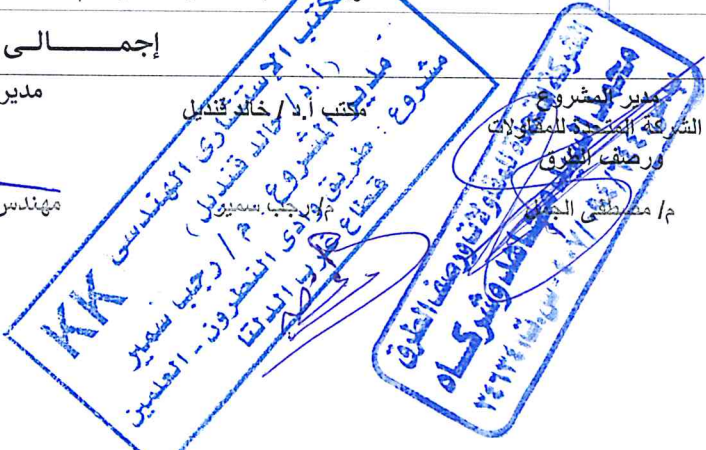

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
هاني محمد محمود طه
٢٠٢٣/٩/٢١
