

مستخلص رقم (٧) جاري

اعمال رفع كفاءة طريق نجم حمادي / ابو شوشة الصحراوي الغربي من المنطقة الى ابو شوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا
عن عملية:-

بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١

المعد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦


رقم الشئ	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس المعدلة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جمله مقدار الاعمال استقطاع او عجز	البال بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	انصال توريد وتشغيل قرية مع الفرش والدمك على طبقات لثشاء الجسر واستكمال الاكثاف والمويل الجاتبية	٢م	٣٠٤٠٠	٣٤	٢٢٥٢٧	.	٢٢٥٢٧	٧٢٥٩١٨,٠٠	٧٢٥٩١٨,٠٠	يراعى تطبيق نصوص المقد
	إضافة علوة ١,٤ حنية نكر كم لمسافة نقل ١٠٠ كم للبند رقم (١)	٢م	٣٠٤٠٠	١٣٧,٢	٢٢٥٢٧	.	٢٢٥٢٧	٣٠٩٠٧٠,٤٠	٣٠٩٠٧٠,٤٠	
٢	بالمتر مكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهكة عدا الصغريه ونقل التربة	٢م	١٣١٢,٦٧	٢٣	١٣٠٦٢	.	١٣٠٦٢	٣٠٠٤٢٦,٠٠	٣٠٠٤٢٦,٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فني التامين متواجد
٣	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه نتج تكسير كسارات صافه النقل ١٠٠ كم	٢م	١٦٠٠٠	٣٠٦	١٤٥٥١	.	١٤٥٥١	٤٤٥٢٦٠,٦٠	٤٤٥٢٦٠,٦٠	اللائحات متواجده الكرفان المتحرك متواجد
٤	اعمال إنشاء طبقه اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة مما	٢م	٢٠٠٠٠	٦٣	١٥٤٢٩٣	.	١٥٤٢٩٣	٩٧٢٦٧٥٩,٠٠	٩٧٢٦٧٥٩,٠٠	المعلومات الارشادية والتعليقيه متواجده /
٥	بالمتر مكعب اعمال توريد واصافه أسمنت مطبق للشروط والمواسفات	طن	٥٨٠٠	٢٢٥٠	٤٤٨٦	.	٤٤٨٦	١٠٠٩٣٥٠,٠٠	١٠٠٩٣٥٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/ البرنامج الزمني متواجد
٦	اعمال إنشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطهير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م	٢م	٢٠٠٠٠	٢٧,٨	١٥٤٠٠٠	.	١٥٤٠٠٠	٤٢٨١٢٠,٠٠	٤٢٨١٢٠,٠٠	عدد (١) سيارة متواجده
٧	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البتومين mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م	٢م	١	٢٢,٤	.	.	.	٠,٠٠	٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجده
٨	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصافه من البتومين السائل RC3000 بمعدل رش ٠,٤ كجم/م	٢م	١	١١,٣	.	.	.	٠,٠٠	٠,٠٠	التقرير المبلى متواجد
٩	اعمال إنشاء طبقه سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٢ب بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	٢٠٠٠٠	١٦٩,٦	٨٠٠٨٣	٢٠٠٠	٨٢٠٨٣	١٣٩٢١٢٧٦,٨٠	١٣٩٢١٢٧٦,٨٠	وليفة التامين متواجده
١٠	اعمال إنشاء طبقه رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣د بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	١	١٧٤,٨	.	.	.	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
بنود مستحقة										
١١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والرافعة والمتنوعة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على الباز بسمك ٥ سم	٢م	٥٩٩٨٩	١٨	٥٩٥١٤	.	٥٩٥١٤	١٠٧١٢٥٢,٠٠	١٠٧١٢٥٢,٠٠	
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبريدورات وقدمه الحماية	٢م	٥٩٨	١٩٥٥	.	.	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والمويل الجاتبية	٢م	٥٩٩٩	٢٧٥	.	.	.	٠,٠٠	٠,٠٠	
انصال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للفائده الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	٨٠٠٨٣	٢٠٠٠	٨٢٠٨٣	٢٤٦٢٤٩,٠٠	٢٤٦٢٤٩,٠٠	
*	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه	٢م		٢٥	١٤٥٥١	.	١٤٥٥١	٣٦٣٧٧٥,٠٠	٣٦٣٧٧٥,٠٠	
الاجمال										
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة										
الاجمالى بعد الخصم										
								٤٨٠٧٢٠٩٧,٨٧	٤٨٠٧٢٠٩٧,٨٧	



سبل صرفها الى المقاول
مهندس /
مدير عام المشروعات
روماني ارميا ملك

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريراً ل
يدفع الى المقاول مبلغ
نهائياً
ملاحظات الفات
غير وارد بهذا الشرط اعتمدت من
تحريراً ل

الجهة المالكه
مهندس المشروع
م / ايمن منصور محمد

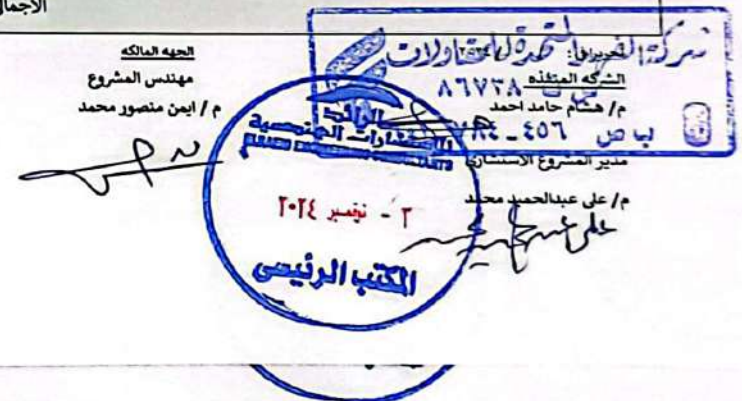

٤٨٠٧٢٠٩٧,٨٧	جملة الاعمال
٤٧٧٢٨٦٢٣,٨٧	السابق صرفه
٣٤٣٤٧٤	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٧١٧٣,٧	تأمين
٨٦٤٣,٤	دمغات
٢٥٨١٧,١	جملة الاستقطاعات

٢٥٨١٧,١	الاستقطاعات
٣١٧٦٥٦,٩	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٧) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادى/ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط - ابوتشت بمحافظة قنا

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
وزارة
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٧١ عن عملية

اعمال رفع كفارة طريق بيج ١٤٨١ / ابو شوشه العوام الغريب من الطابق ١١ ابو شوشه
(القطاع الثالث) بطول ١٥٠ م مركز دوشوط - ابو شوشه بعبا بعبا

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٨٧,٩٧,٧٢	٤٨,٠٧٢	جملة الاعمال ١٧,١٧٢,٧٠
٨٧,٧٢,٧٢	٧٢,٧٢	السابق صرفه ٨٦٤٢,٧٠
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات

الصافي ٢١٧,٦٥٦,٩٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

الفهم المعتمد للمقابلة - العوض المتكامل وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١٠/٢١

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

بيانات الفواتير				رقم
قرن	جنية	تاريخ	رقم	الختم ذو التاريخ 
٩٠	١١٧٦٥٦			
٩٠	٦٥٦			

مصلحة _____

قسم _____

المبلغ المستحق إلى شركة الفحم المنقود للقاول - العمومية بمسكنه

الطلبات طيبة أو .. } بموجب

مستلم طابره رقم ٧

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على _____

شيك على البنك المركزي في _____

شيك على الخارج _____

صاحب الحق أو _____

يسحب باسم شركة الفحم المنقود للقاول - العمومية المسكنه

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط -

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		عدد المرفقات	
نوع الخصم		بيانات	
قرش	جنية	قسم	فرع
٩٠	٦٥٦	٢١٧	بند
٩٠	٦٥٦	لجبا إلى الأصل	
مليم		جنية	
بيانات الاستقطاعات		بيانات	
عادي		إضافي	
قرش	جنية	قرش	جنية
٩٠	٦٥٦	٩٠	٦٥٦

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات.

(٢) إقرار بأن القيمة يرتبط بها على الاعتماد للمخصص

جاء

(۱۰) کل مجموع مصابیح بحساب

الخروج من القبر (١) : الخروج من القبر

الختم ذو التاريخ

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

بِعْتَمَدِ حَسَبِ _____ سَيِّدِكَ

إذن صرف

سنة

وكيل الحسابات

فی

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ "٣.٤") — امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) يجب

(٤) قید او سجل

(۵) ادراج فی کشف

(۶) استقامت

(٦) استلمت / إنن صرف إضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة
