


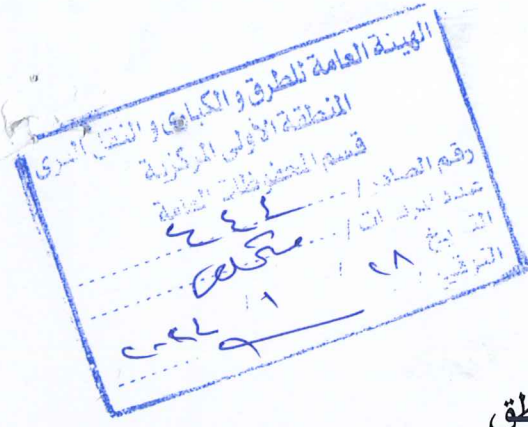

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/٢٤

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ



س

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الى العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري مستخلص رقم (٥) جارى

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طبع



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة: **الهيئة العامة للظرف والكبار**

قسم: **العقود**

المبلغ المستحق إلى: **شركة كونكورد للتشييد والرفف**

الطلبات طيه ، أو : **م (٦) جار**

بموجب {

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم **شركة كونكورد للتشييد والرفف**

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

رقم : _____

الختم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة _____

رئيس القسم _____

الادارة العامة ٢٠ _____

الجملة ٦١٨٢-٤٠

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦١٨٢-٤٠	

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط _____

الختم ذو التاريخ _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم
	م (٦) جار مع عملية تنفيذ محوري مار	قرش ٦١٨٢-٤٠
	التيور ٣ كم ١٥٠ حن كم ١٦٠+١٦٠ طول	
	٢,٦ كم حن مشروع القطر الكهربائي انرج	
	سرد العمل ١١ / ١١ / ٢٠٢٢	
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي إضافي دمغة توقيع	قرش جنيه
	قرش جنيه قرش جنيه قرش	رسم الدمغة
	صافي القيمة المطلوب صرفها	

روجع _____

رئيس المصلحة _____

علامة _____

في _____ سنة ٢٠١ _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات _____

بتاريخ _____

الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠١ _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك _____

إذن صرف _____

يعتمد سحب _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

في _____ سنة ٢٠١ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢-٢٠١٩ س ٢٠٠٠-٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب _____

الختم ذو التاريخ _____

(٣) سحب _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك _____

إذن صرف _____

(٤) قيد في سجل _____

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات _____

الحوالات _____

(٥) أدرج في كشف _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات _____

الحوالات _____

(٦) استلمت _____

شيك _____

إذن صرف _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____

في _____ سنة ٢٠١ _____

(٢)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري											
ثانياً - الأعمال بالأسفلت - البنية التحتية بعد المفاوضة											
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠ / /	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠ / /	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠ / /	١٠٠٠٠,٠٠	١٤٤٨,٠٠	١٤٤٨,٠٠	١٤٤٨,٠٠	١٤٤٨,٠٠	٧٢٤٠٠,٠٠	٧٢٤٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠ / /	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م.ط	٨١,٠٠ / /	٢٧٠٠٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٢٨٩٢,٠٠	٢٨٩٢,٠٠	٢٨٩٢,٠٠	١٧٧٢٤٤٢,٠٠	١٧٧٢٤٤٢,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠ / /	٢٧٠٠٠,٠٠	١٨٩٩,٠٠	٢٨٩٢,٠٠	٢٨٩٢,٠٠	٢٨٩٢,٠٠	١٧٧٢٤٤٢,٠٠	١٧٧٢٤٤٢,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق قطر ١٢٠ سم بالير في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١,٠٠ / /	٤٥٠٠٠,٠٠	٢٢٠١٢,٠٠	١١٧٤,٠٠	٢٣١٨٦,٠٠	٢٣١٨٦,٠٠	١٥٠٩٤٠٨٦٠,٠٠	١٥٠٩٤٠٨٦٠,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٣-١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم.	م.ط	٦٥١,٠٠ / /	٤٥٠٠٠,٠٠	٢٢٠١٢,٠٠	١١٧٤,٠٠	٢٣١٨٦,٠٠	٢٣١٨٦,٠٠	١٥٠٩٤٠٨٦٠,٠٠	١٥٠٩٤٠٨٦٠,٠٠	٨-الامن الصناعي موجود
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠ / /	٠٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	١٣٠٤٨٢٨,٠٠	١٣٠٤٨٢٨,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٤-١	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠ / /	٠٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	١٣٠٤٨٢٨,٠٠	١٣٠٤٨٢٨,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠ / /	١٠٠,٠٠	٤٩,٠٠	٠٥,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٣٥٠٥٤١٠,٠٠	٣٥٠٥٤١٠,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٧-١	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠ / /	١٠٠,٠٠	٤٩,٠٠	٠٥,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٣٥٠٥٤١٠,٠٠	٣٥٠٥٤١٠,٠٠	١٢-إشادة شحاتة ابراهيم
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم٢ ولا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م.ط	١٩٢٤,٠٠ / /	٣٥٠٢,٠٠	٢٧٥١,٠٠	٦٧,٠٠	٢٨١٨,٠٠	٢٨١٨,٠٠	٥٤٢١٨٣٢,٠٠	٥٤٢١٨٣٢,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م.ط	٣٤٦٠,٠٠ / /	٤٦٠٠٠,٠٠	١٣٢٩٩,٠٠	٢٦١٢,٠٠	١٥٩١١,٠٠	١٥٩١١,٠٠	٥٥٠٥٢٠٦٠,٠٠	٥٥٠٥٢٠٦٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة والتيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م.ط	٤٧٧١,٠٠ / /	١٠٠٠٠,٠٠	٦٠٥,٠٠	١٢٥٩,٠٠	١٨٦٤,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٨٨٩٣١٤٤,٠٠	٨٨٩٣١٤٤,٠٠	
٢٠-١	ارتفاع حتي ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠ / /	١٠٠٠٠,٠٠	٦٠٥,٠٠	١٢٥٩,٠٠	١٨٦٤,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٨٨٩٣١٤٤,٠٠	٨٨٩٣١٤٤,٠٠	
٢٠-٢	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠ / /	١٣٥٠٠,٠٠	٣٥٤٧,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٤٧,٠٠	٣٥٤٧,٠٠	١٧٦٣٩٢٣١,٠٠	١٧٦٣٩٢٣١,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالير مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم٢.	م.ط	٩٥٣٤,٠٠ / /	١٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥١,٠٠	٥١,٠٠	٥١,٠٠	٤٨٦٢٣٤,٠٠	٤٨٦٢٣٤,٠٠	
٢٤-١	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	طن	٤٤٤٢,٠٠ / /	٦١٦٢٨,٠٠	٥٦٢٦,٠٠	٨٥٣,٠٠	٦٤٧٩,٠٠	٦٤٧٩,٠٠	٢٨٧٩٣٩٧١٨,٠٠	٢٨٧٩٣٩٧١٨,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب و رص حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٦٤,٠٠ / /	٣٥٠٠٠,٠٠	٦١٧٢,٠٠	٩٣٩,٠٠	٧١١١,٠٠	٧١١١,٠٠	٤٥٥١٠٤,٠٠	٤٥٥١٠٤,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على البارز لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م.ط	٦٤,٠٠ / /	٣٥٠٠٠,٠٠	٦١٧٢,٠٠	٩٣٩,٠٠	٧١١١,٠٠	٧١١١,٠٠	٤٥٥١٠٤,٠٠	٤٥٥١٠٤,٠٠	
التشوينات											
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
السابق											
الباقى											
٥٣٨٢١٣٧٦٣,٠٠ /											
٤٧٦٣٨٣٧٢٣,٠٠ /											
٦١٨٣٠٠٤٠,٠٠ /											

الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاول (كونكورد)		الاستشاري العام للمشروع Systra		مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم		مدير عام الشؤون المالية و الادارية	
مدير المكتب الفني م/ اشرف الهادي		م/ اميرة حسن		مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		م/ اميرة حسن	
مدير المشروع م/ محمد صابر		م / لويس سوسه				م / لويس سوسه	
		م/ باهر ميخائيل				م/ باهر ميخائيل	
		تم التفتيش جها للو ٢ الشفعية العتمة و طبقة التسليح بعمق				تم التفتيش جها للو ٢ الشفعية العتمة و طبقة التسليح بعمق	
		بأمر المهندس				بأمر المهندس	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م/ نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبدالجواد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب / / ٢٠٢٣ /

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ نهائياً

ملاحظة : الفئات : غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من

يعتمد : مدير المصلحة
