

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٦ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لميادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية رفع كفاءة طريق
الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١.٥ كم محافظة الشرقية تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

برجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه بالآزم نحو اطراجةة والصرف وهو افالنا برقم ولأاية السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية.

وتجملوا مساعدتكم بقبول فائق الامتراء ...

تحريراً فى : ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ع. ح.

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ٢٥ } قائمة كميات عدد { ٥٥ } ورقة x عدد { ٣ } نسخ

عدد { ١٨ } معمل المنطقة

عدد { ٤ } مقايمة ختامية + مذكرة

عدد { ١ } وثيقة - ملحق

عدد { ١١ } جوابات - ملحق

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح





المواد الحجرية المستخدمة فى تنفيذ مملية
رفع كفاءة طريق الرزازيق / أبو حماد بطول ١.٥ كم محافظة الشرقية
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

م	البيد	الوحدة	الكمية المتقاربة	الرمال	السن	ملاحظات
١	أعمال توريد وتشغيل رمال	٢م	٢م ١١٥٩٥,٦٩	١١٥٩٥,٦٩	٠	- - - - -
٢	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	٢م	٢م ٥٠١,٥٠	٠	٥٠١,٥٠	- - - - -
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢م	٢م ١٧٠٠٢,٣٣	٣٧٧,٤٧	٦٤٢,٧٢	الرمال - ١٧٠٠٢,٣٣ × ٠,٢٧ = ٣٧٧,٤٧ العن - ١٧٠٠٢,٣٣ × ٠,٠٦ = ٦٤٢,٧٢
٤	أعمال إنشاء طبقة ترميم بتكامل الاسفلت	٢م	٢م ٨٠	٢٩,٦٠	٥٠,٤٠	الرمال - ٨٠ × ٠,٣٧ = ٢٩,٦٠ العن - ٨٠ × ٠,٦٣ = ٥٠,٤٠
٥	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢م	٢م ٧٥٤٨,٧٥	١٩٢,٤٩	١٨٤,٩٤	الرمال - ٧٥٤٨,٧٥ × ٠,٠٥ = ١٩٢,٤٩ العن - ٧٥٤٨,٧٥ × ٠,٠٥ = ١٨٤,٩٤
٦	أعمال توريد وصب خرسانة صلبة للمحافظ	٢م	٢م ٤٥٧٦,٤٠	١٨٣٠,٥٦	٣٧٤٥,٨٤	الرمال - ٤٥٧٦,٤٠ × ٠,٤ = ١٨٣٠,٥٦ العن - ٤٥٧٦,٤٠ × ٠,٦ = ٣٧٤٥,٨٤
٧	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للأرصفة	٢م	٢م ٨,٧٢	٢,٤٨	٥,٢٣	الرمال - ٨,٧٢ × ٠,٤ = ٣,٤٨ العن - ٨,٧٢ × ٠,٦ = ٥,٢٣
	الإجمالي		١٤٠٢٩,٢٩	٨٦٣٠,٦٣		

رمال	٢م ١٤٠٢٩,٢٩	قطر أربعة مشرّاف وتسعة ومشرون و ٢٩ / ١٠٠ متر مكعب
سن	٢م ٨٦٣٠,٦٣	قطر ثمانية آلاف وستمالة وثلاثون و ٦٣ / ١٠٠ متر مكعب

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العلود

ملف رقم : ١٥ /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تدبه طيبه وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد
مركز أبو حماد بطول ١,٥ كم عقد رقم ٩٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العمومية .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (١)
سيارة بالمنطقة وتم توريد عدد (١) جهاز كمبيوتر بمشتملاته لمركز المعلومات - مرفق - .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بهيول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية



رقم بند	البنود	الكمية		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جسمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		المالي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش				جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٢	أعمال تخطيط المساحات	٣٣٠	-	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	٩٠	-	-	١٢٦	٩٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٦٦	-	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	-	-	-	١٨٣٠٥٤٩	-	٢- عمل التوقيع متواجد
٤	أعمال إنشاء وفرش طبقة تهريب برام	٢٧	٥٠	١٤٨٥٠	١٤٨٥٠	١٤٨٥٠	١٤٨٥٠	٨٢	-	-	٤٠٨٣٩٧	٨٢	٣- مهندس عمل التوقيع متواجد
٥	أعمال إنشاء وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٦	-	١١٩٥٠	١١٩٥٠	١١٩٥٠	١١٩٥٠	١٨	-	-	٢٤٨٢٤٨٦	١٨	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة لاسق	٩	٢٠	٩٢٠٠	٩٢٠٠	٩٢٠٠	٩٢٠٠	٥٠	-	-	٨٩٢٥١	٥٠	٥- لم ترقب اللاتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية	١٤٠	-	٧٥٤٠	٧٥٤٠	٧٥٤٠	٧٥٤٠	-	-	-	١٠٥٩٨٢٥	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال ترصيف بالخرطوط الأسفلتي	٢٥٠٠	-	٧٨	٧٨	٧٨	٧٨	-	-	-	٢٠٠٠٠٠	-	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية
٩	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٥٤	٥٠	١٥٣٥٠	١٥٣٥٠	١٥٣٥٠	١٥٣٥٠	٠٣	-	-	٨٣٩٨٦٦	٠٣	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البشود الفرجة بالستخلص
١٠	أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للردم ٢٢٥	٢١٠	٢٠	١٠٩٠٠	١٠٩٠٠	١٠٩٠٠	١٠٩٠٠	٠٣	-	-	٢٤٣٧١٤٤	٠٣	٩- التقارير متواجدة
١١	أعمال رفع وتنصيب الطابق وفرف التفتيش	٤٧٥	-	١٤	١٤	١٤	١٤	-	-	-	٧١٢٥	-	١٠- بولاية التأمين متواجدة
١٢	أعمال توريد وتركيب بالوعات صرف سطر	٤٥٠٠	-	٣	٣	٣	٣	-	-	-	١٣٥٠٠	-	١١- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال
١٣	أعمال الحرسانة العادية للحوادث	٢١٥٠	-	٤٥٦٠	٤٥٦٠	٤٥٦٠	٤٥٦٠	-	-	-	٩٨٣٩٢٦٠	-	١٢- سيطرة العملية متواجدة بالمنطقة
١٤	أعمال توريد حرسانة مسلحة للأساسات	٢٤٢٠	-	٨	٨	٨	٨	-	-	-	٢١١٠٢	-	١٣- برام خصم ما توس به لجنة أسلام وتقييم العملية
١٥	أعمال توريد وتوصيب ورس حديد التسليح	٢٤٥٠٠	-	١٥,٦٦٦	١٥,٦٦٦	١٥,٦٦٦	١٥,٦٦٦	-	-	-	٣٨٥١٨٩	-	١٤- مهندس العملية التوقيع
الإجماليات													
١٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠	-	-	١٩٦٤٩٥٥٥	٥٠	١٥- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال
١٧	أعمال إنشاء وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	١٦٠٣,٣٣	١٦٠٣,٣٣	١٦٠٣,٣٣	١٦٠٣,٣٣	٩٩	-	-	١٢٥٠٣٧	٩٩	١٦- سيطرة العملية متواجدة بالمنطقة
١٨	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية	٣	-	٨,٧٥	٨,٧٥	٨,٧٥	٨,٧٥	٢٥	-	-	٥١٠٠٩	٢٥	١٧- مهندس العملية التوقيع
١٩	أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للردم ٢٢٥	١٣	-	١٠٩٠٠	١٠٩٠٠	١٠٩٠٠	١٠٩٠٠	٩٧	-	-	١٥٠٧٤٣	٩٧	١٨- مهندس العملية التوقيع
إجماليات الكائنات													
٢٠	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٤٩٤٣٧	-	٣٤٩٤٣٧	٣٤٩٤٣٧	٣٤٩٤٣٧	٣٤٩٤٣٧	٧١	-	-	٣٤٩٤٣٧	٧١	١٩- مهندس العملية التوقيع
الإجمالي العام													
٢١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٥٧	-	١٩٩٩٨٩٩٣	١٩٩٩٨٩٩٣	١٩٩٩٨٩٩٣	١٩٩٩٨٩٩٣	٥٧	-	-	١٩٩٩٨٩٩٣	٥٧	٢٠- مهندس العملية التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن التبالغ القيمة بالمرة وقدره : ١٩٧٧٣٢١,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول المحاسب

يبلغ إلى المقاول مبلغ : ٢٢٥٣٧٢,٥٧ جنيه على الحساب

نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أمتعت من

مهندس الإشراف الاسم
مهندس الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم

سنة
توقيع
سنة
توقيع
سنة
توقيع


تحريراً في
تحريراً في



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
المنفذة لعملية رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١.٥ كم محافظة الشرقية
عقد رقم ٩٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً
لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذة .

مهندس الإشراف



تحريراً في: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامي صالح



شهادة

الطرق ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف

W. J. H. J.

تحریر آفی: ۲۰۲۳ / ۷ / ۲۵

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ~~کمال~~

بیلوی سامی صالح



شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية رفع كفاءة طريق
الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١.٥ كم محافظة الشرقية عقد رقم ٩٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
والمنفذة بمعرفة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٩.٩٩ %
بالنسبة للتعاقد .

مهندس الإشراف



تحريراً في: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /



مذكرة إيضاحية لعملية رفع كفاءة طريق
الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١,٥ كم محافظة الشرقية
عقد رقم ٩٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
مقولة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

نظراً لانتهاء الأعمال بعملية أستكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١,٥ كم محافظة الشرقية عقد رقم ٩٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مقولة مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق وإعداد الختامي الخاص بها .
فقد صار تجديد المقايضة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التى بلغت قيمتها الإجمالية ١٩٩٩٨٩٩٣,٥٧ جنيه { فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة ثلاثة وتسعون جنيهاً و ٥٧ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصر الختامى المعد .

مهندس الإشراف




تحرير فى: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



أولاً: المقاييس الخدمية لأعمال رفع كفاءة طريق الرزازيق / أبو حماد بطول ١,٥ كم مركز أبو حماد محافظة الشرقية

رقم بند	الوحدة	بيان الأعمال	المقدار	الوقت ساعة	الإجمالي جنيه
١	٣ م	أعمال تكسير وإزالة المستحاثات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ٢٥ كم .	-	٨٦	-
٢	٣ م	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المستحاثات المنهارة والزخرفة والعموكة والشروخ والرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسعة ٥ سم طبقاً للشروط ومواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والنسوية والنتافة وكل ما يلزم لنهو العمل.	١٢٦,٠٢	٣٣٠	٤١٥٨٩,٩
٣	٣ م	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الانحناس عن ١٠ % وفرداً على طبقتين باستخدام الات النسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملع عن ١٥ سم ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملع الجيد بالهراسات للوصول إلى الصلابة القصوى لا يقل عن ٩٨ % من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن ١٧٠ كم السعر يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المتفردة بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المسؤولة عن المعاجير.	٥٠٠,١,٥	٣٦٦	١٨٣.٥٤٩
٤	٢ م	أعمال إنشاء طبقة تشريب " برابم " باستخدام الاسفلت السائل متوسط التماسير (M.C30) بمعدل ١,٢ كجم / ٢م طبقاً للشروط ومواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حشوية أو ناعمه زائدة قبل الرش و أن يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	١٤٨٥٠,٨٢	٢٧,٥	٤٠٨٣٩٧,٨٢٥
٥	٢ م	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ بمعدل ٦ سم باستخدام من الأحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المعتمدة المطابق للشروط ومواصفات والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح .	١٧٠٠٣,٣٢	١٤٦	٢٤٨٢٤٨٦,١٨
٦	٢ م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التماسير (R.C ٢٠٠) بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ورش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دملعها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التصويحية والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٩٧٠,١,٢٥	٩,٢	٨٩٢٥١,٥
٧	٢ م	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ على الساخن بسعة ٥ سم بعد الدملع باستخدام الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات جبهة الانحناس بأسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٧٥٤٨,٧٥	١٤٠	١٠٥٦٨٢٥

مهندس الهيئة
أحمد سمير عيسى

مهندس شركة
أحمد عيسى

لولا: المقاييس الختامية لأعمال رفع كفاءة طريق الزقاق / أبو حماد بطول ١,٥ كم مركز أبو حماد محافظة الشرقية

رقم البند	الوحدة	بيان الأعمال	المقادير	الوقت	الإجمالي
رقم البند	الوحدة	بيان الأعمال	المقادير	الوقت	الإجمالي
٨	٣م	أعمال ترميم بالمختلط الإسفلتي على الساخن تدرج (٥3) في أماكن الكشط و لاستعمال المناسيب و في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالإسفلت و استخدام الإسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و استخدام ماكينته الفرش الميكانيكية (الملمس) لفرش طبقة الترميم على أن يتم التنفيذ على طبقات و لا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦ سم و طبقا لتعليمات المهندس المشرف و المحاسبه بالمتر المكعب بعد الدمك و الفلة شاملة وضع طبقة تصق من الإسفلت السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠) أو المستحلبات الإسفلتية بعدد لا يقل عن (٥.٤ كجم / م ^٢) أسفل طبقات الترميم و الفلة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المكعب	٨٠	٢٥٠٠	٢٠٠٠٠
٩	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل رمال نظيفة متدرجة عالية من الشوائب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ١٢٦ كم . - السعر لا يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المتنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر	-	٢٠١	-
١٠	٣م	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية و الفرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفلة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل ٣٥ كم .	١٥٣٥٥,٣٤	٥٤,٥	٨٣٦٨٦٦,٠٣
١٠	٢م	بالمتر المسطح أعمال تطهير و إزالة جميع المخلفات و التربة الغير صالحة و تسليم موقع التطهير أو الحفر خالي و نظيف طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفلة شاملة أعمال إزالة الغاب و البوص باماكن التطهير أو الحفر و أعمال نقل المخلفات و التربة الغير صالحة خارج الموقع على مسؤولية المقاول و الفلة شاملة جميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات .	-	٥,٢٥	-
١١	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل رمال نظيفة متدرجة عالية من الشوائب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %) و رشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ١٢٦ كم . - السعر لا يشمل المادة المحجيرة مع قيام الشركة المتنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر	١١٥٩٥,٦٩	٢١,٢	٢٤٣٧٤١٤,٠٣٨
١٢	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرمي) و جهين بارتفاع ٦٠ سم أعلى الفرشة طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) يحتوي اسمي لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٢ و باجهاذ لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ و الفلة تشمل عمل فرشاة الخرسانة العادية سمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاذ لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشارة (١٠ @ ١٦) م.ط و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري	-	٦٨٥	-

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٣٠

نوع المقايضة العادية لأعمال رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد بطول ١,٥ كم مركز أبو حماد محافظة الشرقية

رقم بند	نوع بند	بيان الأعمال	المقايير	الكمية جنية	الإجمالي جنية
١٣	م. ط	بالمزاد الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (ثوب جرس) وجه واحد ارتفاع ٨٠ سم أعلى الفرسة طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (١٨٤٢ ١٨٤٢) بمحتوي أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٣ م واجهات لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم والقلعة تشمل عمل فرشاة الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز واجهات لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسلاك (١٦٥٥٦) م ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية والبند بجميع مستلزماته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	-	٥٠٠	-
١٤	م. ط	بالمزاد المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايح طبقا لرسومات التنفيذ ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم / ٣ م أسمنت بورتلاندي مع الدقة الميكانيكي على ألا يقل أجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم / سم مع اجراء الاختبارات اللازمة أو لزوم القدمات وحماية المرافق القريبة من سطح الطريق إذا لزم الأمر ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مستلزماته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	-	١٤٥٠	-
١٥	بالمعد	أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات بالمعد التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مستلزماته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والقلعة شاملة كل ما يلزم لنه العمل بالمعد.	١٥	٤٧٥	٧١٢٥
١٦	بالمعد	بالمعد توريد وتركيب بالوعات صرف مطر مزودة بغطاء GRB ومحمل عليها مواسير قطر ٦ بوصة P.V.C والبند بجميع مستلزماته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والقلعة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل بالمعد.	٣	٤٥٠٠	١٣٥٠٠
١٧	م. ط	أعمال إنشاء حائط ساند من الخرسانة العادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٣ م واجهات لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم والسعر لا يشمل حديد التسليح.	٤٥٧٦,٤	٢١٥٠	٩٨٣٩٢٦٠
١٨	م. ط	أعمال إنشاء خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والحوائط مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٣ م واجهات لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم والسعر لا يشمل حديد التسليح.	٨,٧٢	٢٤٢٠	٢١١٠٢,٤
١٩	طن	أعمال توريد وتوضيب وورس صلب التسليح (٥٢,٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية طبقا للرسومات وعمل الوصلات ونقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات.	١٥,٧٢٢	٢٤٥٠٠	٣٨٥١٨٩
اجمالي المقايضة					١٩٦٤٩٥٥٥,٨٧

مهندس الهيئة

مهندس شركة

١٥٢٠٠٠


مكتب الوليد للمقاولات للمقاولات العامة
ثانيا: بيان بقيمة الكارتات المحملة علي الأعمال الموردة لعملية
لأعمال رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد بطول ١,٥ كم مركز أبو حماد محافظة الشرقية

البند	توصيف البند	الكمية	الوحدة	قيمة الكارثة	إجمالي قيمة الكارثة
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ... الخ	٥٠٠١,٥	م٣	٢٥	١٢٥٠٣٧,٥
٥	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج ٣د بسمك ٦ سم ... الخ	١٧٠٠٣,٣٣	م٢	٣	٥١٠٠٩,٩٩
٧	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ج علي الساخن بسمك ٥ سم ... الخ	٧٥٤٨,٧٥	م٢	٣	٢٢٦٤٦,٢٥
١١	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل رمال نظيفة متدرجة خالية من الشوائب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %) ... الخ	١١٥٩٥,٦٩	م٣	١٣	١٥٠٧٤٣,٩٧
				٣٤٩٤٣٧,٧١	
				إجمالي قيمة الكارتات علي الأعمال	

١٩٩٩٨٩٩٣,٥٨

إجمالي قيمة الأعمال بالمقايضة المختمة + قيمة الكارتات المستحقة

مهندس الهيئة / 

مهندس الشركة / 



رقم كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد / العبيد - بطول ١٠.٥ كم "حياد كريمة"

الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٢٥) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١١

م/ أحمد ممدوح

قام بإحضار العينات :-

عدد (٧) عينة اسفلت رابط (د٣)

بيانات الزاوية :-
بيانات العينات :-
ملاحظات التي أجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والامتصاص بطريقة مارشال

المواصفات (د٣)	التدرج التصميمي	ك ١٠٠٠	ك ١٠٠	المواصفات
100	95	100	100	1"
100_75	85.4	95	95	3/4"
70_35	59.3	66	66	3/8"
50_30	48.7	46	47	4/16"
35_20	35	33	32	20#
20_5	14	17	18	30#
12_3	5.5	8	9	50#
8_2	2.7	3.9	3.5	100#
4_0	0.2	1.0	0.9	200#
	5.05	4.55	4.71	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠			1290	الثبات بالمكعب
2_4			2.8	الثبات بالمكعب
300_500			461	اختلاف كجم / متر

أنتقله طبق مع حدود التسليمية للتدرج التصميمي معاد المعزات الدشر إليها وتعلق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم مقارنة بالتدرج التصميمي الخواص من الحدود لتقرير رقم ٣٢٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١١ عليه

أو عويشة / الخضراوة / فهد خطاب طرعا لكتاب الشركة المتقدمة للسند الهندسة رئيس الإدارة المركزية وموافقته جهز الاشراف

ملحوظة / العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي	اسماء العينات
2	480	960	مخلوط اسفلتي
2	150	300	فانج مارشال
		150	م. اختبار تدرج
		1410	نسبة الثبات
		211.5	اختلاف كجم / متر
		227.05	الاجمالي
		1848.55	

٢٠٢٣/٦/١١

٢٠٢٣/٦/١١

تدوين في: / السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / د. /
سلوي سامي صالح

مدير العمل
مهندس /
حازم عبد المنعم

المصور



رقم خطة الطريق رقم ١٠٥٠٠ / أبو حماد / العجوة بطول ١,٥ كم "حياء كريمة"

الولاية للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٣٣) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩

المسعود

عدد (١) عينة اسفلت رابطة (٣٣) ك ٥٥٠٠

النتائج -
النتائج والاسفلت وضبط نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والاندماج بطريقة مارشال

المواصفات (د٣)	النتائج التصميم	ك ٥٥٠٠	النتائج
100	100 95	100	1
100_75	95.4 85.4	97	3/4"
70_35	69.3 59.3	67	3/8"
50_30	48.7 40.7	46	4#
35_20	35 30.8	34	8#
20_5	20 14	19	30#
12_3	11.5 5.5	8	50#
8_2	5.7 2.7	3.5	100#
4_0	3.2 0.2	1.4	200#
	5.05 4.55	4.8	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠		1190	النتائج التصميم
2_4		2.8	النتائج التصميم
300_500		425	النتائج التصميم

النتائج تتفق مع حدود السماحية للنتائج التصميم ماعدا المعززة المشمل اليها وتنقل في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميم

تم مقارنة بالنتائج التصميم الوارد من المعامل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٩ عليه

ابن عويشة / الخضار / السيد خطاب شريف لكتاب الشركة المتقدمة للسيدة المعتمدة رئيس الإدارة المركزية وموافقته جهات الإشراف

ملحوظة / العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العيشت	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلت	1	480	480
قلب مارشال	2	150	300
في إعداد تقرير			150
قيمة التعاريف			930
١٥ %			139.5
١٤ %			149.75
الاجمالي			1219.25

٢٠٢٣/٥/٢٩

تحريرا في:

مهندس المعمل / م. السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / م. السيد صالح
سلوي سامي صالح

مدير المعمل
مهندس / م. السيد حازم
حازم عبد المنعم

مهندس / م. السيد حازم
حازم عبد المنعم

مهندس / م. السيد حازم
حازم عبد المنعم



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق الزقازيق / ابو حماد / العباسه بطول ١,٥ كم " حياه كريمه "
تنفيذ شركه : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٢٢

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : /أ/ محمود صالح
بيان العينات :- عدد (٢) عينة ارض طبيعيه طيليه اتريه ناتج حفر خلف الحائط السائد لعمل صلاحيه .
الاختبارات التي اجريت عليها :-
التحليل المنخلي وثوابت التبريج واقصى كثافه جافه ونسبه تحمل كاليفورنيا والانتفاخ .
النتائج :-

المواصفات	ك ٠,٨٠٠	ك ٠,٤٠٠	التجارب
	٩٥,٥	٩٨,٨	مهزه رقم ٤
	٩٣	٩٣	مهزه رقم ١٠
	٥٨	٥٧	مهزه رقم ٤٠
	٢٨	٣٩	مهزه رقم ٢٠٠
	٢٧	٣٨	حد السيوله
	١٩	١٨,٦	مجال التلونه %
	A-٦	A-٦	التصنيف
	١,٤٩	١,٤٧	أقصى كثافه جافه طن /م ٣
	٢٤,٢	٢٤,٨	نسبه المياه الملائمه %
	٤,٥	٤,٧	نسبه تحمل كاليفورنيا %
	٢	٢,٣	الانتفاخ %

يتم الرجوع الى ملف العمله لمقارنة النتائج .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج / التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدات	عدد الوحدات	بيان العينات
٢٩٤٠	١٤٧٠	٢	صلاحيه رمل
١٥٠			م . اعداد تقرير
٣٠٩٠			قيمه التجارب
٤٦٣,٥			م ١٥ ١ %
٤٩٧,٥			ض.ق.م ١٤ %
٤٠٥١,٠			الاجمالي

تحريرا في: ٢٠٢٣/٠٣/٢٧

مهندس المعمل /

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

حاتم عبد المنعم محمد

١٨١٨
٢٢/٢/٢٠٢٣

المعقول



رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد بطول ١,٥ كم مركز أبو حماد (حياء كريمة)

اسم المشروع :

الوليد للمقاولات

تفليد شركة :

تقرير معمل رقم (١٩٧) لسنة ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٢/٢٦

بتاريخ :

قام باحضار العينات : / هشام منصور

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٢) عينه دمك اساس مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك			
المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣
لا يقل عن ٩٨ %	دمك نهائي اساس		
	99	4.6	2.22
	98	4.6	2.19

الدمك مقبول بالمواقع

البروتكتور المستخدم للاساس هو ٢,٢٣ طن/م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,١ %
العينات مسؤولة من احضرها

ملحوظة :

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	2	505	1010
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1160
م. ١٥١ %			174.00
ض. ق. م ١٤ %			186.80
الإجمالي			1520.80

٢٠٢٣/٠٢/٠٥

تحريرا في :

مهندس المعمل / صاوي السيد

مدير المعمل

مهندس / حازم عبدالمنعم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / سلاوي سامي صالح



حازم عبدالمنعم

المستور



اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق الزقازيق / ابو حماد بطول ١,٥ كم مركز ابو حماد (حياء كريمة)
تقديت شركة : التوليد للمطاولات

تقرير مدعنى رقم (١٢٤) لسنة ٢٠٢٣
تاريخ : ٢٠٢٣/٠٢/١٥
ملاحظات ادارية :- قام باحضار العيادات : المصمم
بيان العيادات :-

عدد (٣) عيادات دمك مواقع مختلفة
لاختصارات التي اجريت عليها :-

التكليف عن الكثافة الحافة طن/م³ ونسبة الرطوبة و الدمك النعسي

عيادات الدمك

الموقع	الكثافة الحافة طن/م ³	نسبة الرطوبة %	الدمك النعسي %	المواصفات
اولا : دمك ثلثه اساس من ٦				
ك. ٩٥٠ - يمين	2.20	5.3	98	لا يقل عن ٩٨ %
ك. ٩٠٠ - شمال	2.22	5.2	99	
ثانيا : دمك ثلثه حصى				
مختبر الدائري (محدد)	2.12	6.4	99	لا يقل عن ٩٥ %

الدمك مقبول بالمواقع

البروتوكول المستخدم للرمال هو ٢.١٤ طن/م³ ونسبة المياه الملائمة ٧.٩ %
البروتوكول المستخدم للاساس هو ٢.٢٣ طن/م³ ونسبة المياه الملائمة ٧.١ %
العيادات مسئولة من احصاها


ملاحظة :-

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	505	1515
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1665
م. ١٥١ %			249.75
م. ١١ %			268.10
الإجمالي			2182.85

٢٠٢٣/٠٢/١٩

تحريرا في :



رئيس الإدارة المركزية
مهندس / س. ح. ح. ح.
مبنى مبنى صنف

مدير العمل
مهندس / س. ح. ح. ح.
حارم عبدالمنعم

المصمم

اسم المشروع : عمله رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد بطول ١,٥ كم مركز أبو حماد (حياء كريمه)
تأليف شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معلى رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/١

بيانات ادارية :-

قام باحضار العينات : /المعيد طه

بيان العينات :-

عدد (١) عينة دمك طبقه نهائي رمال

عدد (١) عينة اثربه حصويه صلاحية طبقه نهائي ك.٦٠٠

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت الثريج و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ و التصنيف
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

صلاحية رمال

المواصفات	٠,٦٠٠ ك	الميزات
	82	مهزه رقم ٤
	63	10
	33	40
	11	200
	عديمة	مجال الدونة
	A1-B	التصنيف
	2.14	أقصى كثافة جافة طن / م ^٣
	7.9	نسبة المياه الملائمة %
	27	نسبة تحمل كاليفورنيا %
	.	الانتفاخ %

بتم الرجوع لادفر الشروط الخصوصية للمشروع

ثانيا :- عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن / م ^٣	المواقع
				دمك طبقه اولي رمال
				ك.٢٥٠
لا يقل عن ٩٥ %	99	4.9	2.13	

الدمك مقبول بالمواقع

المروكثور المستخدم للرمال هو ١,١١ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٩ %

ملحوظة : العينات مسئوليّة من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	1	505	505
رمال	1	1290	1290
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1945
م. ١٥١ %			291.75
ض. ق. م. ١٤ %			313.15
الإجمالي			2549.90

رئيس الإدارة المركزية
م. طوى سامي صالح

مهندس /

تدريسا في :
مهندس المعمل /
مدير المعمل
مهندس /
حازم عبدالمنعم

٨٧٤
٢٠٢٣/٢/١٤



اسم المشروع : عمله رفع كفاءه طريق الزقازيق / ابوحماد بطول ١,٥ كم مركز ابوحماد (حياء كريمه)
تفويض شركه : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٤٦) لسنة ٢٠٢٣

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : /مسعد
بيان العينات :- بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٢/٠٨

عدد (٤) عينات دمك اولي اساس مواقع مختلفه

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	الموقع
لا يقل عن ٩٨%	اولا : دمك اولي اساس من ٦			
	99	5.4	2.21	ك. ٧٠٠ يمين
	98	5.4	2.19	ك. ٥٠٠ شمال
	99	5.2	2.22	ك. ٣٠٠ يمين
	98	5.6	2.2	ك. ١٠٠ شمال

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للاساس هو ٢.٢٣ طن/م^٣ و نسبة المياة الملائمة ٧.١%
ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	4	505	2020
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			2170
م. ١٥١ %			325.50
ض. ق. م. ١٤ %			374.35
الإجمالي			2869.85

٢٠٢٣/٠٢/١٢

تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ممدوح

سلوى سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / ٩١٦

حاتم عبد المنعم ٢٠٢٣/٠٢/١٢

المعتمد



اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد بطول ١.٥ كم مركز أبو حماد (مبادرة حياة كريمة)

تفويض شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١١٦) لسنة ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠١/٢٩

بتاريخ :

قام باحضار العينات : / محمد توفيق

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات دمك تربة زلطية نهائى مواقع مختلفة

اختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة ، نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	الموقع
لا يقل عن ٩٥ %	دمك نهائى تربة زلطية			
	98	4.3	2.12	٠.٨٥٠٥
	99	4.2	2.11	٠.٩٧٥٥
	99	4.2	2.13	٠.٠٧٥٥

الدمك مقبول بالمواقع

المبروكاتور المستخدم للرمال هو ١.١٥ طن/م^٣ و نسبة العينة الملائمة ٧.٤ %

ملاحظة : العينات مسلوكة من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	505	1515
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1665
م. ١٥١ %			249.75
م. ١٤ %			268.10
الاجمالي			2182.85

٢٠٢٣/٠١/٣١

تحريرا في :

مهندس المعمل :- م. م. م. م.

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

د. و. م. م. م.



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق الزقازيق / ابو حماد
تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات العامة

تقرير معلى رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٠١

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : ا/ سعيد طه

بيان العينات :- عدد (٣) عينات دمك من مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٥%	98	5.1	2.10	طبقة ثانية رمل ك ٠,٠٥٠
	98	5.2	2.11	طبقة ثالثة رمل ك ٠,٨٥٠
	96	5.1	2.07	طبقة رابعة رمل ك ٠,٥٥٠

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للرمل ٢,١٥ هو طن/م^٣ و نسبة المياة الملائمة ٧,٤%

العينات مسئولية من احضرها

ملحوظة :-

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	505	1515
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1665
م. ١٥ %			249.75
ض. ق. م. ١٤ %			268.10
الإجمالي			2182.85

٢٠٢٣/٠١/٠٣

تحريراً في :

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

حازم عبد المنعم

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ٠٣

ملوى سامى صالح



المعقود

٢٠٢٣/٠١/٠٣

تقرير معمل رقم (٧٨٧) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١

بيانات اداريه :- قام بالصب واحضار المكعبات العينات : م / احمد سمير

بيان العينات :- عدد (١٨) مكعب خرسانه مسلحة لزوم صب حائط خرساني والتفاصيل بالجدول المبين :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٧ ؛ ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (كجم)	الابعاد (سم)	الكثاله (كجم/م ^٣)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة حائط خرساني	٢٠٢٢/١١/٢٤	١	٨٢٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٤	٢٩٩	٢٨٧	٢٠٢٢/١٢/٠١	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٢	٨٢٣٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٩	٢٨٠			
		٣	٨٢٤٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤١	٣١٢			
		٤	٨٢٤٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤١	٣٢٣			
		٥	٨٢٣٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٩	٣٠٢			
		٦	٨٢٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٤	٣٢٨			
خرسانة حائط خرساني	٢٠٢٢/١١/٢٧	١	٨١٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤١٥	٣١٠	٣٠٦	٢٠٢٢/١٢/٠٤	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٢	٨٢٢٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٦	٣١١			
		٣	٨٢١٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٣	٣٠٧			
		٤	٨٢٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٠	٣٢٧			
		٥	٨١٢٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٣٢٨			
		٦	٨٢٢٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٦	٣٣٧			
خرسانة حائط خرساني	٢٠٢٢/١١/٢٩	١	٨٢٣٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٩	٣٠٥	٢٩٤	٢٠٢٢/١٢/٠٦	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٢	٨٢١٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٣	٢٩٣			
		٣	٨٢١٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٣	٢٨٢			
		٤	٨٢٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٠	٣٣٢			
		٥	٨٢٢٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٩	٣٢٤			
		٦	٨١٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤١٥	٣١٥			

يتم الرجوع الى ملف العملية لمقررة النتائج .

ملحوظة / العينات مسؤوليه من احضرها .

قام بالكسر : / سعيد طه .

ج / التكاليف

بيان العينات	تعدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسر مكعب خرسانه	١٨	١٦٧	٣٠٠٦
م. اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٣١٥٦
م. ١٥ %			٤٧٣,٤٠
ض. م. ١٠ %			٥٠٨,١٥
الاجمالي			٤١٣٧,٥٥

تحريرا لي: ٢٠٢٢/١٢/٢٨

المهندس المعمل / زكريا

مهندس المعمل / زكريا

رئيس الاداره المركزيه
مهندس / س /
سلوي ماضي صليح

مدير المعمل
مهندس /
حازم عبد المنعم

٥٧

١٤٤٤/١/٢٠

٢٩

اسم المشروع : عملية رفع كفاءة طريق الزقازيق / ابو حماد بطول ١,٥ كم مركز ابو حماد (مبادرة حياة كريمة)
تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٧٨٠) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٥

قام باحضار العينات : / سعيد طه

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٣) عينات دمك رمال من مواقع مختلفة .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة	نسبة الرطوبة	الدمك النسبي	المواصفات
ك. ٥٠٠ . اولي رمال	2.11	4.8	98.00%	الدمك لا يقل عن ٩٥ %
ك. ٣٥٠ . ثالثة رمال	2.10	5.1	98%	
ك. ٩٥٠ . ثنية رمال	2.11	5	98%	

الدمك مقبول بالمواقع
البرونكتور المستخدم لطبقة الرمال هو ٢,١٥ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٤ %

ملحوظة / العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجملي
عينات دمك	3	505	1515
م . اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1665
م ١٥ %			249.75
ض. ق. م ١٤ %			268.10
الاجملي			2182.85

تحريرا في: ٢٠٢٢/١٢/٢٧

مهندس المعمل /

نائب مدير المعمل

مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
سلوي سامي صالح

مهندس /
حازم عبد المنعم

مهندس /
سعاد جاب الله



المعتمد

٩٥٣/١١٤

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد بطول ١,٥ كم مركز أبو حماد (حياء كريمة)
تفصيل شركة : التوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٣٩) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/٥

قام بالمعمل المجلات : / إرفشام منصور

بيانات الدورية :-

عدد (١) عينة من ٦ لعمل صلاحية ك ٠,٩٠٠ طبقه اولي

بيان المجلات :-

عدد (٣) عينات تمك لهالي رمال مواقع مختلفة

الاختبارات التي أجريت عليها :-

التحليل المعملية و ثوابت التبرج و الصلابة و الأوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليورنيا و الانتفاخ
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

الفئات :- أولا : صلاحية من ٦

المواصفات (تدرج ب)	ك ٠,٩٠٠	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	96	1.5"
55-85	74	1"
50-80	56	3/4"
40-70	44	3/8"
30-60	37	مهزة رقم ٤
20-50	30	10
10-30	16	40
5-15	8.8	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال التدونة %
	8	نسبة السن الطبيعي
لا يزيد عن ١٥%	30	الصلابة %
	2.352	الوزن النوعي الكلي
	2.421	الوزن النوعي مشبع جاف المسطح
	2.526	الوزن النوعي الظاهري
	2.9	الامتصاص %
لا يزيد عن ١٠%	0.4	التحلل %
لا يزيد عن ٥%	2.23	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
	7.8	نسبة المياه الاصولية %
	88	CBR %
لا يقل عن ٨٠%		الانتفاخ %

العينة تتفق في حدود المواصفات من حيث التدرج والنوعية

مناسيد

عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	الملاحظات
طبقة نهالي رمل				
ك. ٢٧٠	2.10	4.8	97	الدمك لا يقل عن ٩٥%
ك. ٤٥٠	2.12	4.9	98	
ك. ٩٠٠	2.14	4.4	99	

الدمك مقبول بالمواقع
البروتوكول المستخدم للرمل هو ٢.١٥ طن/م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧.٨%

ملحوظة: العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	505	1515
من ٦ صلاحية	1	2025	2025
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			3690
م. ا. ١٥ %			553.5
ض. ق. م. ١٤ %			594.10
الإجمالي			4837.60

٢٠٢٣/٠٢/٠٨

تحريراً في:

مهندس المعمل / منار السيد

وليس الإدارة المركزية
٥٠٥
ملوى ساسى صالح

مهندس /

مدير المعمل
حازم عبد المنعم

مهندس /

٥

القصود

٨٧٩
٢٠٢٤/١٢/١٢

اسم المشروع :

تنفيذ شركة :

تقرير معمل رقم (٧٦٣) لسنة ٢٠٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥

بيانات لبارية :- قام باحضار العينات : / محمود صالح

بيانات العينات :- عدد (٣) عينات دمك من مواقع مختلفة .

عدد (٣) عينة ارض طبيعيه طينييه رمليه ورمال حصويه تشويينات لعمل صلاحية .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت الربرج والصلابة والاوزان النوعيه والامتصاص والتحليل ونسبه السن الطبيعي .

الكشف عن الكثافه الجافه طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

اولا : عينات الدمك

النتائج :-

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٠ %	٩٩	٤,٢	٢,٠٤	طبقة ارض طبيعيه ك ٠,١٥٠
	٩٨	٤,٣	٢,٠١	ك ٠,٥٥٠
	٩٨	٥,٣	٢,٠٢	ك ٠,٩٢٥

الدمك مقبول بالموقع .

البرونكتور المستخدم للارض الطبيعيه ٢,٠٥ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٨,٢ %

ثانيا :- صلاحية الرمال

المواصفات	رمال حصويه تشويينات	رمال حصويه تشويينات	ك ٠,٩٢٥ ارض طبيعيه رمليه طينييه	التجارب
	٧٧	٩٣	٩٨,٨	مهزه رقم ٤
	٥٧,٦	٨٢,٤	٩٠	مهزه رقم ١٠
	٣٠	٤٢,٦	٤٢,٨	مهزه رقم ٤٠
	١٣	١٠	١٨	مهزه رقم ٢٠٠
	عديمه	عديمه	عديمه	مجال اللونه %
	A=١٠ b	A=١٠ b	A=٢٠ ٤	التصنيف
	٢,١٥	٢,١٤	٢,٠٥	الدمك المعطل
	٧,٤	٧,٦	٨,٢	القصي كثافه جافه طن / م ^٣
	٢٩	٢٨	٢٢	نسبة المياه الملائمة %
	-	-	-	نسبة تحمل كاليفورنيا %
	-	-	-	الانتفاخ %

يتم الرجوع الي ملف العمله لمقارنة النتائج .

ملحوظة / العينات مسؤوليه من احضرها .

زما

ج ١ التكاليف

الاجمالي	سم الوحدات	عدد الوحدات	بيان الوحدات
٢٨٧٠	١٢٩٠	٢	صلاحيه ومثل
١٥١٥	٥٠٥	٢	ملاك ومك
١٥٠			د. اعداد لمركز
٥٥٢٥			قائمة التوارب
٨٢٠,٢٥			د. ا. ٢٥ %
٨١١,١٥			م. ا. ١١ %
٢٢٥١,٢٠			الاجمالي

تاريخ التقرير ٢٠٢٢/١١/٢٩
مهندس المحلل / د. ا. ح

رئيس الادارة المركزية
مهندس / د. ا. ح
سلوي ماضي صالح

مدير العمل
مهندس / د. ا. ح
مكرم عبد الحليم



١٢



منا (طريق الزقازيق / ابو حماد)

اسم المشروع :

الوليد للمقاولات العامة

تسمية شركته :

تقرير معمل رقم (٧٦٧) لسنة ٢٠٢٢

٢٠٢٢/١٢/١٨

بتاريخ :

قام باحضار العينات : / هشام منصور

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٢) عينات دمك طبقة اولي رمال من مواقع مختلفة .

الإختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة اولي رمال				
ك ٠.٢٥٠	٢.١٢	٤.٩	٩٩	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ٠.٥٥٠	٢.١٣	٤.٩	٩٩	
ك ٠.٩٠٠	٢.١٠	٤.٨	٩٨	

الدمك مقبول بالموقع

البروكاتور المستخدم للرمال ٢.١٥ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧.٤ %

ج / التكاليف

بيانات العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
عينات دمك	٢	٥٠٥	١٥١٥
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			١٦٦٥
م ا ١٥ %			٢٤٩,٧٥
ض. ق. م ١٤ %			٢٦٨,١٠
الاجمالي			٢١٨٢,٨٥

تحريرا في: ٢٠٢٢/١٢/٢١

مهندس المعمل / 

مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية

مهندس / 

سلوي ساسي صالح



تقرير معمل رقم (٧٦٨) لسنة ٢٠٢٢

وردت بتاريخ : ٢٠٢٢/١١/٢٢

قام بالصب العينات : م / احمد سمير

بيان العينات : عدد (١٨) مكعب خرسانه مسلحة لزوم صب حوائط خرسانية امام مدرسه ابو حماد والتفاصيل بالجدول المبين :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٧ ؛ ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

ملاحظات	تاريخ الكسر	متوسط جهد الكسر	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	الكثافة (كجم/سم ^٣)	الابعاد (سم)	الوزن (كجم)	رقم المكعب	تاريخ الصب	نوع الخرسانه
جهد الكسر بعد ٧ ايام	٢٠٢٢/١١/٢٦	٢٨١	٢٦٤	٢,٤٤١	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	١	٢٠٢٢/١١/٢٦	خرسانة حائط خرساني
			٢٦٧	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٢		
			٣١٠	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	٣		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠	٢٠٢٢/١٢/١٧	٣١٦	٣١٥	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٤	٢٠٢٢/١١/٢٦	خرسانة حائط خرساني
			٣١١	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٥		
			٣٢٢	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	٦		
جهد الكسر بعد ٧ ايام	٢٠٢٢/١١/٢٧	٢٨٦	٢٩٦	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	١	٢٠٢٢/١١/٢٠	خرسانة حائط خرساني
			٢٩٨	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٢		
			٢٦٤	٢,٤٤٤	١٥*١٥*١٥	٨٢٥٠	٣		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠	٢٠٢٢/١٢/١٨	٣١٨	٣٢٧	٢,٤٤٧	١٥*١٥*١٥	٨٢٦٠	٤	٢٠٢٢/١١/٢٠	خرسانة حائط خرساني
			٣٠٩	٢,٤٤١	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	٥		
			٣١٧	٢,٤٣٦	١٥*١٥*١٥	٨٢٢٠	٦		
جهد الكسر بعد ٧ ايام	٢٠٢٢/١١/٢٨	٢٨١	٢٦٨	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	١	٢٠٢٢/١١/٢١	خرسانة حائط خرساني
			٢٩١	٢,٤٤١	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	٢		
			٢٨٥	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٣		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠	٢٠٢٢/١٢/١٩	٣١٣	٣٠٨	٢,٤٤١	١٥*١٥*١٥	٨٢٤٠	٤	٢٠٢٢/١١/٢١	خرسانة حائط خرساني
			٣١٣	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٢٠	٥		
			٣١٨	٢,٤٣٩	١٥*١٥*١٥	٨٢٣٠	٦		

يتم الرجوع الي ملف العملية لمقارنة النتائج .

ملحوظة / العينات مسؤوليه من اخضرها .

قام بالكسر : / سعيد طه .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسر مكعب خرسانه	١٨	١٦٧	٣٠٠٦
م اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٣١٥٦
م ا ١٥ %			١٧٣,٤٠
ض م ١٠ %			٥٠٨,١٥
الاجمالي			٤١٣٧,٥٥

تحريرا في: ٢٠٢٢/١٢/١٩

رئيس الاداره المركزيه
مهندس / هادي
مطري سامي صالح

مهندس المعمل / (م) س
مدير المعمل
مهندس / حازم عبد المنعم
المساحه ٦٤٥٦
٢٠٢٢/١٢/١٩
العقود

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR PUBLIC HIGHWAYS
AND LAND TRANSPORT (GAHRT)



عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول
(1.5) كم محافظة الشرقية

حصر ختامي لما تم تنفيذه من أعمال

تنفيذ

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

وزارة النقل

هيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

حصر ختامي لما تم تنفيذه من كميات المنشأة / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

رقم	البيد	الوحدة	كمية آخر معاينة معدلة	ماتبقى صرفه	الكمية الإجمالية المنفذة
2	أعمال كشط وإنزلة المسطحات المنهارة ... الخ	م ^٢	130	126	126.01
3	أعمال توريد وفرش طبقة أساس ... الخ	م ^٢	5010	5001	5001.5
4	أعمال إنشاء طبقة تلميب M.C.O ... الخ	م ^٢	15900	14850	14850.83
5	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم ... الخ	م ^٢	17096	16950	17093.33
6	أعمال توريد وفرش طبقة لاسقة R.C ... الخ	م ^٢	9710	9700	9701.25
7	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم ... الخ	م ^٢	7604	7340	7348.75
8	أعمال ترصم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تخرج ٧٢ ... الخ	م ^٢	110	78	80
١٠ - ١	أعمال الحفر ... الخ	م ^٢	15356	15350	15355.34
11	باعتبار المكتب أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة متدرجة خالية من الشوائب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %) ... الخ	م ^٢	10914	10900	11595.69
15	أعمال رفع منسوب المطابق و طرف التقطيش ... الخ	عدد	19	14	15
16	أعمال توريد وتركيب بالوعات صرف مطر ... الخ	عدد	5	3	3
17	عمال إنشاء حائط ساند من الخرسانة العادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٢ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والسعر لأشعمل حديد التسليح .	م ^٢	4575	4560	4576.4
18	عمال إنشاء خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والحوائط مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٢ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر لأشعمل حديد التسليح .	م ^٢	10	6	8.72
19	عمال توريد وتوصيب ووزن صلب التسليح (٥٢,٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية طبقا للرسومات وعمل الوصلات ونقل الحديد المشكل داخل الموقع ... الخ	طن	16	15.4	15.722

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)


حصر أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفه

بند رقم (٢)	الوحدة	ST.	الاجمالي
بالمتر المكعب أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة و الزاحفه ... الخ	٢م	FROM ST. 0+300 TO ST.1+025	126.03
الاجمالي			126.03

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

حصر أعمال أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+300	0	2	2	0.06	0.00
0+325	25	3.1	2.55	0.06	4.65
0+350	25	4.05	3.575	0.06	6.08
0+375	25	3.9	3.975	0.06	5.85
0+400	25	3.75	3.825	0.06	5.63
0+425	25	3.2	3.475	0.06	4.80
0+450	25	3.2	3.2	0.06	4.80
0+475	25	2.7	2.95	0.06	4.05
0+500	25	2.4	2.55	0.06	3.60
0+525	25	2.5	2.45	0.06	3.75
0+550	25	2	2.25	0.06	3.00
0+575	25	2.15	2.075	0.06	3.23
0+600	25	2.05	2.1	0.06	3.08
0+625	25	1.9	1.975	0.06	2.85
0+650	25	1.75	1.825	0.06	2.63
0+675	25	1.8	1.775	0.06	2.70
0+700	25	1.3	1.55	0.06	1.95
0+725	25	1.2	1.25	0.06	1.80
0+750	25	1.05	1.125	0.06	1.58
0+775	25	1.15	1.1	0.06	1.73
0+800	25	1.5	1.325	0.06	2.25
0+825	25	2.2	1.85	0.06	3.30
0+850	25	2.2	2.2	0.06	3.30
0+875	25	2.15	2.175	0.06	3.23

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

إبراهيم

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الرقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

حصر أعمال أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+900	25	2.75	2.45	0.05	4.13
0+925	25	2.15	2.45	0.06	3.23
0+950	25	7.1	4.625	0.05	8.88
0+975	25	7.15	7.125	0.05	8.94
1+000	25	8.65	7.9	0.05	10.81
1+025	25	8.2	8.425	0.05	10.25
الاجمالي					126.03



مهندس الهيئة

مهندس الشركة
أ. م. فاضل


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)


حصر أعمال توريد وفرش طبقة اساس

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٣)
5001.50	FROM ST. 0+000 TO ST.1+025	٣م	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ... الخ
5001.50	الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)


حصر أعمال توريد وفرش طبقة اساس

ST.	الطول	العرض	متوسط عرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	12.5	18.5	0	0.35	0.00
0+025	25	16.2	17.35	0.36	155.93
0+050	25	15.4	15.8	0.36	142.79
0+075	25	15	15.2	0.36	137.75
0+100	25	14.2	14.6	0.36	133.04
0+125	25	13.5	13.85	0.37	126.81
0+150	25	13.5	13.5	0.37	123.61
0+175	25	13.5	13.5	0.37	123.61
0+200	25	13.5	13.5	0.37	123.61
0+225	25	13.1	13.3	0.37	122.11
0+250	25	12.3	12.7	0.37	117.24
0+275	25	11.9	12.1	0.37	112.00
0+300	25	9.8	10.85	0.38	101.85
0+325	25	8.2	9	0.38	85.39
0+350	25	7.4	7.8	0.38	74.39
0+375	25	7.6	7.5	0.38	71.44
0+400	25	7.7	7.65	0.38	72.82
0+425	25	8.25	7.975	0.38	75.64
0+450	25	8.9	8.575	0.38	80.98
0+475	25	9.6	9.25	0.38	86.95
0+500	25	9.6	9.6	0.38	90.24
0+525	25	8.9	9.25	0.38	87.35
0+550	25	9.55	9.225	0.38	86.74
0+575	25	10	9.775	0.38	91.64
0+600	25	10.3	10.15	0.37	94.97
0+625	25	10.8	10.55	0.37	98.38
0+650	25	10.95	10.875	0.37	101.31
0+675	25	11.3	11.125	0.37	103.39
0+700	25	11.35	11.325	0.37	105.22
0+725	25	11.3	11.325	0.37	105.25

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

حصر أعمال توريد وفرش طبقة اساس

ST.	الطول	العرض	متوسط عرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+750	25	11.3	11.3	0.37	105.02
0+775	25	10.95	11.125	0.37	103.64
0+800	25	10.15	10.55	0.37	98.81
0+825	25	9.7	9.925	0.38	93.23
0+850	25	10.35	10.025	0.37	93.77
0+875	25	10.65	10.5	0.37	98.01
0+900	25	10.95	10.8	0.37	100.61
0+925	25	11.7	11.325	0.37	104.97
0+950	25	11.9	11.8	0.37	109.22
0+975	25	12.05	11.975	0.37	110.73
1+000	25	9.65	10.85	0.38	101.96
1+025	25	6.2	7.925	0.38	76.18
مروحة شمال					
0+000	5	12.5	12.5	0.40	25.00
0+010	10	11	11	0.40	44.00
0+020	10	10.5	10.5	0.40	42.00
0+030	10	10.3	10.3	0.40	41.20
0+040	10	10	10	0.40	40.00
0+050	5	12.4	12.4	0.40	24.80
مروحة يمين					
0+000	5	17	17	0.32	27.20
0+010	10	18	18	0.40	72.00
0+020	10	19	19	0.40	76.00
0+030	10	20	20	0.40	80.00
0+040	10	20	20	0.40	80.00
0+050	10	12.5	12.5	0.40	50.00
0+060	5	16.4	16.4	0.28	22.96
منزل (١) المدرسة					
	25	7.85	7.85	0.35	68.69
منزل (٢) المدرسة					

مهندس الهيئة




مهندس الشركة
أ. د. ع. د.


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال توريد وفرش طبقة اساس

ST.	الطول	العرض	متوسط عرض	متوسط السمك	الاجمالي
	27	6.55		0.20	35.37
	16	6.5		0.20	20.80
منزل (٣)					
	7.8	8		0.2	12.48
منزل (٤)	13	4		0.2	10.40
الاجمالي					5001.50

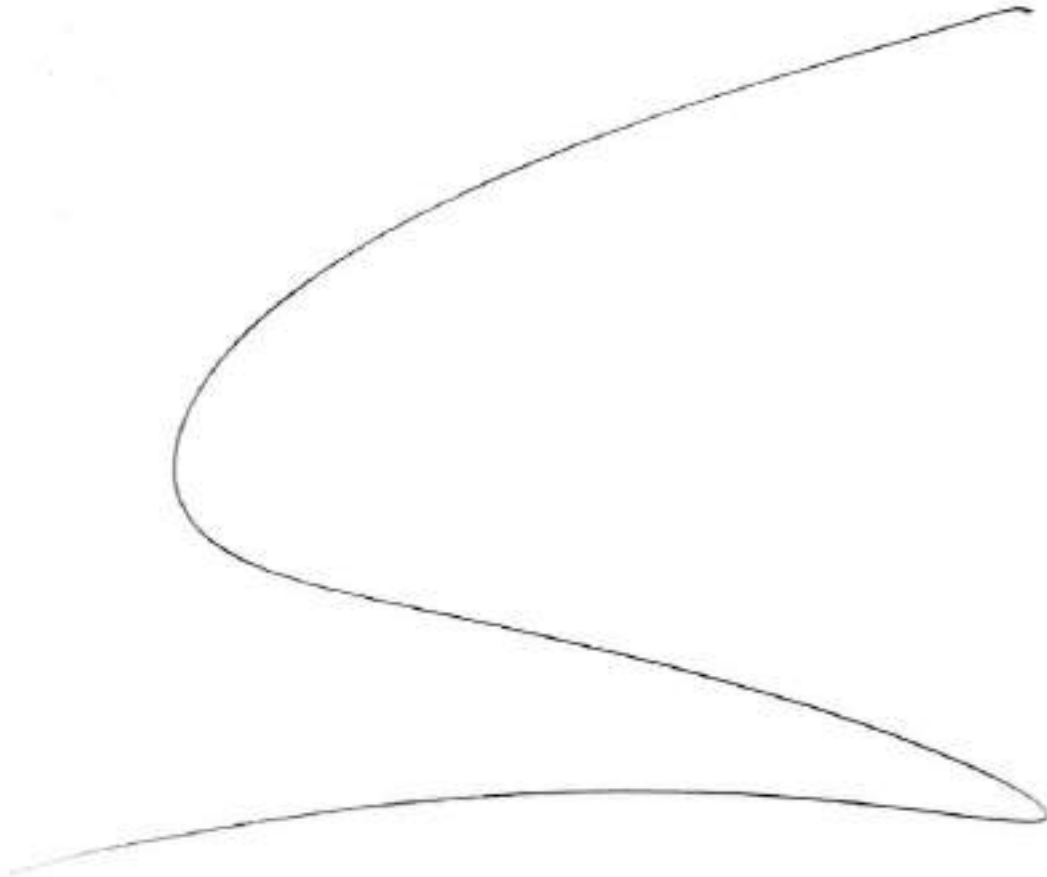

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٥/٢/٢٠٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)

حصر أعمال انشاء طبقه تشريب M.C.O

بند رقم (٤)	الوحدة	ST.	الاجمالي
أعمال انشاء طبقه تشريب " برايم " باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات ... الخ	م ^٢	FROM ST. 0+000 TO ST.1+025 & مناطق مختلفه	14850.83
الاجمالي			14850.83

مهندس الشركة

م. ا. م. م.

مهندس الهيئة

د. م. م. م.

د. م. م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)

حصر أعمال انشاء طبقة تشرية M.C.O

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+000	0	20.05	20.05	0.00
0+025	25	16.4	18.225	455.63
0+050	25	15.7	16.05	401.25
0+075	25	15.2	15.45	386.25
0+100	25	14.55	14.875	371.88
0+125	25	13.45	14	350.00
0+150	25	14	13.725	343.13
0+175	25	14.2	14.1	352.50
0+200	25	14	14.1	352.50
0+225	25	13.6	13.8	345.00
0+250	25	14.4	14	350.00
0+275	25	12.2	13.3	332.50
0+300	25	9.8	11	275.00
0+325	25	8.2	9	225.00
0+350	25	7.4	7.8	195.00
0+375	25	7.6	7.5	187.50
0+400	25	7.7	7.65	191.25
0+425	25	8.25	7.975	199.38
0+450	25	8.9	8.575	214.38
0+475	25	9.6	9.25	231.25
0+500	25	9.6	9.6	240.00
0+525	25	8.9	9.25	231.25
0+550	25	9.55	9.225	230.63
0+575	25	10	9.775	244.38
0+600	25	10.3	10.15	253.75
0+625	25	10.8	10.55	263.75
0+650	25	10.95	10.875	271.88
0+675	25	11.3	11.125	278.13
0+700	25	11.35	11.325	283.13
0+725	25	11.3	11.325	283.13
0+750	25	11.3	11.3	282.50
0+775	25	10.95	11.125	278.13
0+800	25	10.15	10.55	263.75
0+825	25	9.7	9.925	248.13
0+850	25	10.35	10.025	250.63
0+875	25	10.65	10.5	262.50
0+900	25	11.45	11.05	276.25
0+925	25	11.7	11.575	289.38
0+950	25	11.9	11.8	295.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)

حصر أعمال إنشاء طبقة تشريب M.C.O

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الإجمالي
0+975	25	12.05	11.975	299.38
1+000	25	9.65	10.85	271.25
1+025	25	6.2	7.925	198.13
0+000	0	11.5	11.5	0.00
0+025	25	12.75	12.125	303.13
0+050	25	14.2	13.475	336.88
0+075	25	16.45	15.325	383.13
0+100	25	29.3	22.875	571.88
0+125	25	29.3	29.3	732.50
0+136.6	11.6	20.5	24.9	288.84
0+148.4	11.8	12.4	16.45	194.11
منطقة الحمام	8.4	3.8	3.8	31.92
نزلة المدرسة (١)	28.9	7.3	7.3	210.97
نزلة المدرسة (٢)	19	7.4	7.4	140.60
	15.3	6.7	6.7	102.51
الإجمالي				14850.83

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

إبراهيم

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٦ سم

بند رقم (٥)	الوحدة	ST.	الاجمالي
اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج ٣د بسمك ٦ سم باستخدام سن الأحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المعتمدة... الخ	٢م	FROM ST. 0+000 TO ST.1+025 & مناطق مختلفه	17003.33
الاجمالي			17003.33

مهندس الشركة

٢٠١٥

مهندس الهيئة

٢٠١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقاقين ، أبو حماد بطول (١.٥) كم محافظة الشرقية .
تلفيد / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر أعمال إنشاء الطبقة الرابطة بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاحداث
0+000	0	20.05	20.05	0.00
0+025	25	18.4	18.225	855.63
0+050	25	15.7	16.05	871.25
0+075	25	15.2	15.45	886.25
0+100	25	14.55	14.875	871.88
0+125	25	13.45	14	850.00
0+150	25	14	13.725	843.13
0+175	25	14.2	14.1	852.50
0+200	25	14	14.1	852.50
0+225	25	13.6	13.8	845.00
0+250	25	14.4	14	850.00
0+275	25	12.2	13.3	832.50
0+300	25	11.8	12	800.00
0+325	25	11.3	11.55	288.75
0+350	25	11.45	11.375	284.38
0+375	25	11.5	11.475	286.88
0+400	25	11.45	11.475	286.88
0+425	25	11.45	11.45	286.25
0+450	25	12.1	11.775	294.38
0+475	25	12.3	12.2	305.00
0+500	25	12	12.15	303.75
0+525	25	11.4	11.7	292.50
0+550	25	11.55	11.475	286.88
0+575	25	12.15	11.85	296.25
0+600	25	12.35	12.25	306.25
0+625	25	12.7	12.525	313.13
0+650	25	12.7	12.7	317.50
0+675	25	13.1	12.9	322.50
0+700	25	12.65	12.875	321.88
0+725	25	12.5	12.575	314.38
0+750	25	12.35	12.425	310.63
0+775	25	12.1	12.225	305.63
0+800	25	11.65	11.875	296.88
0+825	25	11.9	11.775	294.88
0+850	25	12.55	12.225	305.63
0+875	25	12.8	12.675	316.88
0+900	25	13.2	13	325.00
0+925	25	13.85	13.525	338.13
0+950	25	19	16.425	430.63

مهندس الشركة


مهندس الشركة
أ. م. ش. م.
م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١.٥) كم محافظة الشرقية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

ميد رقم (٥)

حجم أعمال إنشاء الطبقة الواطئة بسماك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+975	25	15.2	15.1	877.50
1+000	25	18.1	18.75	868.75
1+025	25	18.4	16.85	896.75
0+000	0	11.5	11.5	0.00
0+025	25	12.75	12.125	303.13
0+050	25	14.2	13.875	346.88
0+075	25	16.45	15.325	383.13
0+100	25	29.3	22.875	571.88
0+125	25	29.3	29.3	732.50
0+136.6	11.6	20.5	24.9	288.84
0+148.4	11.8	12.4	16.45	194.11
منطقة النحام	8.4	3.8	3.8	31.92
نزلة المدرسة (١)	28.9	7.3	7.3	210.97
نزلة المدرسة (٢)	19	7.4	7.4	140.60
	15.3	6.7	6.7	102.51
الاجمالي				17103.88

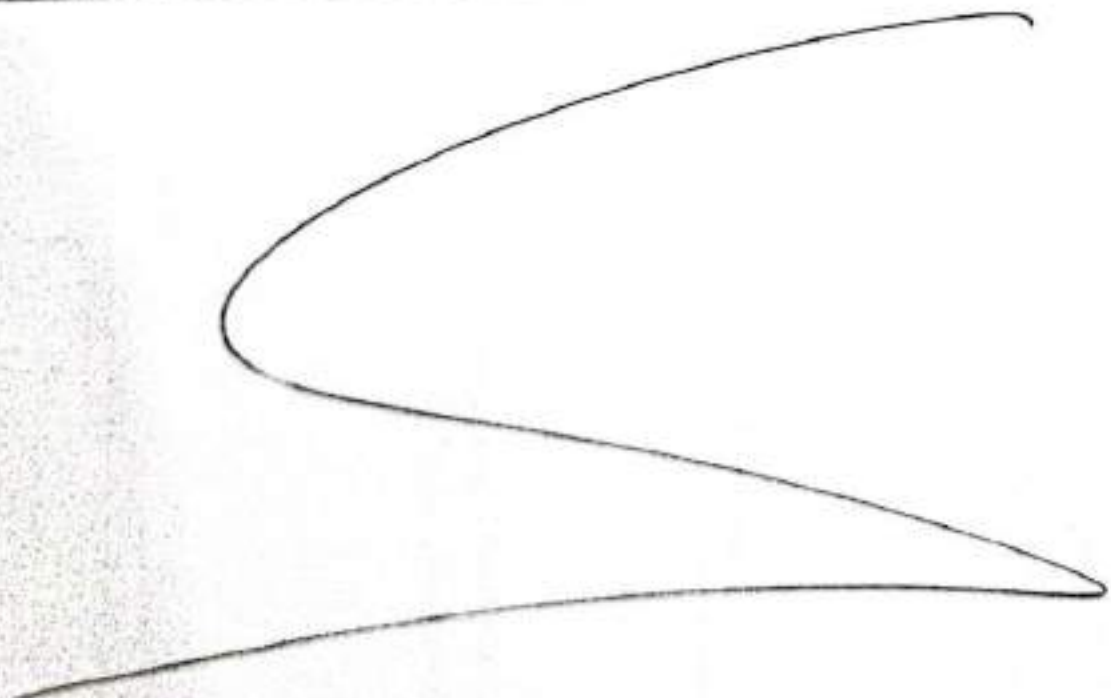

مهندس الشركة
المرشاد

مهندس الهيئة


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)


إجمالي أعمال توريد ورش طبقة لصق R.C

بند رقم (٦)	الوحدة	ST.	الاجمالي
بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير R.C ... الخ	م ^٢	FROM ST. 0+300 TO ST.1+025	2152.50
		FROM ST. 0+100 TO ST.0+625 لإستكمال طريق الزقازيق - ديرب	7548.75
الاجمالي			9701.25

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزفازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال إنشاء طبقة التصلب R.C

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+300	0	2	2	0.00
0+325	25	3.1	2.55	63.75
0+350	25	4.05	3.575	89.38
0+375	25	3.9	3.975	99.38
0+400	25	3.75	3.825	95.63
0+425	25	3.2	3.475	86.88
0+450	25	3.2	3.2	80.00
0+475	25	2.7	2.95	73.75
0+500	25	2.4	2.55	63.75
0+525	25	2.5	2.45	61.25
0+550	25	2	2.25	56.25
0+575	25	2.15	2.075	51.88
0+600	25	2.05	2.1	52.50
0+625	25	1.9	1.975	49.38
0+650	25	1.75	1.825	45.63
0+675	25	1.8	1.775	44.38
0+700	25	1.3	1.55	38.75
0+725	25	1.2	1.25	31.25
0+750	25	1.05	1.125	28.13
0+775	25	1.15	1.1	27.50
0+800	25	1.5	1.325	33.13
0+825	25	2.2	1.85	46.25
0+850	25	2.2	2.2	55.00
0+875	25	2.15	2.175	54.38
0+900	25	2.75	2.45	61.25
0+925	25	2.15	2.45	61.25
0+950	25	7.1	4.625	115.63
0+975	25	7.15	7.125	178.13
1+000	25	8.65	7.9	197.50
1+025	25	8.2	8.425	210.63
الاجمالي				2152.50

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٣١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


أعمال رش طبقة لصق R.C (لاستكمال طريق دهب الزقازيق)

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+100	0	12.5	12.50	0
0+125	25	12	12.25	306.25
0+150	25	11.9	11.95	298.75
0+175	25	13	12.45	311.25
0+200	25	14.3	13.65	341.25
0+225	25	12.8	13.55	338.75
0+250	25	11.1	11.95	298.75
0+275	25	11.1	11.10	277.5
0+300	25	11.5	11.30	282.5
0+325	25	12.1	11.80	295
0+350	25	14.2	13.15	328.75
0+375	25	18	16.10	402.5
0+400	25	17.7	17.85	446.25
0+425	25	19.3	18.50	462.5
0+450	25	17	18.15	453.75
0+475	25	16	16.50	412.5
0+500	25	15.4	15.70	392.5
0+525	25	15	15.20	380
0+550	25	19.6	17.30	432.5
0+575	25	14.7	17.15	428.75
0+600	25	12.7	13.70	342.5
0+625	25	12.6	12.65	316.25
الاجمالي				7548.75

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٧)


إجمالي أعمال انشاء طبقة سطحية بسمك ٥ سم

بند رقم (٧)	الوحدة	ST.	الاجمالي
بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج ٤ ج علي الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك ... الخ	م ^٢	FROM ST. 0+100 TO لإستكمال طريق ST.0+625 الزقازيق - ديرب	7548.75
الاجمالي			7548.75

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزفازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمعاونات العامة


أعمال فرش الطبقة السطحية بسمك ٥ سم (لاستكمال طريق ديرب الزفازيق)

ST	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+100	0	12.5	12.50	0
0+125	25	12	12.25	306.25
0+150	25	11.9	11.95	298.75
0+175	25	13	12.45	311.25
0+200	25	14.3	13.65	341.25
0+225	25	12.8	13.55	338.75
0+250	25	11.1	11.95	298.75
0+275	25	11.1	11.10	277.5
0+300	25	11.5	11.30	282.5
0+325	25	12.1	11.80	295
0+350	25	14.2	13.15	328.75
0+375	25	18	16.10	402.5
0+400	25	17.7	17.85	446.25
0+425	25	19.3	18.50	462.5
0+450	25	17	18.15	453.75
0+475	25	16	16.50	412.5
0+500	25	15.4	15.70	392.5
0+525	25	15	15.20	380
0+550	25	19.6	17.30	432.5
0+575	25	14.7	17.15	428.75
0+600	25	12.7	13.70	342.5
0+625	25	12.6	12.65	316.25
				7548.75
				الاجمالي

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصر أعمال الترميم

بند رقم (٨)	الوحدة	ST.	الاجمالي
أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي علي الساخن تدرج (٣ د (... الخ	م ٣	FROM ST. 0+000 TO ST.1+025	80.00
الاجمالي			80.00

مهندس الشركة

أحمد رضا

مهندس الهيئة

أحمد رضا

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (10-أ)


حصر أعمال الحفر

بند رقم (10-أ)	الوحدة	ST.	الاجمالي
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	٣م	FROM ST. 0+000 TO ST.1+025	15355.34
الاجمالي			15355.34

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٠-أ)

حصر أعمال الحفر

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	الاجمالي
0+000	12.5	17.75	0	1.2	0.00
0+025	25	15.45	16.6	1.4	581.00
0+050	25	14.65	15.05	1.3	489.13
0+075	25	14.25	14.45	1.25	451.56
0+100	25	13.45	13.85	1.3	450.13
0+125	25	12.75	13.1	1.35	442.13
0+150	25	12.75	12.75	1.25	398.44
0+175	25	12.75	12.75	1.4	446.25
0+200	25	12.75	12.75	1.35	430.31
0+225	25	12.35	12.55	1.25	392.19
0+250	25	11.55	11.95	1.35	403.31
0+275	25	11.15	11.35	1.4	397.25
0+300	25	9.05	10.1	1.3	328.25
0+325	25	7.45	8.25	1.25	257.81
0+350	25	6.65	7.05	1.35	237.94
0+375	25	6.85	6.75	1.45	244.69
0+400	25	6.95	6.9	1.3	224.25
0+425	25	7.5	7.225	1.25	225.78
0+450	25	8.15	7.825	1.4	273.88
0+475	25	8.85	8.5	1.35	286.88
0+500	25	8.85	8.85	1.25	276.56
0+525	25	8.15	8.5	1.45	308.13
0+550	25	8.8	8.475	1.2	254.25
0+575	25	9.25	9.025	1.25	282.03
0+600	25	9.55	9.4	1.5	352.50
0+625	25	10.05	9.8	1.55	379.75
0+650	25	10.2	10.125	1.3	329.06
0+675	25	10.55	10.375	1.65	427.97
0+700	25	10.6	10.575	1.6	423.00
0+725	25	10.55	10.575	1.9	502.31
0+750	25	10.55	10.55	1.85	487.94

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أ. م. م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٠-١)

حصر أعمال الحفر

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	الاجمالي
0+775	25	10.2	10.375	1.55	402.03
0+800	25	9.4	9.8	1.6	392.00
0+825	25	8.95	9.175	1.6	367.00
0+850	25	9.6	9.275	1.7	394.19
0+875	25	9.9	9.75	1.8	438.75
0+900	25	10.2	10.05	1.85	464.81
0+925	25	10.95	10.575	1.65	436.22
0+950	25	11.15	11.05	1.4	386.75
0+975	25	11.3	11.225	1.45	406.91
1+000	25	8.9	10.1	1.6	404.00
1+025	25	5.45	7.175	1.55	278.03
الاجمالي					15355.34

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
١٣٤٤


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١١)


حصر أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %)

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١١)
10913.19	FROM ST. 0+000 TO ST.1+025	٣م	أعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة متدرجة خالية من الشوائب لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %) ... الخ
682.50	الحارة الخدمية		
11595.69	الاجمالي		

مهندس الهيئة




مهندس الشركة




عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١١)

حصر أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %)

ST.	الطول	العرض	متوسط عرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	12.5	17.75	0	0	0.00
0+025	25	15.45	16.6	0.49	203.35
0+050	25	14.65	15.05	0.54	203.18
0+075	25	14.25	14.45	0.59	213.14
0+100	25	13.45	13.85	0.55	190.44
0+125	25	12.75	13.1	0.75	245.63
0+150	25	12.75	12.75	0.995	317.16
0+175	25	12.75	12.75	1.05	334.69
0+200	25	12.75	12.75	1.03	328.31
0+225	25	12.35	12.55	1.36	426.70
0+250	25	11.55	11.95	1.46	436.18
0+275	25	11.15	11.35	1.43	405.76
0+300	25	9.05	10.1	1.01	255.03
0+325	25	7.45	8.25	0.71	146.44
0+350	25	6.65	7.05	1.23	216.79
0+375	25	6.85	6.75	1.21	204.19
0+400	25	6.95	6.9	1.23	212.18
0+425	25	7.5	7.225	1.335	241.13
0+450	25	8.15	7.825	1.215	237.68
0+475	25	8.85	8.5	1.13	240.13
0+500	25	8.85	8.85	1.04	230.10
0+525	25	8.15	8.5	1.07	227.38
0+550	25	8.8	8.475	1.49	315.69
0+575	25	9.25	9.025	1.685	380.18

مهندس الشركة

أ. م. م. م.

مهندس الهيئة

أ. م. م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١١)

حصر أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %)

ST.	الطول	العرض	متوسط عرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+600	25	9.55	9.4	1.75	411.25
0+625	25	10.05	9.8	0.54	132.30
0+650	25	10.2	10.125	0.55	139.22
0+675	25	10.55	10.375	0.58	150.44
0+700	25	10.6	10.575	0.67	177.13
0+725	25	10.55	10.575	0.75	198.28
0+750	25	10.55	10.55	0.55	145.06
0+775	25	10.2	10.375	0.69	178.97
0+800	25	9.4	9.8	0.57	139.65
0+825	25	8.95	9.175	0.95	217.91
0+850	25	9.6	9.275	0.98	227.24
0+875	25	9.9	9.75	0.94	229.13
0+900	25	10.2	10.05	1.05	263.81
0+925	25	10.95	10.575	1.07	282.88
0+950	25	11.15	11.05	1.07	295.59
0+975	25	11.3	11.225	1.62	454.61
1+000	25	8.9	10.1	0.91	229.78
1+025	25	5.45	7.175	0.2	35.88
مروحة شمال					
0+000	5	12.50		0.66	41.25
0+010	10	11.00		0.54	59.77
0+020	10	10.50		0.90	94.85
0+030	10	10.30		0.99	101.97
0+040	10	10.00		0.86	86.00
0+050	5	12.40		0.50	31.21
مروحة يمين					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الرقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١١)

حصر أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %)

ST.	الطول	العرض	متوسط عرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+000	5		17.00	0.00	0.00
0+010	10		18.00	0.17	30.60
0+020	10		19.00	0.45	85.50
0+030	10		20.00	0.42	83.00
0+040	10		20.00	0.12	24.50
0+050	10		12.50	0.16	20.31
0+060	5		16.40	0.00	0.00
منزل (١) المدرسة					
	25		7.85	0.35	68.69
منزل (٢) المدرسة					
	27		6.55	0.15	26.53
	16		6.50	0.15	15.60
منزل (٣)					
	7.8		8.00	0.20	12.48
منزل (٤)	13		4.00	0.20	10.40
الاجمالي					10913.19

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١١)

حصر أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %)

ST.	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
الحارة الخدمية	455	3	0.5	682.50
الاجمالي				682.50

مهندس الشركة

٣١/٥/٢٠٢٠

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٥)

حصر أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش

بند رقم (١٥)	الوحدة	ST.	الاجمالي
أعمال رفع منسوب المطابق و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) حتي منسوب الرصف الجديد ... الخ	عدد	FROM ST. 0+000 TO ST.1+025	15.00
الاجمالي			15.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

أ. ع. ع. ع.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٦)


حصر أعمال توريد وتركيب بالوعات صرف مطر

بند رقم (١٦)	الوحدة	ST.	الاجمالي
أعمال توريد وتركيب بالوعات صرف مطر مزودة بغطاء GRB ومحمل عليها مواسير قطر ٦ بوصة P.V.C ... الخ	عدد	FROM ST. 0+000 TO ST.1+025	3.00
الاجمالي			3.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


بند رقم (١٧)
إجمالي أعمال الخرسانة العادية للجوائز

الكمية	الوحده	ST.	البند (١٧)
773.39	٣م	القطاع الاول	عمال الشاه حائط ساند من الخرسانة العادية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لايقبل عن ٣٠٠ كجم / ٣م واجهاد لايقبل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ والسعر لايشمل حديد التسليح .
392.19		القطاع الثاني	
465.92		القطاع الثالث	
104.16		القطاع الرابع	
474.11		القطاع الخامس	
285.72		القطاع السادس	
712.81		القطاع السابع	
1287.86		القطاع الثامن	
56.25		القطاع التاسع	
23.99		حوائط الغرف	
4576.4	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)


حصر أعمال الخرسانة العادية للحوائط القطاع الاول

الاعمال	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي
القدمة	٣م	123.25	3.25	0.75	300.42
القصية الاولى		123.25	1.75	1.00	215.69
القصية الثانية		123.25	1.25	1.25	192.58
القصية الثالثة		123.25	0.75	0.70	64.71
الاجمالي					773.39

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


بند رقم (١٧)
 حصر أعمال الخرسانة العادية للحوائط القطاع الثاني

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الوحدة	الاعمال
152.34	0.75	3.25	62.5	٢م	القدمة
109.38	1.00	1.75	62.5		القصبة الاولى
97.66	1.25	1.25	62.5		القصبة الثانية
32.81	0.70	0.75	62.5		القصبة الثالثة
392.19	الاجمالي				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

حصر أعمال الخرسانة العادية للحوائط القطاع الثالث

الاعمال	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي
القدمة	٣م	74.25	3.25	0.75	180.98
القصة الاولى		74.25	1.75	1.00	129.94
القصة الثانية		74.25	1.25	1.25	116.02
القصة الثالثة		74.25	0.75	0.70	38.98
الاجمالي					
					465.92

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
أ. د. محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

حصر أعمال الخرسانة العادية للحوالط القطاع الرابع

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الوحدة	الاعمال
40.22	0.75	3.25	16.5	٣م	القدمة
28.88	1.00	1.75	16.5		القصة الاولى
25.78	1.25	1.25	16.5		القصة الثانية
9.28	0.75	0.75	16.5		القصة الثالثة
104.16	الاجمالي				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
٣١/٥/٢٠٢١

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)


حصر أعمال الخرسانة العادية للحوائط القطاع الخامس

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الوحدة	الاعمال
171.84	0.75	3.25	70.5	٣م	القدمة
123.38	1.00	1.75	70.5		القصبة الاولى
110.16	1.25	1.25	70.5		القصبة الثانية
68.74	1.30	0.75	70.5		القصبة الثالثة
474.11	الاجمالي				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

حصر أعمال الخرسانة العادية للحوائط القطاع السادس

الاعمال	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي
القدمة	٣م	42.25	3.25	0.75	102.98
القصبة الاولى		42.25	1.75	1.00	73.94
القصبة الثانية		42.25	1.25	1.25	66.02
القصبة الثالثة		42.25	0.75	1.35	42.78
الاجمالي					285.72

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

١٢/٥/٢٠١٥



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

حصر أعمال الخرسانة العادية للحوائط القطاع السابع

الاعمال	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي
القدمة	٣م	104.25	3.25	0.75	254.11
القصبة الاولى		104.25	1.75	1.00	182.44
القصبة الثانية		104.25	1.25	1.25	162.89
القصبة الثالثة		104.25	0.75	1.45	113.37
الاجمالي					712.81

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
أ. م. م. م.
أ. م. م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


بند رقم (١٧)
حصر أعمال الخرسانة العادية للحوائط القطاع الثامن

الاعمال					
القدمة					
القصية الاولى					
القصية الثانية					
القصية الثالثة					
القصية الرابعة					
الاجمالي					

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

حصر أعمال الخرسانة العادية للحوائط القطاع التاسع

الاعمال	الوحدة	الطول	العرض	الارتفاع	الاجمالي
القدمة	٣م	11.25	3.25	0.75	27.42
القصة الاولى		11.25	1.75	1.00	19.69
القصة الثانية		11.25	1.25	0.65	9.14
الاجمالي					56.25

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

إبراهيم

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

حصر أعمال الخرسانة العادية لحوائط الغرف

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الوحدة	الاعمال
6.15	1.10	2.38	2.35	٣م	غرفه (١)
6.22	1.15	2.35	2.3		غرفه (٢)
5.70	1.05	2.33	2.33		غرفه (٣)
5.92	1.10	2.34	2.3		غرفه (٤)
23.99	الاجمالي				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

٣٠
٢٠
١٠
٥
٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٨)


إجمالي أعمال الخرسانة لاسقف الغرف

الكمية	الوحده	ST.	البند (١٨)
8.72	٣م	اسقف الغرف	أعمال إنشاء خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والحوائط مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / ٣م واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح .
8.72	الإجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


بند رقم (١٨)
حصر أعمال اسقف الغرف

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الوحدة	الاعمال
2.24	0.40	2.38	2.35	٣م	غرفه (١)
2.16	0.40	2.35	2.3		غرفه (٢)
2.17	0.40	2.33	2.33		غرفه (٣)
2.15	0.40	2.34	2.3		غرفه (٤)
8.72	الاجمالي				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة


بند رقم (١٩)
إجمالي أعمال توريد ورص الحديد

البند (١٩)	ST,	الوحده	الطول	الارتفاع	الكمية (طن)
اعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢,٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية طبقا للرسومات وعمل الوصلات ونقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهيو العمل نهوا كاملا لاسول الصناعة والرسومات والمواصفات .	القطاع الاول	طن	123.25	3.7	2.397
	القطاع الثاني		62.5	3.7	1.285
	القطاع الثالث		74.25	3.7	1.526
	القطاع الرابع		16.5	3.75	0.335
	القطاع الخامس		70.5	4.3	1.665
	القطاع السادس		42.25	1.59	0.232
	القطاع السابع		104.25	4.45	2.519
	القطاع الثامن		183	4.95	4.931
	القطاع التاسع		11.25	2.4	0.144
	اسقف الغرف		2.35	0.4	0.177
			2.3	0.4	0.171
			2.33	0.4	0.172
			2.3	0.4	0.170
الإجمالي					15.722

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



محضر استلام ابتدائي

لعملية :- رفع كفاءة طريق الرقازيق / ابو حماد بطول ١.٥ كم

تنفيذ :- مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أشراف :- المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٧٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦ والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاينه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

١- المهندس / محمد راجح

٢- المهندس / محمد فتحي

٣- المهندس / رمضان علي محمد

٤- المهندس / ممتاز جمال

٥- المهندس / احمد سمير

٦- المهندس / وليد حمدي

مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة المركزية - رئيسا

مدير ادارة بالادارة المركزية للطرق - عضوا

ادارة ضبط الجودة - عضوا

ادارة المعامل المركزية - عضوا

المنطقة المشرفة - عضوا

مندوب الشركة المنفذة - عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية ودفع الشروط والمواصفات وخطاب المنطقة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥ ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وقامت اللجنة باخذ جسات لقياس سمكات طبقات الرصف الاسفلتية (مرفق كشف) وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية الاعمال المنفذة -

- اعمال توسعة وتقوية واعادة رصف طريق الرقازيق/ ابوحماد وتتضمن اعمال الطبقة الرابطة وطبقة اساس وجوانط خرسانية للحمايات وغرف صرف مياه أمطار .

أولا :- اعمال الطبقة السطحية :-

• تم تنفيذها على طريق الرقازيق / ديرب نجم / السنبلاوين بموافقة السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا (مرفق) .

• تم استلام الطبقة بمحضر استلام ابتدائي رقم (١٦٠٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ وجاري تقييم الطبقة السطحية ضمن مشروع الرقازيق/ ديرب نجم / السنبلاوين .

ثانيا :- اعمال الطبقة الرابطة :-

• مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود عدم تجانس وسوء مناسيب وسوء لحامات طولية وعرضية في بعض القطاعات المتفرقة وقدرة اللجنة بنسبة ٥٠٪ من الكميات المنفذة

ثالثا :- اعمال الجوانط الخرسانية :-

• مقبولة بصفة عامة وقد تلاحظ عدم نهو سطح الخرسانة نهوا جيدا وظهور بعض الزواجين في بعض القطاعات المتفرقة وقدرة اللجنة المسطحات المعيبة بنسبة ٧٪ من اجمالي الكميات المنفذة .

رابعا :- اعمال غرف صرف مياه الامطار :-

• تلاحظ عدم مطابقتها لاصول الصناعة وبراغي استبعادها من هذا الاستلام الابتدائي .

التوصيات اللجنة :-

- ١- يتم خصم نسبة ٥٪ من الكميات المعيبة بالبند ثانيا الخاص بالطبقة الرابطة .
 - ٢- يتم خصم ٧ ٪ من الكميات المعيبة بالبند ثالثا .
 - ٣- يراعى خصم قيمة ١٠٠٪ من البند رابعا الخاص بأعمال إنشاء غرف صرف مياه الأمطار .
 - ٤- على الشركة المنفذة سرعة ترميم أماكن العيوب فوراً تحت إشراف المنطقة المشرفة .
 - ٥- على المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والأعمال المنفذة بصفة عامة وإبلاغ الشركة لإصلاح أي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان وتركيب كافة وسائل تأمين سلامة المرور : علامات إرشادية وتحذيرية وتخطيط - مهندسات سرعة ١٠٠ الخ) .
 - ٦- على المنطقة المشرفة موافاة الإدارة المركزية للطرق بقوائم الكميات الختامية والتجارب المعملية التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ والمستخلص الختامي لاتمام اجراءات التقييم .
 - ٧- على متدوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم .
 - ٨- الحصر مسئولية المنطقة .
- وعليه تری اللجنة انه لا مانع من استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة بنهـو الأعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥ هو بداية فترة الضمان للأعمال المشار إليها عليه .

وعلي هذا جري التوقيع ...

١- 

٤- 

٢- 

٥- 

٣- 

١- 

كشف سماكات

لعملية :- رفع كفاءة طريق الزقازيق / ابو حماد بطول ١.٥ كم

تنفيذ :- مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

اشراف :- المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

رابعة بسمك ٦ سم	
٧	٠.٢٠٠
٦.٥	٠.٧٥٠
٦.٥	٠.٩٠٠

٥

٣

١

٦

٢

٢

محضر التقييم الخاص بعملية

مشروع / رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد بطول ١.٥ كم

إشراف :- المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

تنفيذ :- شركة الوليد للمقاولات و رصف الطرق

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ وبناءً على القرار الإداري رقم (٧٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦ الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣٠ وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف ، وتقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الاستلام ، تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|-----------------------------|---|
| (١) المهندس/ محمد راجح | مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة المركزية - رئيسا |
| (٢) المهندس / محمد فتحى | مدير إدارة بالإدارة المركزية للطرق - عضوا |
| (٣) المهندس/ رمضان على محمد | الإدارة العامة لضبط الجودة - عضوا |
| (٤) المهندس/ ممتاز جمال | الإدارة العامة للمعامل المركزية - عضوا |
| (٥) المهندس/ أحمد سمير | مندوب المنطقة المشرفة - عضوا |
| (٦) المهندس/ وليد حمدي | مندوب الشركة المنفذة - عضوا |

أولا : خصومات الفحص الظاهري على محضر الاستلام الابتدائي :

طبقا للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ٦٧٩١٨.٥٩ جنيها من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالآتي :

❖ الخصم على سطح الطريق الأسفلتي (الطبقة الرابطة) = $١٤٦ * ٠.٠٥ * ٠.٠٥ = ١٧٠٠٣.٣٣$ جنيها

❖ الخصم على الحوائط الخرسانية = $٢١٥٠ * ٠.٠٧ * ٠.٠٧ = ٤٥٧٦.٤$ جنيها

❖ الخصم على غرف صرف الأمطار = $٣ * ٤٥٠٠ = ١٣٥٠٠$ جنيها

ثانيا : الخصومات على نتائج الاختبارات العملية :-

و بناءً على نتائج الاختبارات العملية والحقلية التي تمت على أعمال العملية عاليه تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية التي بلغت خصم مبلغ ٩١٢٣.١٤ جنيهاً فقط لاغير من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبياتها كالتالي :-

• الخصم على الأساس : لا يوجد خصم .

• الخصم على تدرج الطبقة الرابطة ٣ د : يتم خصم مبلغ وقدره ٩١٢٣.١٤ جنيها

• الخصم على سماكات الطبقة الرابطة : لا يوجد خصم .

• الخصم على إجهاد الحوائط الخرسانية : لا يوجد خصم .

❖ تم تقييم أعمال الطبقة السطحية ضمن عملية " استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق ديرب نجم السبلاوين بطول ٨ كم " المنفذة بعدد آخر تنفيذ نفس الشركة .

❖ الحصر الختامي لكميات العملية ونتائج الاختبارات العملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسؤولية على لجنة الاستلام والتقييم .

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ٧٧٠٤١.٧٣ جنيهاً (سبعة وسبعون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً و (١٠٠/٧٣) جنيه مصري فقط لا غير .

التوقيعات :

٦- رئيس هيئة
٥-
٤-
٣-
٢-
١-
١

القيمة ذات : ا) أصل إنشاء الشبكة الربطية (مخرج = 0)

رقم الحساب	وصف الحساب	المبلغ
1000	رصيد	1000
1001	مبيعات	1000
1002	مبيعات	1000
1003	مبيعات	1000
1004	مبيعات	1000
1005	مبيعات	1000
1006	مبيعات	1000
1007	مبيعات	1000
1008	مبيعات	1000
1009	مبيعات	1000
1010	مبيعات	1000
1011	مبيعات	1000
1012	مبيعات	1000
1013	مبيعات	1000
1014	مبيعات	1000
1015	مبيعات	1000
1016	مبيعات	1000
1017	مبيعات	1000
1018	مبيعات	1000
1019	مبيعات	1000
1020	مبيعات	1000
1021	مبيعات	1000
1022	مبيعات	1000
1023	مبيعات	1000
1024	مبيعات	1000
1025	مبيعات	1000
1026	مبيعات	1000
1027	مبيعات	1000
1028	مبيعات	1000
1029	مبيعات	1000
1030	مبيعات	1000
1031	مبيعات	1000
1032	مبيعات	1000
1033	مبيعات	1000
1034	مبيعات	1000
1035	مبيعات	1000
1036	مبيعات	1000
1037	مبيعات	1000
1038	مبيعات	1000
1039	مبيعات	1000
1040	مبيعات	1000
1041	مبيعات	1000
1042	مبيعات	1000
1043	مبيعات	1000
1044	مبيعات	1000
1045	مبيعات	1000
1046	مبيعات	1000
1047	مبيعات	1000
1048	مبيعات	1000
1049	مبيعات	1000
1050	مبيعات	1000
1051	مبيعات	1000
1052	مبيعات	1000
1053	مبيعات	1000
1054	مبيعات	1000
1055	مبيعات	1000
1056	مبيعات	1000
1057	مبيعات	1000
1058	مبيعات	1000
1059	مبيعات	1000
1060	مبيعات	1000
1061	مبيعات	1000
1062	مبيعات	1000
1063	مبيعات	1000
1064	مبيعات	1000
1065	مبيعات	1000
1066	مبيعات	1000
1067	مبيعات	1000
1068	مبيعات	1000
1069	مبيعات	1000
1070	مبيعات	1000
1071	مبيعات	1000
1072	مبيعات	1000
1073	مبيعات	1000
1074	مبيعات	1000
1075	مبيعات	1000
1076	مبيعات	1000
1077	مبيعات	1000
1078	مبيعات	1000
1079	مبيعات	1000
1080	مبيعات	1000
1081	مبيعات	1000
1082	مبيعات	1000
1083	مبيعات	1000
1084	مبيعات	1000
1085	مبيعات	1000
1086	مبيعات	1000
1087	مبيعات	1000
1088	مبيعات	1000
1089	مبيعات	1000
1090	مبيعات	1000
1091	مبيعات	1000
1092	مبيعات	1000
1093	مبيعات	1000
1094	مبيعات	1000
1095	مبيعات	1000
1096	مبيعات	1000
1097	مبيعات	1000
1098	مبيعات	1000
1099	مبيعات	1000
1100	مبيعات	1000
1101	مبيعات	1000
1102	مبيعات	1000
1103	مبيعات	1000
1104	مبيعات	1000
1105	مبيعات	1000
1106	مبيعات	1000
1107	مبيعات	1000
1108	مبيعات	1000
1109	مبيعات	1000
1110	مبيعات	1000
1111	مبيعات	1000
1112	مبيعات	1000
1113	مبيعات	1000
1114	مبيعات	1000
1115	مبيعات	1000



۷۔ ولہ اسی

62-2

5-11

146	سعر الطبقة الرابطة (جنيه)
6	سمك الطبقة الرابطة (سم)
73.00	سعر طبقة اسفلتية بسمك 3 سم جديدة

تقييم عملية : رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد بطول 1.5 كم

إشراف :- المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

تنفيذ :- شركة الوليد للمقاولات ورصف الطرق

تقييم سمك الطبقة الرابطة

م	الحارة	الكميلو متر	الطول الممثل (م)	العرض (م)	سمك الرابطة (سم)	النقص في السمك (سم)	نسبة النقص في السمك (%)	قيمة خصم نقص الكميات (جنيه)	قيمة الخصم الفنى (جنيه)	اجمالي الخصم على الطبقة (جنيه)	الخصم الكلى
	بداية القطاع	0.000									
1	يمين	0.300	525	11.50	7	0	0.00	0	0	0	0
2	يمين	0.750	300	11.50	6.5	0	0.00	0	0	0	0
3	يمين	0.900	675	11.50	6.5	0	0.00	0	0	0	0
	نهاية القطاع							1.500			
											0.00

0.00	اجمالي قيمة الخصم على النقص في السماكات للطبقة الرابطة (بالجنيه)
------	--



١- 

٢- 
٣- 

٥- 

تقييم عملية / رفع كفاءة طريق الزقزريق / أبو حماد بطول ١.٥ كم

إشراف / المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
تأليف / شركة البراد للمقاولات ورصف الطرق
تقييم بنك أصل الأساس

رقم	نوعية التربة	نوع الأساس															نوعية التربة										نوعية التربة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"	33"	34"	35"	36"	37"	38"	39"	40"	41"	42"	43"	44"	45"	46"	47"	48"	49"	50"	51"	52"	53"	54"	55"	56"	57"	58"	59"	60"	61"	62"	63"	64"	65"	66"	67"	68"	69"	70"	71"	72"	73"	74"	75"	76"	77"	78"	79"	80"	81"	82"	83"	84"	85"	86"	87"	88"	89"	90"	91"	92"	93"	94"	95"	96"	97"	98"	99"	100"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

5001.50	إجمالي كمية الأساس تحت عملية (م)
2500.75	كمية الأساس المسكة لكل حارة (م)
0.00	إجمالي الخصم في التربة (م)
0.00	إجمالي الخصم في القاع (م)
0.00	إجمالي الخصم لتبعية رقم ٢٠٠ (م)
0.00	إجمالي الخصم في تطهير (م)
0.00	إجمالي كمية شحومات نسبة لعمق لفتور CBR
0.00	إجمالي الخصم المستحق على صلاحية طبقة الأساس



٦- وليد مرس

٢- ع

٢

٥- ع

٢- ع

١
