

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى - بلبيس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم ١٧.٨٠٠ إلى الكم ١٨.٨٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافانا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات



م



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية
لخط السكة الحديد { الروبيكى - بلييس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠
بطول ١ كم أتجاه بلييس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وتم توريد عدد
(٢٥) كرتونة ورق لمركز المعلومات ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحرير أفى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامي صالح

لسم



ملاحظة: الصورة ليست للرجل

[illegible]

المختتم ذو التاريخ



(ب) الكاتب المنوط

الختام ذو التاريخ



حـ ۹۹

رئيس المصلحة

في ————— سنة ٢٠٢

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء : —————

في التاريخ (ح) تاريخ حالة ٥٥ : رقم : توقيع الكاتب النشط بالسجل :

الحکم ذو التاریخ (ب) ، تبتدئ فی سبیل رسم « ع » ح « برسم : ————— کو بیع انساب استوار بہ کتب :

رُوجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشيء

(٤) قيد في سجل المحفوظات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدر في كشف الشكايات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

الحواشي

(٦) استلمت

إذ: هدف

إمضاء طالب أ.هـ. كاتب التصدير

فر. ————— سنة ٢٠٢

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the gelation time of the epoxy resin.

أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبىكى - بلينس - الماشر من رمضان }
من عملية
مستخلص رقم { ٣ } جارى
بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠ مع شركة سعة للبناء والتخيد
إدارة المة - رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٩٥ المقدر رقم ٢٠٢٣ / ٢ / ٤
المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم اتجاه بلينس بالأمير المياثر

رقم البند	البند	الذئفة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جئلة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جئلة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استماتع أو حجز		الباقى بعد الاستماتع	
		قرض	جئبة	إجراءه	فى هذه المدة	تحت		قرض	جئبة		قرض	جئبة	قرض	جئبة
١-٢	حفر لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	-	٢٠	٣م	٢٤٨٣,٧٧	٢٤٨٣,٧٧	جارى	٤٠	-	-	-	-	٤٠	٤٩١٧٥
١-١	حفر لعمق ١٠ متر	-	٨٢	٣م	١٠٠	١٠٠	جارى	-	-	-	-	-	-	٨٢٠٠
١-٢	حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية عمق ٥ متر	٢٥	٢٥	٣م	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جارى	-	-	-	-	-	-	٢٥٩٩٠٠٠
١-٢	حفر فى التربة الصخرية عدا الصخرية عمق ١٠ متر	٢٩	٢٩	٣م	١٢٤٠٠	١٢٤٠٠	جارى	-	-	-	-	-	-	٤٨٨١١٥
٢-٢	حفر فى التربة الصخرية عمق ١٠ متر	٧٠	٧٠	٣م	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	-	-	-	-	-	-	٣٤١٧٩٠
٢-٢	حفر فى التربة الصخرية عمق ١٠ متر	٢٥	٢٥	٣م	٧٨٨٨١	٧٨٨٨١	جارى	٤٢٥	-	-	-	-	-	١٥٣٢٢٦٣
٢-٢	حفر فى التربة الصخرية عمق ١٠ متر	١٩	١٩	٣م	٣٦٥٨٦	٣٦٥٨٦	جارى	٤٥	-	-	-	-	-	٢٤٩٩٩٩
٢-٢	حفر فى التربة الصخرية عمق ١٠ متر	٨٢٥	٨٢٥	٣م	٣٦٥٨٦	٣٦٥٨٦	جارى	٤٧٥	-	-	-	-	-	٥٣٠٨٧٦٣
٢-٢	حفر فى التربة الصخرية عمق ١٠ متر	-	-	-	-	-	الإجمالى	٤٧٥	-	-	-	-	-	٥٣٠٨٧٦٣
٢-٢	حفر فى التربة الصخرية عمق ١٠ متر	-	-	-	-	-	الإجمالى	٤٧٥	-	-	-	-	-	٥٣٠٨٧٦٣

- ١- طاقم التنفيذ من قبل الحركة متواجد
- ٢- عمل الوق متواجد
- ٣- مهندس عمل الوق متواجد
- ٤- مكتب جهاز الأخراف متواجد
- ٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
- ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
- ٧- بمعرفة الحركة باستخدام الملاصات الإرضائية والتخيرية
- ٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البشور الدرجة بالمختص
- ٩- التقارير متواجدة
- ١٠- بوليمة التأمين متواجدة
- ١١- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال
- ١٢- تم توريد عدد (٢٥) كرتونة ورق لركز المطويات

التوقيع
الاسم
مهندس العملية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البقية بظهرة وقدره : ٤٥٥٩٧٥٧,٠٧٥ جنيهه سبق صرفها للمقاول

التوقيع
الاسم
مهندس العملية

على الحساب
مهندس العملية
مهندس العملية

التوقيع
الاسم
مهندس العملية

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتقدت من

التوقيع
الاسم
مهندس العملية

التوقيع
الاسم
مهندس العملية





حصر اعمال مستخلص رقم (3)

عملية : اكمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)

بنود تم تنفيذها طبقا لقائمة بوليو 2022 حتى زياده قيمة السولار (2023/5/4)

م	البنو	الوحدة	كمية المقايمة المعدلة طبقا لآخر مقايضة	الغلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	المنفذ
1_2	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة المتماسكة و الصخرية	3م	2483.77	20			2483.77

بنود تم تنفيذها طبقا لقائمة يناير 2023 و زياده البنومين (2023/3/6) وزياده السولار (2023/5/4)

م	البنو	الوحدة	كمية المقايمة المعدلة طبقا لآخر مقايضة	الغلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	المنفذ
1_1	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية العادية	3م	3500.00	82.00	100.00	0.00	100.00
1_2	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة المتماسكة و الصخرية	3م	113500.00	23.60	100000.00	19209.93	119209.93
	عمق الحفر حتى 5 م						
	عمق الحفر حتى 10 م		20000.00	25.60	3067.00	29203.96	32270.96
	عمق الحفر حتى 15 م		1.00	27.60	0.00	808.96	808.96
2_2	بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة	3م	13000.00	26.70	12400.00	6589.42	18989.42
	عمق الحفر حتى 5 م						
	عمق الحفر حتى 10 م		3000.00	28.70	0.00	1591.22	1591.22
	عمق الحفر حتى 15 م		1.00	30.70	0.00	0.00	0.00

مهندس المنطقة

مهندس استشاري الهيئة




مهندس الشركة



As Built Volume Report (5+000 to 5+200)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
5+000.00	8.5	0	0
5+020.00	15.64	241.9	241.9
5+040.00	13.58	292.18	534.08
5+060.00	21.2	347.55	881.63
5+080.00	8.95	301.81	1,183.44
5+100.00	10.72	196.8	1,380.23
5+120.00	9.62	203.43	1,583.66
5+140.00	12.86	225.25	1,808.91
5+160.00	13.99	268.93	2,077.85
5+180.00	11.9	258.76	2,336.61
5+200.00	2.81	147.16	2,483.77
Total As built Volume			2,483.77

سمة نلبناء والتشيد
 ش. ذ. م. ح.
 س. ت. (٥٦٠)



كميات الحفر في التربة غير المتماسكة

عمق حفر من (0 إلى 5 م)

شركة سمة للبناء والتشييد قطاع 17+410 إلى 18+410

As built 13 / 1 / 2024

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
17+410.00	9.09	0	0
17+420.00	16.43	127.57	127.57
17+440.00	140.16	1565.82	1693.39
17+460.00	199.19	3393.48	5086.87
17+470.00	210.95	2050.7	7137.57
17+480.00	222.27	2166.11	9303.68
17+500.00	202.77	4250.48	13554.16
17+520.00	231.25	4340.22	17894.38
17+540.00	220.71	4519.59	22413.97
17+560.00	227.1	4478.08	26892.05
17+580.00	226.41	4535.09	31427.14
17+600.00	222.72	4491.31	35918.45
17+620.00	186.42	4091.41	40009.86
17+640.00	184.94	3713.58	43723.44
17+660.00	199.02	3839.61	47563.05
17+680.00	199.32	3983.43	51546.48
17+700.00	189.07	3883.83	55430.31
17+720.00	184.87	3739.4	59169.71
17+740.00	178.34	3632.19	62801.9
17+760.00	186.61	3649.55	66451.45
17+780.00	188.96	3755.7	70207.15
17+800.00	165.98	3549.39	73756.54
17+820.00	148.91	3148.95	76905.49
17+840.00	137.06	2859.75	79765.24
17+860.00	109.78	2468.43	82233.67
17+880.00	130.41	2401.94	84635.61
17+900.00	122.15	2525.59	87161.2
17+920.00	148.57	2707.13	89868.33
17+940.00	151.63	3001.94	92870.27
17+960.00	61.44	2130.73	95001
17+980.00	85.24	1466.84	96467.84
18+000.00	43.9	1291.43	97759.27
18+180.00	114.2	2394.5	100153.77
18+200.00	101.91	2161.08	102314.85
18+220.00	87.31	1892.16	104207.01
18+240.00	100.23	1875.32	106082.33

Mr. Hale

سنة البناء والتأسيس
١٤٣٥ هـ

كميات الحفر في التربة غير المتماسكة

عمق حفر من (5 - 10م)

شركة سمة للبناء والتشييد قطاع 17+410 إلى 18+410

As built 13 / 1 / 2024


Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
17+410.00	0	0	0
17+420.00	0	0	0
17+440.00	0	0	0
17+460.00	8.83	88.29	88.29
17+470.00	29.72	192.77	281.06
17+480.00	55.05	423.87	704.93
17+500.00	21.05	761	1465.93
17+520.00	90.15	1112.02	2577.95
17+540.00	87.62	1777.74	4355.69
17+560.00	83.64	1712.6	6068.29
17+580.00	144.41	2280.44	8348.73
17+600.00	156.63	3010.36	11359.09
17+620.00	134.24	2908.69	14267.78
17+640.00	123.36	2575.96	16843.74
17+660.00	133.08	2564.33	19408.07
17+680.00	118.17	2512.51	21920.58
17+700.00	87.83	2060.03	23980.61
17+720.00	60.38	1482.1	25462.71
17+740.00	39.87	1002.52	26465.23
17+760.00	53.47	933.36	27398.59
17+780.00	40.88	943.5	28342.09
17+800.00	19.84	607.27	28949.36
17+820.00	0.25	200.89	29150.25
17+840.00	0.67	9.14	29159.39
17+860.00	0.01	6.82	29166.21
17+880.00	0.39	4.08	29170.29
17+900.00	0	3.93	29174.22
17+920.00	4.03	40.32	29214.54
17+940.00	32.52	365.51	29580.05
17+960.00	0	325.19	29905.24
17+980.00	0	0	29905.24
18+000.00	0	0	29905.24
18+180.00	0	0	29905.24
18+200.00	0	0	29905.24
18+220.00	0	0	29905.24
18+240.00	0	0	29905.24

Moheli



السنة للبناء والتشييد
من ١٩٥٠ م. إلى ١٩٥١ م.
١٩٥١ م.

18+260.00	0	0	29905.24
18+280.00	0	0	29905.24
18+300.00	0	0	29905.24
18+320.00	0	0	29905.24
18+340.00	0	0	29905.24
18+360.00	0	0	29905.24
18+380.00	0	0	29905.24
18+400.00	0	0	29905.24
18+410.00	0	0	29905.24
Total volume			29905.24

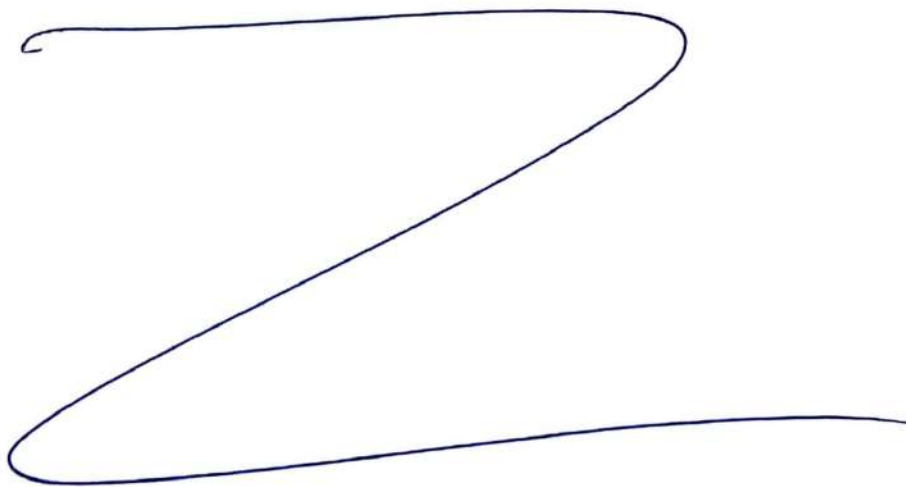

كميات الحفر في التربة غير المتماسكة

عمق حفر من (10 - 15م)

شركة سمة للبناء والتشييد قطاع 17+410 إلى 18+410

As built 13 / 1 / 2024

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
17+410.00	0	0	0
17+420.00	0	0	0
17+440.00	0	0.00	0.00
17+460.00	0	0.00	0.00
17+470.00	0	0.00	0.00
17+480.00	0	0.00	0.00
17+500.00	0	0.00	0.00
17+520.00	0	0.00	0.00
17+540.00	0	0.00	0.00
17+560.00	0	0.00	0.00
17+580.00	0	0.00	0.00
17+600.00	16.96	169.60	169.60
17+620.00	21.51	384.71	554.31
17+640.00	0.93	224.38	778.68
17+660.00	0.14	10.65	789.33
17+680.00	0.91	10.50	799.84
17+700.00	0	9.12	808.96
17+720.00	0	0.00	808.96
17+740.00	0	0.00	808.96
17+760.00	0	0.00	808.96
17+780.00	0	0.00	808.96
17+800.00	0	0.00	808.96
17+820.00	0	0.00	808.96
17+840.00	0	0.00	808.96
17+860.00	0	0.00	808.96
17+880.00	0	0.00	808.96
17+900.00	0	0.00	808.96
17+920.00	0	0.00	808.96
17+940.00	0	0.00	808.96
17+960.00	0	0.00	808.96
17+980.00	0	0.00	808.96
18+000.00	0	0.00	808.96
18+180.00	0	0.00	808.96
18+200.00	0	0.00	808.96
18+220.00	0	0.00	808.96
18+240.00	0	0.00	808.96



Handwritten signature and a blue ink mark resembling a stylized 'W' or a signature.


18+260.00	0	0.00	808.96
18+280.00	0	0.00	808.96
18+300.00	0	0.00	808.96
18+320.00	0	0.00	808.96
18+340.00	0	0.00	808.96
18+360.00	0	0.00	808.96
18+380.00	0	0.00	808.96
18+400.00	0	0	808.96
18+410.00	0	0	808.96
Total volume			808.96

Moh.

مجلس القضاء
البنائي والتشغيلي
٢٠٢٠

كميات الحفر في التربة المتماسكة			
عمق حفر من (0 إلى 5 م)			
شركة سمة للبناء والتشييد قطاع 17+410 إلى 18+410			
As built 13 / 1 / 2024			
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
18+020.00	36.29	801.91	801.91
18+040.00	68.75	1050.37	1852.28
18+060.00	129.89	1986.41	3838.69
18+080.00	147.34	2772.36	6611.05
18+100.00	156.47	3038.16	9649.21
18+120.00	164.37	3208.38	12857.59
18+140.00	161.78	3261.49	16119.08
18+160.00	125.25	2870.34	18989.42
Total volume			18,989.42

الموقع



شركة سمة للبناء والتشييد
قطاع 17+410 إلى 18+410
13 / 1 / 2024



كميات الحفر في التربة المتماسكة

عمق حفر من (5 - 10م)

شركة سمة للبناء والتشييد قطاع 17+410 إلى 18+410

As built 13 / 1 / 2024

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
18+020.00	0	0	0
18+040.00	0	0	0
18+060.00	0.87	8.7	8.7
18+080.00	15.23	161.02	169.72
18+100.00	29.8	450.3	620.02
18+120.00	26.25	560.46	1180.48
18+140.00	7.41	336.61	1517.09
18+160.00	0	74.13	1591.22
Total volume			1,591.22

Maths

سنة ثمان وثمانين
مئة واربعمائة
هـ

شركة سمة للبناء والتشييد

حصر كميات حفر الإحلال (-50 سم)

حفر من (صفر إلى 5 متر)

Station	Width	Length	Thickness	sum
17+900	13.916	20	0.5	139.16
17+960	13.916	20	0.5	139.16
17+980	13.916	20	0.5	139.16
18+000	13.916	20	0.5	139.16
18+020	13.916	20	0.5	139.16
18+040	13.916	20	0.5	139.16
18+160	13.916	20	0.5	139.16
18+180	13.916	20	0.5	139.16
18+200	13.916	20	0.5	139.16
18+220	13.916	20	0.5	139.16
18+240	13.916	20	0.5	139.16
18+260	13.916	20	0.5	139.16
18+280	13.916	20	0.5	139.16
18+300	13.916	20	0.5	139.16
18+320	13.916	20	0.5	139.16
18+340	13.916	20	0.5	139.16
18+360	13.916	20	0.5	139.16
18+380	13.916	20	0.5	139.16
18+400	13.916	20	0.5	139.16
18+410	13.916	10	0.5	69.58
SUM				2713.62

م-10



شركة سمة للبناء والتشييد

حصر كميات حفر الإحلال (-50 سم)

حفر من (5 إلى 10 متر)

Station	Width	Length	Thickness	sum
17+700	13.916	20	0.5	139.16
17+720	13.916	20	0.5	139.16
17+740	13.916	20	0.5	139.16
17+760	13.916	20	0.5	139.16
17+780	13.916	20	0.5	139.16
17+800	13.916	20	0.5	139.16
17+820	13.916	20	0.5	139.16
17+840	13.916	20	0.5	139.16
17+860	13.916	20	0.5	139.16
17+880	13.916	20	0.5	139.16
17+920	13.916	20	0.5	139.16
17+940	13.916	20	0.5	139.16
18+060	13.916	20	0.5	139.16
18+080	13.916	20	0.5	139.16
18+100	13.916	20	0.5	139.16
18+120	13.916	20	0.5	139.16
18+140	13.916	20	0.5	139.16
Sum				2365.72

