

عملية انشاء حائط علي خوازيق سند لسير مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاة المعادي

تنفيذ شركة الفاطمية للتشييد والكباري

بيان المهندسين والموظفين والمعدات المتواجدة بالمشروع

سنة التخرج	الوظيفة	الاسم
2013	مدير المشروع	احمد محمد عبدالعظيم
2017	مهندس تنفيذ	محمود ياسر احمد
2018	مهندس مكتب فني	مصطفى محمد عبدالعظيم
	مساح	محمد عادل السيد
	مساعد مساح	محمد دعاء ايوب
	D.C	محمد حامد احمد
	مشرف	عيد شعبان فيصل
	مشرف	سعيد علي محمد

المعدات

CAT 950F
CAT 225
ماكينة خوازيق Soilmec R-312
عدة حفر خوازيق نص ميكانيكي
مضخة خرسانة بوتزماستر 36 متر
فنتاس مياه MAN
كومبريسور هواء
مولد كهرباء 60 كيلو
ماكينة شوت كريت
رمالة
اجهزة مساحية (توتال استيشن + ميزان قامة)
كرفان حجرتين 9 متر

عملية انشاء حائط علي خوازيق سند لسير مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاه المعادي

بيان اعمال مستخلص رقم ١

البند	نوع العمل	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن
١	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق يدوي ميكانيكي باستخدام المسابية قطر ٥٠ سم	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	١٥٦,٠٠
١٢	علاوة حفر خوازيق في تربة صخرية (٢٥١/٥٠٠) كجم/سم ٢	٠,٠٠	١٦,٩٠	١٦,٩٠
٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٥٠ سم	٠,٠٠	٣١٢,٠٠	٣١٢,٠٠
١٣	علاوة حفر خوازيق في تربة صخرية (٢٥١/٥٠٠) كجم/سم ٢	٠,٠٠	٣٣,٨٠	٣٣,٨٠
٤	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة حتى منسوب سطح الطريق	٠,٠٠	٢٢٧١,٣١	٢٢٧١,٣١
٥	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية للأساسات	٠,٠٠	٨٣,١٣	٨٣,١٣
٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية للكمرات الرابطة للخوازيق	٠,٠٠	٢,٣٩	٢,٣٩
٩	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الرابطة للخوازيق	٠,٠٠	١٩,٠٧	١٩,٠٧
١٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح	٠,٠٠	١٨,٦٣٦	١٨,٦٤
١١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ اعمال المراسمة لسطح الحائط الساند باستخدام الكمبيوتر سور والرماله	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠
١٢	بالمتر المكعب أعمال تكسية علي المائل من الدبش من الاحجار الصلبة والسليمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤	بالمتر المكعب نقل ناتج الحفر خارج الموقع الي المقالب العمومة	٠,٠٠	٢٥٩٢,٩٠	٢٥٩٢,٩٠
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	٠,٠٠	٩٦,٠٠	٩٦,٠٠

التوقيع / علي
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (الصفحة - مطروح)

التوقيع / محمد
شركة الفاطمية للتشييد والكباري
رقم التسجيل: ٢٤٤-٨١٢-٥٢٣
رقم تجاري: ٩١٢٣٢
رقم القيد: ١٩٩/٠٠/٠٠١

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية على الايكل محتوى الاسمنت البورتلاندي العالي عن ١٥٠ كجم لكل م^٣

التوقيع / ع. ب. م.
م. عبد الحبيب البر
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الإستشارات الهندسية
El Rafed For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (المرحلة - الأولى)

شركة الفاطمية للتشييد والكباري
م/محمود اسرار احمد
التوقيع / 



عملية إنشاء حائط على خوازيق سند لسير مصنع أمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاه المعادي

ملاحظات	الإجمالي	مساحة المكعبات		تكرار	خصومات	الأبعاد			عدد	الوحدة	بيان الأعمال
		إجمالي	إجمالي			ارتفاع	عرض	طول			
		577.31		1			577.31		1	م ²	الحائط تحت سور الحرب الإلكتروني
		224.18		1			224.18		1	م ²	قطع خلف الخوازيق
											إجمالي الخصم
											إجمالي قبل الخصم
	801.49										بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (ما عدا المتمسكة وشديدة التماسك والصخرية)

التوقيع / م. محمود ياسر احمد

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

للإستشارات الهندسية

El Rafeed For Consulting Engineering

مشروع القطار الكهربائي السريع (المرحلة - مطروح)

التوقيع / م. محمود ياسر احمد

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

للإستشارات الهندسية

El Rafeed For Consulting Engineering

مشروع القطار الكهربائي السريع (المرحلة - مطروح)




Cut/Fill Summary


Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
الكمية	1.000	1.000	117.70sq.m	362.55 Cu. M.	0.00 Cu. M.	362.55 Cu. M.<Cut>
Totals			117.70sq.m	362.55 Cu. M.	0.00 Cu. M.	362.55 Cu. M.<Cut>



٢٣/٢٠٢٠ م
SF



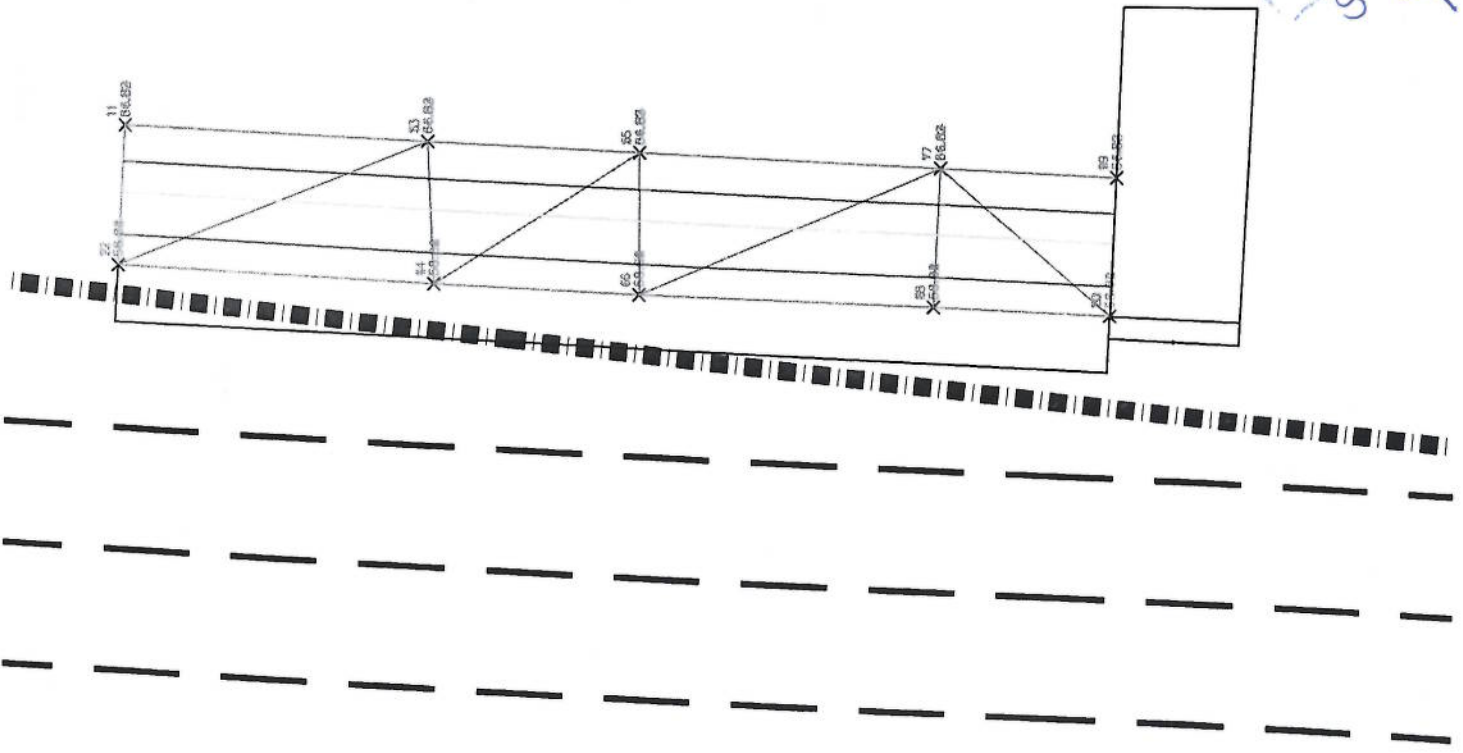

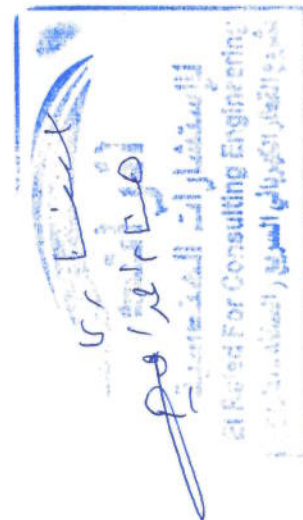

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
الكسب	1.000		151.65sq.m	220.46 Cu. M.	0.00 Cu. M.	220.46 Cu. M.<Cut>
Totals			151.65sq.m	220.46 Cu. M.	0.00 Cu. M.	220.46 Cu. M.<Cut>

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
الكسب	1.000		151.65sq.m	220.46 Cu. M.	0.00 Cu. M.	220.46 Cu. M.<Cut>
Totals			151.65sq.m	220.46 Cu. M.	0.00 Cu. M.	220.46 Cu. M.<Cut>

عملية إنشاء حائط على خوازيق سند لسير مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاه المعادي

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق يدوي ميكانيكي باستخدام السابية قطر 50 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندتي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم2 على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق

ملاحظات	الاجمالي	الابعاد			الوحدة	عدد	بيان الاعمال	مستلم
		اجمالي	اضافات	خصومات				
		156.00				13	ط.م	
							اجمالي الخصم	
		156.00					اجمالي قبل الخصم	
	156.00						بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق يدوي ميكانيكي باستخدام السابية قطر 50 سم	



عملية إنشاء حائط علي خواريق سند لسير مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاه المعادي

علاوة حفر خوازيق في تربيه صخرية (٥٠٠/٢٥١) كجم/سم^٢

التوقيع

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الاستشارات الهندسية

Eligible For Consulting Engineering

مجلس الشورى

التوقيف

21/09/2020

شركة الفاظمية للتشييد والكباري



عملية إنشاء حائط علي خوازيق سند لسير مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاه المعادي

ملاحظات	الاجمالي	الإعداد			عدد	الوحدة	بيان الاعمال	ملاحظات
		اجمالي	اضافات	خصومات				
		312.00			26	م.ط		
							إجمالي الخصم	
		312.00					اجمالي قبل الخصم	
	312.00						بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 50سم	

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 50سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم المتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم2 على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعي يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما قيمته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشراف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق .

عملية إنشاء حائط علي خوازيق سند لسير مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاه المعادي

علاوة حفر خوازيق في ترية صخرية (٥٠٠/٢٥١) كجم/سم^٢

١٣

ملاحظات	الاجمالي	الايصاد			عدد	الوحدة	بيان الاعمال
		اجمالي	اضافات	خصومات			
		33.80			26	م.ط	
							إجمالي الخصم
		33.80					اجمالي قبل الخصم
	33.80						علاوة حفر خوازيق في ترية صخرية (٥٠٠/٢٥١) كجم/سم ^٢



ملاحظات	الاجمالي	مساحة المكعبات		الابعاد				عدد	الوحدة	بيان الاعمال	تسليم
		اجملي	تكرار	خصومات	ارتفاع	عرض	طول				
		2271.31	1		2271.31			1	٣ م	اعمال الردم المؤقت	
										اجمالي الخصم	
										اجمالي قبل الخصم	
	2271.31									بالمنظر المكعب اعمال الردم المؤقت بآثرية صلاحة حتى منسوب سطح الطريق	

شركة الفاظمية للتشييد والكباري



Cut/Fill Summary


Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
الكمية	1.000	1.000	866.94sq.m	0.00 Cu. M.	2271.31 Cu. M.	2271.31 Cu. M.<Fill>
Totals			866.94sq.m	0.00 Cu. M.	2271.31 Cu. M.	2271.31 Cu. M.<Fill>



م/م مازن دباس حيدر



د/عبدالله بن
عبدالله بن
عبدالله بن

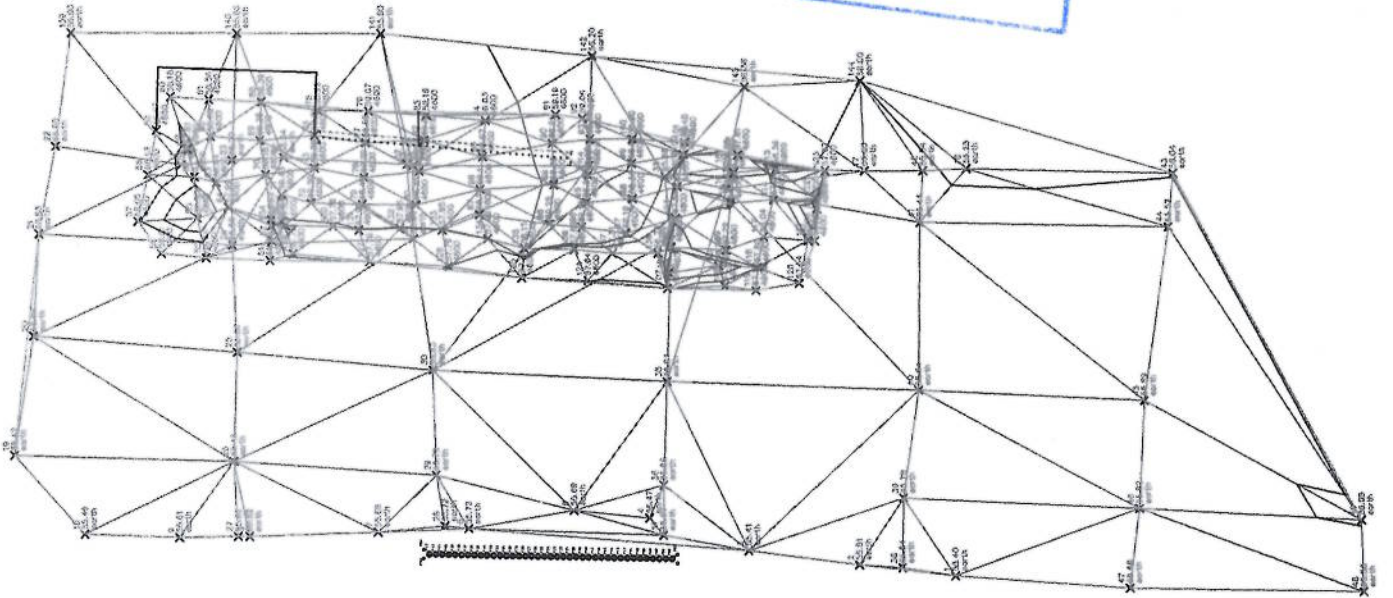

اسكتش توضيحي للرمل المثبت خلف حائط الدبش اسفل سور الحرب الايكترونية

سور الحرب الايكترونية

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية


م/ محمد احمد عبد البر

ع/ علي

شركة الفاطمية للتشييد والكباري

م/ ماصود ياسين احمد

ع/ محمد

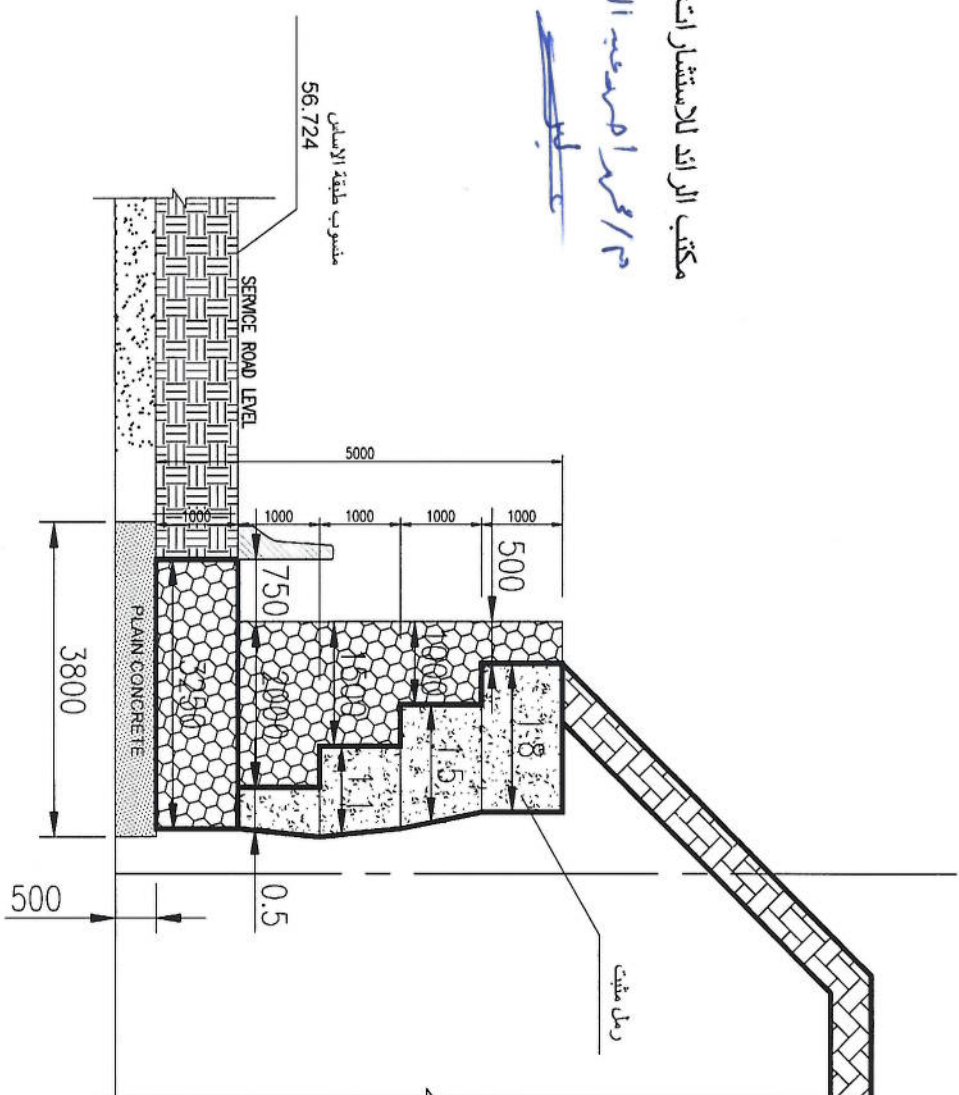



عملية إنشاء حائط علي خوازيق سند لسبر مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجة المعادي

بالمتر المكعب توريد وتنفيد خرسانة عادية للكمرة الرابطة للخوازيق مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي محتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/سم³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم³ وعمل كل ما يلزم لنهول العمل طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف

ملاحظات	الاجملى	مساحة المكعبات		الابعاد			عدد	الوحدة	بيان الاعمال	الترتيب
		اجملى	تكرار	خصومات	ارتفاع	عرض	طول			
		2.39	1		0.10	1.00	23.86	1	3م	
		0.77	39		0.10	0.20		1	3م	خصم امكان الخوازيق
		0.77							اجملى الخصم	
		2.39							اجملى بعد الخصم	
	2.39								بالمتر المكعب توريد وتنفيد خرسانة عادية	

التوقيع / م
مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
للإستشارات الهندسية
El Rased For Consulting Engineering
مصر - القاهرة (الكهرباء - المرفق - المرفق - المرفق)

التوقيع / م
محمود ياسر احمد
شركة الفاطمية للتشييد والكبارى



عملية إنشاء حائط علي خوازيق سدة لسير مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاه المعادي

بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الرابطة للخوازيق اجهاد 350 كجم/سم² ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م³ والفئة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول الصناعة والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية و الفئة تشمل المعدات المانعة اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي كل ما يلزم العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	الاجمالي	مساحة المكعبات			الابعاد			عدد	الوحدة	بيان الاعمال
		اجمالي	تكرار	خصومات	ارتفاع	عرض	طول			
		19.07	1		1.00	0.80	23.84	1	3م	
										إجمالي الخصم
										اجمالي قبل الخصم
	19.07									بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الرابطة للخوازيق

التوقيع / م. محمد ياسر
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
للإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي (الصفحة - ملاحق)

التوقيع / م. محمد ياسر
شركة الفاطمية للتشييد والكباري



عملية إنشاء حائط على خوازيق سند لسير مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاه المعادي

بالمتر المكعب نقل ناتج الحفر خارج الموقع الى المقالب الصومة المعدة

14

ملاحظات	الإجمالي	مساحة المكعبات		تكرار	خصومات	الإبعاد			عدد	الوحدة	بيان الأعمال
		إجمالي	عرض			ارتفاع	عرض	طول			
		321.59		1			321.59		1	م ^٢	الجزء المنهار تحت سور الحرب الإلكتروني
		2271.31		1			2271.31		1	م ^٢	نقل مخلفات بجوار الخوازيق
									إجمالي الخصم		
									إجمالي قبل الخصم		
	2592.90								بالمتر المكعب نقل ناتج الحفر خارج الموقع الى المقالب الصومة المعدة		

التوقيع / هشام العبدالله

م/ محمود ياسر احمد

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

El-Raid For Consulting Engineering

مشروع القطار الكهربائي المربع (المرحلة الأولى)

م/ محمود ياسر احمد

التوقيع / هشام العبدالله

م/ محمود ياسر احمد

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

El-Raid For Consulting Engineering

مشروع القطار الكهربائي المربع (المرحلة الأولى)

م/ محمود ياسر احمد

التوقيع / هشام العبدالله



Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
الكمية	1.000	1.000	866.94sq.m	0.00 Cu. M.	2271.31 Cu. M.	2271.31 Cu. M.<Fill>
Totals			866.94sq.m	0.00 Cu. M.	2271.31 Cu. M.	2271.31 Cu. M.<Fill>






م/م ٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٠٢٠





مستشار
١٥/١٠/٢٠٢٠

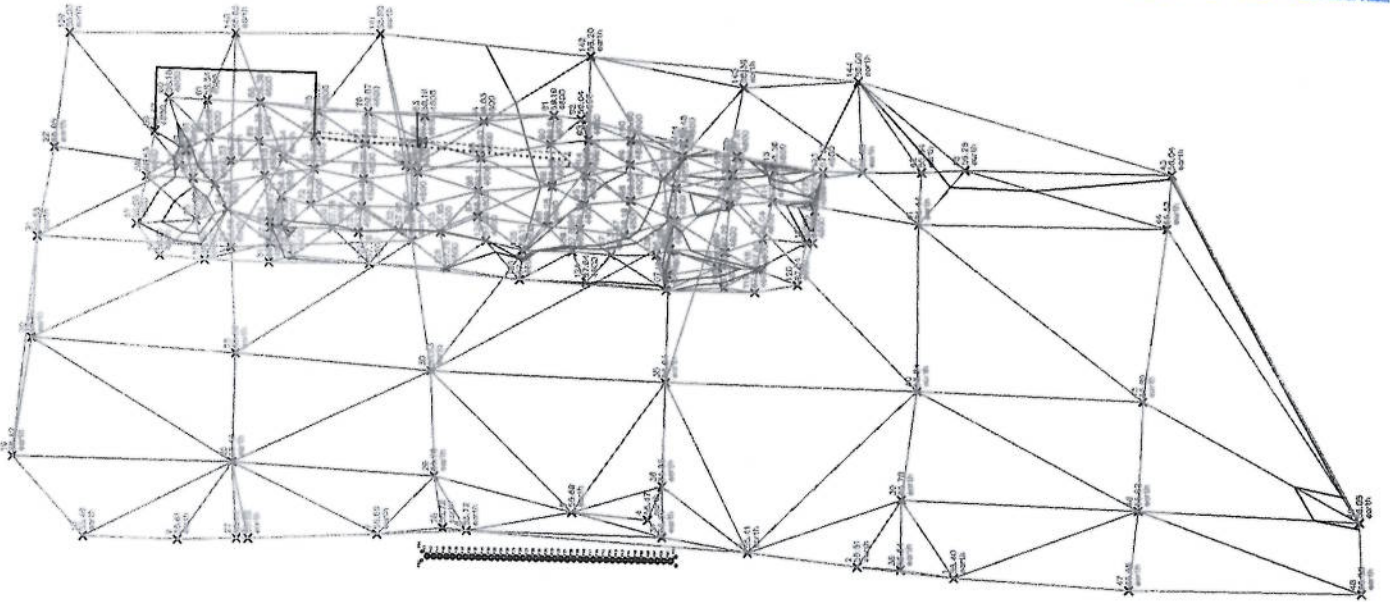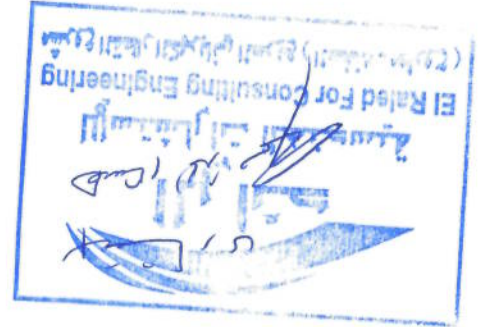

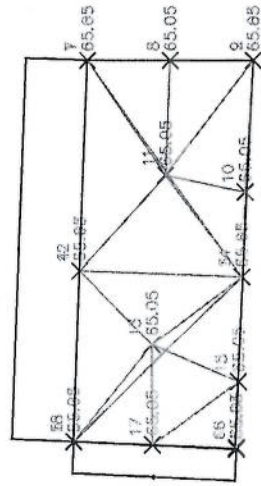

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
الكمية	1.000	1.000	34.14sq.m	0.00 Cu. M.	321.59 Cu. M.	321.59 Cu. M.<Fill>
Totals			34.14sq.m	0.00 Cu. M.	321.59 Cu. M.	321.59 Cu. M.<Fill>



[illegible]

شركة الفاطمية للتشييد والكباري
م/ محمود ياسر احمد
التوقيع /





3.028

El Raled For Consulting Engineering
مشروع القطاع الكهربائي المبرمج (المشقة - مبرمجة)

شركة الفاظمة للتشييد والكبارى



عملية إنشاء حائط على جوانب سدة لسير مصنع أسمنت طوان الجنب الأيمن التجهة المعادي

10	بخطن عوربد وتشكيل وتركيب وصنع اسياخ حديد التسليح حتى 12 م (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكهرباء والسور يشمل التطبيق طبقة الترسيمات وصل الوصلات التي لم ترد برسومات الطام والسور يشمل ايضا الاختبارات وكل السمات الارمية لتلال الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والسمات الارمية لتوصيب وقطع وتشكيل ورغ الحديد والسور يشمل كل ما يلزم لتتو العمل ككلا حسب اصول الصناعة ونظريات المهندسين المشرف .										
	ملامحات	الاجملي	تكرار	وزن (ميجا)	شتر	طول	عدد	الوحدة	بيان الاعمال	العصر	MARK
1		0.265	1	1.579	16	12.000	14	طن	شعاع رئيسي	3	
3		0.015	1	1.579	16	1.200	8	طن	طراق		
4		0.11069	1	0.617	10	12.000	14.95	طن	مكثت		
0.391		الإجمالي للخازوق									
		الإجمالي لعدد									
10.169				26							

عملية إنشاء حائط على جوانب سدة لسير مصنع أسمنت طوان الجنب الأيمن التجهة المعادي

ملامحات											الاجملي	تكرار	الابعاد				الوحدة	بيان الاعمال	العصر	MARK	
											0.15474	1	1.579	16	7.000	14	طن	شعاع رئيسي		1	
											0.13264	1	1.579	16	6.000	14	طن	شعاع رئيسي		2	
											0.008	1	1.579	16	1.200	4	طن	طراق		3	
											0.067	1	0.617	10	12.000	9.06	طن	مكثت		4	
											0.008	1	1.579	16	1.200	4	طن	طراق		5	
											0.049	1	0.617	10	12.000	6.59	طن	مكثت		6	
الإجمالي للخازوق																					
0.418																					
الإجمالي لعدد																					
13																					
5.439																					



عملية إنشاء حائط علي خوارزمي سند لسير مصنع أسمنت حلوان الجانب الأيمن اتجاه المعادي

بالمر المستطع وتوريد و تنفيذ اعمال المرأشعة لسطح الحائط الساتد الكمبرسور والرماله وتخزين السطح وصب خرسانه مقفوفة على طبقات بطريقه shotcrete الطبقه لا تقل عن ٥ سم وياجى ١٠ سم والفقه تشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنيه بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم على الاقل المقاوله المميزه للمكعب الخرسانى بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٣٥٠ كجم/م^٢.

[illegible]

التوقيع / ع ل

June 13/2

مكتب الراىء للاستشارات الهندسية

五

Eligible For Compensation

Engineering Consulting Engineering


1. The first part of the text discusses the importance of the first impression.

التفقه / ك

مجلس


شركة الفااطمية للتشييد والكباري





اجمالي الكمية ٢٥٠٢ - ١٢٠٢٤ = ١٢٠٩٦ سم^٢ (٢٥)

اجمالي الكمية بالمترا المقطع
١٢٩.٦ م^٢



سمك الشوت كريت خارج الخوازيق 15 سم وبين الخوازيق 20 سم
 $24 \times 35 \times 3 = 25.2 \text{ m}^3$
اجمالي حجم الخوازيق 168
 $39 \times 3 \times 0.25 \times 0.25 \times 3.14 \times (192/360) = 12.96 \text{ m}^3$
صافي كمية الشوت كريت لسمك 10 سم
١٤٤.٩ 129.6 م^٢

شركة الفاطمية
م/ محمود ياسر احمد

