

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة (اسيوط) مستخلص (1) جارى

مستخلص جاري (1) عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور لمشروع طريق اسيوط الصحراوي الغربي في المسافة من القوصية حتى منفلوط بطول 33 كم

العقد رقم : (2025/2024/574)

بتاريخ : 2024/12/22

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

بداية العمل يوم 1/1/2025

شاملة المدة من بداية العمل حتى 6/2/2025



| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                      | الفئة      | كمية البند بالمقايضة | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراءه | مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جاري ام نهائي | جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنية | استقطاع او حجز جنية | الباقى بعد الاستقطاع جنية | ملاحظات                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                | قرش / جنية |                      |        |                           |                                   |                                      |               |                                          |                     |                           |                                                                                                                                                                             |
| 1         | اعمال تخطيط الطريق بالبيوت المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر 15 سم أو 20 سم وذلك وفقا للمواصفات | 510        | 30000                | م2     | 0                         | 26500                             | 26500                                | جاري          | 13515000                                 | 400000              | 13115000                  | البرنامج الزمني متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة<br>المهندس والفني متواجدان<br>تم استقطاع المبلغ المذكور لحين ورود نتائج الاختبارات |
| الاجمالى  |                                                                                                                                                                |            |                      |        |                           |                                   |                                      |               |                                          |                     |                           | 13115000                                                                                                                                                                    |

المقاول

الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مدير المشروع

الاسم / محمد احمد سالم

رقم التسجيل / ٤٨١٠٢

الجهة المالكة

(الهيئة العامة للطرق والكبارى)

مهندس المشروع

مهندس / شهاب احمد محمد

التوقيع /

مدير عام الصيانة

مهندس / محمود عبدالغنى


التوقيع /

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة (اسيوط)

مهندس /

"اسلام محمد فوزى"

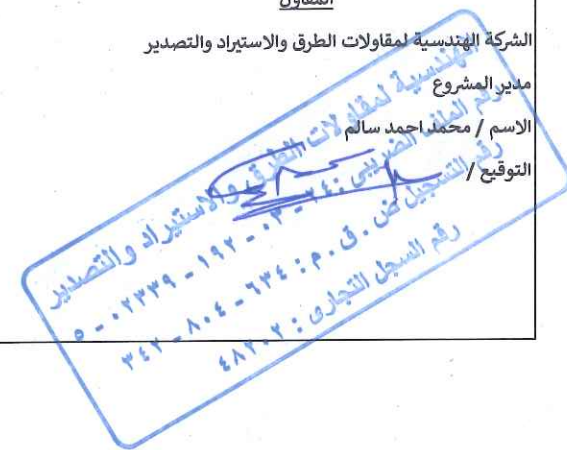

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| جملة الأعمال         | ١٣,١١٥,٠٠٠,٠٠ |
| جملة الأعمال السابقة | ٠,٠٠          |
| المستحق صرفه         | ١٣,١١٥,٠٠٠,٠٠ |

#### الإستقطاعات

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| ٥ % حسن سير عمل            | ٦٥٥,٧٥٠,٠٠ |
| دمغة عادية                 | ٧٨,٧٩٠,٠٠  |
| دمغة إضافية                | ٢٣٦,٣٧٠,٠٠ |
| دمغة توقيع وموارد          | ٠,٤٠       |
| رسوم معامل مركزية بالإدارة | ٠,٠٠       |
| رسوم معملية بالمنطقة       | ٠,٠٠       |
| رسوم                       | ٠,٠٠       |
| ١٥ % م.أ                   | ٠,٠٠       |
| ١٤ % ض.م                   | ٠,٠٠       |
| عمالة غير منتظمة           | ٥٩,٠١٧,٥٠  |
| غرامة تأخير                | ٠,٠٠       |
| يعطى لحساب الدائنين        | ٠,٠٠       |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| جملة الإستقطاعات | ١,٠٢٩,٩٢٧,٩٠  |
| الصافي           | ١٢,٠٨٥,٠٧٢,١٠ |



يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"

*(Handwritten signature)*
