


Subsequently, the β value was calculated as follows:

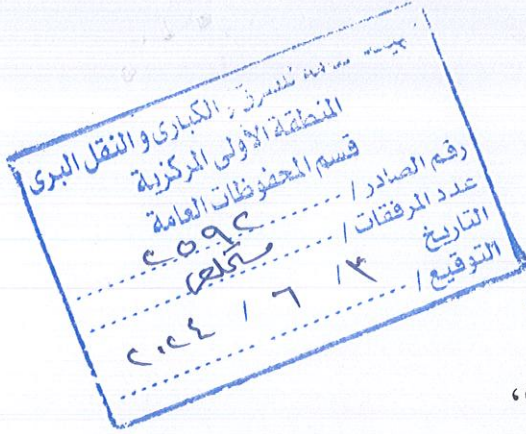

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٠) تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق بمحافظة الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٩٨	٢٠٢٤/٢/٢٦	١٣١٠	مركزي
٢	١٣٨	٢٠٢٤/٣/١١	١٣١٠	
		الاجمالى	٢٦٢٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٣٠

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
حصر الاعمال
خطاب محملات



يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

Handwritten signatures and initials in blue ink.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٠) تنفيذ اعمال انشاء كوبرى اعلى
مزلقان المرازيق بمحافظه الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٩٨	٢٠٢٤/٢/٢٦	١٣١٠	مركزي
٢	١٣٨	٢٠٢٤/٣/١١	١٣١٠	
		الاجمالى	٢٦٢٠	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٣٠

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع. ح
عدد (١) حصر أعمال
عدد (١) كشف المهندسين
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) تجارب معمل الموقع

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ



صورة مرسلة : السيد المهندس / مدير عام المعامل المركزية

تحية طيبة .. وبعد ،،،

رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

المقاول

مهندس المكتب الفني

إيديكس الدولية للنسج والنقاولات

عضو الاتحاد المصري لمهندسي النسيج والنقاولات ١٩٦٦

كوبري اعلي منزلقان النلاحة بالمرازيق

مدير المشروع

م / احمد عبد الفلاح

PJ-071

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / ايمن محمد السيد
التوقيع /

مدير جهاز الاشراف
م/ خالد حسونة
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية
أستاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

يعتمد،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
مهندس / محمد نصر طنبوخ
التوقيع

بند المیزانیه :

..... القيمة :

حرف:

قيمة		بيان المنصرف من المقاول									
مليم	جنيه	الأعمال التي تمت الان		رقم الاستمارة							
		محجوز									
		مصرح بصرفه									
		سابق صرفه									
		مستحق صرفه									
		الاستقطاعات									
مليم	جنيه	رسم دمغة									
		رسم دمغة اضا									
		١٠٠٠									
		غرامة تأخير									
		٨٤٠									
		١٠									
		فقط مبلغ :		لاغير							
		رئيس المصلحه		علامة							
		إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :		إمضاء :							
		إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف :		إمضاء :							
		إقرار بأن المبلغ معلي بالامانات :		إمضاء :							
		تنفيذ في سجل رقم ٥٥ ع.ج. برقم :		الكاتب المنوط :							
		تحريرا في :		الختم ذو التاريخ							
		سنة:		روجع :							
		علامات الكتاب المنوطين									
		بمبلغ :		٢٠١٠٠							
		تحريرا في:		يعتمد بسحب : <u>شيك</u> إذن صرف							
		١ شطب		رقم :							
		٢ سحب		١١٠٠							
		٣ تنفيذ في سجل		٢٤٣٠							
		٤		١١٥٠							
		رقم القيد و علامه كتاب الشطب		٢١٠							
		تسلمت التحويل رقم		٣١٥							
		و ليس لي طلبات علي الحكومه بخصوص هذا العمل.		و أقر بأن أوافق علي الحساب المتقدمه .							
		تحريرا في		٤٢٠							
		(*) اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا الاقرار		٧٠٠							
		المقاول									

شاملة المدة من ٢٠٢٤/١/٢١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	نسبة الاستقطاع (%)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
53	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (معدا التماسكة وشديدة التماسك) مسافة النقل ٢ كم	م٣	٥٠,٠٠٠	١٩,٨٠٢,٠٠٠	١٩,٨٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٨٠١,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩,٠٠٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل حتى ٢٠ كم		١٨,٠٠٠		١٩,٨٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٨٠١,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٦,٤١٨,٠٠٠	
55	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٩٠,٠٠٠	١,٧٩٤,٠٠٠	١,٧٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٩٣,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١,٣٧٠,٠٠٠	
56	بالمتر المكعب توريد ورم برمال نظيفة حول الاساسات	م٣	١٤٥,٠٠٠	٤,٧٠٠,٠٠٠	٤,٦٥١,٠٠٠	٤,١٧١,٠٠٠	٤,٦٥١,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٤,٣٩٥,٠٠٠	
57	بالمتر المكعب اصمال خرسانة عادية للارصفة والبردورات	م٣	١,٨٣٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٢٠,٠٠٠	
58	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	١,٧٦٥,٠٠٠	١,٠٦٥,٠٠٠	١,٠٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦٤,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٧٧,٩٦٠,٠٠٠	
59	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٢,٤٨٠,٠٠٠	٢,٤٣٣,٠٠٠	٢,٤٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٣٢,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٣١,٣٦٠,٠٠٠	
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاصعدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات	م٣	٣,٠١٥,٠٠٠	١,١٥٥,٠٠٠	١,١٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٤,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٧٩,٣١٠,٠٠٠	
	علاوة زيادة الارتفاع عن ٦ م		١٠٠,٠٠٠		٤٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٥٠,٠٠٠	
61	بالمتر المكعب اصمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اصعدة الكوبري	م٣	٣,١٥٥,٠٠٠	٤٣٤,٠٠٠	٤٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٣,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٦٦,١١٥,٠٠٠	
	علاوة زيادة الارتفاع عن ٦ م		١٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
62	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب	م٣	٤,١٠٥,٠٠٠	٣١٦,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٩٣,٠٧٥,٠٠٠	
63	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية حتى ارتفاع ٦ م وفي حالة زيادة الارتفاع يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه	م٣	٣,٤٤٠,٠٠٠	٥,٣٢٢,٠٠٠	٥,٣٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٣٢٢,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٣٠٧,٦٨٠,٠٠٠	
	ارتفاع حتى ٦ م		١٠٠,٠٠٠		٢,٤٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٦٤,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦,٤٠٠,٠٠٠	
	ارتفاع اعلي من ٦ م		٢,٩٧٠,٠٠٠	٤١١,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢١٧,٧٠٠,٠٠٠	
64	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائدة	م٣	٢,٥٨٥,٠٠٠	٥١٦,٠٠٠	٤٩٩,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٥١٥,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٣١,٢٧٥,٠٠٠	
65	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلي الكمرات سابقة الصب اجهاد ٥٠٠ كجم/سم٢	م٣	٦٩,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٧٨	١٦,٧٦	٠,٠٠٠	١٦,٧٦	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٦,٤٤٠,٠٠٠	
66	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد (seven wire strands)	طن	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦٣٠,٠٠٠	٣,٦٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٢٩,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٥٢٤١,٠٠٠,٠٠٠	
67	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري 60/40	طن	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٨,٠٠٠	٣٩٢,٠٠٠	٦٣,١٧	٤٥٥,١٧	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٧٥٨,٥٠٠,٠٠٠	
68	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كبرياتي للاجزاء المعدنية	طن	٥٥,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٥١٦,٨٠٠	٠,٠٠٠	٥١٦,٨٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٤,٢٤٠,٠٠٠	
69	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البتومين علي البارد	م٢	١٠٥,٠٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠٠	١٧,٠٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٦٦,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٩١,٩٣٠,٠٠٠	
70	بالمتر المسطح توريد وصب دهانات اسمنتية عازلة	م٢									
الاجمالي (بالجنيه) صفحة رقم ٢ =											
١٦٨٦٢٧٧٣٨,٠٠											



يعتمد،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
 للمنطقة الأولى المركزية
مهندس / محمد نصر طنبخ
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية
المنطقة الأولى المركزية
استاذ / مصطفى عبد الجواد
التوقيع

مدير جهاز الاشراف
م / خالد حسونة
التوقيع

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / ايمن محمد السيد
التوقيع



استشاري المالك
مهندس الاستشاري
م / محمد
مدير المشروع
م / أسامة ابو النصر

المقاول
مهندس المكتب الفني
إيديكس الدولية للمهندسين والمقاولات
عضو الاتحاد المصري للمهندسين
كوبري اعلي مزلقان النلاكة بالمرازق
مدير المشروع
م / احمد عتبة الفتاح
PJ-071

..... بند الميزانيه :

القيمة :

حرف:

[illegible]

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠١/٢١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغسة بالجنه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنه)	نسبة الانقطاع (%)	استقطاع أو حجز (بالجنه)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
71	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التوبيرين طبقا للابعاد الاتية:											
	حمولة حتى ٤٠٠ طن بجوايت مقاس ١٣٧,٧٧*٤٠٠*٤٠٠	عدد	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠,٠٠٠	
	حمولة حتى ٢٥٠ طن بجوايت مقاس ١٩٧/١٢١*١٩٧*٤٥٠*٤٥٠	عدد	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠	
	حمولة حتى ٢٥٠ طن بدون بجوايت مقاس ١٣٢/٨٨*٤٥٠*٤٥٠	عدد	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
	حمولة حتى ٤٠٠ طن بجوايت مقاس ٩٢/٤٤*٤٥٠*٤٤٠	عدد	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠	
	حمولة حتى ٥٥٠ طن بجوايت مقاس ١٦٧/٩٩*٦٠٠*٤٥٠	عدد	٨٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠	
	حمولة حتى ٢٥٠ طن بدون بجوايت مقاس ١٥٢/٨٨*٥٠٠*٤٠٠	عدد	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
72	بالمتر الطولي اصيل توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint)	م.ط	٦,٥٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩,٦٦	٩٩,٦٦	٦٤٧,٧٩,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٧,٧٩,٠٠٠	
73	Therma Joint بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع تسمح بالحركة من (± ٢,٥ سم (إذا لزم الأمر) بأبعاد (١٠ سم عرض) ٤٠ * ٤٠ سم عرض	م.ط	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٢٤	٣٦,٢٤	١٦٣,٠٨٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٣,٠٨٠,٠٠٠	
74	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بتربيه من السن والرمل بنسبه (١:٢)	م.٣	٣٠٠,٠٠٠	٢,٠٧٣,٠٠	٢,٠٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧٢,٠٠	٦٢١,٦٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢١,٦٠٠,٠٠٠	
75	بالعدد تجرية تحميل استيكي للكوبرى قبل افتتاحه	عدد	١١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	
76	بالمتر توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والبلاكية المعدنية	طن	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠	٢٣,٠٠	٣,٤٠	٢٦,٤٠	١,٠٢٩,٦٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٩,٦٠٠,٠٠٠	
77	بالعدد توريد وتركيب واختيار عמוד انارة الطرق فردي بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن	عدد	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٨,٠٠	٦٥,٠٠	٣,٠٠	٦٥,٠٠	١,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠	
78	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٣ × ١٨٥ + ٩٥ م	م.ط	٨٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠	
79	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤ × ٢٥ م	م.ط	٤٢٥,٠٠٠	١,٦٥٣,٠٠	١,٦٥٣,٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٥٣,٠٠	٧٠٢,٥٢٥,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٢,٥٢٥,٠٠٠	
80	كابلات الجهد المنخفض: توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٦*١ مم Earth من الالومنيوم	م.ط	٥٠,٠٠٠	١,٦٥٣,٠٠	١,٦٥٣,٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٥٣,٠٠	٨٢,٦٥٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢,٦٥٠,٠٠٠	
81	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (LED TYPE) قدرة ١٥٠ وات لاصدة الإنارة	عدد	٩,٠٠٠,٠٠٠	٦٨,٠٠	٦٥,٠٠	٣,٠٠	٦٥,٠٠	٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠	
84	بالعدد توريد وتركيب واختيار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (LP - IN) واللوحه ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحه مزودة بخليه ضوئية	عدد	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	
85	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار عدايات PVC	م.ط	٢٦,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠	١,٥٨٨,٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٨٨,٠٠	٤١٢,٨٨٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٢,٨٨٠,٠٠٠	
	مسورة ٣ بوصة	م.ط	٢٦,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠	١,٥٨٨,٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٨٨,٠٠	٤١٢,٨٨٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٢,٨٨٠,٠٠٠	
87	بالعدد فك وتحميل ونقل عמוד انارة الى المخازن التي يحددها المهندس المشرف والبند يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقلها الى المقالب العمومية	عدد	٨٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٠٠,٨٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٨٠٠,٠٠٠	
89	غرفة تجميع المطر	عدد	٥,٦٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠٠	
90	بالمقطوعة عمل تحويلية منفردة وتوفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا	مقطوعة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
	التشويبات											
	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبرى 60/40	طن	٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الاجمالي (بالجنه) صفحة رقم ٣ =												
الاجمالي العام بالجنه =												٢٠٥,٩٠٥,٩٧٢,١٨
إجمالي ما سبق صرفه =												١٩٦,٣٤٦,٤٣٢,٥٠
المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٠) =												٩,٥٥٩,٥٣٩,٦٨



يعتمد،،،،، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية مهندس / محمد نصر طيخ التوقيع	المستخلص رقم (١٠) جاري أعمال تنفيذ كوبري انشاء كوبري اعلى مزلقان المراتيق - بمحافظة الجيزة عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٢ تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات	مدير جهاز الاشراف م / خالد حسونة التوقيع	مدير المشروع م / ايمن محمد السيد التوقيع	مدير عام المشروعات م / جهاد محمد التوقيع	استشاري المالك مهندس الاستشاري م / احمد رمضان التوقيع	المقاول مهندس المكتب الفني م / احمد رمضان التوقيع
---	---	--	--	--	--	--

بند الميزانيه :

..... : القيمة

حرف:

بيان المنصرف من المقاوله					
قيمة					
مليم	جنيه				
الأعمال التي تمت الان					
محجوز					
مصرح بصرفه					
سابق صرفه					
مستحق صرفه					
الاستقطاعات					
مليم		جنيه			
رسم دمغة					
رسم دمغة اضا					
١٠٠٠					
غرامة تأخير					
٨٤٠					
١٠					
فقط مبلغ :		لاغير			
رئيس المصلحه		علامة			
إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :		إمضاء :			
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف :		إمضاء :			
إقرار بأن المبلغ معلي بالامانات :		إمضاء :			
تنفيذ في سجل رقم ٥٥ ح.ع. برقم :					
تحريرا في :					
سنه:		الكاتب المنوط :			
علامات الكتاب المنوطنين		روجع :			
يتمد بسحب : شيك		الختم ذو التاريخ			
إذن صرف					
بمبلغ :					
تحريرا في:					
(١) شطب		رقم :			
(٢) سحب		الشيكات			
(٣) تنفيذ في سجل		الحالات			
(٤)		و أدرج في كشف الحواتل رقم			
(رقم القيد و علامه كتاب الشطب)					
تسلمت التحويل رقم		و أقر بأن أوافق على الحساب المتقدمه .			
وليس لي طلبات علي الحكومه بخصوص هذا العمل.					
تحريرا في		٤٢٠			
(*) اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا الاقرار		٧٠٠			
المقاول					
