

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري مستخلص رقم (٧) جارى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٢٧




يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طبخ

Handwritten signature and initials in blue ink.

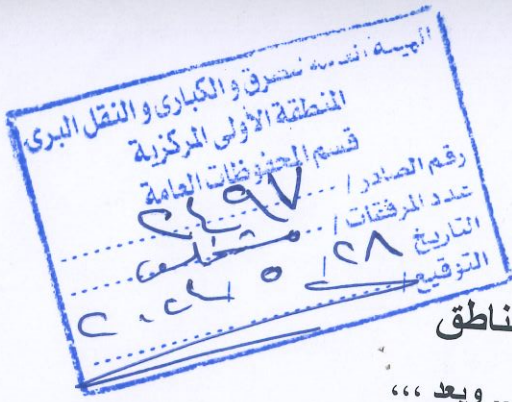

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٢٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الرئيسة العامة للظرم والنجارى

قسم : العقود
المبلغ المستحق إلى : شركة كوندور للتصدير والرمص
بموجب : الطلبات طيه ، أو : قارى

مبار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أويسحب باسم : شركة كوندور للتصدير والرمص

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٢١٩٥٨٢٥٦٨٨		

٥١٤٦٦

٢١٩٥٨٢٥٦٨٨

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المختص

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
٢١٩٥٨٢٥٦٨٨						
	إجمالى الأصل					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادى	إضافى	دمغة توقيع	
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
			رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها		

علامة

فى سنة ٢٠١٠

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
- الإيرادات : _____
- بتاريخ : _____
- الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ	
(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____	توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجع فى سنة ٢٠١٠	(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
يعتمد سحب	شيك
إذن صرف	
مدير أو رئيس الحسابات	وكيل الحسابات
فى سنة ٢٠١٠ بمبلغ	

الختم ذو التاريخ	
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح»)	إمضاء الكاتب المنوط : _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة :	إمضاءات موظفى الشطب
(٣) سحب	رقم : _____
(٤) قيد فى سجل	تحت رقم : _____
(٥) أدرج فى كشف	رقم : _____
(٦) استلمت	إمضاء طالب أو كاتب التصدير
	فى سنة ٢٠١٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال السكك الحديدية											
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	٣م	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٥٩٢,٠٠	٢٠٣٥,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥ سم	٣م	٥١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	٥١٢٢٤,٠٠	٥١٢٢٤,٠٠	٥١٢٢٤,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	٣م	١٠١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية قبل تنفيذ الاعمال	٣م	١٠١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب و تشويشها داخل الموقع	٣م	٨١,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٦٧٧٢,٠٠	٢٩٤,٠٠	٢٧٠٦٦,٠٠	٢١٩٢٣٤٦,٠٠	٢١٩٢٣٤٦,٠٠	٢١٩٢٣٤٦,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
٩-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	٤م	١٥٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١٥٢,٦١	١١٥٢,٦١	١٨٢١١٢,٣٨	١٨٢١١٢,٣٨	١٨٢١١٢,٣٨	٧-البرنامج الزمنى متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن ورمل	٤م	١٥٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١٥٢,٦١	١١٥٢,٦١	١٨٢١١٢,٣٨	١٨٢١١٢,٣٨	١٨٢١١٢,٣٨	٨-الأمن الصناعى موجود
١٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٦٠٣٣,٠٠	٨٤٤,٠٠	٢٦٨٧٧,٠٠	١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠	١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠	١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠	٩-التقرير المبدئى موجود
١٣-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	٤م	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٦٠٣٣,٠٠	٨٤٤,٠٠	٢٦٨٧٧,٠٠	١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠	١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠	١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمى	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٤-أ	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٢-المستندات متوفرة
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالى عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٨,٠٠	٠٢,٠٠	٧٠,٠٠	٤٥٤٤٠٥٠,٠٠	٤٥٤٤٠٥٠,٠٠	٤٥٤٤٠٥٠,٠٠	
١٧-أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	٣م	١٩٢٤,٠٠	٢٥٠٢,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٦٦٢٨١٨٠,٠٠	٦٦٢٨١٨٠,٠٠	٦٦٢٨١٨٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم/ ولا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م	٣م	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	١٩٦٢٢,٠٠	١١٤٧,٠٠	٢٠٧٦٩,٠٠	٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠	٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠	٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/ اسمنت بورتلاندى عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم/	٣م	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	١٩٦٢٢,٠٠	١١٤٧,٠٠	٢٠٧٦٩,٠٠	٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠	٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠	٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم/ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/ اسمنت بورتلاندى عادى	٣م	٤٧٧١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	١١٨,٠٠	٢٣٤١,٠٠	١١١٦٨٩١١,٠٠	١١١٦٨٩١١,٠٠	١١١٦٨٩١١,٠٠	
٢٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣م	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	٤١٨٣,٠٠	٣٧٦,٠٠	٤٥٥٩,٠٠	٢٢٦٧١٩٠,٧٠٠	٢٢٦٧١٩٠,٧٠٠	٢٢٦٧١٩٠,٧٠٠	
٢٠-هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣م	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	٤١٨٣,٠٠	٣٧٦,٠٠	٤٥٥٩,٠٠	٢٢٦٧١٩٠,٧٠٠	٢٢٦٧١٩٠,٧٠٠	٢٢٦٧١٩٠,٧٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة اجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم/.	٣م	٩٥٣٤,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٢٧٣,٠٠	١٠٢٣,٠٠	٩٧٥٣٢٨٢,٠٠	٢٤٣٨٣٢٠,٥٠	٧٣١٤٩٦١,٥٠	حجز ٢٥ % من إجمالى الكمية
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	٣م	٥٨٢٥,٠٠	٨٠٣,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريق طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٧٧١٤,٠٠	٣٨٦,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠	٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠	٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR ..	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٤٨٥٨٦٠,٠٠	٢٤٨٥٨٦٠,٠٠	٢٤٨٥٨٦٠,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطوي للكوبرى بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm الخ.	طن	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٤٤٢٤,٠٠	١١٠,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	٩٣٠١٧٦,٠٠	٩٣٠١٧٦,٠٠	٩٣٠١٧٦,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على الiard لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال والأسعار النهائية بعد المفاوضة											
السابق											
الباقى											

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ الميينة بظهره وقدرها	سبق صرفها إلى المقابل	مدير عام الشئون المالية و الادارية
تحريراً فى / / ٢٠٢٣	المحاسب /	م/ مصطفى عبد الجواد
قرش جنيه	على الحساب	م/ محمد نصر طيبح
يدفع المقابل مبلغ	نهائياً	م/ محمد نصر طيبح
ملاحظة : الفئات	غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من	م/ محمد نصر طيبح
يعتمد ...	مدير المصلحة	م/ محمد نصر طيبح

الاستشارى العام للمشروع Systra

م/ اميرة حسن	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم
م / لويس سوسه	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد
م/ باهر ميخائيل	
م/ محمد صابر	

المقابل (كونكورد)

مدير المكتب الفنى م/ اشرف الهادى	مدير المشروع م/ محمد صابر
م/ محمد صابر	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / محمد نصر طيبح

رقم ومقدار التصديق

بند الميزانية

بيان المنصروف من المداولة


قيمة	
قرش	جنية
٦٧٤٠٠٩٩٤٩٨٨	٦٧٤٠٠٩٩٤٩٨٨
٦٤٤١٠٨٧٠٥١	٦٤٤١٠٨٧٠٥١
٢١٩٥٨٢٥٤٨٨	٢١٩٥٨٢٥٤٨٨
٠	٠
صافي المبلغ المستحق	

الاستقطاعات
رسم دفعة أصلي
رسم دفعة اضافي
امانات
ايرادات

تحريرا في سنة ٢٠٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبالغ مطلى بالامانة بتاريخ

الختم ذو التاريخ



رئيس الحسابات

الكاتب المنوط

روجع
يتمدد - سحب
شيك
اذن صرف

تقيد في سجل رقم ٥٥ ((ح . ع)) برقم
تحريرا في سنة ٢٠٠٠

علاقات الكاتب المنوطين

بمبلغ

تحريرا في سنة ٢٠٠٠

1- شطب

شيك

2- سحب

اذن صرف

شيك

3- تقيد في سجل

اذن صرف

4- وادرج في كشف الحوالات رقم

رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بينه (*) (واني تسلمت المستحق لى بالتام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

الجملة

استقطاعات

قيمة التحويل

تاريخ الميزانية

بتحويل

رقم الاستمارة

جنية

قرش

جنية

قرش

جنية

قرش

جنية

قرش

جنية

قرش

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠٠

جنية

قرش

قيمة التحويل

جنية

قرش

رسم دفعة اصلي

رسم دفعة اضافي

امانات

ايرادات

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول
