

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد ( رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) ( بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧ )

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع  
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع ( السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم ) بالامر المباشر

تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل  
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل  
عمالة او محملات اخري مستخلص رقم (٧) جارى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٢٧




يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طبخ

Handwritten signature and initials in blue ink.

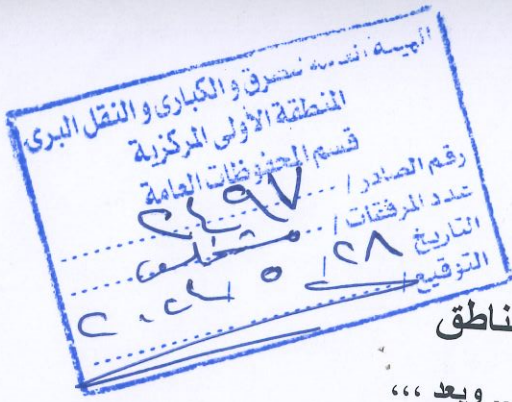

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع ( السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم ) بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف  
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...  
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٢٧

عدد المرفقات ( )  
أصل وصورتين من المستخلص  
استمارة ٥٠ ع ح  
عدد (١) كشف المعدات  
عدد (١) كشف المهندسين  
خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

Handwritten signatures and initials in blue ink.

## استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الرئيسة العامة للظرم والنجارى

قسم : العقود  
 المبلغ المستحق إلى : شركة / كوندور للتصدير والرمص  
 المطلوبات طيه ، أو : قارى } بموجب

مبار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك

شيك على البنك المركزي فى : صاحب الحق أو

شيك على الخارج : شركة / كوندور للتصدير والرمص

يسحب باسم : شركة / كوندور للتصدير والرمص

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

| بيانات الفواتير |         |       |
|-----------------|---------|-------|
| رقم             | التاريخ | جنيته |
| ٢١٩٥٨٢٥٦٨٨      |         |       |

٥١٤٦٦

٢١٩٥٨٢٥٦٨٨

رقم : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المختص

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

| عدد المرفقات | الاعتماد الإدارى ونوع الخصم |       |                    |                           |            |     |
|--------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------------------|------------|-----|
|              | بيانات                      |       |                    | نوع الخصم                 |            |     |
|              | قرش                         | جنيته | قسم                | فرع                       | فصل        | بند |
| ٢١٩٥٨٢٥٦٨٨   |                             |       |                    |                           |            |     |
|              | إجمالى الأصل                |       |                    |                           |            |     |
|              | قرش                         | جنيته | بيانات الاستقطاعات |                           |            |     |
|              |                             |       | عادى               | إضافى                     | دمغة توقيع |     |
|              |                             |       | قرش جنيته          | قرش جنيته                 | قرش        |     |
|              |                             |       | رسم الدمغة         | صافي القيمة المطلوب صرفها |            |     |

علامة

فى سنة ٢٠١٠

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_
- الإيرادات : \_\_\_\_\_
- بتاريخ : \_\_\_\_\_
- الإمضاء : \_\_\_\_\_

| الختم ذو التاريخ                           |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ | توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____ |
| روجع فى سنة ٢٠١٠                           | (علامات المراجع ورئيس المصلحة)     |
| يعتمد سحب                                  | شيك                                |
| إذن صرف                                    |                                    |
| مدير أو رئيس الحسابات                      | وكيل الحسابات                      |
| فى سنة ٢٠١٠ بمبلغ                          |                                    |

| الختم ذو التاريخ                                            |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح » ) | إمضاء الكاتب المنوط : _____ |
| (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة :                         | إمضاءات موظفى الشطب         |
| (٣) سحب                                                     | رقم : _____                 |
| (٤) قيد فى سجل                                              | تحت رقم : _____             |
| (٥) أدرج فى كشف                                             | رقم : _____                 |
| (٦) استلمت                                                  | إمضاء طالب أو كاتب التصدير  |
|                                                             | فى سنة ٢٠١٠                 |

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠٠٢ - ٢٠١٩

| رقم البند                                      | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                        | الوحدة | الفترة بعد المفاوضة بالجنيه | الكمية حسب المقايمة | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه) | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى | استقطاع أو حجز (بالجنيه) | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| أولاً : الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                             |                     |                           |                                   |                                                |                                 |                          |                      |                                          |
| ١                                              | بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                                                                                        | م.ط    | ٨٠٥,٠٠                      | ٥٥٠,٠٠              | ٥٥٠,٠٠                    | ٥٥٠,٠٠                            | ٥٥٠,٠٠                                         | جاري                            | ٤٤٢٧٥٠,٠٠                | ٤٤٢٧٥٠,٠٠            | ١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة    |
| ١-١                                            | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم                                                                                                                                                                                                                   | ٣م     | ٥٠,٠٠                       | ١٠٠٠,٠٠             | ٢٥٩٢,٠٠                   | ٢٠٣٥,٠٠                           | ٤٦٢٧,٠٠                                        | جاري                            | ٢٣١٣٥٠,٠٠                | ٢٣١٣٥٠,٠٠            | ٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين     |
| ٤                                              | بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسبك ٢٥ سم                                                                                                                                                      | ٣م     | ٥١,٠٠                       | ١٠٠٠,٠٠             | ٠٠,٠٠                     | ١٠٠٢٤,٠٠                          | ١٠٠٢٤,٠٠                                       | جاري                            | ٥١١٢٢٤,٠٠                | ٥١١٢٢٤,٠٠            | ٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة |
| ٧                                              | بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة                                                                                                                                                     | ٣م     | ١٠١,٠٠                      | ٣٠٠٠,٠٠             | ٣٠٠٠,٠٠                   | ٣٠٠٠,٠٠                           | ٣٠٠٠,٠٠                                        | جاري                            | ٣٠٣٠٠٠,٠٠                | ٣٠٣٠٠٠,٠٠            | ٤-مكتب الموقع متواجد                     |
| ٨                                              | بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية قبل تنفيذ الاعمال                                                                                                                                                                                        | ٣م     | ١٠١,٠٠                      | ٣٠٠٠,٠٠             | ٣٠٠٠,٠٠                   | ٣٠٠٠,٠٠                           | ٣٠٠٠,٠٠                                        | جاري                            | ٣٠٣٠٠٠,٠٠                | ٣٠٣٠٠٠,٠٠            | ٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة         |
| ٩                                              | بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب و تشويشها داخل الموقع                                                                                                                                            | ٣م     | ٨١,٠٠                       | ٢٧٠٠,٠٠             | ٢٦٧٧٢,٠٠                  | ٢٩٤,٠٠                            | ٢٧٠٦٦,٠٠                                       | جاري                            | ٢١٩٢٣٤٦,٠٠               | ٢١٩٢٣٤٦,٠٠           | ٦-لوحات المشروع متواجدة                  |
| ٩-١                                            | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم                                                                                                                                                                                                                   | ٤م     | ١٥٨,٠٠                      | ٢٠٠٠,٠٠             | ٠٠,٠٠                     | ١١٥٢,٦١                           | ١١٥٢,٦١                                        | جاري                            | ١٨٢١١٢,٣٨                | ١٨٢١١٢,٣٨            | ٧-البرنامج الزمني متواجد                 |
| ١٠                                             | بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة احلال سن و رمل                                                                                                                                                                                                    | ٤م     | ١٥٨,٠٠                      | ٢٠٠٠,٠٠             | ٠٠,٠٠                     | ١١٥٢,٦١                           | ١١٥٢,٦١                                        | جاري                            | ١٨٢١١٢,٣٨                | ١٨٢١١٢,٣٨            | ٨-الأمن الصناعي موجود                    |
| ١٣                                             | بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.                                                                                                   | م.ط    | ٦٥١٠,٠٠                     | ٤٥٠٠,٠٠             | ٢٦٠٣٣,٠٠                  | ٨٤٤,٠٠                            | ٢٦٨٧٧,٠٠                                       | جاري                            | ١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠             | ١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠         | ٩-التقرير المبني موجود                   |
| ١٣-١                                           | اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم                                                                                                                                                                                                                     | ٤م     | ٦٥٢٤١٤,٠٠                   | ٠٣,٠٠               | ٠٣,٠٠                     | ٠٣,٠٠                             | ٠٣,٠٠                                          | جاري                            | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠               | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠           | ١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة   |
| ١٤                                             | بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمى                                                                                                                                                                        | عدد    | ٦٥٢٤١٤,٠٠                   | ٠٣,٠٠               | ٠٣,٠٠                     | ٠٣,٠٠                             | ٠٣,٠٠                                          | جاري                            | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠               | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠           | ١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه        |
| ١٤-١                                           | قطر ١٢٠ سم                                                                                                                                                                                                                                       | عدد    | ٦٤٩١٥,٠٠                    | ١٠٠,٠٠              | ٦٨,٠٠                     | ٠٢,٠٠                             | ٧٠,٠٠                                          | جاري                            | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠               | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠           | ١٢-المستندات جاهزة                       |
| ١٧                                             | بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...                                                                                                                                                    | عدد    | ٦٤٩١٥,٠٠                    | ١٠٠,٠٠              | ٦٨,٠٠                     | ٠٢,٠٠                             | ٧٠,٠٠                                          | جاري                            | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠               | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠           |                                          |
| ١٧-١                                           | قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .                                                                                                                                                                          | ٣م     | ١٩٢٤,٠٠                     | ٢٥٠٢,٠٠             | ٣٤٤٥,٠٠                   | ٠٠,٠٠                             | ٣٤٤٥,٠٠                                        | جاري                            | ٦٦٢٨١٨٠,٠٠               | ٦٦٢٨١٨٠,٠٠           |                                          |
| ١٨                                             | بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم/ ٢ ولا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م                                                                                                | ٣م     | ٣٤٦٠,٠٠                     | ٤٦٠٠,٠٠             | ١٩٦٢٢,٠٠                  | ١١٤٧,٠٠                           | ٢٠٧٦٩,٠٠                                       | جاري                            | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠              | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠          |                                          |
| ١٩                                             | بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/ ٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم/ ٢                                      | ٣م     | ٣٤٦٠,٠٠                     | ٤٦٠٠,٠٠             | ١٩٦٢٢,٠٠                  | ١١٤٧,٠٠                           | ٢٠٧٦٩,٠٠                                       | جاري                            | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠              | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠          |                                          |
| ٢٠                                             | بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ و صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم/ ٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/ ٣ اسمنت بورتلاندي عادى       | ٣م     | ٤٧٧١,٠٠                     | ١٠٠٠,٠٠             | ٢٢٢٣,٠٠                   | ١١٨,٠٠                            | ٢٣٤١,٠٠                                        | جاري                            | ١١١٦٨٩١١,٠٠              | ١١١٦٨٩١١,٠٠          |                                          |
| ٢٠-١                                           | ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج                                                                                                                                                                                   | ٣م     | ٤٩٧٣,٠٠                     | ١٣٥٠,٠٠             | ٤١٨٣,٠٠                   | ٣٧٦,٠٠                            | ٤٥٥٩,٠٠                                        | جاري                            | ٢٢٦٧١٩٠,٧٠               | ٢٢٦٧١٩٠,٧٠           |                                          |
| ٢٠-٢                                           | ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج                                                                                                                                                                               | ٣م     | ٤٩٧٣,٠٠                     | ١٣٥٠,٠٠             | ٤١٨٣,٠٠                   | ٣٧٦,٠٠                            | ٤٥٥٩,٠٠                                        | جاري                            | ٢٢٦٧١٩٠,٧٠               | ٢٢٦٧١٩٠,٧٠           |                                          |
| ٢٤                                             | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة اجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم/ ٢. | ٣م     | ٩٥٣٤,٠٠                     | ١٣٠٠,٠٠             | ٧٥٠,٠٠                    | ٢٧٣,٠٠                            | ١٠٢٣,٠٠                                        | جاري                            | ٢٤٣٨٣٢٠,٥٠               | ٧٣١٤٩٦١,٥٠           | حجز ٢٥ % من إجمالي الكمية                |
| ٢٤-٢                                           | ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة                                                                                                                                                                                    | ٣م     | ٥٨٢٥,٠٠                     | ٨٠٣,٠٠              | ٢٩٢,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٢٩٢,٠٠                                         | جاري                            | ١٧٠٠٩٠٠,٠٠               | ١٧٠٠٩٠٠,٠٠           |                                          |
| ٢٥                                             | بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة للبريق طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م/ ٣                                                                                                                                  | طن     | ٤٤٤٤٢,٠٠                    | ٢١٦٢٨,٠٠            | ٧٧١٤,٠٠                   | ٣٨٦,٠٠                            | ٨١٠٠,٠٠                                        | جاري                            | ٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠             | ٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠         |                                          |
| ٢٧                                             | بالطن توريد وتربيط و رص حديد تسليح B500 DWR ..                                                                                                                                                                                                   | طن     | ١٢٤٢٩٣,٠٠                   | ١٥٠٠,٠٠             | ٢٠,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ٢٠,٠٠                                          | جاري                            | ٢٤٨٥٨٦٠,٠٠               | ٢٤٨٥٨٦٠,٠٠           |                                          |
| ٢٩                                             | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm ..... الخ.                                                     | طن     | ٦٤,٠٠                       | ٢٥٠٠,٠٠             | ١٤٤٢٤,٠٠                  | ١١٠,٠٠                            | ١٤٥٣٤,٠٠                                       | جاري                            | ٩٣٠١٧٦,٠٠                | ٩٣٠١٧٦,٠٠            |                                          |
| ٣٢                                             | بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على الiard لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة                                                                                                                                                  | طن     | ٤٤٤٤٢,٠٠                    | ٢١٦٢٨,٠٠            | ٠٠,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ٠٠,٠٠                                          | جاري                            | ٠٠,٠٠                    | ٠٠,٠٠                |                                          |
| ٢٧                                             | بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..                                                                                                                                                                                                               | طن     | ٤٤٤٤٢,٠٠                    | ٢١٦٢٨,٠٠            | ٠٠,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ٠٠,٠٠                                          | جاري                            | ٠٠,٠٠                    | ٠٠,٠٠                |                                          |
| إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة  |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                             |                     |                           |                                   |                                                |                                 |                          |                      |                                          |
| السابق                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                             |                     |                           |                                   |                                                |                                 |                          |                      |                                          |
| الباقى                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                             |                     |                           |                                   |                                                |                                 |                          |                      |                                          |

الهيئة العامة للطرق والكبارى

|                                                                 |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها | سبق صرفها إلى المقاول            | مدير عام الشئون المالية و الادارية |
| تحريراً فى / / ٢٠٢٣                                             | المحاسب /                        | م/ مصطفى عبد الجواد                |
| قرش جنيه                                                        | على الحساب                       |                                    |
| يدفع المقاول مبلغ                                               | نهائياً                          |                                    |
| ملاحظة : الفئات                                                 | غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من |                                    |
| يعتمد                                                           | مدير المصلحة                     |                                    |

الاستشاري العام للمشروع Systra

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| م/ اميرة حسن    | مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم  |
| م / لويس سوسه   | مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد |
| م/ باهر ميخائيل |                                    |

المقاول ( يونيكورد )

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| مدير المكتب الفني م/ اشرف الهادى |  |
| مدير المشروع م/ محمد صابر        |  |

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / ناصر محمد نصر طيبخ

بند المیزانیة :

| تحريرا في .....                        | سنة ٢٠٠٠ | رئيس المصلحة | علامة         |
|----------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات     | .....    | .....        | امضاء : ..... |
| اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف | .....    | .....        | امضاء : ..... |
| بان المبالغ مطبى بالامانة بتاريخ       | .....    | .....        | امضاء : ..... |

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



### رئيس الحسابات

## علاقات الكتاب المنوطين

يعتمد - سحب

---

شيك

اذن صرف

بمبلغ

تصريف اف..... سنة ٢٠٠

- 1- شطب  
شيك
- 2- سحب  
اذن صرف  
شيك
- 3- تعيد في سجل  
اذن صرف

وادرج فى كشف الحوالات رقم.....  
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم ..... وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( \* ) (( واني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل ))  
التاريخ ..... سنة ٢٠٠٠  
المقاول : .....

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

[illegible]

عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم ١٥٧ حتى كم ١٦٠+٦٠٠ بطول ٣,٦ كم ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السفينة - العلمين)

مستخلص رقم (٩) جارى

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٣/٣١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١

تنفيذ : كونكوردي للتشييد والرصف

الهيئة العامة للطرق والكباري

| رقم البند                                       | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                      | الوحدة | الفئة بعد المفاوضة بالجنيه | الكمية حسب المقايضة | مقدار العمل السابق لإجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه) | استقطاع أو حجز (بالجنيه) | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| أولاً : أعمال الكوبري                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                            |                     |                            |                                   |                                      |                                                |                          |                      |                                          |
| ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                            |                     |                            |                                   |                                      |                                                |                          |                      |                                          |
| ١                                               | بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                                                                                                      | م.ط    | ٨٠٥,٠٠                     | ٥٥٠,٠٠              | ٥٥٠,٠٠                     | ٥٥٠,٠٠                            | ٥٥٠,٠٠                               | ٥٥٠,٠٠                                         | ٤٤٢٧٥٠,٠٠                | ٤٤٢٧٥٠,٠٠            | ١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة    |
| ١.١                                             | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                    | م      | ٥٠,٠٠                      | ١٠٠٠,٠٠             | ٢٥٩٢,٠٠                    | ٢٠٣٥,٠٠                           | ٤٦٢٧,٠٠                              | ٤٦٢٧,٠٠                                        | ٢٣١٣٥٠,٠٠                | ٢٣١٣٥٠,٠٠            | ٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين     |
| ٤                                               | بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم                                                                                                                                                                    | م      | ٥١,٠٠                      | ١٠٠٠,٠٠             | ٣٠٠٠,٠٠                    | ١٠٠٢٤,٠٠                          | ١٠٠٢٤,٠٠                             | ١٠٠٢٤,٠٠                                       | ٥١١٢٢٤,٠٠                | ٥١١٢٢٤,٠٠            | ٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة |
| ٧                                               | بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة                                                                                                                                                                   | م      | ١٠١,٠٠                     | ٣٠٠٠,٠٠             | ٣٠٠٠,٠٠                    | ٣٠٠٠,٠٠                           | ٣٠٠٠,٠٠                              | ٣٠٠٠,٠٠                                        | ٣٠٣٠٠٠,٠٠                | ٣٠٣٠٠٠,٠٠            | ٤-مكتب الموقع متواجد                     |
| ٨                                               | بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال                                                                                                                                                                                                      | م      | ١٠١,٠٠                     | ٣٠٠٠,٠٠             | ٣٠٠٠,٠٠                    | ٣٠٠٠,٠٠                           | ٣٠٠٠,٠٠                              | ٣٠٠٠,٠٠                                        | ٣٠٣٠٠٠,٠٠                | ٣٠٣٠٠٠,٠٠            | ٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة         |
| ٩                                               | بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب و تشوينها داخل الموقع                                                                                                                                                          | م      | ٨١,٠٠                      | ٢٧٠٠,٠٠             | ٢٦٧٧٢,٠٠                   | ٢٩٤,٠٠                            | ٢٧٠٦٦,٠٠                             | ٢٧٠٦٦,٠٠                                       | ٢١٩٢٣٤٦,٠٠               | ٢١٩٢٣٤٦,٠٠           | ٦-لوحات المشروع متواجدة                  |
| ١.٩                                             | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                    | م      | ١٥٨,٠٠                     | ٢٠٠٠,٠٠             | ٢٠٠٠,٠٠                    | ١١٥٢,٦١                           | ١١٥٢,٦١                              | ١١٥٢,٦١                                        | ١٨٢١١٢,٣٨                | ١٨٢١١٢,٣٨            | ٧-البرنامج الزمني متواجد                 |
| ١٠                                              | بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن ورمل                                                                                                                                                                                                                   | م      | ١٥٨,٠٠                     | ٢٠٠٠,٠٠             | ٢٠٠٠,٠٠                    | ١١٥٢,٦١                           | ١١٥٢,٦١                              | ١١٥٢,٦١                                        | ١٨٢١١٢,٣٨                | ١٨٢١١٢,٣٨            | ٨-الامن الصناعي موجود                    |
| ١٣                                              | بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة                                                                                                                  | م.ط    | ٦٥١٠,٠٠                    | ٤٥٠٠,٠٠             | ٢٦٠٣٣,٠٠                   | ٨٤٤,٠٠                            | ٢٦٠٣٣,٠٠                             | ٢٦٠٣٣,٠٠                                       | ١٧٤٩٦٩٢٧,٠٠              | ١٧٤٩٦٩٢٧,٠٠          | ٩-التقرير المبني موجود                   |
| ١.١٣                                            | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                      | م.ط    | ٦٥١٠,٠٠                    | ٤٥٠٠,٠٠             | ٢٦٠٣٣,٠٠                   | ٨٤٤,٠٠                            | ٢٦٠٣٣,٠٠                             | ٢٦٠٣٣,٠٠                                       | ١٧٤٩٦٩٢٧,٠٠              | ١٧٤٩٦٩٢٧,٠٠          | ١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة   |
| ١٤                                              | بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي                                                                                                                                                                                      | عدد    | ٦٥٢٤١٤,٠٠                  | ٠٣,٠٠               | ٠٣,٠٠                      | ٠٣,٠٠                             | ٠٣,٠٠                                | ٠٣,٠٠                                          | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠               | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠           | ١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه        |
| ١.١٤                                            | قطر ١٢٠ سم                                                                                                                                                                                                                                                     | عدد    | ٦٥٢٤١٤,٠٠                  | ٠٣,٠٠               | ٠٣,٠٠                      | ٠٣,٠٠                             | ٠٣,٠٠                                | ٠٣,٠٠                                          | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠               | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠           | ١٢-المستندات تاريخه                      |
| ١٧                                              | بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...                                                                                                                                                                  | عدد    | ٦٤٩١٥,٠٠                   | ١٠٠٠,٠٠             | ٦٨,٠٠                      | ٠٢,٠٠                             | ٦٨,٠٠                                | ٦٨,٠٠                                          | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠               | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠           | ١٣-المستندات تاريخه                      |
| ١.١٧                                            | قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ                                                                                                                                                                                          | م      | ١٩٢٤,٠٠                    | ٢٥٠٢,٠٠             | ٣٤٤٥,٠٠                    | ٠٠٠,٠٠                            | ٣٤٤٥,٠٠                              | ٣٤٤٥,٠٠                                        | ٦٦٢٨١٨٠,٠٠               | ٦٦٢٨١٨٠,٠٠           | ١٤-المستندات تاريخه                      |
| ١٨                                              | بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم <sup>٢</sup> ولا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup>                                                                                       | م      | ٣٤٦٠,٠٠                    | ٤٦٠٠,٠٠             | ١٩٦٢٢,٠٠                   | ١١٤٧,٠٠                           | ١٩٦٢٢,٠٠                             | ١٩٦٢٢,٠٠                                       | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠              | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠          | ١٥-المستندات تاريخه                      |
| ١٩                                              | بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup>                               | م      | ٣٤٦٠,٠٠                    | ٤٦٠٠,٠٠             | ١٩٦٢٢,٠٠                   | ١١٤٧,٠٠                           | ١٩٦٢٢,٠٠                             | ١٩٦٢٢,٠٠                                       | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠              | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠          | ١٦-المستندات تاريخه                      |
| ٢٠                                              | بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ و صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و النجبان و الاكتاف باستخدام قرم مصغره مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه بإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادى | م      | ٤٧٧١,٠٠                    | ١٠٠٠,٠٠             | ٢٢٢٣,٠٠                    | ١١٨,٠٠                            | ٢٢٢٣,٠٠                              | ٢٢٢٣,٠٠                                        | ١١١٦٨٩١١,٠٠              | ١١١٦٨٩١١,٠٠          | ١٧-المستندات تاريخه                      |
| ٢٠.١                                            | ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج                                                                                                                                                                                                 | م      | ٤٩٧٣,٠٠                    | ١٣٥٠,٠٠             | ٤١٨٣,٠٠                    | ٣٧٦,٠٠                            | ٤١٨٣,٠٠                              | ٤١٨٣,٠٠                                        | ٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠              | ٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠          | ١٨-المستندات تاريخه                      |
| ٢٠.٢                                            | ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج                                                                                                                                                                                             | م      | ٤٩٧٣,٠٠                    | ١٣٥٠,٠٠             | ٤١٨٣,٠٠                    | ٣٧٦,٠٠                            | ٤١٨٣,٠٠                              | ٤١٨٣,٠٠                                        | ٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠              | ٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠          | ١٩-المستندات تاريخه                      |
| ٢٤                                              | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالير مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup>    | م      | ٩٥٣٤,٠٠                    | ١٣٠٠,٠٠             | ٧٥٠,٠٠                     | ٢٧٣,٠٠                            | ٧٥٠,٠٠                               | ٧٥٠,٠٠                                         | ٢٤٣٨٢٢٠,٥٠               | ٢٤٣٨٢٢٠,٥٠           | ٢٠-المستندات تاريخه                      |
| ٢٤.ب                                            | ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة                                                                                                                                                                                                  | م      | ٥٨٢٥,٠٠                    | ٨٠٣,٠٠              | ٢٩٢,٠٠                     | ٠٠٠,٠٠                            | ٢٩٢,٠٠                               | ٢٩٢,٠٠                                         | ١٧٠٠٩٠٠,٠٠               | ١٧٠٠٩٠٠,٠٠           | ٢١-المستندات تاريخه                      |
| ٢٥                                              | بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م <sup>٣</sup>                                                                                                                                      | طن     | ٤٤٤٤٢,٠٠                   | ٢١٦٢٨,٠٠            | ٧٧١٤,٠٠                    | ٣٨٦,٠٠                            | ٧٧١٤,٠٠                              | ٧٧١٤,٠٠                                        | ٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠             | ٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠         | ٢٢-المستندات تاريخه                      |
| ٢٧                                              | بالطن توريد وترتيب و رص حديد تسليح B500 DWR                                                                                                                                                                                                                    | طن     | ١٢٤٢٩٣,٠٠                  | ١٥٠٠,٠٠             | ٢٠,٠٠                      | ٠٠٠,٠٠                            | ٢٠,٠٠                                | ٢٠,٠٠                                          | ٢٤٨٥٨٦,٠٠                | ٢٤٨٥٨٦,٠٠            | ٢٣-المستندات تاريخه                      |
| ٢٩                                              | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالير Low Relaxation                                                                                                                                   | طن     | ٦٤,٠٠                      | ٢٥٠٠,٠٠             | ١٤٤٢٤,٠٠                   | ١١٠,٠٠                            | ١٤٤٢٤,٠٠                             | ١٤٤٢٤,٠٠                                       | ٩٣٠١٧٦,٠٠                | ٩٣٠١٧٦,٠٠            | ٢٤-المستندات تاريخه                      |
| ٣٢                                              | بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على اليباد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة                                                                                                                                                                | م      | ٦٤,٠٠                      | ٢٥٠٠,٠٠             | ١٤٤٢٤,٠٠                   | ١١٠,٠٠                            | ١٤٤٢٤,٠٠                             | ١٤٤٢٤,٠٠                                       | ٩٣٠١٧٦,٠٠                | ٩٣٠١٧٦,٠٠            | ٢٥-المستندات تاريخه                      |
| التشوينات                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                            |                     |                            |                                   |                                      |                                                |                          |                      |                                          |
| ٢٧                                              | بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR                                                                                                                                                                                                                                | طن     | ٤٤٤٤٢,٠٠                   | ٢١٦٢٨,٠٠            | ٧٧١٤,٠٠                    | ٣٨٦,٠٠                            | ٧٧١٤,٠٠                              | ٧٧١٤,٠٠                                        | ٢٤٨٥٨٦,٠٠                | ٢٤٨٥٨٦,٠٠            | ٢٦-المستندات تاريخه                      |
| إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة   |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                            |                     |                            |                                   |                                      |                                                |                          |                      |                                          |
| السابق                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                            |                     |                            |                                   |                                      |                                                |                          |                      |                                          |
| الباقى                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                            |                     |                            |                                   |                                      |                                                |                          |                      |                                          |

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونكوردي)

مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم

م/ اميرة حسن

مدير المكتب الفني م/ اشرف الهادى

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

م/ لويس سوسه

مدير المشروع م/ محمد صابر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ..... سقى صرفها إلى المقاول

المحاسب /

تحريراً فى / / ٢٠٢٣

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ .....

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد ...

غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

بند المیزانیة

| قيمة                |       | بي                         | ان المنص | رف من المة | اول        | ة          |
|---------------------|-------|----------------------------|----------|------------|------------|------------|
| قرش                 | جنية  | بيان الاعمال التي تمت الان | محدود    | مصرح بصرفه | مباقة صرفه | مستحق صرفه |
| 775.00              | 99.99 |                            |          |            |            |            |
| 75.00               | 10.00 |                            |          |            |            |            |
| 115.00              | 20.00 |                            |          |            |            |            |
| 0                   |       |                            |          |            |            |            |
| صافي المبلغ المستحق |       |                            |          |            |            |            |

| تحريرا في .....                        | منة   | ٢٠٠ رئيس المصلحة | علامة         |
|----------------------------------------|-------|------------------|---------------|
| اقرار كاتب سجل الحجزات والتفازلات      | ..... | .....            | امضاء : ..... |
| اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف | ..... | .....            | امضاء : ..... |
| بلن المبالغ مطلى بالامانة بتاريخ       | ..... | .....            | امضاء : ..... |

تقيد في سجل رقم ٥٥ (( ح . ع )) برقم  
تحريرا في ..... سنة ٢٠٠

الكتب المنوط

الختم نو التاريخ

..... روجع

يُعمد - مسح

---

شيك

انتم ص ف

علاقات الكتاب المنوطين

بمبلغ

تحریر افی..... سلة ۲۰۰

1- شطب

ك

-2

اذن مصرف

شيك

3- نقد ف. سطل

اذن صرف

ت رقم

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم ..... وأقر بآني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( \* ) (( واني تسلمت المستحق لي بالتام وإيس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل ))  
التاريخ ..... سنة ٢٠٠  
المقاول : .....

\* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]

| رقم البند                                       | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                     | الوحدة | الفترة بعد المفاوضات بالجنيه | الكمية حسب المقايمة | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه) | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه) | استقطاع او حجز (بالجنيه) | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| أولاً : الأعمال الكباري                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                     |                           |                                   |                                                |                                                |                          |                      |                                           |
| ثانياً : الأعمال بالاسعار النهائية بعد المفاوضة |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                     |                           |                                   |                                                |                                                |                          |                      |                                           |
| ١                                               | بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                                                                                                     | م.ط    | ٨٠٥,٠٠                       | ٥٥٠,٠٠              | ٥٥٠,٠٠                    | ٥٥٠,٠٠                            | ٥٥٠,٠٠                                         | ٥٥٠,٠٠                                         | ٤٤٢٧٥٠,٠٠                | ٤٤٢٧٥٠,٠٠            | ١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة    |
| ١-١                                             | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم                                                                                                                                                                                                                                | م      | ٥٠,٠٠                        | ١٠٠,٠٠              | ٢٥٩٢,٠٠                   | ٢٠٣٥,٠٠                           | ٤٦٢٧,٠٠                                        | ٤٦٢٧,٠٠                                        | ٢٣١٣٥٠,٠٠                | ٢٣١٣٥٠,٠٠            | ٢- مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين     |
| ٤                                               | بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم                                                                                                                                                                   | م      | ٥١,٠٠                        | ١٠٠,٠٠              | ٠٠,٠٠                     | ١٠٠,٢٤,٠٠                         | ١٠٠,٢٤,٠٠                                      | ١٠٠,٢٤,٠٠                                      | ٥١١٢٢٤,٠٠                | ٥١١٢٢٤,٠٠            | ٣- التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة |
| ٧                                               | بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة                                                                                                                                                                  | م      | ١٠١,٠٠                       | ٣٠٠,٠٠              | ٣٠٠,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٣٠٠,٠٠                                         | ٣٠٠,٠٠                                         | ٣٠٣٠٠٠,٠٠                | ٣٠٣٠٠٠,٠٠            | ٤- مكتب الموقع متواجد                     |
| ٨                                               | بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال                                                                                                                                                                                                     | م      | ٨١,٠٠                        | ٢٧٠,٠٠              | ٢٦٧٧٢,٠٠                  | ٢٩٤,٠٠                            | ٢٧٠,٦٦,٠٠                                      | ٢٧٠,٦٦,٠٠                                      | ٢١٩٢٣٤٦,٠٠               | ٢١٩٢٣٤٦,٠٠           | ٥- الحد الأدنى من المعدات متواجدة         |
| ٩                                               | بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع                                                                                                                                                         | م      | ١٥٨,٠٠                       | ٢٠٠,٠٠              | ٠٠,٠٠                     | ١١٥٢,٦١                           | ١١٥٢,٦١                                        | ١١٥٢,٦١                                        | ١٨٢١١٢,٣٨                | ١٨٢١١٢,٣٨            | ٦- لوحات المشروع متواجدة                  |
| ١-٩                                             | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم                                                                                                                                                                                                                                | م      | ٦٥١,٠٠                       | ٥٠٠,٠٠              | ٢٦٠,٣٣,٠٠                 | ٨٤٤,٠٠                            | ٢٦٨٧٧,٠٠                                       | ٢٦٨٧٧,٠٠                                       | ١٧٤٩٩٩٢٧,٠٠              | ١٧٤٩٩٩٢٧,٠٠          | ٧- البرنامج الزمني متواجد                 |
| ١٠                                              | بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن و رمل                                                                                                                                                                                                                 | م      | ٦٥١,٠٠                       | ٥٠٠,٠٠              | ٢٦٠,٣٣,٠٠                 | ٨٤٤,٠٠                            | ٢٦٨٧٧,٠٠                                       | ٢٦٨٧٧,٠٠                                       | ١٧٤٩٩٩٢٧,٠٠              | ١٧٤٩٩٩٢٧,٠٠          | ٨- الأمن الصناعي موجود                    |
| ١٣                                              | بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.                                                                                                                | م.ط    | ٦٥١,٠٠                       | ٥٠٠,٠٠              | ٢٦٠,٣٣,٠٠                 | ٨٤٤,٠٠                            | ٢٦٨٧٧,٠٠                                       | ٢٦٨٧٧,٠٠                                       | ١٧٤٩٩٩٢٧,٠٠              | ١٧٤٩٩٩٢٧,٠٠          | ٩- التقرير المبدئي موجود                  |
| ١-١٣                                            | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم                                                                                                                                                                                                                                  | م      | ٦٥١,٠٠                       | ٥٠٠,٠٠              | ٢٦٠,٣٣,٠٠                 | ٨٤٤,٠٠                            | ٢٦٨٧٧,٠٠                                       | ٢٦٨٧٧,٠٠                                       | ١٧٤٩٩٩٢٧,٠٠              | ١٧٤٩٩٩٢٧,٠٠          | ١٠- وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة   |
| ١٤                                              | بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمي                                                                                                                                                                                      | عدد    | ٦٥٢٤١٤,٠٠                    | ٠٣,٠٠               | ٠٣,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ٠٣,٠٠                                          | ٠٣,٠٠                                          | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠               | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠           | ١١- وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه        |
| ١-١٤                                            | قطر ١٢٠ سم                                                                                                                                                                                                                                                    | عدد    | ٦٥٢٤١٤,٠٠                    | ٠٣,٠٠               | ٠٣,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ٠٣,٠٠                                          | ٠٣,٠٠                                          | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠               | ١٩٥٧٢٤٢,٠٠           | ١٢- شهادة سلامة ابراهيم                   |
| ١٧                                              | بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...                                                                                                                                                                  | عدد    | ٦٤٩١٥,٠٠                     | ١٠٠,٠٠              | ٦٨,٠٠                     | ٠٢,٠٠                             | ٧٠,٠٠                                          | ٧٠,٠٠                                          | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠               | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠           |                                           |
| ١-١٧                                            | قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .                                                                                                                                                                                       | عدد    | ٦٤٩١٥,٠٠                     | ١٠٠,٠٠              | ٦٨,٠٠                     | ٠٢,٠٠                             | ٧٠,٠٠                                          | ٧٠,٠٠                                          | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠               | ٤٥٤٤٠٥٠,٠٠           |                                           |
| ١٨                                              | بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات ويدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم <sup>٢</sup> و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م <sup>٣</sup>                                                                                     | م      | ١٩٢٤,٠٠                      | ٣٥٠,٢,٠٠            | ٣٤٤٥,٠٠                   | ٠٠,٠٠                             | ٣٤٤٥,٠٠                                        | ٣٤٤٥,٠٠                                        | ٦٦٢٨١٨٠,٠٠               | ٦٦٢٨١٨٠,٠٠           |                                           |
| ١٩                                              | بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادى و على ان تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup>                               | م      | ٣٤٦٠,٠٠                      | ٤٦٠,٠٠              | ١٩٦٢٢,٠٠                  | ١١٤٧,٠٠                           | ٢٠٧٦٩,٠٠                                       | ٢٠٧٦٩,٠٠                                       | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠              | ٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠          |                                           |
| ٢٠                                              | بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ و صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادى | م      | ٤٧٧١,٠٠                      | ١٠٠,٠٠              | ٢٢٢٣,٠٠                   | ١١٨,٠٠                            | ٢٣٤١,٠٠                                        | ٢٣٤١,٠٠                                        | ١١١٦٨٩١١,٠٠              | ١١١٦٨٩١١,٠٠          |                                           |
| ٢٠-د                                            | ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج                                                                                                                                                                                                | م      | ٤٩٧٣,٠٠                      | ١٣٥٠,٠٠             | ٤١٨٣,٠٠                   | ٣٧٦,٠٠                            | ٤٥٥٩,٠٠                                        | ٤٥٥٩,٠٠                                        | ٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠              | ٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠          |                                           |
| ٢٠-هـ                                           | ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج                                                                                                                                                                                            | م      | ٤٩٧٣,٠٠                      | ١٣٥٠,٠٠             | ٤١٨٣,٠٠                   | ٣٧٦,٠٠                            | ٤٥٥٩,٠٠                                        | ٤٥٥٩,٠٠                                        | ٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠              | ٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠          |                                           |
| ٢٤                                              | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالير مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> . | م      | ٩٥٣٤,٠٠                      | ١٣٠٠,٠٠             | ٧٥٠,٠٠                    | ٢٧٣,٠٠                            | ١٠٢٣,٠٠                                        | ١٠٢٣,٠٠                                        | ٢٤٣٨٣٢٠,٥٠               | ٢٤٣٨٣٢٠,٥٠           | حجز ٢٥% من اجمالي الكمية                  |
| ٢٤-ب                                            | ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة                                                                                                                                                                                                 | م      | ٥٨٢٥,٠٠                      | ٨٠٣,٠٠              | ٢٩٢,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٢٩٢,٠٠                                         | ٢٩٢,٠٠                                         | ١٧٠٠٩٠٠,٠٠               | ١٧٠٠٩٠٠,٠٠           |                                           |
| ٢٥                                              | بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م <sup>٣</sup>                                                                                                                                     | م      | ٤٤٤٤٢,٠٠                     | ٢١٦٢٨,٠٠            | ٧٧١٤,٠٠                   | ٣٨٦,٠٠                            | ٨١٠٠,٠٠                                        | ٨١٠٠,٠٠                                        | ٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠             | ٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠         |                                           |
| ٢٧                                              | بالطن توريد وتربيط و رص حديد تسليح B500 DWR ..                                                                                                                                                                                                                | طن     | ١٢٤٢٩٣,٠٠                    | ١٥٠,٠٠              | ٢٠,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ٢٠,٠٠                                          | ٢٠,٠٠                                          | ٢٤٨٥٨٦٠,٠٠               | ٢٤٨٥٨٦٠,٠٠           |                                           |
| ٢٩                                              | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm ..... الخ .                                                                | طن     | ٦٤,٠٠                        | ٢٥٠٠,٠٠             | ١٤٤٢٤,٠٠                  | ١١٠,٠٠                            | ١٤٥٣٤,٠٠                                       | ١٤٥٣٤,٠٠                                       | ٩٣٠١٧٦,٠٠                | ٩٣٠١٧٦,٠٠            |                                           |
| ٣٢                                              | بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان و جهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة                                                                                                                                                              | م      | ٦٤,٠٠                        | ٢٥٠٠,٠٠             | ١٤٤٢٤,٠٠                  | ١١٠,٠٠                            | ١٤٥٣٤,٠٠                                       | ١٤٥٣٤,٠٠                                       | ٩٣٠١٧٦,٠٠                | ٩٣٠١٧٦,٠٠            |                                           |
| التشوينات                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                     |                           |                                   |                                                |                                                |                          |                      |                                           |
| ٢٧                                              | بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..                                                                                                                                                                                                                            | طن     | ٤٤٤٤٢,٠٠                     | ٢١٦٢٨,٠٠            | ٠٠,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ٠٠,٠٠                                          | ٠٠,٠٠                                          | ٠٠,٠٠                    | ٠٠,٠٠                |                                           |
| إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة   |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                     |                           |                                   |                                                |                                                |                          |                      |                                           |
| السابق                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                     |                           |                                   |                                                |                                                |                          |                      |                                           |
| الباقى                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                     |                           |                                   |                                                |                                                |                          |                      |                                           |
| ٦٧٤٠٥٩٩٢٩,٨٨                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                     |                           |                                   |                                                |                                                |                          |                      |                                           |
| ٦٤٢١٠١٥٧٥,٠٠                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                     |                           |                                   |                                                |                                                |                          |                      |                                           |
| ٣١٩٥٨٣٥٤,٨٨                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                     |                           |                                   |                                                |                                                |                          |                      |                                           |

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول ( كونكورد )

مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم

م/ اميرة حسن

مدير المكتب الفني م/ اشرف الهادي

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

م/ لويس سوسة

مدير المشروع م/ محمد صابر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب / ..... / ٢٠٢٣ / / تحريراً في

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ .....

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد ...

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م/ نصر محمد نصر طيبخ

| تحريرا في .....                        | سنة ٢٠٠٠ | رئيس المصلحة | علامة |
|----------------------------------------|----------|--------------|-------|
| اقرار كتب سجل الحجوزات والتفاريات      | .....    | امضاء :      | ..... |
| اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف | .....    | امضاء :      | ..... |
| بان المبالغ مملو بالامانة بتاريخ       | .....    | امضاء :      | ..... |

الكاتب المنوط

الْخَتَمُ نَوَ الْقَارِيخِ



رئيس الحسابات

يعتمد - سحب  $\frac{\text{شيك}}{\text{اذن صرف}}$

علاقات الكتاب المخطوطين

بمیلین

تحریر افی ..... سالہ ۲۰۰

- |    |                                                                 |         |              |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 1- | شطب                                                             | شيك     | الكتب المنوط | الختم ذو التاريخ |
| 2- | مسحب                                                            | اذن صرف | الكتب المنوط |                  |
| 3- | تقييد في سجل                                                    | شيك     | الكتب المنوط |                  |
|    | اذن صرف                                                         | تحت رقم | الكتب المنوط |                  |
| 4- | وادرج في كشف الحوالات رقم.....<br>رقم التقييد وعلامة كتاب الشطب |         |              |                  |

رقم القيد و علامة كتاب المطب

تسلمت التحويلة رقم ..... وأقر باني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( \* ) (( واني تسلمت المستحق لي بالتام واني ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل ))  
التاريخ ..... سنة ٢٠٠٠  
المقاول : .....

\* اذا كلفت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]
