

بخصوص :-  
عملية تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم /  
الواحات داخل دير الانبا مكاريوس

تنفيذ :-  
مكتب اعمار للمقاولات العامة ( يوسف شعبان و عبد العليم  
عبد القادر )  
عقد رقم :- العقد رقم ( ٥٧ ) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد .....

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم ( ختامي ) عن العملية عاليه من اصل و صورة  
و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

تحريراً في :- ٢٠٢٣/٠٩/٢٦  
مرفقات : ( )

اصل المستخلص + عد ١ صورة  
اصل استمارة ٥٠ ع . ح  
اصل بيان اعمال  
اصل الحصر  
صورة تجارب معمل  
عدد ( ٧ ) شهادات  
اصل المقاييس النهائية  
اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

عملية تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم /  
الواحات داخل دير الانبا مكاريوس  
بخصوص :-

مكتب اعمار للمقاولات العامه ( يوسف شعبان و عبد العليم  
عبد القادر )  
تنفيذ :-  
عقد رقم :- العقد رقم ( ٥٧ ) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

### السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد .....

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و  
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات  
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٣- لا يوجد محملات في هذا العقد
- ٤- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

تحرير في: ٢٠٢٣/٠٥/٣١  
مرفقات: ( )

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم / الواحات داخل دير الانبا مكاروريوس

مكتب اعمار للمقاولات العامه ( يوسف شعبان و عبد العليم عبد القادر )

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١

| بند | نوع الاعمال                                            | الوحدة         | الكمية السابقة | الكمية خلال المدة | الاجمالي | الموقع |     | الملاحظات                          |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|--------|-----|------------------------------------|
|     |                                                        |                |                |                   |          | من     | الي |                                    |
| 1   | اعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم                | م <sup>٢</sup> | ١٦,٥٠٠         | ٢٥٠               | ١٦,٧٥٠   |        |     |                                    |
| 2   | اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لصب قدمه الميول الجانبيه | م <sup>٣</sup> | ١,١٥٠          | ١٣٠               | ١,٢٨٠    |        |     | تم تنفيذ الاعمال بعد تاريخ ٢٠٢٢/١١ |

مهندس الشركه  
 نو

مهندس المشروع

مدير عام تنفيذ والصيانه



مقايضة ختامية عملية / اعمال التكميلية لمشروع طريق جنوب الفيوم - الواحات (الاعمال الصناعية ٣)

الشركة المنفذة / الشركة إعمار للمقاولات العامة (م/يوسف شعبان عبد العليم)

| رقم البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوحدة         | الكمية | السعر | الاجمالي |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
|           | اعمال الحماية من اخطار السيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |       |          |
| 1         | بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠.٨ فلوميت متدرج + ٣ م ٠.٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي على أن يكون السن نظيف و مضول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و تسوية السطح أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. | م <sup>٢</sup> | ١٦٧٥٠  | ١٨٥   | ٣٠٩٨٧٥٠  |
| 2         | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لصب قدمة الميول الجانبية طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى الاسمنت ٢٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> بورتلاند مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ١٨٥ كجم/سم <sup>٢</sup> و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                      | م <sup>٣</sup> | ١٢٨٠   | ١١٢٠  | ١٤٣٣٦٠٠  |
|           | الاجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |       | ٤٥٣٢٣٥٠  |
|           | العلاوة ٨%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |       | ٣٦٢٥٨٨   |
|           | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |       | ٤٨٩٤٩٣٨  |

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والمراقبة

م / حسام الدين حنا

مهندس الهيئة

م / محمد عبد الرازق

مهندس المقاول

م / يوسف شعبان

حصر أعمال

الاعمال الصناعية طريق جنوب الفيوم - الواحات

| رقم بند | وصف الاعمال                                                          | الوحدة         | الكمية بالمقاييس | العدد | الكميات المنقذة على الطبيعة |       |          | إضافة   | خصم  | الإجمالي | ملاحظات |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-------|----------|---------|------|----------|---------|
|         |                                                                      |                |                  |       | الطول                       | العرض | الارتفاع |         |      |          |         |
| ١       | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لصب قنطرة الميول الجانبية | م <sup>٣</sup> | ١٤٠٠             |       |                             |       |          |         |      |          |         |
|         | ميدة علوية                                                           |                |                  |       |                             |       |          |         |      |          |         |
|         | من محطة ٥٨.٦٤٠ الى محطة ٥٩.٦٠٠                                       |                |                  | ٢     | ٩٦٠.٠٠                      | ١.٦٥  | ٠.٢٠     | ٦٣٤     |      |          |         |
|         | ميدة سفلية                                                           |                |                  |       |                             |       |          |         |      |          |         |
|         | من محطة ٥٨.٦٤٠ الى محطة ٥٩.٦٠٠                                       |                |                  | ٢     | ٩٦٠.٠٠                      | ٠.٥٠  | ٠.٧٥     | ٧٢٠     |      |          |         |
|         | الإجمالي                                                             |                |                  |       |                             |       |          | ١٣٥٣.٦٠ | ٠.٠٠ | ١٣٥٣.٦٠  |         |

مهندس الإشراف  
/ محمد عبدالرازق حبيب

مهندس المقاول  
م / يوسف شعبان محمد العليم

٢

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السادسة بنى سويف

حصر أعمال

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السادسة بنى سويف

حصر أعمال

عملية / الاعمال التكميلية لمشروع طريق جنوب الفيوم - الواحات (القطاع الثالث من الاعمال الصناعية )  
مسطح الخرسانة م2

| المحطة    | المسطح | حجم الخرسانة م3 | مسطح الخرسانة م2 |
|-----------|--------|-----------------|------------------|
| 59+060.00 | 6.93   | 140.56          | 937.07           |
| 59+080.00 | 6.31   | 132.41          | 882.73           |
| 59+100.00 | 6.12   | 124.29          | 828.60           |
| 59+120.00 | 6.08   | 121.99          | 813.27           |
| 59+140.00 | 6.11   | 121.83          | 812.20           |
| 59+160.00 | 6.19   | 123.01          | 820.07           |
| 59+180.00 | 6.31   | 125.01          | 833.40           |
| 59+200.00 | 6.23   | 125.34          | 835.60           |
| 59+220.00 | 6.14   | 123.66          | 824.40           |
| 59+240.00 | 6.02   | 121.49          | 809.93           |
| 59+260.00 | 5.93   | 119.31          | 795.40           |
| 59+280.00 | 5.79   | 117.03          | 780.20           |
| 59+300.00 | 5.66   | 114.37          | 762.47           |
| 59+320.00 | 5.52   | 111.69          | 744.60           |

م. المعيارى  
ن. س

حصر أعمال

|          |          |      |           |
|----------|----------|------|-----------|
| 722.33   | 108.35   | 5.32 | 59+340.00 |
| 694.00   | 104.1    | 5.09 | 59+360.00 |
| 646.40   | 96.96    | 4.62 | 59+380.00 |
| 599.80   | 89.97    | 4.41 | 59+400.00 |
| 537.33   | 80.6     | 3.68 | 59+420.00 |
| 459.13   | 68.87    | 3.23 | 59+440.00 |
| 391.93   | 58.79    | 2.67 | 59+460.00 |
| 308.07   | 46.21    | 1.97 | 59+480.00 |
| 225.67   | 33.85    | 1.43 | 59+500.00 |
| 188.87   | 28.33    | 1.41 | 59+520.00 |
| 183.20   | 27.48    | 1.34 | 59+540.00 |
| 174.73   | 26.21    | 1.28 | 59+560.00 |
| 163.93   | 24.59    | 1.18 | 59+580.00 |
| 120.27   | 18.04    | 0.63 | 59+600.00 |
| 16895.60 | الاجمالي |      |           |

مهندس الاشراف

م / محمد عبد الرازق

مهندس المقاول

م / يوسف شعبان



تقرير رقم : ( ١٧١ )  
بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٢

المشروع : تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات ( القطاع الثالث )  
مقاول : شركة اعمار للمقاولات العامة  
نوع العينة : عدد ١٥ مكعب خرسانة  
نوع الاختبار : جهد الكسر

أحضرت العينة بمعرفة السيد المهندس / محمد عبدالرازق  
تنبيه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

| بيان الأعمال                     | تاريخ الصب | تاريخ الكسر | جهد الكسر<br>كجم/سم <sup>٢</sup> |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| مجموعات<br>خرسانه ميول<br>جانبيه | ٢٠٢٢/٨/١٤  | ٢٠٢٢/٩/٢٧   | ٢٧٢                              |
|                                  |            |             | ٢٧٢                              |
|                                  |            |             | ٢٦٢                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/١٥  |             | ٢٢٦                              |
|                                  |            |             | ٢٤٩                              |
|                                  |            |             | ٢٢٦                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/١٦  |             | ٢٦٢                              |
|                                  |            |             | ٢٨٠                              |
|                                  |            |             | ٢٤٤                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/١٧  |             | ٢٦٢                              |
|                                  |            |             | ٢٤٤                              |
|                                  |            |             | ٢٣٥                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/١٨  |             | ٢٢٦                              |
|                                  |            |             | ٢٤٠                              |
|                                  |            |             | ٢٧١                              |

ملاحظات :- تم صب المكعبات بمعرفة مهندس الاشراف والكسر بتاريخ دخولها المعمل

٧ ١ ١٩  
٢ ٠ ٠٠

| الاختبار     | السعر  |
|--------------|--------|
| كسر مكعب     | ١٥٠١٠٠ |
| اعداد تقرير  | ١٥٠    |
| قيمة الاعمال | ١٦٥٠   |

## محضر استلام ابلك اني

عنية / تنفيذ الاعمال التنموية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات داخل دير الانبا مكر بوس بطول 23 كم للمحابة من اخطر السبول  
تنفيذ :- شركة اعصر للمقاولات العامة  
اشراف :- المنظمة المسماة ( بنى سوف )

انه في يوم الاحد الموافق 2023/01/15 وبناءً على قرار السيد المهندس /ريس قطاع التنفيذ والمنطق رقم (526)  
بشراخ 2022/11/14 والخاصة بالاستلام الابتدائي للاعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من المسألة :-

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| الادارة المركزية للطرق - رئيسا | السيد المهندس / محمد سعيد           |
| ادارة ضبط الجودة - عضوا        | السيد المهندس / محمد عتر            |
| ادارة المعامل المركزية - عضوا  | السيد المهندس / هاني عبدالفتاح      |
| المنطقة المشرفة - عضوا         | السيد المهندس / يوسف شعبان عبدالغيم |
| مهندس الشركة المنفذة - عضوا    |                                     |

وفد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد اللجنة على الطبيعة للمرور  
على الاعمال المنفذة ومعينتها ظاهريا وكذلك اخذ الكوار خرسانية وقد اسطر الفحص والمعاينة الظاهرية عن ان الاعمال عبارة عن كما  
فكر مندوب المنطقة المشرفة :-

من كم 59+060 الى كم 59+600 بطول 540 متر للإتجاهين طريق الفيوم / الواحات

### ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

#### اولا :- اعمال الحميات الخرسانية (slope protection) :-

الاعمال المنفذة مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود بعض الشروخ وسوء المصنعية والمعالجة وسوء تنفيذ فواصل التمدد  
وعدم تنفيذ البعض في مسافات متفرقة وقد قدرت اللجنة هذا العيب بنسبة ( 10% ) من اجمالي الكميات المنفذة .

### توصيات اللجنة:-

- 1- يتم خصم نسبة ( 10% ) من البناولا .
- 2- الحصر مسؤولية المنطقة .
- 3- على المنطقة متابعة سنوك الاعمال المنفذة بصفة عامة وإبلاغ الشركة لإصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
- 4- على مندوب المنطقة مواءمة الادارة المركزية للطرق بقراسم الكميات والتجارب العملية التي اجريت على الاعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .
- 5- على مندوب المعامل المركزية مواءمة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .

وطية ترى اللجنة له لا مانع من الاستلام الابتدائي للاعمال المنفذة أعلاه وحيث أن الطريق مفتوح للمرور يعتبر تزيخ خطيب  
المنطقة هو 2022/11/01 بداية فترة الضمان للاعمال المشار اليها أعلاه .

وطي: ذك جري التوقيع :-

5- ذو ط

4-

3-

2-

1-

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
( GARBLT )

مشروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة / إعمار للمقاولات العامة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية / تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم / الواحات داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول 23 كم للحماية من أخطار السيول وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة




حسام الدين حسن

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

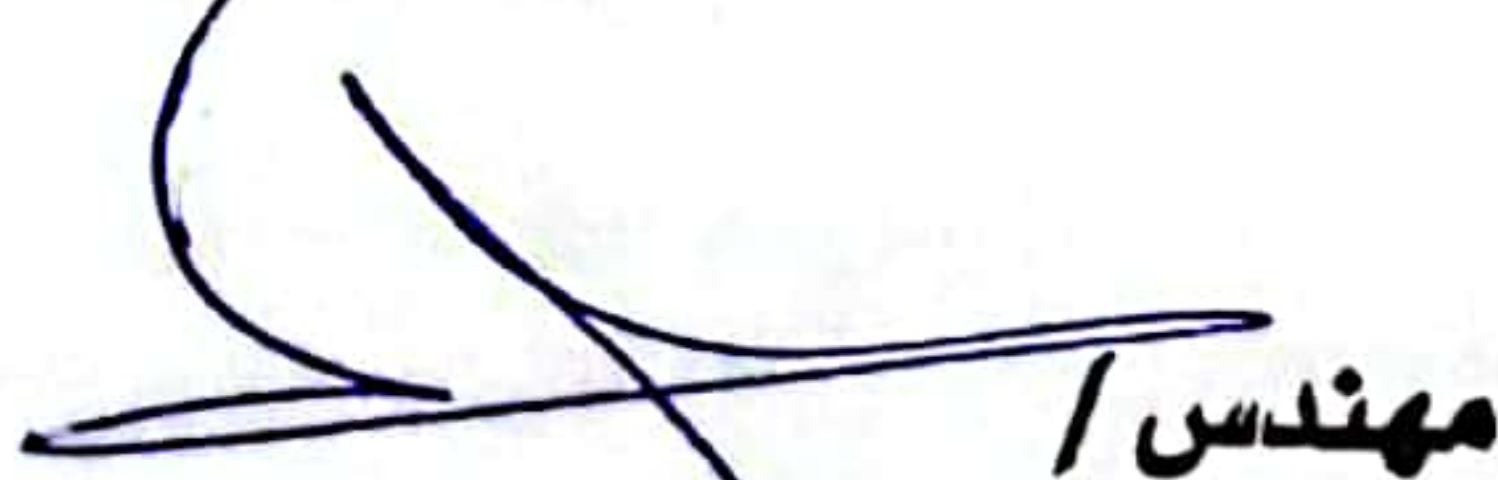

مهندس /

طارق يوسف الجزار



أحضرت العينة بمعرفة السيد المهندس / محمد عبدالرازق  
تتبعه هام ( العينات مسنولية من احضرها )

| بيان الأعمال      | تاريخ الصب | تاريخ الكسر | جهد الكسر<br>كجم/سم <sup>٢</sup> |
|-------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| ميده علويه وسفليه | ٢٠٢٢/٨/٢١  | ٢٠٢٢/٨/٢    | ٣١٧                              |
|                   |            |             | ٢٤٤                              |
|                   |            |             | ٣٠٨                              |
|                   | ٢٠٢٢/٨/٢٢  |             | ٢٩٨                              |
|                   |            |             | ٣١٧                              |
|                   |            |             | ٢٧١                              |
|                   | ٢٠٢٢/٨/٢٣  |             | ٢٧١                              |
|                   |            |             | ٣١٧                              |
|                   |            |             | ٣٣٩                              |

ملاحظات :- تم صب المكعبات بمعرفة مهندس الاشراف والكسر بتاريخ دخولها المعمل

| لاخبار       | السعر |
|--------------|-------|
| كسر مكعب     | ٩٠١٠٠ |
| قيمة الاعمال | ٩٠٠   |

١١ / ١٢ / ٢٠٢٢  
٢٠٠٠

تقرير رقم : ( ١٨٦ )

بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤

المشروع : تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم / الواحات ( القطاع الثالث )  
مقاول : شركة اعمار للمقاولات العامة  
نوع العينة : عدد ٢١ مكعب خرسانة  
نوع الاختبار : جهد الكسر

أحضرت العينة بمعرفة السيد المهندس / محمد عبدالرازق  
تنبيه هام ( العينات مسئولية من احضرها )

| بيان الأعمال                     | تاريخ الصب | تاريخ الكسر | جهد الكسر<br>كجم/سم <sup>٢</sup> |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| مجموعات<br>خرسانه ميول<br>جانبية | ٢٠٢٢/٨/٢١  | ٢٠٢٢/٨/٢    | ٢٠٣                              |
|                                  |            |             | ٢١٧                              |
|                                  |            |             | ٢٨١                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/٢٢  |             | ٣٦٢                              |
|                                  |            |             | ٣٢٦                              |
|                                  |            |             | ٣٦٢                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/٢٣  |             | ٢٣٥                              |
|                                  |            |             | ٣٦٢                              |
|                                  |            |             | ٣٩٨                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/٢٤  |             | ٣٥٣                              |
|                                  |            |             | ٣١٢                              |
|                                  |            |             | ٢٧٢                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/٢٥  |             | ٢٣٥                              |
|                                  |            |             | ٣٦٢                              |
|                                  |            |             | ٣٩٨                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/٢٨  |             | ٣٨٠                              |
|                                  |            |             | ١٦٣                              |
|                                  |            |             | ١٨١                              |
|                                  | ٢٠٢٢/٨/٢٩  |             | ٣٥٣                              |
|                                  |            |             | ١٥٨                              |
|                                  |            |             | ٣٣٥                              |

ملاحظات :- تم صب المكعبات بمعرفة مهندس الاشراف والكسر بتاريخ دخولها المعمل

١١/١٢  
٥٠٠٤

| الاختبار     | السعر  |
|--------------|--------|
| كسر مكعب     | ٢١٠١٠٠ |
| اعداد تقرير  | ١٥٠    |
| قيمة الاعمال | ٢٢٥٠   |



## شهادة

اسم العملية :- تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم / الواحات داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول 23 كم للحماية من أخطار السيول  
اسم الشركة المنفذة :- إعمار للمقاولات العامة

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

| رقم المسلسل | اسم مهندس الشركة      | العمل القائم به | التقرير |
|-------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 1           | يوسف شعبان عبدالعليم  | مدير المشروع    | جيد     |
| 2           | محمد جابر محمود       | مهندس تنفيذ     | جيد     |
| 3           | محمود عبدالرحمن السيد | مكتب فني        | جيد     |
| 4           | أحمد علي أحمد         | مساحة           | جيد     |

مدير عام التنفيذ والصيانة

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



## شهادة

نشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها  
والمحددة طبقا لعقد عملية / تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم / الواحات داخل منطقة دبر الانبا  
مكارموس بطول 23 كم للحماية من أخطار السيول.  
والتي قامت بتنفيذها الشركة / إعمار للمقاولات العامة

وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم / الواحات داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول 23 كم للحماية من أخطار السيول والتي قامت بتنفيذها شركة / إعمار للماولات العامة انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

العملية : / تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم / الواحات داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول 23 كم للحماية من أخطار السيول

### تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٤٨٤٩٠٢٠ جنيه

مدة العملية طبقا للعقد: ثلاثة أشهر

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٢/١٠/٣١ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايضة معتمدة: ٤٨٤٩٠٢٠ جنيه

قيمة العملية طبقا للختامي: ٤٨٤٥٩٨٨.٦٢ جنيه

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٢/١٠/٣١ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ١٠٠ %

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ حسام الدين حسن

مهندس المشروع

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



## كشف خاص بأعمال المقاولين

اسم العملية : تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم / الواحات داخل منطقة دهر الانبا مكارىوس

بطول 23 كم للحماية من أخطار السيول

الشركة المنفذة: إعمار للمقاولات العامة

● قيمة العملية طبقا للعقد: 4849020 جنيه

● قيمة العملية طبقا للختامي: ٨٤٥٩٨٨.٦٢ جنيه

● تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: 2022/08/01 م

● تاريخ النتهاء الفعلي: ٢٠٢٢/١٠/31 م

مدير عام التنفيذ والحسابات

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

## شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / تنفيذ الاعمال التكميلية لطريق جنوب الفيوم / الواحات داخل منطقة دير الانبا مكاريوس بطول 23 كم للحماية من أخطار السيول والتي قامت بتنفيذها الشركة / إعمار للمقاولات العامة بالاتي :

- 1 - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- 2- تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٣١ م
- 3- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- 4- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

حسام الدين حسن

مهندس المشروع

ك

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار
