

السيد المهندس /نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال رفع كفاءة وصلة
ابوشوشة الصحراوى الغربى بطول ١.٤ كم من الكم ١٨.٠٠ حتى الكم ١٩.٤ ضمن المبادرة
الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة محمود على احمد عبدالعال) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩١٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٩

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين


المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

١٤١٠ فغ كغاه و١٤١٠ سوتو المصروف العرب دول ١٤١٠م

١٨١- ١٨١٠ من المبداء الرئيسيه (مذكره)

عن شهر مايو ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٢٠٠٠	٧٧٢ ٢٧٩	جملة الاعمال ٢٢٢ ٦٢٦
-	-	السابق صرفه ١٦٠ ٥٤٥
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة ٥٢ ٥٥٠
		المستحق صرفه
٢٠٠٠	٧٧٢ ٢٧٩	جملة الاستقطاعات ٤٩٩ ٤٢٧
		الصافي ٦ ١٧٢ ٢٩٥

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

لحمود عبد الهال وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٥/٥/

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع


عدد (٢) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة

١٧٨-١٧٧



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى		المنطقة الخامسة المنطقة الخامسة بطن	
بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري			
اعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتي الكم ١٩,٤ محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.			
رقم البند وبيانه: (٣)		بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات	
تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال			
بيان الأعمال	الموقع الكيلو متر	الطول م	الاجمالي م
	من	الى	
أعمال الأساس	٥٩٦٠	٦٢٠٠	١٧٩٠
الاجمالي			
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			
مهندس الشركة المنفذة		مهندس الهيئة	
التوقيع /		التوقيع /	

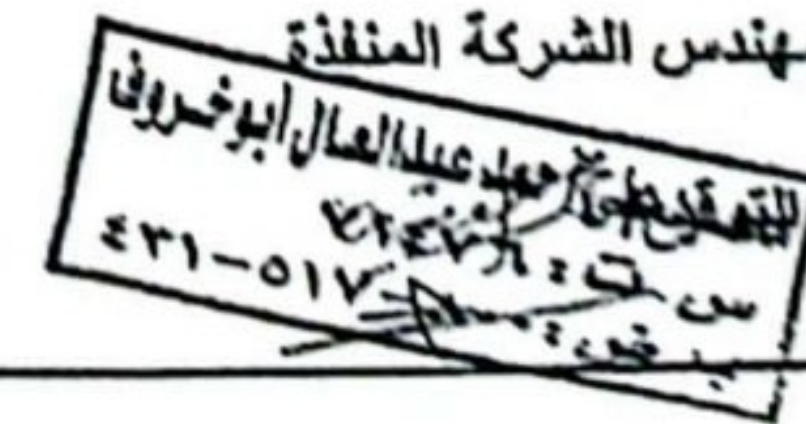

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

اعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتى الكم ١٩,٤ محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

رقم البند وبيانه: (٤) ببالمر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم /م^٢

تنفيذ شركة / محمود علي احمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م	الاجمالى م ^٢
	من	الى		
اعمال mco	٥٣٣٥	٦٢٠٠	٨٦٥	١٥١٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الهيئة

التوقيع

التوقيع
محمود علي احمد عبدالعال
٧١٤٧٦٠٠
س.ب. ٨٠٠-٥١٧-٤١١



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

اعمال رفع كفاءة وصلة أبو شوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتي الكم ١٩,٤ محافظة قنا ضمن مبادرة حياة كريمة.

رقم البند وبيانه: (٥) بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك

تنفيذ شركة / محمود علي أحمد عبدالعال

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م	الاجمالى م
	من	الى		
سطحية	٥٣٣٥	٦٢٠٠	٨٦٥	١٥١٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع

محمود علي أحمد عبدالعال ابو خروفا
س.ت: ٧١٤٧٦
ب.ض: ٨٠٠٠-٥١٧-٤٣١



صورة ١٤٢٢
١٠٤

(استمارة ٥٠٠ ع. ح)

جمهورية مصر العربية

استمارة الاعتماد المصرف

(١)

بيانات الفواتير				رقم
رقم	التاريخ	جنية	قرش	الختم ذو التاريخ
٦١٧٢	٢٩٥	٦٠		
المجموع				٢٩٥

مصلحة التأمين العام للفرق والكليات
قسم
المبلغ المستحق إلى شركة لمصر ١٩٥١
الطلبات طية أو ..
بموجب
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

تقيد في السجل برقم

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	نوع الخصم			
		جنية	قرش	مليم	جنية
١٩٠٤	١٩٠٤ دفع كفاهه و١٩٠٤ بوضو العراون الفرب	٢٩٥	٦٠		
	بلول ١٩٠٤ كم لم الي ١٨ - ١٩٠٤	٢٩٥	٦٠		
	من الموده الرأسة (١٩٠٤ كرم)				
	بيانات الاستقطاعات				
	عادي إضافي دمغة توقيع				
	قرش جنية قرش جنية قرش				
	رسم الدمغة				
	بمبلغ القيمة المطلوب صرفها	٢٩٥	٦٠		

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء

توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

شيك / إذن صرف رقم إمضاء الكاتب المنوط

الشيكات / الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط

الشيكات / الحوالات رقم إمضاء الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في سنة

استلمت

تقرير رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / وصلة ابو شوشة الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة ~~محو~~ ابو خروف لانشاء الطرق والكباري

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة ~~محو~~ ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٢١	اختبار صلاحية عينه اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٢٨٦٠
١٤ % ضريبة القيمة المضافة	٤٠٠.٤
المبلغ الاجمالي	٣٢٦٠.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٧) بتاريخ ٥/١٩/ ٢٠٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ رفع كفاءة وصلة ابو شوشه الصحراوى الغربى
تنفيذ/ شركة جواهر ابو خروف

احضرت العينة بمعرفة المهندس/ مهدي جمال (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٦٢١	ارقام العينات
	اساس سن تكسير	الطبقة المختبرة
	٥٠٧.٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٢	"١.٥
٨٥-٥٥	٨٢.٢	"١
٨٠-٥٠	٧٤.٣	"٤/٣
٧٠-٤٠	٥٧.٣	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٥٠.٥	رقم ٤
٥٠-٢٠	٤٠.٥	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢٥.٦	رقم ٤٠
١٥-٥	١٣.٢	رقم ٢٠٠
—	%٥.٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الاتفاخ
لا تقل عن ٨٠%	%٨٨	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	١٨.٢	حد السيولة
صفر - ٦	٣.٢	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٣٣	نسبة لوس انجلوس
لا تزيد عن (١٠) %	%٢	تحديد نسبة الطبعي

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/٢٢
فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس

تقرير رقم (١٧٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية /وصلة ابو شوشه الصحراوى الغربى
تنفيذ/ شركة شؤر ابو خروف لانشاء الطرق والكبارى

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/مهدى جمال (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٦٢٣	٦٢٢	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
		طبقة سطحية		الطبقة المختبرة	
		٦.٢٠٠ كم	٥.٤٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
١٠٠-٧٥	٨٥.٤٦-٧٥.٤٦	٩١.٠٤	٨٥.٢	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٧٥.٩٩-٦٥.٩٩	٧٥	٨٠.٦	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٣.١٨-٣٥.١٨	٤٦	٤٧.٨	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٢.٥-٢٦.٥	٣٢.٥	٣٢	رقم ٨	
٢٢-١٠	٢٠.٥-١٤.٥	٢٠.٥	٢٠	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٤.٢٩-٨.٢٩	١٠.٢	١٠.٠٥	رقم ٥٠	
١٢-٤	٩.٦٤-٣.٦٤	٣.٨	٣.٧	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٦٨-٢.٦٨	٢.٨	٢.٧	رقم ٢٠٠	
		%٥.٠١	%٤.٩٨	نسبة الإسفلت	
		%٢.٤	%٢.٥	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/٢٥

فني المعمل

مدير المعمل

طرق والكبارى
الإدارة المركزية
مهندس
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٧٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية /وصلة ابو شوشه الصحراوى الغربى
تنفيذ/ شركة حور ابو خروف لانشاء الطرق والكبارى

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة حور ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملى كالاتى:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٢٢-٦٢٣	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتى:-

١٧٥٠	قيمة اجراء التجارب
٢٤٥	١٤% ضريبة القيمة المضافة
١٩٩٥	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥

فنى المعمل،،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال رفع كفاءة وصلة ابوشوشة الصحراوي الغربي بطول ١,٤ كم من الكم ١٨ حتى الكم ١٩,٤
مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩١٢

تنفيذ شركة :- محمود علي أحمد عبدالعال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

•توريد أجهزة العمل اللازمة (جهاز استخلاص البيتومين) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق

المعامل المركزية بالهيئة لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٥/٢٦ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



٢٠٢٥/٥/٢٦
