

عملية تنفيذ الأعمال الكهربائية لوحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش  
بقنا  
ضمن أعمال تطوير طريق قنا / الأقصر

المشروع والكميات  
(GARB)



| رقم البند      | بند الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوحدة | الكمية | الفئة   | الاجمالي |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------|
| إعمال الكهرباء |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |         |          |
| ١              | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية 54 Ip مكون من الآتي :<br>عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ١٦٠ أمبير MCCB<br>عدد ٤ مفتاح ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB<br>عدد ١ مفتاح ثلاثي ١٠٠ أمبير MCCB<br>(بالعدد واحد)                                               | عدد    | ١      | ١٤٠,٠٠٠ | ١٤٠,٠٠٠  |
| ٢              | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الآتي :<br>عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB<br>عدد ٣٦ مفتاح احادي ١٠-٣٢ أمبير<br>(بالعدد واحد)                                                                                     | عدد    | ١      | ٧٠,٠٠٠  | ٧٠,٠٠٠   |
| ٣              | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الآتي :<br>عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB                                                                                                                                        | عدد    | ١      | ٦٠,٠٠٠  | ٦٠,٠٠٠   |
| ٤              | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية :<br>عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٣٢ أمبير MCCB<br>عدد ٤ مفتاح احادي ١٠-٢٥ أمبير<br>(بالعدد واحد)                                                                                                                                   | عدد    | ١      | ١٠,٠٠٠  | ١٠,٠٠٠   |
| ٥              | بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٢٠+٧٠) مم ٢ ألومنيوم مسلح<br>(بالمتر الطولي مائة وستون متر)                                                                                                                                                                | م ط    | ١٦٠    | ١٤٠٠    | ٢٢٤٠٠٠   |
| ٦              | بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥×٤ مم ٢ ألومنيوم ثرموبلاستيك<br>(بالمتر الطولي اثنان و اربعون متر)                                                                                                                                                           | م ط    | ٤٢     | ٣٥٠     | ١٤٧٠٠    |
| ٧              | بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦×٤ مم ٢ ألومنيوم ثرموبلاستيك<br>(بالمتر الطولي ثلاثون متر)                                                                                                                                                                   | م ط    | ٣٠     | ٢٥٠     | ٧٥٠٠     |
| ٨              | بالعدد توريد وتركيب كشف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية 66 Ip كامل بالمكونات واللمبة بقدرة ١٠٠ وات LED والبند محمل علي ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون بيوية<br>( بالعدد تسعة عشر )                                                    | عدد    | ١٩     | ٨٥٠٠    | ١٦١٥٠٠   |
| ٩              | بالعدد توريد وتركيب كشف انفاق قدرة ١٠٠ وات بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ قدرة ١٠٠ وات مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٣٢ مم لتغذية كشافات الانارة ومحمل عالبند والمواسير وجميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة .<br>( بالعدد تسعة ) | عدد    | ٩      | ٩٠٠٠    | ٨١٠٠٠    |
| ١٠             | بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف.<br>( بالعدد ثمانية )                                                                                                                        | عدد    | ٨      | ٢٥٠٠    | ٢٠٠٠٠    |
| ١١             | بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع.<br>(بالعدد اثنان)                                                                                                                                                                                           | عدد    | ٢      | ٣٨٠٠    | ٧٦٠٠     |
| ١٢             | بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج ٣٠*٣٠ سم<br>(بالعدد خمسة)                                                                                                                                                                 | عدد    | ٥      | ٢٠٠٠    | ١٠٠٠٠    |
| ١٣             | بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٥ سم<br>(بالعدد ستة)                                                                                                                                                                | عدد    | ٦      | ١٧٥٠    | ١٠٥٠٠    |
| ١٤             | بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركب بالأسقف (بلفونيرة) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع<br>(بالعدد خمسة عشر)                                                                                                                                     | عدد    | ١٥     | ١٥٠٠    | ٢٢٥٠٠    |
| ١٥             | بالعدد توريد وتركيب واختبار كشف ٦٠×٦٠ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل باللمبة الفلورسنت<br>(بالعدد اربعة)                                                                                                                                                        | عدد    | ٤      | ١٤٠٠    | ٥٦٠٠     |
| ١٦             | بالعدد توريد وتركيب كشف ليد ٦٠ × ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل باللمبة والدويل و الترانس<br>(بالعدد خمسة واربعون)                                                                                                                                                            | عدد    | ٤٥     | ٣٥٠٠    | ١٥٧٥٠٠   |



!

عملية تنفيذ الأعمال الكهربائية لوحدة مطاي بجوار نقطة تفتيش  
بقنا  
ضمن أعمال تطوير طريق قنا / الأقصر

المشروع رقم  
الكباري  
(GAR2)



| رقم البند                                       | بند الأعمال                                                                               | الوحدة | الكمية | الفئة | الاجمالي |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|
| ١٧                                              | بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦x٢ امبير<br>(بالعدد ستة عشر)                   | عدد    | ١٦     | ٨٠٠   | ١٢٨٠٠    |
| ١٨                                              | بالعدد توريد وتركيب مخرج مفتاح انارة احدى ماجيك قطعه واحدة<br>(بالعدد خمسة عشر)           | عدد    | ١٥     | ٤٠٠   | ٦٠٠٠     |
| ١٩                                              | بالعدد توريد وتركيب مخرج مفتاح انارة ثنائي ماجيك<br>(بالعدد عشرة)                         | عدد    | ١٠     | ٤٥٠   | ٤٥٠٠     |
| ٢٠                                              | بالعدد توريد وتركيب مخرج مفتاح انارة ثلاثي<br>(بالعدد تسعة عشر)                           | عدد    | ١٩     | ٦٠٠   | ١١٤٠٠    |
| ٢١                                              | بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A<br>(بالعدد ثلاثون)                                  | عدد    | ٣٠     | ٥٢٠   | ١٥٩٠٠    |
| ٢٢                                              | بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع<br>(بالعدد عشرة)                         | عدد    | ١٠     | ٤٠٠   | ٤٠٠٠     |
| ٢٣                                              | بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة معلومات<br>(بالعدد ثلاثة عشر)                           | عدد    | ١٣     | ٥٠٠   | ٦٥٠٠     |
| ٢٤                                              | بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون<br>(بالعدد عشرة)                               | عدد    | ١٠     | ٤٥٠   | ٤٥٠٠     |
| ٢٥                                              | بالعدد توريد وتركيب ذر جرس من اجود الانواع<br>(بالمتر الطولي عشرة متر)                    | م.ط    | ١٠     | ٧٠٠   | ٧٠٠٠     |
| ٢٦                                              | بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١ حصان<br>(بالعدد اثنان)                          | عدد    | ٢      | ٢٩٠٠٠ | ٥٨٠٠٠    |
| ٢٧                                              | بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ٢ حصان<br>(بالعدد اثنان)                          | عدد    | ٢      | ٣٧٠٠٠ | ٧٤٠٠٠    |
| ٢٨                                              | بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر<br>(بالعدد اثنان)                                  | عدد    | ٢      | ٥٠٠٠  | ١٠٠٠٠    |
| ٢٩                                              | بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر<br>(بالعدد اثنان)                                  | عدد    | ٢      | ٣٠٠٠  | ٦٠٠٠     |
| ٣٠                                              | بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد<br>(بالعدد ثلاثة)  | عدد    | ٣      | ٤٠٠٠٠ | ١٢٠٠٠٠   |
| ٣١                                              | بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد<br>(بالعدد اثنان) | عدد    | ٢      | ٥٦٠٠٠ | ١١٢٠٠٠   |
| ٣٢                                              | غرفة قطب ارضي شاملة القضيب النحاس<br>(بالعدد واحد)                                        | عدد    | ١      | ٤٥٠٠٠ | ٤٥٠٠٠    |
| الاجمالي (مليون و خمسمائة الف جنيها فقط لا غير) |                                                                                           |        |        |       | ١٥٠٠٠٠٠  |

١- الأسعار تقديرية لحين المفاوضة .

٢١




*[Handwritten signature]*

اجمالي حصر الاعمال بالعمليه  
عملية تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحدة مطلقى بجوار نقطة تغشيش بقنا ضمن أعمال تطوير طريق قنا / الأقصر  
مستخلص جاري ١

المكتب الهندسي  
المحلى  
الهندسة المعمارية والبناء  
الهندسة الكهربائية والبناء  
الهندسة الميكانيكية والبناء  
الهندسة المدنية والبناء  
الهندسة الجيوتقنية والبناء  
الهندسة البيئية والبناء  
الهندسة الصناعية والبناء  
الهندسة الكيميائية والبناء  
الهندسة النووية والبناء  
الهندسة الفضائية والبناء  
الهندسة البحرية والبناء  
الهندسة الجوية والبناء  
الهندسة الفضائية والبناء  
الهندسة البحرية والبناء  
الهندسة الجوية والبناء

| رقم بند | بند الأعمال                                                                                                          | الوحدة | حصر الاعمال<br>وعدد الخط | اجمالي الكميات | فرق الكميات  | كمية المقايسة | التجاوز | كمية المستخلص | القيمة       | اجمالي المستخلص | كمية خارج المقايسة والمستخلص | كمية      | قيمة      | شكليات    | سابق (م)  | حالي      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ١       | بالحدود توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية للملح الحائط بدرجة حماية 54 Ip                                        | م      | ١,٠٠                     | ١,٠٠           | ١,٠٠         | ١,٠٠          | ٠,٠٠    | ١,٠٠          | ١٤٠٠٠٠,٠٠    | ١٤٠٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢       | بالحدود توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٣٦ خط                                                                  | م      | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ٧٠٠٠٠,٠٠     | ٧٠٠٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٣       | بالحدود توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٢٤ خط                                                                  | م      | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ٦٠٠٠٠,٠٠     | ٦٠٠٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٤       | بالحدود توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٤ خط                                                                   | م      | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ١٠٠٠٠,٠٠     | ١٠٠٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٥       | بالحدود توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠٠×١٢٠×٣) مم ٢ المونومر مسطح                                                | م      | ١٦٠,٠٠                   | ١٦٠,٠٠         | ١٦٠,٠٠       | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ١٦٠,٠٠        | ٢٢٤٠٠٠,٠٠    | ٢٢٤٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١٦٠,٠٠    | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٦       | بالحدود توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥×٤ مم ٢ المونومر ثرموبلاستيك                                                | م      | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ٣٥٠,٠٠       | ٣٥٠,٠٠          | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٧       | بالحدود توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦×٤ مم ٢ المونومر ثرموبلاستيك                                                | م      | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ٢٥٠,٠٠       | ٢٥٠,٠٠          | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٨       | بالحدود توريد وتركيب كشف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية 65 Ip كاشف بالمحولات وللمبة بقوة ١٠٠ وات                       | م      | ١٤,٠٠                    | ١٤,٠٠          | ١٤,٠٠        | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ١٤,٠٠         | ١١٩٠٠٠,٠٠    | ١١٩٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١٤,٠٠     | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٩       | بالحدود توريد وتركيب كشف انفاق قدرة ١٠٠ وات بواسطة كابل تحمل قطاع ٣٣٣ مم ٢ قدرة ١٠٠ وات                              | م      | ٩,٠٠                     | ٩,٠٠           | ٩,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٩,٠٠          | ٨١٠٠٠,٠٠     | ٨١٠٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٩,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١٠      | بالحدود توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة                                                                       | م      | ٨,٠٠                     | ٨,٠٠           | ٨,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٨,٠٠          | ٢٠٠٠٠,٠٠     | ٢٠٠٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٨,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١١      | بالحدود توريد وتركيب واختبار مروحة حائط ١ بوصة من أجود الأنواع                                                       | م      | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ٣٨٠٠,٠٠      | ٣٨٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١٢      | بالحدود توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط أو زجاج سم                                | م      | ٢,٠٠                     | ٢,٠٠           | ٢,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٢,٠٠          | ٤٠٠٠,٠٠      | ٤٠٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٢,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١٣      | بالحدود توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط أو زجاج سم                                | م      | ٦,٠٠                     | ٦,٠٠           | ٦,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٦,٠٠          | ١٠٥٠٠,٠٠     | ١٠٥٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٦,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١٤      | بالحدود توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركيب بالأسقف (فلوئوريه) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من أجود الأنواع | م      | ١٥,٠٠                    | ١٥,٠٠          | ١٥,٠٠        | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ١٥,٠٠         | ٢٢٥٠٠,٠٠     | ٢٢٥٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١٥,٠٠     | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١٥      | بالحدود توريد وتركيب واختبار كشف ٦٠×٦٠ سم من النوع الذى يتم تركيبه فوق الحوض كامل باللمبة الفلورسنت                  | م      | ٤,٠٠                     | ٤,٠٠           | ٤,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٤,٠٠          | ٥٦٠٠,٠٠      | ٥٦٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٤,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١٦      | بالحدود توريد وتركيب كشف اليد ٦٠×٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل باللمبة والتوصيل والترانس                              | م      | ٤٣,٠٠                    | ٤٣,٠٠          | ٤٣,٠٠        | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٤٣,٠٠         | ١٥٠٠٠,٠٠     | ١٥٠٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٤٣,٠٠     | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١٧      | بالحدود توريد وتركيب واختبار مفتاح تشغيل ٢٦٠٠ امبير                                                                  | م      | ١٣,٠٠                    | ١٣,٠٠          | ١٣,٠٠        | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ١٣,٠٠         | ١٠٤٠٠,٠٠     | ١٠٤٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١٣,٠٠     | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١٨      | بالحدود توريد وتركيب مفتاح انارة احدى ملاعبه وقطعه واحدة                                                             | م      | ٥,٠٠                     | ٥,٠٠           | ٥,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٥,٠٠          | ٢٠٠٠,٠٠      | ٢٠٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٥,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ١٩      | بالحدود توريد وتركيب مفتاح انارة ثلثي ملاعبه                                                                         | م      | ٥,٠٠                     | ٥,٠٠           | ٥,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٥,٠٠          | ٢٢٥٠,٠٠      | ٢٢٥٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٥,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢٠      | بالحدود توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي                                                                               | م      | ١٧,٠٠                    | ١٧,٠٠          | ١٧,٠٠        | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ١٧,٠٠         | ١٠٢٠٠,٠٠     | ١٠٢٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١٧,٠٠     | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢١      | بالحدود توريد وتركيب برزخ كهرباء ١٦ A                                                                                | م      | ٨٣,٠٠                    | ٨٣,٠٠          | ٨٣,٠٠        | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٨٣,٠٠         | ١٥٩٠٠,٠٠     | ١٥٩٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٨٣,٠٠     | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢٢      | بالحدود توريد وتركيب برزخ تليفون من أجود الأنواع                                                                     | م      | ٩,٠٠                     | ٩,٠٠           | ٩,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٩,٠٠          | ٣٦٠٠,٠٠      | ٣٦٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٩,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢٣      | بالحدود توريد وتركيب واختبار برزخ مطومات                                                                             | م      | ٩,٠٠                     | ٩,٠٠           | ٩,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٩,٠٠          | ٤٥٠٠,٠٠      | ٤٥٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٩,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢٤      | بالحدود توريد وتركيب واختبار برزخ تليفزيون                                                                           | م      | ٧,٠٠                     | ٧,٠٠           | ٧,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٧,٠٠          | ٣١٥٠,٠٠      | ٣١٥٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٧,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢٥      | بالحدود توريد وتركيب ثر جرس من أجود الأنواع                                                                          | م      | ٤,٠٠                     | ٤,٠٠           | ٤,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٤,٠٠          | ٢٨٠٠,٠٠      | ٢٨٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٤,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢٦      | بالحدود توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١ حصان                                                                      | م      | ١,٠٠                     | ١,٠٠           | ١,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ١,٠٠          | ٢٩٠٠,٠٠      | ٢٩٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢٧      | بالحدود توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ٢ حصان                                                                      | م      | ١,٠٠                     | ١,٠٠           | ١,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ١,٠٠          | ٣٧٠٠,٠٠      | ٣٧٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ١,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢٨      | بالحدود توريد وتركيب سفن كهرباء ٥٠ لتر                                                                               | م      | ٢,٠٠                     | ٢,٠٠           | ٢,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٢,٠٠          | ١٠٠٠٠,٠٠     | ١٠٠٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٢,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٢٩      | بالحدود توريد وتركيب سفن كهرباء ٣٠ لتر                                                                               | م      | ٢,٠٠                     | ٢,٠٠           | ٢,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٢,٠٠          | ٦٠٠٠,٠٠      | ٦٠٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٢,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٣٠      | بالحدود توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت بولت بقوة ١,٥ حصان بارد                                               | م      | ٢,٠٠                     | ٢,٠٠           | ٢,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٢,٠٠          | ٨٠٠٠,٠٠      | ٨٠٠٠,٠٠         | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٢,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٣١      | بالحدود توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت بولت بقوة ٢,٢٥ حصان بارد                                              | م      | ٢,٠٠                     | ٢,٠٠           | ٢,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٢,٠٠          | ١١٢٠٠,٠٠     | ١١٢٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٢,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
| ٣٢      | فرقة قلب ارضي شاملة التظهير للناس                                                                                    | م      | ٠,٠٠                     | ٠,٠٠           | ٠,٠٠         | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ٤٥٠٠٠,٠٠     | ٤٥٠٠٠,٠٠        | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
|         |                                                                                                                      |        | ١,١٩٣,٩٩٠,٠٠             | ١,١٩٣,٩٩٠,٠٠   | ١,١٩٣,٩٩٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ١,١٦٥,٩٠٠,٠٠ | ١,١٦٥,٩٠٠,٠٠    | ٢٨,٠٩٠,٠٠                    | ٢٨,٠٩٠,٠٠ | ٢٨,٠٩٠,٠٠ | ٢٨,٠٩٠,٠٠ | ٢٨,٠٩٠,٠٠ | ٢٨,٠٩٠,٠٠ |
|         |                                                                                                                      |        | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠             | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠   | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |
|         |                                                                                                                      |        | ٣٠٦,٠١٠,٠٠               | ٣٠٦,٠١٠,٠٠     | ٣٠٦,٠١٠,٠٠   | ٠,٠٠          | ٠,٠٠    | ٠,٠٠          | ٠,٠٠         | ٠,٠٠            | ٠,٠٠                         | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      | ٠,٠٠      |

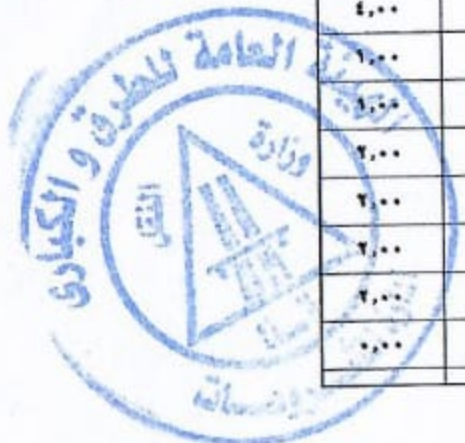

مهندس الهيئة



مكة للمقاولات العامة  
مهندسين للشركة  
CONTRACTING



### محضر استلام موقع

مشروع " تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحدة مطافي بجوار  
نقطة تفتيش بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر "  
العقد رقم ( ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٧ ) المؤرخ في ٢٥/٩/٢٠٢٤  
تنفيذ : شركة مكة للمقاولات العامة  
اشراف : المنطقة الثامنة - قنا

• انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٩ م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- |                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ١. السيد المهندس / عبدالرحيم محمد حسين | الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة |
| ٢. السيد المهندس / محمود أحمد فؤاد     | الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة |
| ٣. السيد المهندس / احمد محمد النوبي    | الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة |
| ٤. السيد المهندس / محمد ابراهيم محمد   | ممثل الشركة المنفذة ( الفاتح للمقاولات )     |

• وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع نقطة المطافي الواقعة بجوار نقطة تفتيش العقب الامنية بقنا وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا محضرا باستلام الموقع وتاريخ بدء العمل .

التوقيعات :-

٤. السيد المهندس / محمد ابراهيم محمد  
٣. السيد المهندس / احمد محمد النوبي  
٢. السيد المهندس / محمود أحمد فؤاد  
١. السيد المهندس / عبدالرحيم محمد حسين



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين
