



الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية - المنطقة الأولى

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة B4 (القطاع الأول)

عقد رقم 2024/2023/260

تنفيذ مكتب سامي عبيد عبد اللطيف

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه مستخلص رقم (1) جارى.

برجاء من سيادتك التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

نقدمه لسيادتك

مكتب سامي عبيد عبد اللطيف

مهندس / محمد جمال بكر



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،


نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم 1 لمشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر
واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة
(B4) القطاع الاول بالامر المباشر عقد 260 - 2023 - 2024 تنفيذ مكتب سامى عبيد
عبداللطيف..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس الادارة المركزية
مهندس/ 
نصر محمد نصر طيخ







 مشروع القطار الكهربائي السريع المقايضة المعلقة (11) حصة 27.0 مكتب (سلي عبد الطيف) منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر (منطقة B4 (القطاع الأول)) (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) 					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجملى
أعمال الحفر					
1	حفر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية سطح بالأت التسوية والفرش بلمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تتبيلها طبقا للتنسبب التصميمية والقطاعات العرضية التونجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - علاوة 1 جنيه /كم لمسافة نقل نتج الحفر . - علاوة 0.6 جنيه/ 3م لارتفاع السورار ونك لتكميات المنفذه بعد 4/5/2023 . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه/8 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .	م3	1	23	23.00
2	حفر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتسلسلة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والفرش بلمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تتبيلها طبقا للتنسبب التصميمية والقطاعات العرضية التونجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - علاوة 1 جنيه /كم لمسافة نقل نتج الحفر . - علاوة 0.7 جنيه/ 3م لارتفاع السورار ونك لتكميات المنفذه بعد 4/5/2023 . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه/8 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .	م3	0.692	26	18 18/12
3	حفر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتسلسلة (طبقة متحجرة) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والفرش بلمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تتبيلها طبقا للتنسبب التصميمية والقطاعات العرضية التونجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - يتم تحديد نوع التربة طبقا بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التتبيل باستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنيه /كم لمسافة نقل نتج الحفر . - علاوة 0.8 جنيه/ 3م لارتفاع السورار ونك لتكميات المنفذه بعد 4/5/2023 . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه من عمق 8 م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية.	م3	319530	30	9,585,900 9/12
4	حفر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتى : 1- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرنتة السيول الجبلية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد تربة مقلبة لتواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكنتاف (نسبة تحمل كلبورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بلمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تتبيلها طبقا للتنسبب التصميمية والقطاعات العرضية التونجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه/ 8 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية . ذات إجهد (100-200) كجم / سم 2 - علاوة 1.6 جنيه لارتفاع السورار ونك لتكميات المنفذه بعد 4/5/2023 . ذات إجهد (200-300) كجم / سم 2 - علاوة 1.9 جنيه لارتفاع السورار ونك لتكميات المنفذه بعد 4/5/2023 . ذات إجهد (300-400) كجم / سم 2 - علاوة 2.2 جنيه لارتفاع السورار ونك لتكميات المنفذه بعد 4/5/2023 . ذات إجهد (400-500) كجم / سم 2 - علاوة 2.4 جنيه لارتفاع السورار ونك لتكميات المنفذه بعد 4/5/2023 . ذات إجهد (500-600) كجم / سم 2 - علاوة 2.5 جنيه لارتفاع السورار ونك لتكميات المنفذه بعد 4/5/2023 . ذات إجهد (600-700) كجم / سم 2 - علاوة 2.7 جنيه لارتفاع السورار ونك لتكميات المنفذه بعد 4/5/2023 .	م3	1	60	60
		م3	1	70	70
		م3	1	82	82
		م3	1	88	88
		م3	110,783	94	10,413,602
		م3	1	100	100
أعمال الردم Embankment					
5	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مقلبة لتواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 60 سم حتى منسوب (20 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (20 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكنتاف (نسبة تحمل كلبورنيا حتى 20 %) ورشها بلمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تتبيلها طبقا للتنسبب التصميمية والقطاعات العرضية التونجية والرسومات التفصيلية المصنعة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - في حقة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . 2 - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بزيادة أو نقصان . - يتم احتساب علاوة 2 كم . - يتم احتساب علاوة 2 كم . - يتم احتساب علاوة 2 كم .	م3	1	57	57
					20,000,000

مهندس /
رئيس منطقة مركزية للمنطقة الاولى
مكتب (سلي عبد الطيف)

مكتب (سلي عبد الطيف)
مهندس /

مكتب (سلي عبد الطيف)
مهندس /

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة B4 القطاع الاول
تنفيذ مكتب سامي عبيد عبد اللطيف .



انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/08/23 وبناء على عقد العملية رقم 2024/2023/260

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / كارم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 2- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / مصطفى علي السيد | سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 4- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| 5- السيد المهندس / احمد هشام | مكتب XYZ استشاري المساحة |
| 6- السيد المهندس / محمد جمال بكر | مكتب سامي عبيد عبد اللطيف |


وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023/08/23 هو تاريخ استلام الموقع .
واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

6- 
5- 
4- 
3- 
2- 
1- 

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى


مهندس /

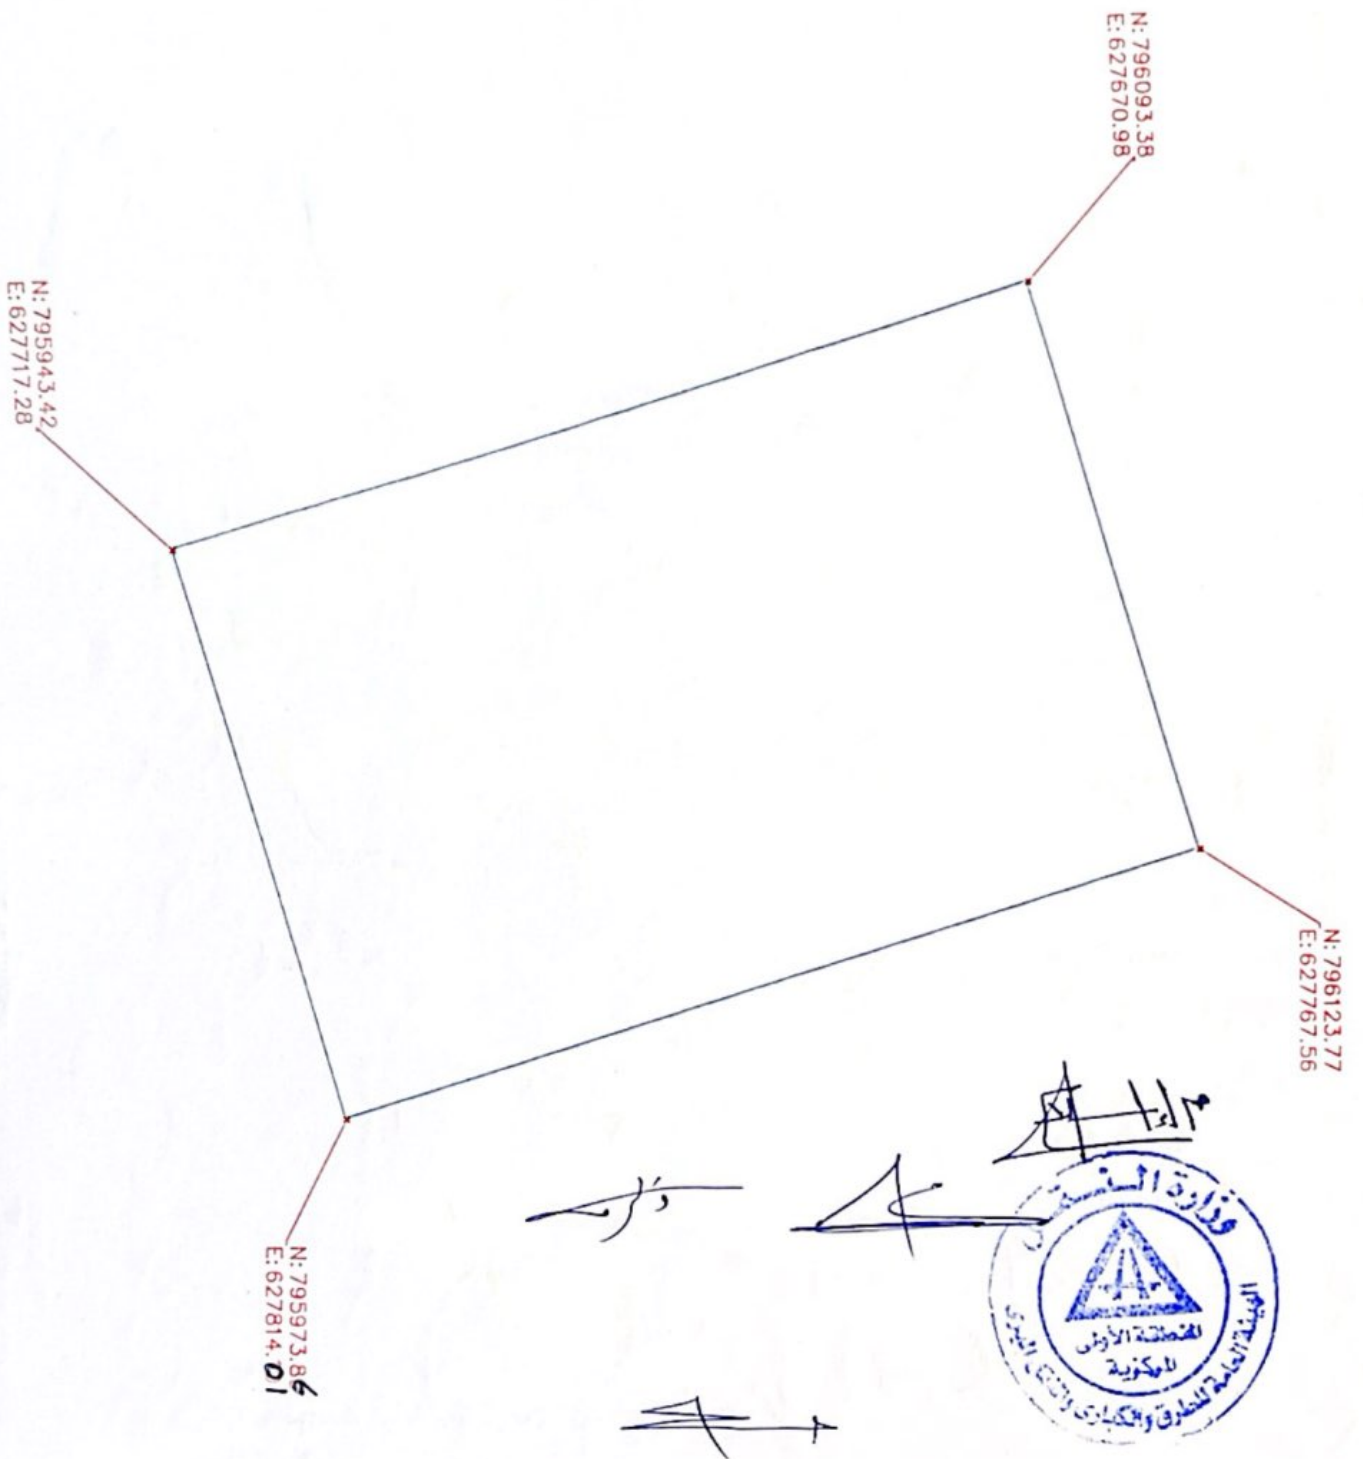

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) القطاع الأول

العقد رقم : (2024/2023/260) بتاريخ : 2023/08/23

البرنامج الزمني لإنهاء الاعمال

مكتب سامي عبيد عبد اللطيف

منطقة B4

2024	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	المخطط	الكمية الإجمالية 3م	البند	م
35,539	35,539	35,539	35,539	35,539	35,539	35,539	35,539	35,539	مخطط شهري	106,616	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الشديدة المتصاعدة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	3
284,311	248,772	213,233	177,694	142,155	106,616	71,078	35,539	35,539	مخطط تراكمي			
36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	36,928	مخطط شهري	110,783	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	4
295,421	258,494	221,566	184,638	147,711	110,783	73,855	36,928	36,928	مخطط تراكمي			

مدير المشروع
1/4
م/مسيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى
1/4

الإستشارى المشرف
مكتب إنترالن كونسلتنج
1/4

الشرية المنقذة
مكتب سامي عبيد عبد اللطيف


اعمال الورش المركزية بـ

76,274	كمية عذراء أقل من 8 متر إلى 30 متر أسفل منسوب الأرض الطبيعية
0	كمية عذراء أقل من 30 متر إلى 50 متر أسفل منسوب الأرض الطبيعية

الأستاذ د. العام

ج. (۱) ع. ۱۰۰

مستشار الاستشارات الهندسية



تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) القطاع الاول .
العقد رقم : (2024/2023/260) بتاريخ : 23/08/2023

منطقة B4

مكتب سامي عبيد عبد اللطيف

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	سيارة ملاكي	5
2	سيارة نصف نقل	4
3	سيارة جامبو 10 طن	3
4	لودر كاتربيلر 980	8
5	تاك مينة	2
6	عربية نقل 20 م	35
7	بلدوزر D11	1
8	بلدوزر D10	3
9	حفار	35

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسولتج

م / أحمد محمد
أ. س. م.

الشركة المنفذة

مكتب / سامي عبيد عبد اللطيف

أ. س. م.

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أ. س. م.

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) القطاع الاول .
العقد رقم : (2024/2023/260) بتاريخ : 23/8/2023


منطقة B4

مكتب سامي عبيد اللطيف


فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	10
2	مهندس تنفيذ	1	6
3	مهندس مكتب فني	1	6
4	مساح	3	4
5	مساعد مساح	6	1
6	مشرف	5	4
7	ميكانيكي	4	10
8	سائق حفار	35	5
9	سائق	60	3

الهيئة العامة للطرق والكبارى



الإستشارى المشرف



الشركة المنفذة

مكتب / سامي عبيد اللطيف





Electric Express Train - HSR

From El Ain El Sokhna City To El Alamein



Section - 3 From West of the River Nile

Green Land (GL) MAIN DEPOT

منطقة طريق الاقتراب محطة حدائق اكتوبر




Contractor Consultant

DESCRIPTION :	(B4 ناتج قطع منطقة ال)			DATE :	
Station		TO		Sample	Clay
Company	سامي عبيد للمقاولات			Q.T	


SIEVE SIZE	WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	5500	100
1 1/2"	0	5500	100
1"	0	5500	100
3/4"	0	5500	100
1/2"	318	5182	94
3/8"	482	4700	85
# 4	1202	3498	64
Passing	3498		
Sample Total Wt.	5500		
Fine Sample WT.	500		
# 10	42	458	58.3
# 40	99	401	51.0
# 200	168	332	42.2

* Attached document doesn't determine classification of the soil

* Final Classification of Soil whether it is Cohesive, Non cohesive etc) is must be subjected to approved Geotechnical reference and

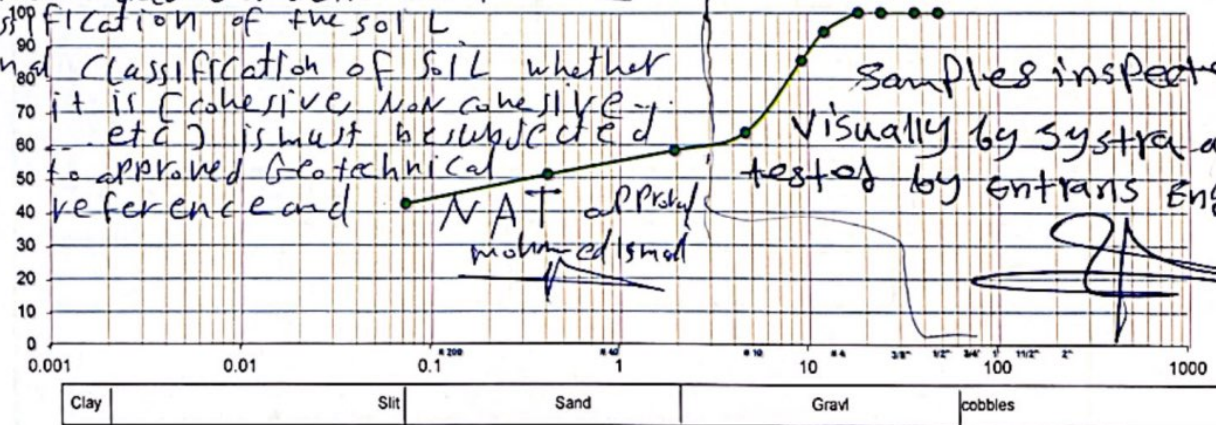

SOIL CLASSIFICATION			Description		
A.6			clay		
L.L =	29.63	P.L =	16.5	P.I =	13.1
CC=	NP		cu=	NP	



M.E./CONSULTANT

محمود حسام



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein

Section - 3 From West of the River Nile

Green Land (GL) MAIN DEPOT

منطقة طريق الاقتراب محطة حدائق التوتير




Contractor Consultant

ATTERBERG LIMIT TEST

DESCRIPTION :	نتج قطع منطقة ل (B4)		DATE :	
Station		TO	Sample	Clay
Company	سامي عبيد للمقاولات		Q.T	

TEST		LIQUID LIMIT			PLASTIC LIMIT		
	NO. OF BLOWS	23	31	38			
A	CONTAINER NO.	13	14	2	5	10	1
A	CONTAINER WEIGHT	35.34	23.6	27.84	23.6	28.9	26.72
B	MASS OF WET SOIL+TARE g	62.9	63.2	61.6	35.0	35.1	37.2
C	MASS OF DRY SOIL+TARE g	56.0	54.2	54.6	33.3	34.2	35.7
	MOISTURE CONTENT % (B-C)/C	33.5	29.4	26.0	17.1	16.0	16.5
LIMITS		LIQUID (LL) 29.6			PLASTIC (PL) 16.5		

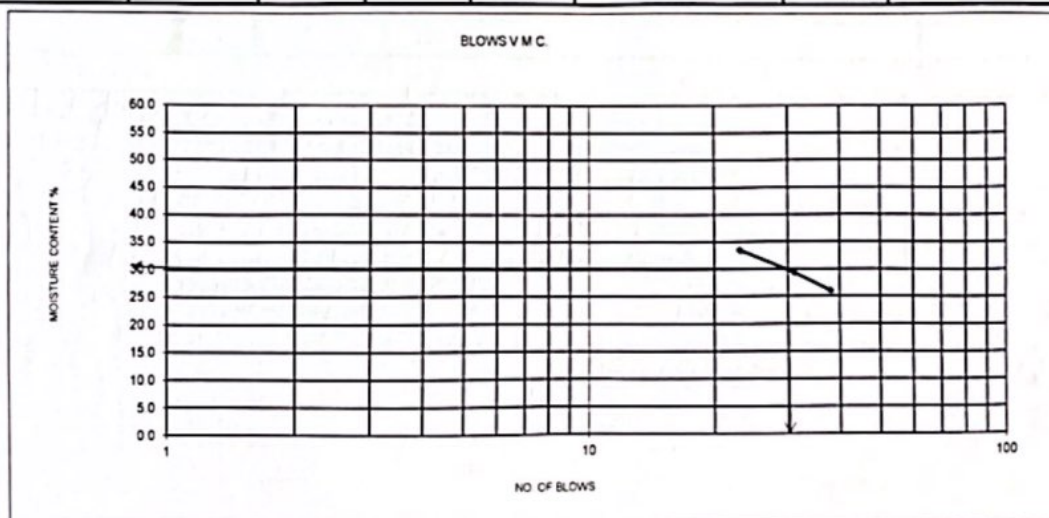

Liquid Limit (LL)	=	29.6
Plastic Limit (PL)	=	16.5
Plastic Index (PI)	=	13.1

note: All samples were taking after cleaning the natural ground

ME/CONTRACTOR

محمد صالح

ME/CONSULTANT


م. محمد حسام

مختبر العالمية


م. محمد حسام

 Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein Section - 3 From West of the River Nile Green Land (GL) MAIN DEPOT منطقة طريق الانتراب محطة حدائق الكنوبر		 المكتب الهندسي للتصميم والبناء EnTrans CONSULTING Contractor Consultant	
DESCRIPTION :	(B4) عينة ناتج قطع منطقة ال		DATE :
Station	TO	Sample	Clay 1
Company	سامي عبيد للمقاولات		Q.T

SIEVE SIZE	WT. RETAINED	CUM.WT. PASSING	% PASSING
2"	0	5000	100
1 1/2"	0	5000	100
1"	0	5000	100
3/4"	0	5000	100
1/2"	62	4938	99
3/8"	85	4853	97
# 4	265	4588	92
Passing	4588		
Sample Total Wt.	5000		
Fine Sample WT.	500		
# 10	20	480	83.1
# 40	125	375	68.8
# 200	272	228	41.8

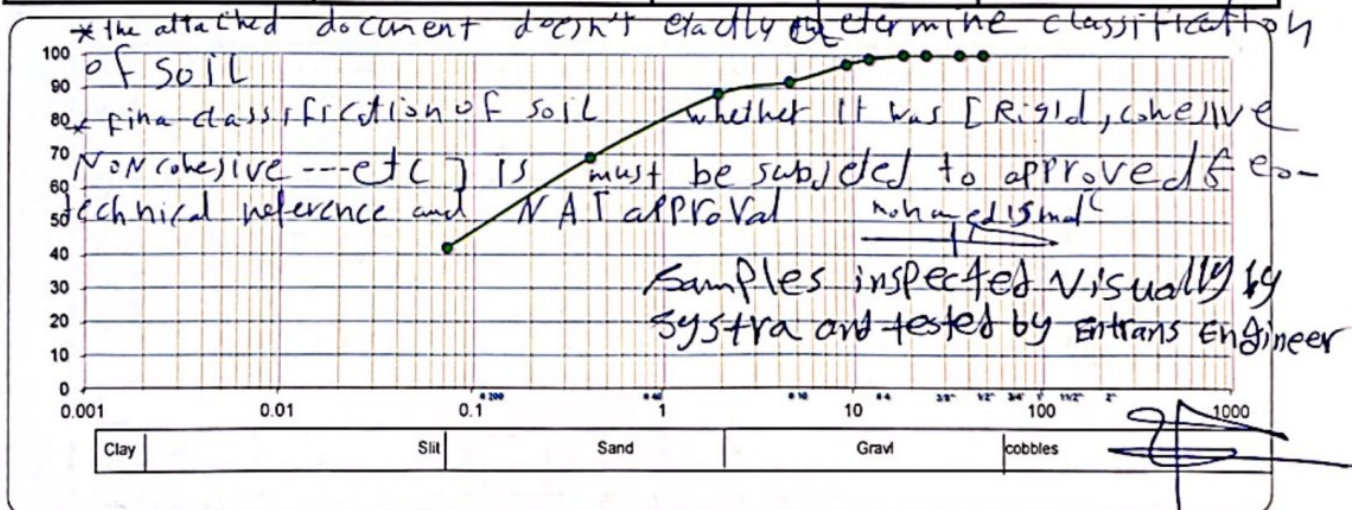

SOIL CLASSIFICATION			Description		
A.7			clay		
L.L =	41.9	P.L =	23.9	P.I =	18.0
CC=	NA	cu=	NA		



M.E./CONSULTANT

مهندس سامي



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein
Section - 3 From West of the River Nile
Green Land (GL) MAIN DEPOT
منطقة محطة حدائق التوتير




Contractor Consultant

ATTERBERG LIMIT TEST

DESCRIPTION :	عينة نتج قطع منطقة ال (B4)		DATE :	
Station		TO	Sample	Clay 1
Company	سامي عبيد للمقاولات		Q.T	

TEST		LIQUID LIMIT			PLASTIC LIMIT		
		NO. OF BLOWS	17	25	37		
A	CONTAINER NO.	20	18	5	9	1	11
A	CONTAINER WEIGHT	26.75	27.05	23.6	25.78	26.72	20.69
B	MASS OF WET SOIL+TARE g	61.8	61.1	57.4	29.0	30.2	23.9
C	MASS OF DRY SOIL+TARE g	50.5	51.0	48.5	28.4	29.5	23.3
MOISTURE CONTENT % (B-C)/(C		47.6	42.2	35.7	23.2	24.1	24.4
LIMITS		LIQUID (LL)	41.9		PLASTIC (PL)	23.9	

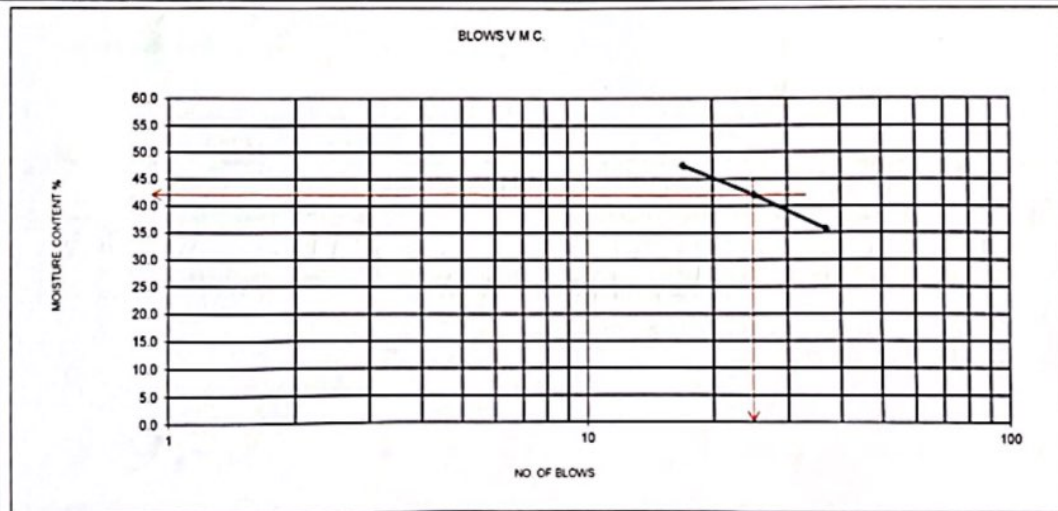

Liquid Limit (LL)	=	41.9
Plastic Limit (PL)	=	23.9
Plastic Index (PI)	=	18.0

note: All samples were taking after cleaning the natural ground

ME/CONTRACTOR

مختبر العالمية

ME/CONSULTANT

محمود دحام

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب سامي عبيد عبد اللطيف بشأن تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع
الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)

منطقة (B4) (القطاع الاول) عقد رقم 2023/2022/260

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2023/8/23

بحضور كلاً من:-


ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل سيسترا للاستشارات الهندسية
ممثل مكتب انترانس كونسولتنج استشاري الهيئة
ممثل مكتب XYZ
ممثل مكتب سامي عبيد عبد اللطيف

1. م/إ. إلهام محمد
2. م/إ. محمد ربيع
3. م/إ. أحمد محمد
4. م/إ. أحمد محمد
5. م/إ. محمد ربيع

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحه من نواتج الحفر من القطاع الى المقابل المحدده من جهة الاشراف على الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (622) م عن مكان المقلب المعتمد واقفل المحضر على ذلك.

التوقيعات

التوقيع:




الاسم:

5- محمد جمال بركات
4- محمد ربيع
3- أحمد محمد
2- محمد ربيع
1- م/إ. محمد ربيع

احداثيات المشاؤون ومسافة النقل لقطاع القطع

Samy Ebaid

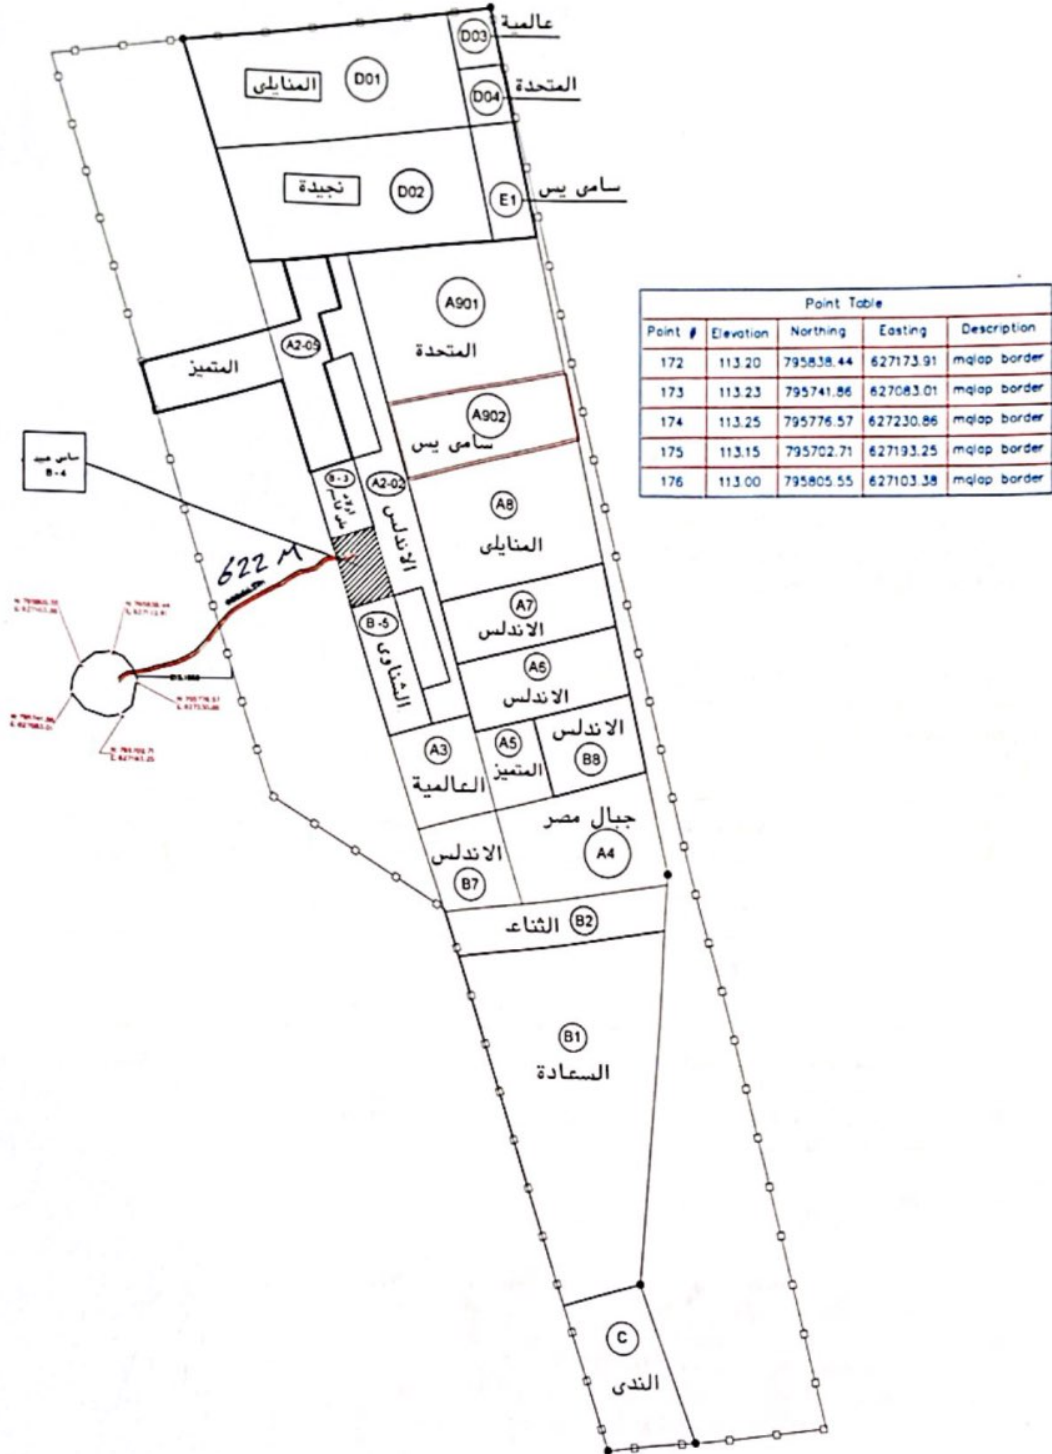

GARAB

Systra QA/QC

Systra Survey

XYZ

Entrans QA/QC

Contractor

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر (B4) القطاع الأول عقد رقم (٢٦٠) (مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ مكتب سامي عبيد عبد اللطيف . طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

غياب السيارات (طبقاً لقاعدة البيانات).

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات



محمد
١٤/٧

١٤/٧
١٤/٧



COMIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين



شركة كاسعة الأحكام التأمين رقم ١٦٠٠٧
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠٢٣/٠٨/٢٣
سجل تجاري رقم ٤٤٦٣٤ - الجيزة

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	عماد الدين	رقم الوثيقة	١٦٠٠٧	و /	٢	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٣/١١/٢٧	العملة	جنية مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٣/١٠/٢٧	ظهرا الى	ظهرا
اسم المتعاقد	شركة مامي محمد محمد اللطيف	اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق	تاريخ الميلاد	اكبر من ١٦ سنة و اقل من ٦٥ سنة	العنوان	كما هو وارد بالوثيقة	لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى	كما بالكشف المرفق	وظيفة	كما بالكشف المرفق	

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه وصلة كل منهم به
الورثة الشرعيون من المعلوم والمتفق عليه

أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة عالية تقتصر على عدد (١) مهندس وعدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ فنى و (١) سائق معدة او سيارة ومن في حكمهم و (١) عامل بدون ذكر اسم اثناء وبسبب العمل داخل نطاق العمل إسناد أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B4) القطاع الأول (بالأمر المباشر) لايجوز إجراء أية تعديلات فى بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى / المستفيد عقد رقم ٢٠٢٣/٠٨/٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣ - علما بأن استلام الموقع ٢٠٢٣/٠٨/٢٣

القسط الصافى	نصف الدفعة النسبية	نصف الدفعة الامتياز	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالى
١٩٧,٠٠	٣,٠٠	٤,٠٠	٥٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٦٧	١,٢٣	٢٦٠,٠٠

فقط مائتي و ستون جنية مصري لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

- اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمس في الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبنود ثانيا من هذا الجدول طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى اقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

COMIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة الحوادث المتقوعة
فرع عماد الدين
صلاح محمد أحمد مختار

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com



MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين



شريعة خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم
سجل تجاري رقم ٨٤٦٣٤ - الجيزة

وثيقة تأمين حوادث شخصية



٢٠٢٣/١١/٢٧	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٣/١١/٢٧	رقم الوثيقة	عماد الدين	الفرع المصدر
٢٠٢٣/١١/٢٧	ظهر الى	٢٠٢٣/١١/٢٧	مدة التأمين من	جنينة مصرى	العملة

٣٥٨١

شروق فريد فايز حافظ

من المعلوم والمتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة وعددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة وعددها

٢٠٢٣/١١/٣٠

تحريرا فى

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.

شركة المهندسين للتأمين


إدارة الحوادث المتنوعة

فرع عماد الدين ٢/١٨٦

صلاح محمد أحمد مختار

التوقيع

٣١



للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

شركة المهندسين للتأمين

19B18



MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين



لترسيم خاصصة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مصححاً بتعديله العامة للرقابة المالية رقم
سجل تجاري رقم ٨٤٦٣٤ - الجيزة



كشف باسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ١٦٠٠٧ د ٢

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
الولاية	حقة العجز الكلي او الجزئي المستقيم	المعز الكلي المؤقت	المعز	اسعار	جنترة
عدد (١) مهندس بدون ذكر اسم	١	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠
عدد (١) مساعد مهندس بدون ذكر اسم	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠٠	٠٠
عدد (١) سائق معده او سيارة بدون ذكر اسم	١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٠٠	٠٠
عدد (١) عامل بدون ذكر اسم	١	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠٠	٠٠
اجمالي مبلغ التأمين			١٣٠٠٠٠	جنية مصري	

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم ٢٥,٠٠٠
٣٩,٥٠

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
من المعلوم والمتفق عليه
- أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة عالية تقتصر على عدد (١) مهندس وعدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ فني و (١) سائق معده او سيارة ومن في حكمهم و (١) عامل بدون ذكر اسم اثناء وبسبب العمل داخل نطاق العمل إسناد اعمال الحفر وتحويل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر (B٤) منطقة القطاع الأول (بالأمر المباشر)
- لايجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى / المستفيد
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٦٠/٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٢ -
علما بأن استلام الموقع ٢٠٢٣/٠٨/٢٢

MIC

شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة

شرح عماد الدين ٢/١٨/٦

التوقيع

صافي القسط ١٩٧,٠٠

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

19218



MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

وثيقة تأمين حوادث شخصية

نظام كاسعة الأحكام التأمين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١
مملكة البحرين
شركة تجارية رقم ١٤٣٤ - الجدة

الفرع المصدر : عماد الدين رقم الوثيقة : ٢/١٦٠٠٨ تاريخ طلب التأمين : ٢٠٢٣/١١/٣٠

العملة : جنية مصري مدة التأمين من ٢٠٢٣/١٠/٢٧ ظهرا الي ٢٠٢٤/١٠/٢٧ ظهرا

اسم المتعاقد : شركة سامى عبيد عبد اللطيف

اسم المؤمن عليه : كما هو وارد بالوثيقة تاريخ الميلاد : اكبر من ١٦ سنة و أقل من ٦٥ سنة

العنوان : كما هو وارد بالوثيقة الوظيفة : كما بالكشف المرفق

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه وصلة كل منهم به .

الورثة الشرعيون للمؤمن عليهم .

من المعلوم والمتفق عليه :-

أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة عاليه تقتصر على عدد (١) شخص بدون ذكر اسم بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠
بعملية تنفيذ اسناد اعمال الحظر وترحيل اعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
(منطقة القطاع الأول - بالأمر المباشر B) وذلك أثناء وبسبب العمل ذهابا وعودة وداخل نطاق الموقع بشرط سلوكهم الطريق المعتاد وبشرط
ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة .
لا يجوز إجراء أية تعديلات فى بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى

القسط الإجمالي	مصاريف الهيئة	مصاريف الإشراف	مصاريف الإصدار	نصف الامتياز	نصف الدمغة	القسط الصافي
١٧٠,٠٠	٠١,٠٠	٠١,٠٠	٥٠,٢٥	٠٣,٠٠	٠١,٠٠	١١٣,٧٥

(فقط وقدره مائة سبعون جنيها مصرياً فقط لا غير)

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

أولا : إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة أشهر من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا وقدره ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (أنظر الكشف المرفق) وذلك وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة و وفقا لحدود المسؤولية للشخص الواحد .
ثانيا : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا وقدره ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (أنظر الكشف المرفق) وذلك وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة و وفقا لحدود المسؤولية للشخص الواحد .
ثالثا : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالشروط العامة لهذه الوثيقة .

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mobins.com



MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين



شركتهم خاصة لأحكام التأمين رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩١
وسجلت بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم
سجل تجاري رقم ٨٤٦٣٤ - الجيزة

وثيقة تأمين حوادث شخصية



الفرع المصدر عماد الدين ٢٠٢٣/١١/٢٧ تاريخ طلب التأمين ٢٠٢٣/١١/٢٧ رقم الوثيقة ١٦٠٠٨ / ٢
العملة جنية مصرية مدة التأمين من ٢٠٢٣/١١/٢٧ ظهور الى ٢٠٢٤/١١/٢٧ ظهور

٢٢٥٨١

شروق فريد فايز حافظ

من المعلوم والمتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تملك الشروط العامة للوثيقة و عدها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة و عدها

٢٠٢٣/١١/٣٠

تحريرا في

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
بالتوقيع

[Signature]

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاقد لبن الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

شركة المهندسين للتأمين

19E13



كشف بأسماء المستفيدين المؤمن عليه

كشف متمم للوثيقة ٢/١٦٠٠٨

الاسم	الوظيفة	مبلغ التأمين	القسط
	في حالة الوفاة	في حالة العجز الكلي أو الجزئي المستديم	
عدد (١) شخص بدون ذكر اسماء بواقع ١٠,٠٠٠ جم	شخص	١٠,٠٠٠ جم	١١٣,٧٥ جم
اجمالي مبلغ التأمين ١,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصرية			

خصومات واضافات
عدم ذكر أسم ٢٥,٠٠ % ٤٣,٧٥ جم

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه وصلة كل منهم به .

من المعلوم والمتفق عليه :-

الورثة الشرعيون للمؤمن عليهم

. أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة عاليه تقتصر على عدد (١) شخص بدون ذكر اسم فقط بواقع ١٠,٠٠٠ جم بعملية تنفيذ اسناد اعمال الحفر وترحيل اعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة القطاع الأول - بالأمر المباشر (B) وذلك اثناء وبسبب العمل ذهابا وعودة وداخل نطاق الموقع بشرط سلوكهم الطريق المعتاد وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة .
- لايجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى

صافي القسط ١١٣,٧٥ جم
