

**الدكتور إبراهيم عبد العليم** **الدكتور محمد عباس** **الدكتور محمد عباس**  
الأستاذ الدكتور محمد عباس **الدكتور محمد عباس** **الدكتور محمد عباس**  
**الدكتور محمد عباس** **الدكتور محمد عباس** **الدكتور محمد عباس**



٢٠٢٢ / ٦ / ٢٣ : رقم : ٨٧٥  
مذكرة : ٩٤١٢٦٣٢٠٢٢

## Lesson 11: The Four Elements

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة ...  
جامعة حلبية ٢٠١٤ ...

تحية طيبة وبعد ...  
تشرف بان ترسل اسيادكم توجة العينات المرسلة بخطاب سعادتكم مع ملاحظة ان مقابل  
اجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره جنيه ٢٠٠٠ ٣٥٠ جنيها  
فقد (للمزيد من تفاصيل اتفاقكم يرجى الاتصال بنا على ٠٩٦٦٧٠٩٦٦٧٠٩٦٦) لا غير .

العنوان: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_  
لذا يرجى منكم اتخاذ ما يخصها من المستخلص الشهري الشامل على  
حساب \_\_\_\_\_ ورقة / \_\_\_\_\_ لبيانها، \_\_\_\_\_ وابلاغنا به فوراً برق  
المستخلص وبياناته وابلاغ الادارة المالية بالوحدة بما تعلم -  
\_\_\_\_\_ ونوهناها بقبول وافق الاحترام ...

الكتاب المقدس، موسى عليه السلام

سیاست و اقتصاد

See Note

{ Next 33,000}

卷之三

152058

وتحت الإشراف المركبة للمحتمل المتكتبة

دکتور محمدحسن /

جعفر عبد الله الطيفي

الدعاية والتقويم والتجارة

٦٥٥- مراجعة مرسنات للسيد إبراهيم قدوس / ورئيس مجلس إدارة شركة / عبد العليم قدوس، رئيس مجلس إدارة شركة / ورئيس قيادة الشفافية والسلامة.

الإدارة العامة للمعاملات المركزية  
العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل  
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري  
تلفون: ٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس: ٢٢٦٣٠٤٩١

تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٢/١٠/٢٤



معلم: المواد

كتيرر رقم: ١٦٢٠

بخصوص: توسيعة الطريق الدائري ( الطريق السطحي من المرج للسلام )

**تقرير اختبارات معملية**

بيانات إدارية:

- القائمين بإحضار العينات: م/ محمود المحمدى ( متدرب المنطقة ).
- الجهة المشرفة: المنطقة الرابعة عشر ( الطريق الدائري و محاوره )
- الجهة المثلثة: شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة .
- استشارى: مكتب سبيكرام لاستشارات الهندسية
- عينة رقم (٥٣٠٥): من الحجار سيليسية جيرية ناتج تكسير كسارات من كم ١٤٥٢٠ حتى ١٤٥٢٠ كم.

التجارب التي أجريت:

- ١- التدرج ط - ١٠٢ ( 27 - 06 ) . AASHTO T 96 - 02 ( 2006 )
- ٢- التأكل بجهاز اللومن الجلوس ط - ١٠٦ ( ١٠٦ ) . AASHTO T 112 - 00 ( 2008 )
- ٣- الأوزان النوعية والامتصاص ط - ١٠٨ AASHTO T ( 85 - 10 ) ، واللتقت ط - ١١٣ ( ١١٣ ) .
- ٤- نسبة المحيط والمستقبل % (طبقاً للكود المصري) .
- ٥- نسبة الطين % .
- ٦- حد المسويلة ط - ٢ - ٣ AASHTO T ( 89 - 10 ) ، وحد اللدونة ط - ٤ Method - AASHTO T ( 180 - 10 ) .
- ٧- الدمل المعدل ط - ٦ - ١ AASHTO T ( 193 - 10 ) .
- ٨- نسبة تحمل كاليقونيا ط - ٤ AASHTO T ( 193 - 10 ) .

النتائج:

**١- التدرج**

مواصفات الأسماء تدرج (ب)	٥٣٠٥	رقم العينة	سعة أو رقم المهزة
			"٣
-	١٠٠		"٣
١٠٠	١٠٠		"٣
١٠٠/٧٠	٩٢		"١,٥
٨٥/٥٥	٦٨		"١
٨٠/٥٠	٥٠		"٤٤/٣
٧٠/٤٠	٤٤		"٨/٣
٦٠/٣٠	٣٥		رقم ٤
٥٠/٢٠	٢٧		رقم ١٠
٣٠/١٠	١٣		رقم ٤٠
١٥/٥	٧,٥		رقم ٢٠٠

**٢- التأكل بجهاز اللومن الجلوس**

المواصفات الخاصة بالأساس	٥٣٠٥	رقم العينة	التجربة
لا يزيد عن ٤٠ %	٢٩		نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفة بـ%

بيان

الإدارة العامة للمعاملات المركزية  
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل  
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري  
تلفون:- ٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس:- ٢٢٦٣٠٤٩١

تاريخ استلام العينات : ٢٤/١٠/٢٠٢٢

تقرير رقم :- ٦٦٠

معلم :- المواد

### ٣- الأوزان النوعية والامتصاص والتافت

المواصفات الخاصة بالأساس	رقم العينة	التجربة
--	٥٣٠٥	
--	٢.٥٦٧	الوزن النوعي الكلي
--	٢.٥٩٧	الوزن النوعي الكلي مثمن جاف للسطح
--	٢.٦٧٩	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن .١%	١.٩	الامتصاص %
لا يزيد عن .٢%	.٢	التافت %
لا يزيد عن .١٠%	٢	٤- نسبة الطبيعى %
صفر		٥- نسبة المبسط والمستطيل %

### ٦- السبولة والتدوينة

المواصفات الخاصة بالأساس	رقم العينة	التجربة
لا يزيد عن .٣%	٥٣٠٥	حد المسوولة %
لا يزيد عن .٨%	٦٤٧٤	مجال التدوينة %

### ٧- الدمعك المعدل

رقم العينة	التجربة
٢.١٩٠	القص كثافة جافة بالمعمل جم / سم <sup>٣</sup>
٠.٧٥	٥- نسبة المياه العالقة %

### ٨- نسبة تحمل كلية قوربها

المواصفات الخاصة بالأساس	رقم العينة	التجربة
لا يتأكل عن .٨%	٥٣٠٥	% C.B.R
عليهم الالتفاف	١٠٠٪	٦- نسبة الالتفاف %
صفر		(٣)

الإدارة العامة للمعامل المركبة  
العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل  
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري  
تلفون: ٢٢٣٨٩١٩٧٦ ، فاكس: ٢٢٦٣٠٤٩١

تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٢/١٠/٢٤



معمل: المواد

تقرير رقم: ١٦٢٠

- التطبيقات والتوصيات:
- ١- الهيئة تحت مسؤولية الذي أحضرها.
  - ٢- لا يعاد إصدار التقارير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركبة ويعاد إصداره كاملاً.
  - ٣- الهيئة تتفق و حدود المعاصفات من حيث التوجيهة و تدرج (ب) للأساس.

تاريخ إصدار التقرير: ٢٠٢٢/١١/١٦

التوكيلات:

محد التقرير: كيمياتى / معالى منى بن

مدير فني المعمل: مهندس / مروان سلام ع

مستشار الجودة

كيمياتى / امل  
أمل نصر الدين

مدير الجودة

كيمياتى / لـ  
مجدى الشحات خليل

القائم بأعمال مدير عام المعامل المركبة

المهندسة / سماح

سماح حسين لرويش

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركبة

دكتور مهندس / س. د.

أحمد جيد الطيف عراقى

( ٢٠٢٢/١٦٢٠ )

تقرير رقم :- ٦٦٠

يخصومن: متوسطة الطريق الدائري (الطريق السطحي من المرج للسلام )

الشارف : المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري و محاوره) - الاستشارى : مكتب اسيكترام للاستشارات الهندسية  
لشركة المنفذة: :- شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

(جمالي التكاليف)	تكاليف الاختبارات		الاختبار
	مسن ٦	عدد العينات	
60	60	1	تحضير العينة
165	165	1	تقديم خشن
150	150	1	تقديم ناعم
230	230	1	التاكل بجهاز اللومن أجلومن
160	160	1	الأوزان النوعية + الامتصاص
100	100	1	التفتت ( التحلل )
80	80	1	تحديد نسبة الطبيعى
80	80	1	تحديد نسبة المبطط والممستطول
130	130	1	السيولة و اللدونة عديمة
0	310	0	بها لدونة
450	450	1	الدمك المعدل
500	500	1	نسبة تحمل كاليفورنيا ( المعدل )
150	تكاليف اعداد و كتابة التقرير		
0	تكاليف خروج مهندس		
2255	اجمالى التكاليف المعملية		
338.25	المصاريف الإدارية ( % ١٥ )		
2593.25	الاجمالى ( تكاليف العينات + المصاريف الإدارية )		
363.055	ضريبة المبيعات ( % ١٤ )		
2956.31	الاجمالى		
مدير فني المعمل :- تامر		الشئون المالية للمعامل المركزية :-	
مسئول الجودة :- زاهر		القائم باعمال مدير عام المعمل المركزية :-	

نомер رقم: ١٢٠٢٢٥٩٤ / ٢٠٢٢  
مشروع: تزويد مكتب الطريق الراقي

(الميزان طبعه: ٢٠٢٢)

مدة: سنتين اذهم انتهى في تاريخ التلقيه والتسلیمه

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية المتعلقة بالتجارب - هيثم سليمان سليمان  
تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسلة بخطاب سعادتكم مع ملاحظة ان مقابل اجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ~~٢٣٣٧٦٣٣٣٦~~ جنيها فقط ( ~~الألف و تسعمائة و سبعون مليوناً و سبعين و ستمائة~~ ) لا غير.

بيان القيمة كالتالي:

القيمة الكلية لطرق و الكباري و النقل البري	البيان	المبلغ
الادارة المركزية للمعامل البركلي	قيمة تجارب المعمل	٢٣٣٧٦٣٣٣٦
المصاريف الإدارية	( ١٠% من قيمة التجارب )	٢٣٣٧٦٣٣٣٦
المصاريف الإدارية	( قيمة التجارب + المصاريف الإدارية )	٢٣٣٧٦٣٣٣٦
الإجمالي	٢٣٣٧٦٣٣٣٦	٢٣٣٧٦٣٣٣٦

انتمي من سيادتكم التجارب بخصوصها من المستخلص الشهري للعملية على  
حساب شركه اذهم انتهى في تاريخ التلقيه والتسلیمه وابلاغه سانته  
المستخلص و تاريخه و ابلاغ الادارة المالية بالهيئة بما تم .  
وتفضوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير المخودة

كيسانی /  
مجدی الشحات

الموئلية /

سراج حسین



الهيئة العامة لطرق و الكباري و النقل البري

رئيس الادارة المركزية للمعامل

دكتور مهندس /

وزارة النقل

احمد عبد الخالق عراقی

هيئة دراسة السير المونديا / رئيس مجلس ادارة شركة اذهم انتهى في تاريخ التلقيه والتسلیمه  
وزيرة مرحلة المسجد الجواري / رئيس قطاع البناء والمتاحف

**معلم الطريق والاسفلات**

نثري رقم: ٦٦٠

تاريخ استلام العينات: ٢٤/١٠/٢٢

**بنصوص:** - مشروع توسيع الطريق الدائري (الطريق السطحي من المخرج للسلام)**نثري اختبارات معملية****بيانات ادارية:**

القائم بالحضور العينات: /ا/ امين محمد السيد (مندوب المنشأة)

الجهة المشرفة: المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره .

الجهة المنفذة: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

امثلاري: مكتب امثلاري للاستشارات الهندسية

بيان العينات: ١- العينة رقم ٥٣٠٦: عينة اتربة رملية بيضاء اللون كم ٤٦٥٠ الى ٥٦٠

التجربة التي أجريت:

(١) التدرج ( AASHTO T 27 - 06 ) ( ط - ١٠٢ )

(٢) السبورة ( AASHTO T 89 - 10 ) ( ط - ٣ ) والبلونة ( AASHTO T 90 - 00 ) ( ٢٠٠٨ )

(٣) النك العدل ( AASHTO T99-10 ) ( ط - ١٠١ ) ( ٤ ) نسبة تحمل كاليلورنيا ( ١٠ - ١٩٣ ) ( ط - ١ )

**المطالع:**

مواصفات الاتربة الخامسة بالعينة	٥٣٠٦	رقم العينة	
		التجربة	التجربة
--	١٠١	"٢,٦	١- التدرج
	٩٩	"٢	
	٩٤	"١,٥	
	٨٩	"١	
	٨٥	"٤/٣	
	٧٥	"٨/٣	
	٦٧	٤ رقم	
	٤١	١٠ رقم	
	٣٤	٤٠ رقم	
	٩	٢٠٠ رقم	
--	٢٨	حد العبروبة س.ل	٢- السبورة والبلونة
	٦	P.L. سهل البلونة	
	١١	التصنيف	
--	٢,١	ال UNS رقم / سم³	٣- النك العدل
	٦,٨	نسبة الماء الماء%	
٪١٠ لاقل عن	٨٩	% (C. B. R)	٤- نسبة تحمل كاليلورنيا
٪٣ لازيد عن	٣٦	% الانكس	



النثري رقم: ٦٦٠

٢ من ٢

الملحق رقم: ٦٢٠ تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٢/١٠/٢٤  
بنصوص: - مشروع قيسمة الطريق الدائري (الطريق السطحي من المرج للسلام)

- التعليمات والتوصيات: ١- العينة مسئولية من احضرها .  
٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير علم المعامل المركزية وبعد إصداره كاملاً  
٣- العينة تتلقى وحدود مواصفات الاقرنة الخاصة بالعينة ويرجى الترجوع للمواصفات الخاصة بالمشروع إن وجدت .

تاريخ إصدار التقرير: ٢٠٢٢/١١/٢١

مد المكتير: ميسة محسن رئيس  
المدير الثاني المعامل: ثابروة شعبان محسن

ممثل الجودة  
كيميكالية /  
أمل نصر الدين

مدير الجودة  
كميالي /  
مجد الشحات خليل

القائم باعمال مدير علم المعامل المركزية

مهندس  
سماح حسن درويش

رئيس الادارة المركزية للمعامل المركزية  
دكتور مهندس /



تكليف معلم التربية

رقم التقرير: ٦٢ تاريخ الاستلام: ١٠ / ٢٤ / ٢٢

بخصوصهـ مشروع توسيع الطريق الدائري (الطريق الممتد من المرج للسلام)

الجهة العشرة - المنطقة الرابعة عشر - الدايري ومحابه .

الجية المنفذة بشركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة

التجرب	عدد العينات	التكليف	الاجمالى
تحضير العينة	1	60	60
التدرج الشن	1	165	165
التدرج الناهم	1	150	150
اللدونة	1	130	130
السيولة	1	180	180
بروكتور ( محل )	1	450	450
C.B.R ( معدل )	1	500	500
اعداد تقرير	1	150	150
اجمالى تكاليف محصل التربة			1785.00
المصاريف الادارية ( 15 % من اجمالى التكاليف )			287.75
اجمالى التكاليف + المصاريف الادارية			2052.75
الضريبة المضافة ( ١١ % )			287.39
الاجمالى			2440.14

مقدمة التقرير : نصوص

## **الشئون المالية للمعامل المركزية :**

مسنون الجودة:



PROJECT :	الطريق المستحسن من المدرج للسلام (اتجاه تلقي السلام بالنفس)		
	طريقه استقللت زاوية 3 د	Testing Date	23/12/2023
Location st :	0+630--0+933	REQ:-	

## EXTRACTION & GRADATION

A) MIX TEMPERATURE: 145


9) BITUMEN CONTENT:  $4.80 \pm 0.25$  [4.55 : 5.05]

a- Wt. before extraction.	=	1249 gm	e- Wt. of ash	=	2.0 gm
b- Wt. after extraction.	=	1190 gm	f- Total wt. extract. agg.(b+e) =		1192 gm
			% Bt. 100 (e-f)/f =		4.73 %

### C) GRADATION OF AGGREGATES

weight of sample after washing		=	1192
SIEVE SIZE	WT. OF RETAINED	% RETAINED	
1"	0.0	0.0	
3/4"	102.0	8.5	
5/8"	488.0	40.9	
#4	712.0	59.7	
#8	823.0	69.0	
#30	1044.0	87.6	
#50	1145.0	96.1	
#100	1162.0	97.5	
#200	1178.0	98.7	
Residual	14.0		

PASSING%	J.M.F	Tolerance		Specification	
		Spec Min%	Spec Max%	Spec. Min%	Spec Max%
100.0	100.0	100	100	100	100
91.4	89.5	84.8	94.5	78	100
59.1	55.8	50.8	60.8	45	70
40.3	38.2	34.2	42.2	30	50
31.0	29.6	26.6	32.6	20	36
12.4	12.2	9.2	15.2	4	20
3.9	6.0	3.0	9.0	3	12
2.5	3.1	2.0	4.6	2	8
1.3	2.0	0.5	3.6	0	4

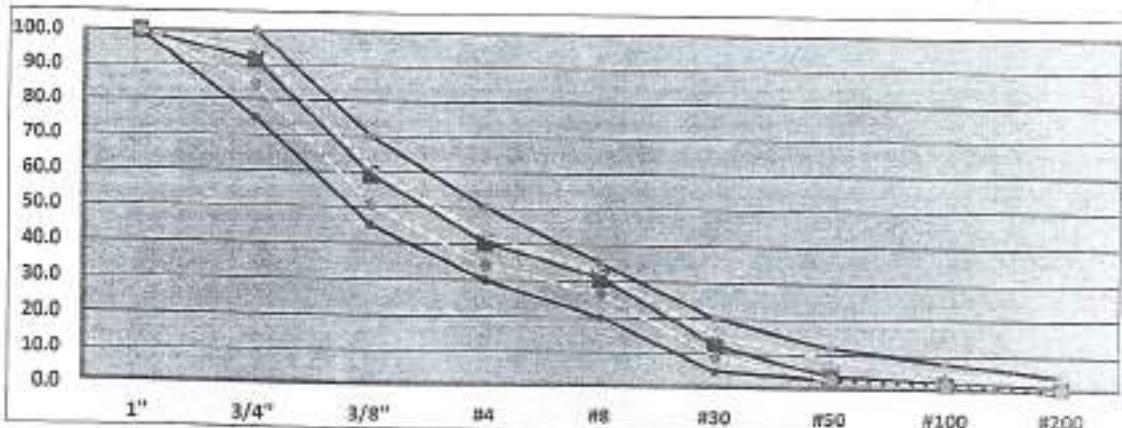

二三七

مدونة الاستشاري

2223



الجهاز المركزي للمعايرة والتقييم



## مذكرة الطريقة النطح من المرج السلام

## Marshal Test ASTM D1559

Activity &amp; Sample description: Asphalt (Binder course)

Sampling date: 23/12/2022

Testing date: 24/12/2022

Location: 0+530—0+933

No.	Stability			specification
	1	2	3	
Bitumen(%)		4.78		
Wt. in air (gm)	1224.0	1233	1252	
Wt. in water (gm)	713	715	717	
Wt. of saturated surface dry(gm)	1228	1235	1255	
Volume (cm <sup>3</sup> )	515	520	538	
Density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.377	2.371	2.327	
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )			2.356	
Load (kg)	1142	1156	1185	
Average stability @ 60.0C		1161		≥ 1000
Flow(mm)	3.1	3.3	3.5	
Average of Flow(mm)		3.3		3-5

مهندس الاستشاري

مهندس المعلم

## اختبار قياس السمهك و الكثافة لمعبئات الاسفلت

التاريخ : ٢٠٢٢-١٢-٣١  
 المكان : مصر الجديدة  
 المسئول : ٥٦٣٠--٥٩٣٣  
 مشروع الطريق السطحي من السرج للسلام

السمك (%)	$d_{40} \text{ (mm)}$	5p Gr	weight in Grams	العيونه	السواره	الممکع	مسسل الممکع
			SSD in air	water	air	(سمك) (سم)	
98	/	2.360	2.316	758	432	755	30
99	/	2.360	2.328	756	433	752	30
99	/	2.360	2.327	736	421	733	30
						R	6.9
						0.810	3
							3

مهندس الجرونة

  
 مهندس سامي / شريف  
 مهندس الجرونة  
 ٣ / محمد عبد الحميد



PROJECT:	萃取 من المزيج للسلام (النهاية تطلق السلام داخل)		
	مليمة استكشاف رابطة ٣	Testing Date	23/12/2020
Location st.:	0+587—0+628	REQ.:	

### EXTRACTION & GRADATION


A) MIX TEMPERATURE : 145

B) BITUMEN CONTENT:  $4.80 \pm 0.25$  (4.55 : 5.05)

a- Wt. before extraction.	=	1266 gm	e- Wt. of ash =	3.0 gm
b- Wt. after extraction.	=	1205 gm	f- Total wt. extract agg. (b-e) =	1208 gm
			% Bit. 100 (a-f) / f =	4.80 %

C) GRADATION OF AGGREGATES :

weight of sample after washing = 1208								
SIEVE SIZE	WT. OF RETAINED	% RETAINED	PASSING%	J.M.F	Tolerance		Specification	
					Spec. Min%	Spec. Max%	Spec. Min%	Spec. Max%
1"	0.0	0.0	100.0	100.0	100	100	100	100
3/4"	89.0	7.4	92.6	89.5	84.8	94.5	75	120
3/8"	485.0	41.0	59.0	58.8	50.8	60.8	42	70
#4	768.0	63.8	36.4	38.2	34.2	42.2	30	50
#6	862.0	71.4	28.6	29.6	26.6	32.6	20	35
#10	1032.0	85.4	14.6	12.2	9.2	15.2	5	20
#20	1150.0	96.2	4.8	8.0	3.0	9.0	3	12
#40	1168.0	96.7	3.3	3.1	2.0	4.6	2	8
#60	1184.0	98.0	2.0	2.0	0.5	3.5	0	4
Residual	12.0							

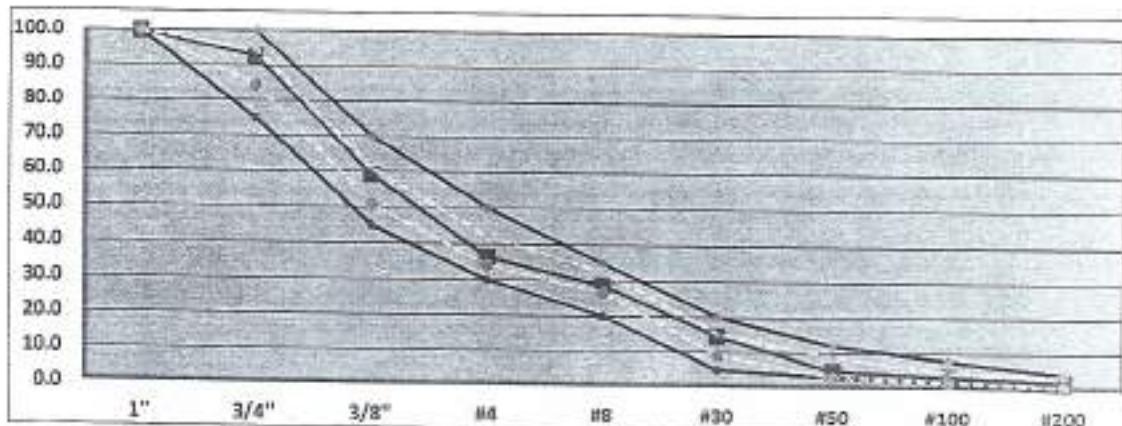

ملاحظات :

مهندس الجودة الاستشاري

مهندس الورقة

مشروع الطريق الطنجي من المرج للسلام

Marshal Test ASTM D1559

Activity & Sample description: Asphalt (Binder course)

Sampling date: 23/12/2022

Testing date: 24/12/2022


Location: 0+687 --- 0+699

Testing Results & Calculations				specification
No.	1	2	3	
Bitumen(%)		4.80		
Wt. In air (gm)	1225.0	1244	1249	
Wt. In water (gm)	713	715	717	
Wt. of saturated surface dry(gm)	1228	1246	1252	
Volume (cm <sup>3</sup> )	515	531	536	
Density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.379	2.343	2.336	
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )			2.352	
Load (kg)	1152	1176	1198	
Average stability @ 60.0°C		1175		≥ 1000
Flow(mm)	3.2	3.4	3.5	
Average of Flow(mm)		3.4		3-5

مهندس الاستشاري

مهندس المعلم

للمطر و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)



## اختبار قياس السمك و الكثافة لمياهات الأسمدة

2022-12-31  
ID

الماء  
الماء

مشيخة الصارفية السطحية من المرج للسلام  
0+584—0+829

الماء  
الماء

composition %	نسبة الماء	50.6%	weight in Grams			السمك (سم)	النطاع	مسلسل لم المياه
			SSD in air	water	air			
99	—	2.350	2.318	746	425	744	3D	1
98	—	2.350	2.295	757	428	755	3D	1
99	—	2.350	2.333	724	415	721	3D	1
						7.1	C	3
						—	0+810	3
						—	0+750	2
						—	0+600	1

أ.د. محمد عبد الحميد

أ.د. محمد عبد الحميد

مهندس الماء


م/ شريف سامي

PROJECT	بيان عن ترسّمة التفريغ المائي من المرج للسكة		
Location st.	طريق اسلات رايدر 0+000---0+603	Testing Date REQ:-	27/9/2022
<u><b>EXTRACTION &amp; GRADATION</b></u>			

A) MDT TEMPERATURE:	24.5		
B) SITUATION CONTENT:	$4.80 \pm 0.23$ [4.57 ± 0.26]		
a- Wt. before extraction:	1395 gm	e- Wt. of agg. retained [a-c] =	3.0 gm
b- Wt. after extraction:	1195 gm	f- Total wt. extract. agg. [b-e] =	1192 gm
c- Wt. of filter & agg.	48.0 gm	% Ret. 100 [a-f] / f =	4.76 %
d- Initial wt. filter:	45.0 gm		

C) GRADATION OF AGGREGATES :

SIEVE SIZE	WT. OF RETAINED	% RETAINED	PASSING%	I.M.F	Tolerance		Specification	
					Specs. Min%	Specs. Max%	Specs. Min%	Specs. Max%
1"	0.0	0.0	100.0	100.0	100	100	100	100
3/4"	75.0	6.3	93.7	93.7	84.6	94.6	75	105
5/8"	482.0	39.5	61.4	55.8	50.0	60.0	45	75
1/2"	745.0	62.2	37.5	38.2	34.2	42.2	10	30
5/16"	345.0	70.5	29.5	29.8	29.8	32.8	20	30
#30	1025.0	38.6	14.4	12.2	8.2	15.2	5	25
#50	1089.0	91.7	8.3	8.0	3.0	9.0	5	15
#100	1152.0	96.2	3.8	3.1	1.6	4.6	2	8
#200	1163.0	97.1	2.9	2.0	0.6	1.5	2	4
Residual	36.0							

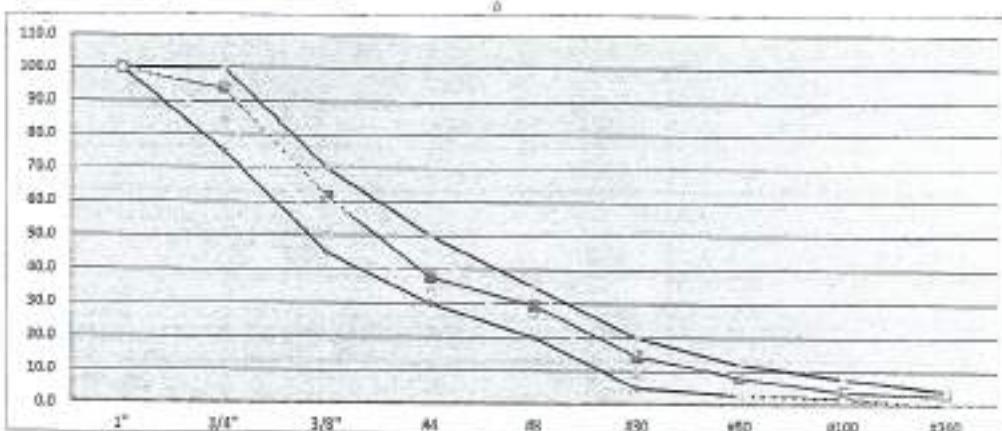

بيان عن

مهندس المواد الاستكباري

مهندس المواد

مشروع الطريق السعير للنارى من المرج للسلام

Marshal Test ASTM D1559

Activity & Sample description: Asphalt (Binder course) Location: 0+000---0+803

Sampling date: 27/9/2022 3D

Testing date: 28/9/2022 Source: al salam international

Testing Results & Calculations						Specification
No.	1	2	3			
Bitumen(%)	4.76					
Vt. In air (gm)	1230.0	1235	1239			
Vt. In water (gm)	711	712	713			
Vt. of saturated surface dry(gm)	1233	1238	1242			
Volume (cm <sup>3</sup> )	522	526	529			
Density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.356	2.348	2.342			
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.349					
Load (kg)	1094	1105	1123			
Average stability @ 60.0C	1107			≥ 1000		
Flow(mm)	3.2	3.3	3.5			
Average of Flow(mm)	3.3			3-5		

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



المهندسة المصادفة  
للتغذية الكيميائية والنفط البري  
(GARBET)

## اختبار قياس السهمك والكتافة لعينات الاسفلت

2022-10-05  
3D

التاريخ  
تصنيف المدينة

جامعة طنطا  
الكلية الصناعية  
قسم التغذية الصناعية  
00000-01663

جامعة طنطا  
الكلية الصناعية  
قسم التغذية الصناعية

weight in Grams

compaction %	الرسالة الاسمية	Sp.Gr	SSD in air	water	air	Alab.	Egyp.	القطن	الصينية	ميكانيكي
99	—	2.320	2.288	758	428	755	30	—	7.3	0.080
98	—	2.320	2.272	756	425	752	30	—	7.3	0.150
98	—	2.320	2.283	736	415	733	30	—	7.3	0.250
99	—	2.320	2.287	743	419	741	30	—	7.3	0.390
99	—	2.320	2.292	725	410	722	20	—	7	0.460
99	—	2.320	2.305	736	418	733	30	—	6.9	0.550
									—	6

أحمد العزبي الأستاذ

محمد عبد الرحمن

جامعة طنطا  
الكلية الصناعية  
قسم التغذية الصناعية  
00000-01663



PROJECT:	الخريف لطامر من المرج للسلام		
Location st:	بلدة سهلات رقم 4 2+200--2+305	Testing Date REQ.:	23/12/2022

### EXTRACTION & GRADATION

A) MIX TEMPERATURE : 145


B) DRYER TEMPERATURE : 4.80 ± 0.25 (0.87 : 0.08)

c- Wt. before extraction	1227 gm	e- Wt. of agg. retained (0-5)	1.0 gm
d- Wt. after extraction	1137 gm	f- Total wt. extract. agg. (b+d)	1160 gm
b- Wt. of fine agg.	48.0 gm	g- Wt. 20% (x-4) / f	4.31 %
a- Initial wt. fine	45.0 gm		

C) GRADATION OF AGGREGATES :

weight of sample after washing = 1160

SIEVE SIZE	WT. OF RETAINED	% RETAINED	PASSING%	J.M.F.	Tolerance		Specification	
					Specs. Min%	Specs. Max%	Specs. Min%	Specs. Max%
1"	0.0	0.0	100.0	100.0	100	100	100	100
3/4"	53.0	4.5	95.5	93.2	84.5	94.5	75	100
1/2"	472.0	40.7	89.3	88.0	50.5	50.5	45	75
#4	726.0	63.2	34.8	34.2	34.2	42.2	30	50
#8	831.0	71.5	28.4	29.8	26.8	22.6	20	32
#16	1007.0	88.9	19.2	12.2	9.2	15.2	5	20
#32	1071.0	92.1	7.7	6.0	3.0	9.0	3	12
#64	1121.0	95.6	3.4	3.1	1.6	4.6	1	3
#128	1134.0	97.8	2.3	2.0	0.5	3.5	0	4
Residual	26.0							

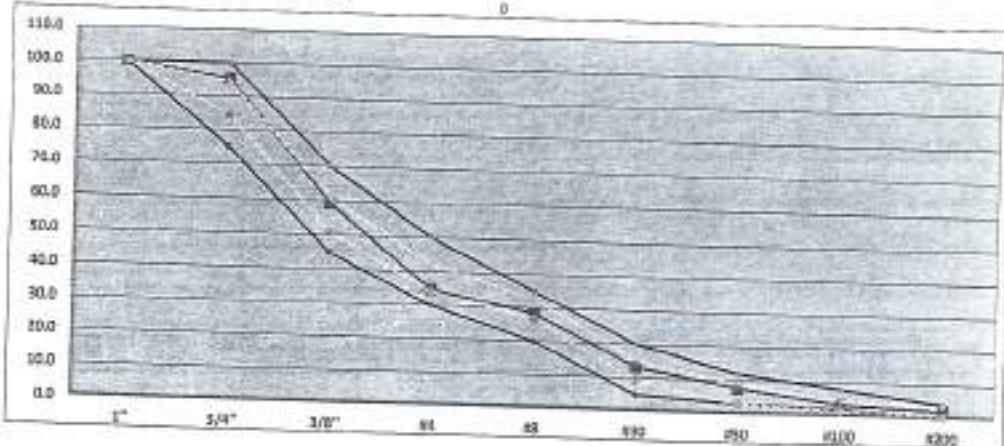

تم مسح

مختبر الوجه الاستشاري

مختبر المراجعة



مشروع الطريق السطحي من المرج للسلام

**Marshall Test ASTM D1559**

Activity & Sample description: Asphalt (Binder course)

Location: 2+200--2+306

Sampling date: 13/12/2022

Testing date: 14/12/2022

Testing Results & Calculations				Stability			specification
No.	1	2	3				
Bitumen(%)	4.91						
Wt. In air (gm)	1226.0	1238	1255				
Wt. In water (gm)	712	716	713				
Wt. of saturated surface dry(gm)	1229	1242	1257				
Volume (cm <sup>3</sup> )	517	526	544				
Density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.371	2.354	2.307				
Average density (gm/cm <sup>3</sup> )	2.344						
Load (kg)	1195	1185	1175				
Average stability @ 60.0°C	1185						≥ 1000
Flow(mm)	3.5	3.3	3.1				
Average of Flow(mm)	3.3						3-5

مهندس الاستشارى

مهندس المعلم



الإمارة المأهولة  
الطرق و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)

## اختبار قياس السمك و الكثافة لعينات الأسفلت

2022-12-31  
3D

النوع  
اصناف العينة

مشروع الطريق  
الوطني  
2+400---2+306

الموقع  
الموقع

compaction %	Sp.Gr	weight in Grams			النوع	النوع	مسلسل
		SSD in air	water	air	السمك (سم)	الارتفاع	المدينة
97	2.344	2.275	715	402	712	3D	7.2
98	2.344	2.303	746	423	744	3D	7.6
98	2.344	2.295	725	410	723	3D	7.1
						2+300	2
						2+300	3

مهندس المعاشر

مهندسان المعاشر

مهندس المعاشر

مهندس المعاشر



الشركة العامة  
لـ تكباري و النقل البري  
(GARSLT)

PROJECT :	اطريق السطح من المرج للسلام ( اتجاه تل نشابة (نطاف )		
	نطافه استلت ترميم 3	Testing Date	18-05-22
Location st. :	1+480--1+160	REQ:-	

### EXTRACTION & GRADATION


A) MIX TEMPERATURE : 143

B) BITUMEN CONTENT:  $4.80 \pm 0.25$  [4.55 : 5.05]

a- Wt. Before extraction:	1379 gm	a- Wt.of ash =	3.0 gm
b- Wt. after extraction:	1314 gm	F- Total wt extract agg.(b-a) =	1317 gm
		% Bit. 100 (a-F) / F =	4.71 %

C) GRADATION OF AGGREGATES :

weight of sample after washing = 1317		
SIEVE SIZE	WT. OF RETAINED	% RETAINED
1"	0.0	0.0
3/4"	93.0	7.1
3/8"	815.0	60.7
#4	885.0	64.9
#8	360.0	27.9
#16	1170.0	88.8
#32	1233.0	93.6
#64	1280.0	97.2
#128	1295.0	98.3
Residual	22.0	

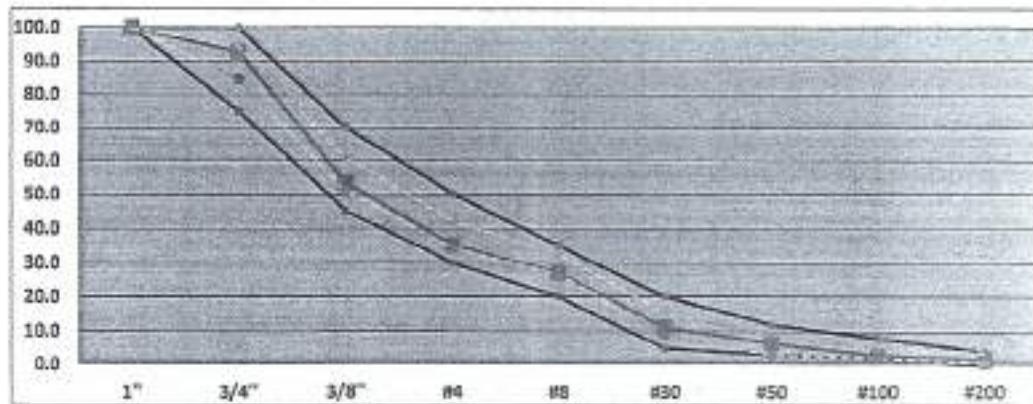

لوحة بحث :

مهندس الورقة الاستثنائي



م/ محمد عبد الحميد

مهندس التوزيع






جامعة  
الغاربى و النقل البرى  
(GARBLT)

Project :	الغرين السطحي من المدرج السلام ( الدار تلق السلام باطن )		
Location at :	طبقه اسلات رابطه 3 + 1+480--1+640	Testing Date REQ:-	23/12/202

### EXTRACTION & GRADATION

A) MIX TEMPERATURE : 145  
 B) BITUMEN CONTENT:  $4.80 \pm 0.25$  (4.55 : 5.05)  
 a- Wt. before extraction = 1255 gm      b- Wt. of ash =  
 b- Wt. after extraction = 1195 gm      f- Total wt. extract agg (b+c) = 2.0 gm  
 % Bit. 100 (a-f)/f = 1197 gm  
 C) GRADATION OF AGGREGATES : 4.85 %

### C) GRADATION OF AGGREGATES .

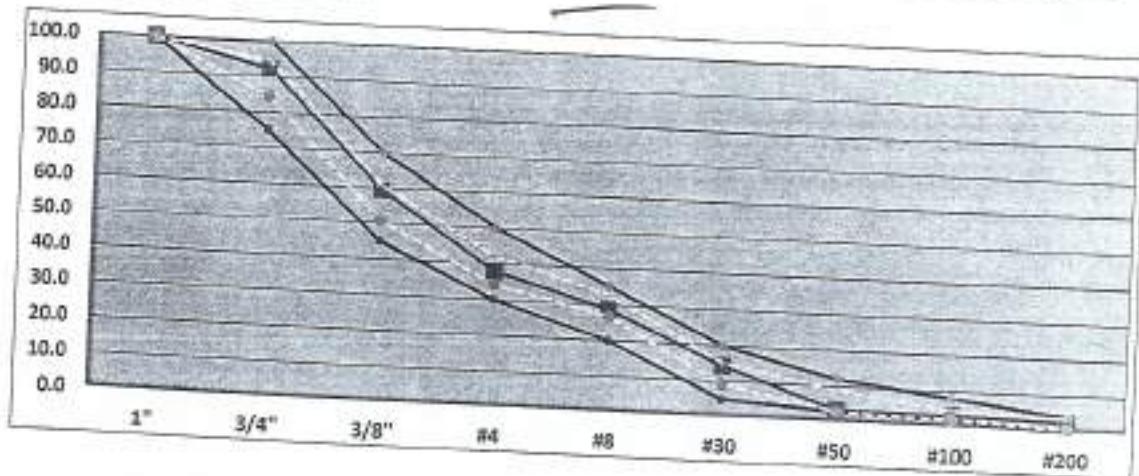


آموزشی

مكتبة العودة الائتمانية

میں تھا

$\overrightarrow{PQ}$



اطبعة الم Hague  
كتابات وتألیف البریج (GARBTI)

## اختيار قياس السمك و الكثافة لعينات الاسفلت

2022-12-31

۲۷۰

الدُّرْق

النسبة المئوية (%)	الكتلة (كيلوغرام)	Sp.Gr	SSD in air	water	air	العينة	الجارة	القطع	العينة	معدل
99	2.344	2.329	725	415	722	30	R	7.2	3+510	1
98	2.344	2.308	753	428	750	30	L	7.6	1+580	2
99	2.344	2.316	758	432	755	30	C	7.1	1+620	3


卷之三

/ 1000

دعاية

م / شریف سعید

۱۰



### Determination Rate of Spray for Prime Coat (MC-30)

Project	اسم المشروع / الطريق السطحي من المرج للسلام	
Testing Date	2023/05/22	
Request No.		

Type of Material :	Prime Coat MC-30	( Location )Station Limits	
MC-1 Temperature :	80 C	From	
Width :		1+257	
Speed of Distributer :		1+502	

Test Number	A	B	
Taken at Station			
a- Weight of Tray without Prime Coat	gms	450	430
b- Weight of Tray with Prime Coat	gms	833	825
c- Weight of Prime Coat (b) - (a)	gms	383	388
d- Area of Tray	m <sup>2</sup>	0.25	0.25
e- Rate of Spray (c) / (d)	Kg/m <sup>2</sup>	1.532	1.552
Required Rate of Spray (MC-30)	1.5 - 2 Kg/m <sup>2</sup>		

Remarks :

---



---



---



---



---

CONTRACTOR

CONSULTANT



شركة السيف للمقاولات



### Determination Rate of Spray for Prime Coat (MC-30)

Project	اسم المشروع / الطريق السطحي من المرج للسلام		
Testing Date	2023/05/22		
Request No.			


Type of Material :	Prime Coat MC-30	( Location ) Station Limits	
MC-1 Temperature :	80 C	From	
Width :			
Speed of Distributer :		0+860	
		0+998	

Test Number		A	B	
Taken at Station				
a- Weight of Tray without Prime Coat	gms	450	430	
b- Weight of Tray with Prime Coat	gms	836	859	
c- Weight of Prime Coat (b) - (a)	gms	386	388	
d- Area of Tray	m <sup>2</sup>	0.25	0.25	
e- Rate of Spray (c) / (d)	Kg/m <sup>2</sup>	1.544	1.552	
Required Rate of Spray (MC-30)		1.5 - 2 Kg/m <sup>2</sup>		

Remarks :

CONTRACTOR

CONSULTANT



شركة السلام للمقاولات



د.م. عمار بنبل



### Determination Rate of Spray for Prime Coat (MC-30)

Project	اسم المشروع / الطريق السطحي من المرج للسلام		
Testing Date	2023/05/22		
Request No.			

Type of Material :	Prime Coat MC-30	( Location ) Station Limits	
MC-1 Temperature :	80 C	From	
Width :			0+998
Speed of Distributer :			1+160

Test Number	A	B	
Taken at Station			
a- Weight of Tray without Prime Coat	gms	450	430
b- Weight of Tray with Prime Coat	gms	836	810
c- Weight of Prime Coat (b) - (a)	gms	386	380
d- Area of Tray	m <sup>2</sup>	0.25	0.25
e- Rate of Spray (c) / (d)	Kg/m <sup>2</sup>	1.544	1.520
Required Rate of Spray (MC-30)	1.5 - 2 Kg/m <sup>2</sup>		

Remarks :

CONTRACTORCONSULTANT



### Determination Rate of Spray for Prime Coat (MC-30)

Project	اسم المشروع / الطريق السطحي من المرج للسلام		
Testing Date	2023/05/22		
Request No.			

Type of Material :	Prime Coat MC-30	( Location ) Station Limits	
MC-1 Temperature :	80 C	From	
Width :		0+410	
Speed of Distributer :		0+619	

Test Number		A	B	
Taken at Station				
a- Weight of Tray without Prime Coat	gms	450	430	
b- Weight of Tray with Prime Coat	gms	833	815	
c- Weight of Prime Coat (b) - (a)	gms	383	385	
d- Area of Tray	m <sup>2</sup>	0.25	0.25	
e- Rate of Spray (c) / (d)	Kg/m <sup>2</sup>	1.532	1.540	
Required Rate of Spray (MC-30)		1.5 - 2 Kg/m <sup>2</sup>		

Remarks :

---



---



---



---




---



---

CONTRACTOR

CONSULTANT



### Determination Rate of Spray for Prime Coat (MC-30)

Project	اسم المشروع / الطريق المسطوح من المرج للسلام	
Testing Date	2023/05/22	
Request No.		

Type of Material :	Prime Coat MC-30	( Location )Station Limits		
MC-1 Temperature :	80 C	From		
Width :			0+619	
Speed of Distributer :			0+630	

Test Number	A			
Taken at Station				
a- Weight of Tray without Prime Coat	gms	450		
b- Weight of Tray with Prime Coat	gms	829		
c- Weight of Prime Coat (b) - (a)	gms	379		
d- Area of Tray	m <sup>2</sup>	0.25		
e- Rate of Spray (c) / (d)	Kg/m <sup>2</sup>	1.516		
Required Rate of Spray (MC-30)		1.5 - 2 Kg/m <sup>2</sup>		

Remarks :

---



---



---



---




---



---

CONTRACTOR

CONSULTANT



شركة المستقبل للمقاولات



Determination Rate of Spray for Prime Coat (RC-3000)


Project	اسم المشروع / مشروع الطريق السطحي من المرج الى السلام	
Testing Date	2023/05/22	
Request No.		

Type of Material :	Prime Coat RC-3000	( Location ) Station Limits
Width :		
Speed of Distributer :		0+000----0+080

Test Number Taken at Station	A	B		
a- Weight of Tray without Prime Coat	gms	450	430	
b- Weight of Tray with Prime Coat	gms	575	562	
c- Weight of Prime Coat (b) - (a)	gms	125	132	
d- Area of Tray	m <sup>2</sup>	0.25	0.25	
e- Rate of Spray (c) / (d)	Kg/m <sup>2</sup>	0.500	0.528	
Required Rate of Spray (RC-3000)		0.4 - 0.6 Kg/m <sup>2</sup>		

Remarks :

CONTRACTORCONSULTANT



Determination Rate of Spray for Prime Coat (RC-3000)

Project	اسم المشروع / مشروع توسيع الدائري من المرج الى السلام		
Testing Date	2022-06-20		
Request No.			
Type of Material :	Prime Coat RC-3000		( Location ) Station Limits
Width :			
Speed of Distributer :	0+210---0+370		
Test Number	A	B	
Taken at Station			
a- Weight of Tray without Prime Coat	gms	450	430
b- Weight of Tray with Prime Coat	gms	586	566
c- Weight of Prime Coat (b) - (a)	gms	136	136
d- Area of Tray	m <sup>2</sup>	0.25	0.25
e- Rate of Spray (c) / (d)	Kg/m <sup>2</sup>	0.544	0.544
Required Rate of Spray (RC-3000)	0.4 - 0.6 Kg/m <sup>2</sup>		

Remarks:

---

---

---

---

---

CONTRACTOR



CONSULTANT



Project Name:	مشروع الطريق السطحي من المرج للسلام		المشروع :
Location At Site:			
Description Of Sample:	طبقه الرسميات	5/5/2023	تاريخأخذ العينة :
		5/5/2023	تاريخ الاختبار :

**Sieve Analysis****AASHTO T - 27 (ASTM C - 136 )**

المناشر	المحجوز الكلي	وزن الماء	نسبة الماء
WAT. SIEVES	CUM. WT. RETAINED	CUM.WT	PASSING
2"	0	10230	100.0
1 1/2"	932	9298	90.9
1"	1623	8607	84.1
3/4"	2541	7689	75.2
3/8"	4871	5359	52.4
# 4	6552	3578	35.0
# 10	161	339	23.7
# 40	358	142	9.9
# 200	412	88	6.2
PAN			
WASH			
TOTAL			

**Atterberg Limits (Liquid Limit & Plastic Limit )**

TYPE OF TEST	نوع الاختبار	LIQUID LIMIT				PLASTIC LIMIT		حد الترورة
		1	2	3	4	1	2	
TRIAL NO.	رقم التجارب							
NO. OF BLOWS	عدد الضربات							
CONTAINER NO.	رقم المقطرة							
SAMPLE WET +TARE	العينة الرطبة + القاعدة	gm						
SAMPLE DRY +TARE	العينة الجافة + القاعدة	gm						
WT. OF WATER	وزن الماء في العينة	gm						
WT. OF CONTAINER	وزن المقطرة	gm						
WT. OF DRY SAMPLE	وزن العينة الجافة	gm						
WATER CONTENT	محتوى الماء%	%						

= (حد السيرولة) L.L

0.0

= (حد الترورة) P.L

0.00

= (حد الترورة) P.L

0.0

A-1-b

مهندس مواد الاستشاري

مهندس مواد المقاول


تجربة بركتور

رقم العينة

5/5/2023

التاريخ

5	4	3	2	1	رقم المحاولة
	10487	10595	10325	10186	أولن الناب + المبنية مطبوعة
	5940	5940	5940	5940	ب أولن الناب فارغ
	4547	4655	4385	4246	ج أولن العينة مطبوعة آهـ
	2048	2048	2048	2048	د سليم الناب سـمـا
	2.220	2.273	2.141	2.073	هـ الكثافة الرطبة طن / 3م <sup>3</sup>
	8	7	6	5	وـ رقم الجنة
	200	200	200	200	رـ أولن المبنية رطبة + الجنة
	190	192	193	194	حـ 55 العينة جافة + الجنة
	75	75	75	75	طـ وزن الجنة
	10	8	7	6	كـ وزن الماء (ارسـ)
	115	117	118	119	لـ وزن العينة جافة (رجـ طـ)
	8.7	6.8	5.9	5.0	مـ نسبة الرطوبة كـ 100%
	7.8		5.5	3.6	نـ متوسط نسبة الرطوبة
	2.060		2.155	2.067	هـ الكثافة الجافة طن / 3م <sup>3</sup>
				2.023	

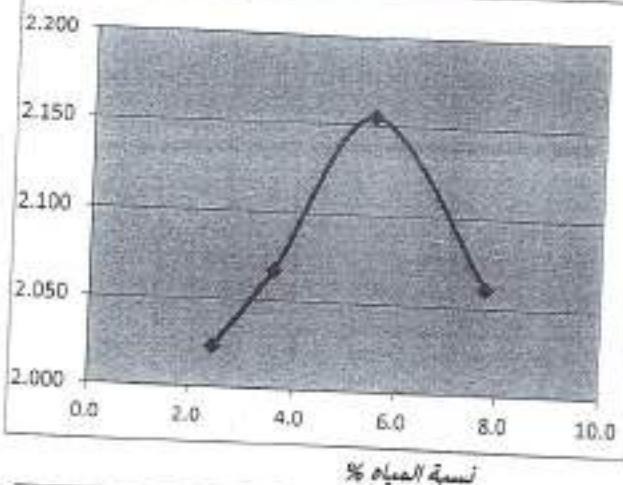

الكتافة الجافة طن / 3م<sup>3</sup>

2.155

نسبة الماء الملاعبة %

5.5

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة


PROJECT :		Sampling Date	6/5/2023
Location st.		Testing Date	10/5/2023
		Lab. Sample No	

California Bearing Ratio " CBR " AASHTO T193-72 & ASTM D698

الارتفاع من سطح الماء (cm)	القراوة الابتدائية للمهيكروميتر		الارتفاع من سطح الماء (%)
	0	1	
125	2.4	4.5	القراوة النهائية للمهيكروميتر
	1.92	100 * ((4.5 - 2.4) / 1.92)	الارتفاع من سطح الماء %

Testing Results & calculations :-

penetration (mm )	0.635	1.27	1.905	2.54	3.81	5.08	6.35
load (kg)	125	321	485	635	723	844	980
load (kN)	1.226	3.148	4.756	6.227	7.990	8.277	9.611
penetration (inch )	0.025	0.050	0.075	0.100	0.150	0.200	0.250
load (lb )	276	707	1069	1400	1593	1860	2160

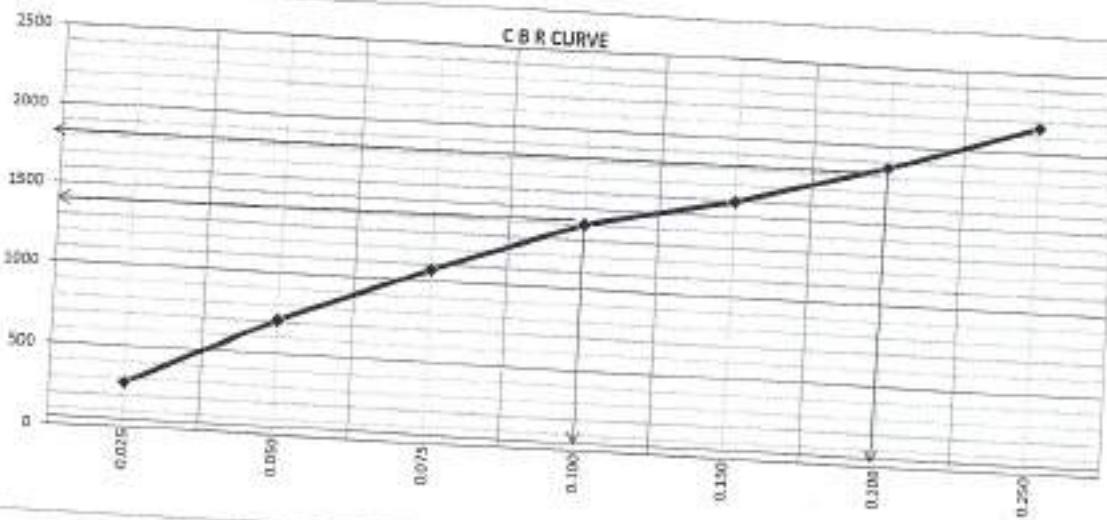

CBR Value (0.1 inch) = 46.7 %  
 CBR Value (0.2 inch) = 41.3 %

مختبر مواد البناء

مختبر مواد المقاول



Safy



**Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136**

Activity & Sample description: SI Base cours

Testing date: 28/06/2023

Checking date: 28/06/2023

Total Wt : 10260

**Testing Results & Calculations:**

حجم المنخل (mm)	حجم المنخل (inch)	وزن المحجور التراكمي (gm)	المحجور %	النمار %	المواصفات
50.8	2"	0	0.0	100.0	100.0
37.5	1.5"	155	1.5	98.5	100-70
25	1"	1965	19.2	80.8	85-55
19	3/4"	3655	35.6	64.4	80-50
9.5	3/8"	5632	54.9	45.1	70-40
4.75	# 4	6253	60.9	39.1	60-30
2	# 10	152	72.8	27.2	50-20
0.425	# 40	320	85.9	14.1	30-10
0.075	# 200	396	91.9	8.1	15-5

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة


نجدية بركبور

رقم العينة

28/6/2023

التاريخ

رقم المحاوشه	1	2	3	4	5
أ وزن القاب + المبنية بمسموطة	10400	10723	10895	10795	
ب وزن القاب قارع	5940	5940	5940	5940	
ج وزن العينة بمسموطة - ب	4460	4783	4955	4855	
د حجم القاب سم³	2048	2048	2048	2048	
ه الكثافة الرطبةطن / 3م³	2.178	2.335	2.419	2.371	
و رقم الجملة	1	2	3	4	5
ز وزن العينة رطبة + الجملة	150	150	150	150	150
ح وزن العينة جافة + الجملة	146	146	143	141	137
ط وزن الجملة	30	31	31	30	30
اد وزن الناء (ارج.)	4	7	9	9	13
آل وزن العينة جافة (ج-ط)	116	116	110	110	107
م نسبة الرطوبة كـ%	3.4	3.4	8.2	8.2	12.1
ن متوسط نسبة الرطوبة	3.4	6.4	8.2	12.1	2.250
و الكثافة الجافةطن / 3م³	2.105	2.196	2.236	2.114	

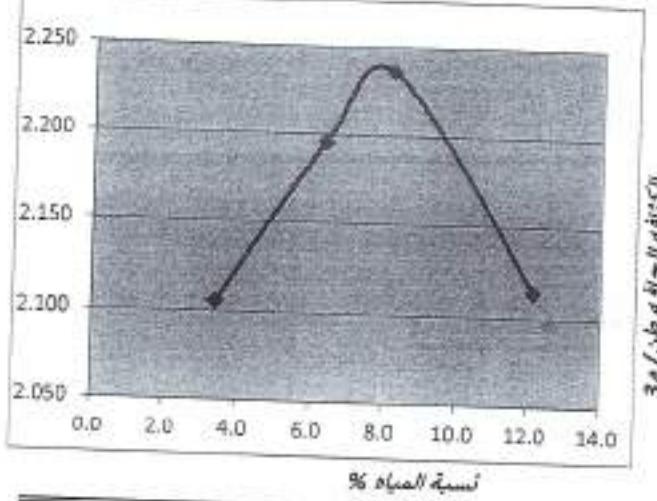

الكتافة الجافةطن / 3م³

2.236

نسبة المياه الملاصقة %

8.2

مهندس الاستشاري



مهندس الشركة






PROJECT :		Sampling Date	29/6/2023
Location st.		Testing Date	3/7/2023
		Lab. Sample No	

California Bearing Ratio " CBR " AASHTO T193-72 &amp; ASTM D698

ارتفاع القباب	٠	١	القراءة الاختالية للميكروميتر
125	2.4	ب	القراءة النهائية للميكروميتر
	1.92	100 <sup>٠</sup> ( ا ) ( ا ) ( ا ) / ارتفاع القباب )	الاختلاف من ارتفاع القباب %

**Testing Results & calculations :-**

penetration (mm)	0.635	1.27	1.905	2.54	3.81	5.08	6.35
load (kg)	530	832	1055	1246	1520	1823	2000
load (kn)	5.198	8.159	10.346	12.219	14.906	17.878	20.000
penetration (inch)	0.025	0.050	0.075	0.100	0.150	0.200	0.250
load (lb)	1168	1834	2325	2746	3350	4018	4408

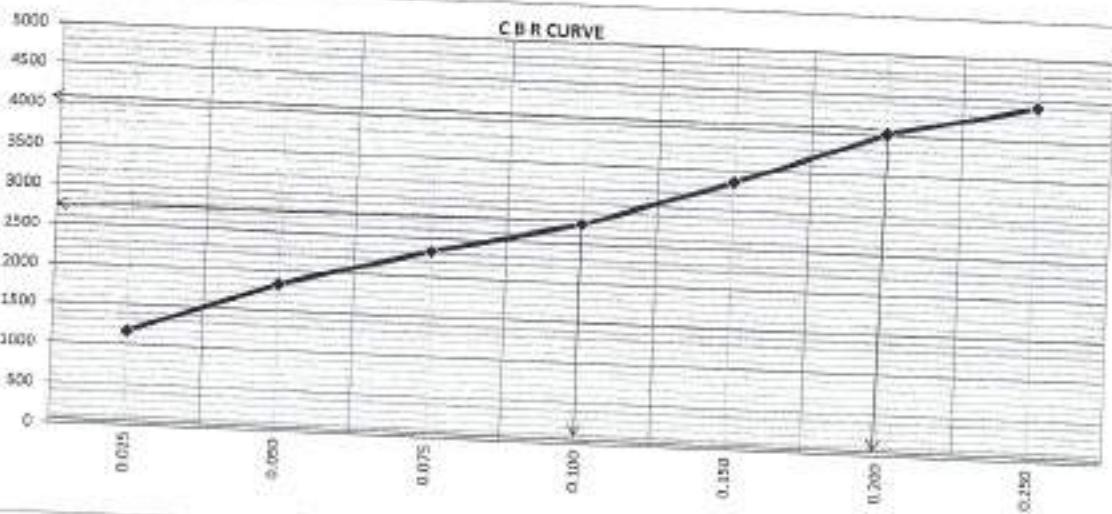

$$\text{CBR Value (0.1 inch)} = 91.5 \%$$

$$\text{CBR Value (0.2 inch)} = 89.3 \%$$

مهندس مواد البناء
مهندس مواد المقاول



**Los Angeles Abrasion - ASTM C131**

**Activity & Sample description:** Base Course

**Sampling date:** 28/06/2023

**Testing date:** 28/06/2023

**Testing Results & Calculations:**

No. of Spheres	8	No. of revolutions	500
Separating sieve	# 12		

Sieves		Sieves		Weight (gm)	
Passing		Retained			
mm	inch	mm	inch		
37.5	1.5"	25	1"		
25	1"	19	3/4"		
19	3/4"	12.5	1/2"		
12.5	1/2"	9.5	3/8"		
9.5	3/8"	6.35	1/4"	2500	
6.35	1/4"	4.75	# 4	2500	
4.75	# 4	2.36	# 8		

Total weight of sample	5000
Weight retained on the separating sieve	3526
Abrasion value %	29.5 ✓

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع الطريق السطحي من السلام إلى المرج  
(القوس الداخلي)



بيان مستخلص رقم (١)

بند رقم (٤) : بالметр المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية للوصول إلى منسوب التأمين الصالح

رقم المستخلص	الكمية (م³)	طول القطاع (م)	المخطه		رقم طلب الفحص و الإسلام	منطقة العمل	الغصر	م
			إلى	من				
1	1,684.74	974.77	0+974.77	0+000.00	182	من كوبرى السلام إلى بنزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	1,239.91	603.51	0+603.51	0+000.00	8	من كوبرى محور الطواريء إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	4,889.76	2,408.90	2+408.90	0+000.00	58-59-78-85- 86-97-102- 128- 145-146-179	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطواريء	Salam SR-02	3
1	703.67	1,832.45	1+832.45	0+000.00	110 - 195 - 203	من نفق محمد نجيب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	—	من كوبرى مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	293.47	2,079.62	2+079.62	0+000.00	126 - 131	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	6
		اجمالي (م³)						
		8,811.55						

استشاري التنفيذ - مكتب سيفتام:  
م/ حمادة مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/ عبدالرحمن الرفاعي



بيان مستخلص رقم (١)

بندرقم (٥) : بالметр المكعب نقل المخلفات أو الأتربة الزائدة

رقم المستخلص	الكمية (م <sup>3</sup> )	طول القطاع (م)	المحطة		رقم طلب الفحص و الاستلام	منطقة العمل	العنصر	م
			إلى	من				
1	1,459.34	974.77	0+974.77	0+000.00	31 - 207 - 208	من كوبرى السلام إلى بنزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	1,293.53	603.51	0+603.51	0+000.00	4	من كوبرى محور الطواريء إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	1,887.45	2,408.90	2+408.90	0+000.00	3 - 2 - 15	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطواريء	Salam SR-02	3
1	0.00	1,832.45	1+832.45	0+000.00	----	من كوبرى مصرف بليبيس ٤ إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	----	من كوبرى مصرف بليبيس ٤ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	0.00	2,079.62	2+079.62	0+000.00	----	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بليبيس ٤	Salam SR-07	6
			المجموع (م <sup>3</sup> )					
			4,640.32					

استشاري التنفيذ - مكتب سبكترام:  
م/عادل الرحمن الرافعى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عادل الرحمن الرافعى



مشروع الطريق السطحي من السلام إلى المرج  
(القوس الداخلي)



بيان مستخلص رقم (١)

بندر رقم (٦) : بالметр المسطح كشط و إزالة المصطبات المنهارة بالرصف الحالى بمسك ٥ سم

رقم المستخلص	الكمية (م٢)	طول القطاع (م)	المخطى		رقم طلب الفحص و الإسلام	منطقة العمل	العنصر	م
			إلى	من				
1	0.00	974.77	0+974.77	0+000.00	—	من كوبرى السلام إلى بنزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	0.00	603.51	0+603.51	0+000.00	—	من كوبرى محور الطواريء إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	0.00	2,408.90	2+408.90	0+000.00	—	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطواريء	Salam SR-02	3
1	0.00	1,832.45	1+832.45	0+000.00	—	من نفق محمد نجيب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	—	من كوبرى مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	0.00	2,079.62	2+079.62	0+000.00	—	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	6
1	780.96	1,384.59	—	—	216	أسفل جميع الكباري و الأنفاق	Under All Tunnels	7
<b>780.96</b>			<b>اجمالي (م٢)</b>					

استشاري التنفيذ - مكتب سيكترام:  
م/عبد الرحمن الرافعي  
م/حسانة مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عبد الرحمن الرافعي



مشروع الطريق السطحي من السلام إلى المرج  
(القوس الداخلي)



بيان مستخلص رقم (١)

بند رقم (٧) : بالметр المكعب تكبير وازالة الميادين المتدهارة بالرصف الحالى

رقم المستخلص	الكمية (م³)	طول القطاع (م)	المخطه		رقم طلب الفحص و الإسلام	منطقة العمل	العنصر	م
			إلى	من				
1	729.63	974.77	0+974.77	0+000.00	38	من كوبرى السلام إلى بзыنة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	0.00	603.51	0+603.51	0+000.00	----	من كوبرى محور الطواريء إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	6.00	2,408.90	2+408.90	0+000.00	----	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطواريء	Salam SR-02	3
1	0.00	1,832.45	1+832.45	0+000.00	----	من نفق محمد نجيب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	----	من كوبرى مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	0.00	2,079.62	2+079.62	0+000.00	----	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	6
<u>729.63</u>		إجمالي (م³)						

استشاري التنفيذ - مكتب سيدراج:  
م/حمادة مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عبد الرحمن الرافعى



مشروع الطريق السطحي من السلام إلى المرج  
(القوس الداخلي)



بيان مستخلص رقم (١)

بندر رقم (٤) : بالметр المكعب أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل

ملاحظات	رقم المستخلص	الكمية (م³)	طول القطاع (م)	المحطة		رقم طلب الشخص و الاستلام	منطقة العمل	العنصر	م
				إلى	من				
	1	850.57	974.77	0+974.77	0+000.00	29-36-183-187	من كوبرى السلام إلى بترزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
	1	1,747.31	603.51	0+603.51	0+000.00	45-46-53-54-76	من كوبرى محور الطواريء إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
	1	4,804.39	2,408.90	2+408.90	0+000.00	7-11-17-19-23-63- 64-66-87-90-115- 147-149-152-185	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطواريء	Salam SR-02	3
	1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	----	من كوبرى مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	4
	1	585.51	1,832.45	1+832.45	0+000.00	110 - 195 - 203	من نفق محمد نجيب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	5
	1	734.41	2,079.62	2+079.62	0+000.00	126 - 131	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	6
		<b>8,722.19</b>			<b>الم (م³)</b>		<b>اجم</b>		

مستشار التنفيذ - مكتب سيفتارام:  
م/عبدالرحمن الرافعي  
م/محمداء مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عبدالرحمن الرافعي



مشروع الطريق السطحي من السلام إلى المرج  
(القوس الداخلي)



بيان مستخلص رقم (١)

بندر رقم (١٥) : بالметр المسطوح أعمال تسوية الأرض الطبيعية لتجهيزها لتوريد الآتية

رقم المستخلص	الكمية (م²)	(عرض (م)	طول القطاع (م)	المخططة		رقم طلب الشخص و الاستلام	منطقة العمل	العنصر	م
				إلى	من				
1	0.00	----	619.39	0+619.39	0+000.00	29 - 183 - 187 - 36	من كوبرى السلام إلى بзыنة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	2,238.36	—	603.51	0+603.51	0+000.00	45 - 46 - 53 - 54 - 76	من كوبرى محور الطواريء إلى كوبرى السلام	Salam SR-41	2
1	6,966.00	—	287.01	0+287.01	0+000.00	7-11-17-19-23-63-64-66-87-90-115-147-149-152-185	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطواريء	Salam SR-42	3
1	114.09	—	1,832.45	1+832.45	0+000.00	110 - 195 - 203	من نفق محمد تجيب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-44	4
1	0.00	—	452.22	0+452.22	0+000.00	—	من كوبرى مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد تجيب	Salam SR-43	5
1	708.54	----	2,079.62	2+079.62	0+000.00	265	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	5
<b>10,026.99</b>		<b>(إجمالي (م²)</b>		<b>إجمالي</b>					

استشاري التنفيذ - مكتب سبکرام:  
م/احمد: مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عبدالرحمن الرافعى



بيان مستخلص رقم (١٦)

بند رقم (١٦) : بالметр المكعب توريد وردم رمال نظيفة خالية من المواد العضوية

رقم المستخلص	الكمية (م³)	طول القطاع (م)	المحطة			منطقة العمل	العنصر	م
			إلى	من				
1	1,516.43	974.77	0+974.77	0+000.00	157-158-159-160-162	من كوبرى السلام إلى بنزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	343.65	603.51	0+603.51	0+000.00	161-169	من كوبرى محور الطوارئ ٤ إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	1,372.80	2,408.90	2+408.90	0+000.00	154-163-165-166-167-168-236-237-238	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطوارئ ٤	Salam SR-02	3
1	147.47	1,832.45	1+832.45	0+000.00	235	من نفق محمد نجيب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	—	من كوبرى مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	154.59	2,079.62	2+079.62	0+000.00	266	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	6
			إجمالي (م³)		3,534.93			

مستشاري التقى - مكتب سبكترام:  
م/حمداء مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عادل حسن الرافعي



بيان مستخلص رقم (١)

بند رقم (١٧) : بالметр المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجلة

رقم المستخلص	الكمية (م <sup>٣</sup> )	طول القطاع (م)	المحطة		رقم طلب الشخص و الاستلام	منطقة العمل	العنصر	م
			إلى	من				
1	2,096.62	974.77	0+974.77	0+000.00	30-32-39-42-186-188-189-192	من كوبرى السلام إلى بنزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	2,031.26	603.51	0+603.51	0+000.00	49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 57	من كوبرى محور الطواريء إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	5,377.54	2,408.90	2+408.90	0+000.00	10-12-13-14-15-21-22-26-27-68-70-71-72-73-77-79-80-88-89-91-92-119-122-148-150-153-155-156-	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطواريء	Salam SR-02	3
1	591.09	1,832.45	1+832.45	0+000.00	111 - 196 - 200 - 204 - 205	من نفق محمد نجيب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	-----	من كوبرى مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	429.29	2,079.62	2+079.62	0+000.00	127 - 143 - 144 - 177	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	5
<b>10,525.79</b>			إلى (م <sup>٣</sup> )		اجم			

استشاري التنفيذ - مكتب سبكترام:  
م/احمداء مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عبدالرحمن الرافعى

بيان مستخلص رقم (١)

بند رقم (٢٠) : بالметр المسطوح أعمال توريد و رش طبقة تثريب من البيتو مينا المسال متوسط التطهير MC30

رقم المستخلص	الكمية (م²)	طول القطاع (م)	المحلط		رقم طلب الفحص و الإسلام	منطقة العمل	العنصر	م
			إلى	من				
1	6,860.16	974.77	0+974.77	0+000.00	132	من كوبرى الصالام إلى بتنينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	6,782.98	603.51	0+603.51	0+000.00	34 - 81	من كوبرى محور الطوارىء إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	16,720.99	2,408.90	2+408.90	0+000.00	18 - 24 - 28 - 82 - 95 - 96	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطوارىء	Salam SR-02	3
1	1,823.74	1,832.45	1+832.45	0+000.00	211	من نفق محمد نجيب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	—	من كوبرى مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	1,324.04	2,079.62	2+079.62	0+000.00	199	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	6
<b>33,511.91</b>				<b>إجمالي (م²)</b>				

استشاري التنفيذ - مكتب سبكرام:  
م/احمد مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عبد الرحمن الراهنى

بيان مستخلص رقم (١)

بندر رقم (٢١) : بالметр المسطوح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتمون السائل متوسط التطابير RC3000

رقم المستخلص	الكمية (م²)	طول القطاع (م)	المخطه		رقم طلب الفحص و الاستلام	منطقة العمل	الفنصر	م
			إلى	من				
1	0.00	974.77	0+974.77	0+000.00	—	من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	0.00	603.51	0+603.51	0+000.00	—	من كوبري محور الطواريء إلى كوبري السلام	Salam SR-01	2
1	0.00	2,408.90	2+408.90	0+000.00	—	من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطواريء	Salam SR-02	3
1	0.00	1,832.45	1+832.45	0+000.00	—	من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	—	من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	0.00	2,079.62	2+079.62	0+000.00	—	من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	6
	780.96	1,384.59	—	—	217	أسفل جميع الكباري و الانفاق	Under All Tunnels	7
	<b>780.96</b>					<b>إجمالي (م²)</b>		

استشاري التنفيذ - مكتب ميكرازم:  
م/محمد مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عبد الرحمن الرافعى



بيان مستخلص رقم (١)

بند رقم (٢٢) : بالметр المسطوح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سماكة ٧ سم

رقم المستخلص	الكمية (م²)	طول القطاع (م)	المخطه		رقم طلب الفحص و الاستلام	منطقة العمل	العنصر	م
			إلى	من				
1	6,860.16	974.77	0+974.77	0+000.00	41 - 133	من كوبرى السلام إلى بترزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	6,782.98	603.51	0+603.51	0+000.00	83	من كوبرى محور الطوارىء إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	16,720.99	2,408.90	2+408.90	0+000.00	20 - 35 - 84 - 135 - 136 - 190	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطوارىء	Salam SR-02	3
1	1,823.74	1,832.45	1+832.45	0+000.00	0+218.00	من نفق محمد تجوب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	—	من كوبرى مصراف بليبيس ٤ إلى نفق محمد تجوب	Salam SR-03	5
1	1,324.04	2,079.62	2+079.62	0+000.00	—	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصراف بليبيس ٤	Salam SR-07	6
	780.96	1,384.59	—	—	223	أسفل جميع الكباري و الأنفاق	Under All Tunnels	7
	<u>34,292.86</u>			(إجمالي (م²))				



بيان مستخلص رقم (١)

بندرقم (٢٥) : بالметр الطولي أصل توريد و صب بردورة من الخرسانة العادي

رقم المستخلص	الكمية (متر)	طول القطاع (م)	المخطه		رقم طلب الفحص و الاستلام	منطقة العمل	العنصر	م
			إلى	من				
1	1,508.52	974.77	0+974.77	0+000.00	43 - 44 - 47 - 48 - 61	من كوبرى السلام الى بنزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	976.65	603.51	0+603.51	0+000.00	60- 142	من كوبرى محور الطواريء الى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	2,468.00	2,408.90	2+408.90	0+000.00	37 - 62 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141	من كوبرى مؤسسة الزكاة الى كوبرى محور الطواريء	Salam SR-02	3
1	471.64	1,832.45	1+832.45	0+000.00	234 - 235		Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	—	من كوبرى مصرف بلبيس ٢ (إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	342.34	2,079.62	2+079.62	0+000.00	0+202.00	من كوبرى المرج الى كوبرى مصرف بلبيس ٢	Salam SR-07	6
						اجمالي (متر)		
						5,767.15		

استشاري التنفيذ - مكتب سيفتام:  
م/حمادة مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عبد الرحمن الرافعى

بيان مستخلص رقم (١)

بيان رقم (٢٦) : بالметр المسطوح توريد و صب خرسانة عادي سماكة ١٠ سم لزوم الأرصفة

رقم المستخلص	الكمية (م²)	طول القطاع (م)	المخطه		رقم طلب الفحص و الإسلام	منطقة العمل	العنصر	م
			إلى	من				
1	3,032.85	974.77	0+974.77	0+000.00	157 - 158 - 159 - 160 - 162	من كوبرى السلام إلى بنزينة Chill Out	SR Asher to Basareyat	1
1	687.29	603.51	0+603.51	0+000.00	161 - 169	من كوبرى محور الطواريء إلى كوبرى السلام	Salam SR-01	2
1	2,745.60	2,408.90	2+408.90	0+000.00	154 - 163 - 165 - 166 - 167 - 168 - 236 - 237 - 238	من كوبرى مؤسسة الزكاة إلى كوبرى محور الطواريء	Salam SR-02	3
1	294.95	1,832.45	1+832.45	0+000.00	235	من نفق محمد نجيب إلى كوبرى مؤسسة الزكاة	Salam SR-04	4
1	0.00	452.22	0+452.22	0+000.00	----	من كوبرى مصرف بليبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب	Salam SR-03	5
1	309.17	2,079.62	2+079.62	0+000.00	280	من كوبرى المرج إلى كوبرى مصرف بليبيس ٢	Salam SR-07	6
<b>7,069.86</b>			<b>إجمالي (م²)</b>					

استشاري التنفيذ - مكتب سبكترام:  
م/عبد الرحمن الرافعى  
م/حمادة مصطفى

شركة السلام إنترناشونال:  
م/عبد الرحمن الرافعى
