

دفتر حصر أعمال للمستخلص الجارى رقم (٥)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مهندس الشركة : الحبيب محمد

اك

مدير الأعمال (الهيئة)

مهندس الهيئة



عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد
ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			جزني	خصم	إجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية							
	مقابله							
١	٠+٠٠ حتى ٤+١١٧ اتجاه القصير					١٤٤٣٧٨,٤٥		
٢	٠+٠٠٠ حتى ٥+٢٤٩ سفاجا					٧٨٢٧٩,٨٢		
	الإجمه					٢٢٢٦٥٨,٢٧		٢٢٢٦٥٨,٢٧
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (٥)							٢٢٠٠٠٠,٠٠

الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط



مهندس التنفيذ /

مهندس /

المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

<u>رقم البند</u>	<u>نوع الأعمال والتوريدات</u>	<u>عدد</u>	<u>مقاسات</u>				
			طول	عرض	ارتفاع	جزني	خصم
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج مهزات						
	ما قبل هـ						٢٩٢١٤,١٤
١	٣+١٠٠ حتى ٣+٣٠٠ اتجاه القصير	طبقة ١				٣٠٠٦,٣٨	
٢	٣+٦٥٠ حتى ٣+٨٠٠ اتجاه القصير	طبقة ٢				٢٧٥٠,٠٠	
٣	١+٣٥٠ حتى ٢+٢٧٥ سفاجا	طبقة ٢				٢٢١٠,٧٣	
	الإجمـــالي حتى ٢٠٢٥/٥/٢٨ م					٧٩٦٧,١١	٣٧١٨١,٢٥
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (٥)						٣٤٠٠٠,٠٠

مهدي / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس / الحبيب علي



عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء
الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور
بطول ٥ كم (ازدواج)

دفتر حصر اعمال

15/10/1975

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس التنفيذ / 
مهندس الاحياء الحيوانية / 

دفتر حصر اعمال

الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس التنفيذ / 

مهندس / 

عملية :- مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة
من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

تنفيذ :- شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

دفتر حصر اعمال

رقم البند	نوع الأعمال والتوريدات	عدد	مقاسات			اجمالي / جزني	خصم	إجمالي
			طول	عادية	تغليف			
١٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء حمايات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم للاكتاف والميول الجانبية							
	ماقبا							
١	سفاجا	١ + ٣٥٠ : ١ + ٧٥٠				٥٣٤٤,٠٠		
	الإجمه الي حتى ٢٠٢٥/٥/٢٨ م							
	إجمالي المستحق صرفه للمستخلص الجاري رقم (٥)							
	٣٥٠٠,٠٠							


الجهة المالكة /

مهندس / محمد حسنين عبد الباسط

مهندس التنفيذ /

مهندس الاحين




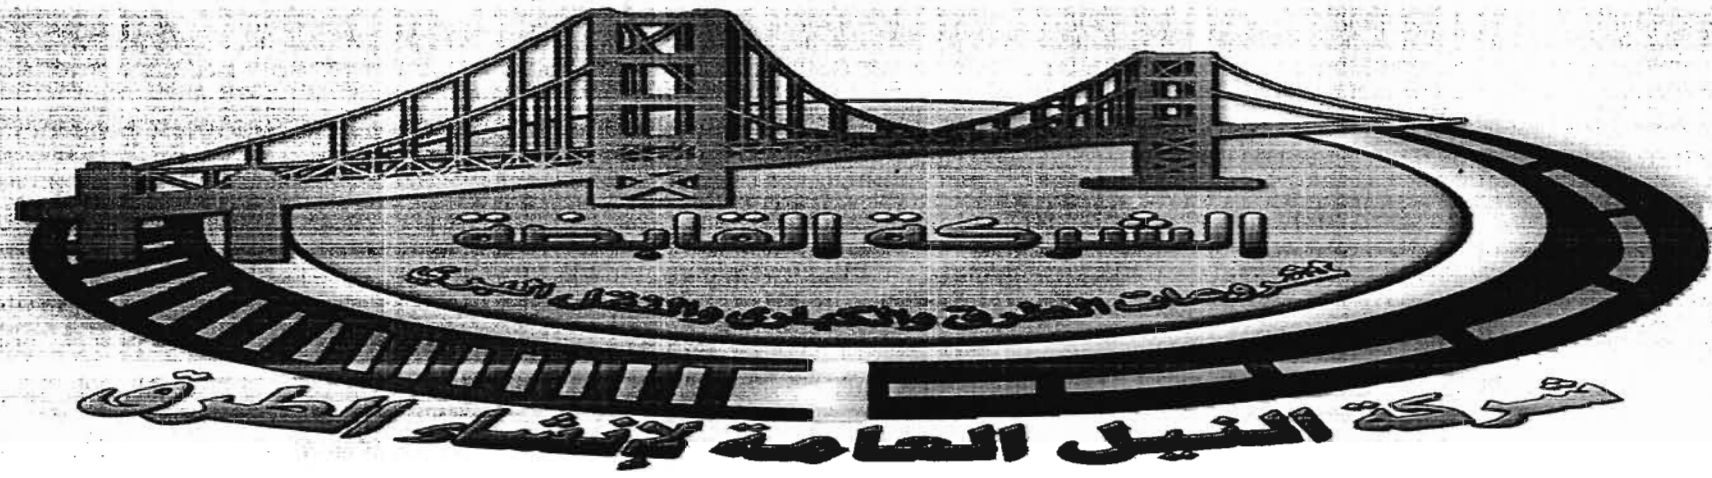

ملخص بالاختبارات المعملية عملية

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٥)

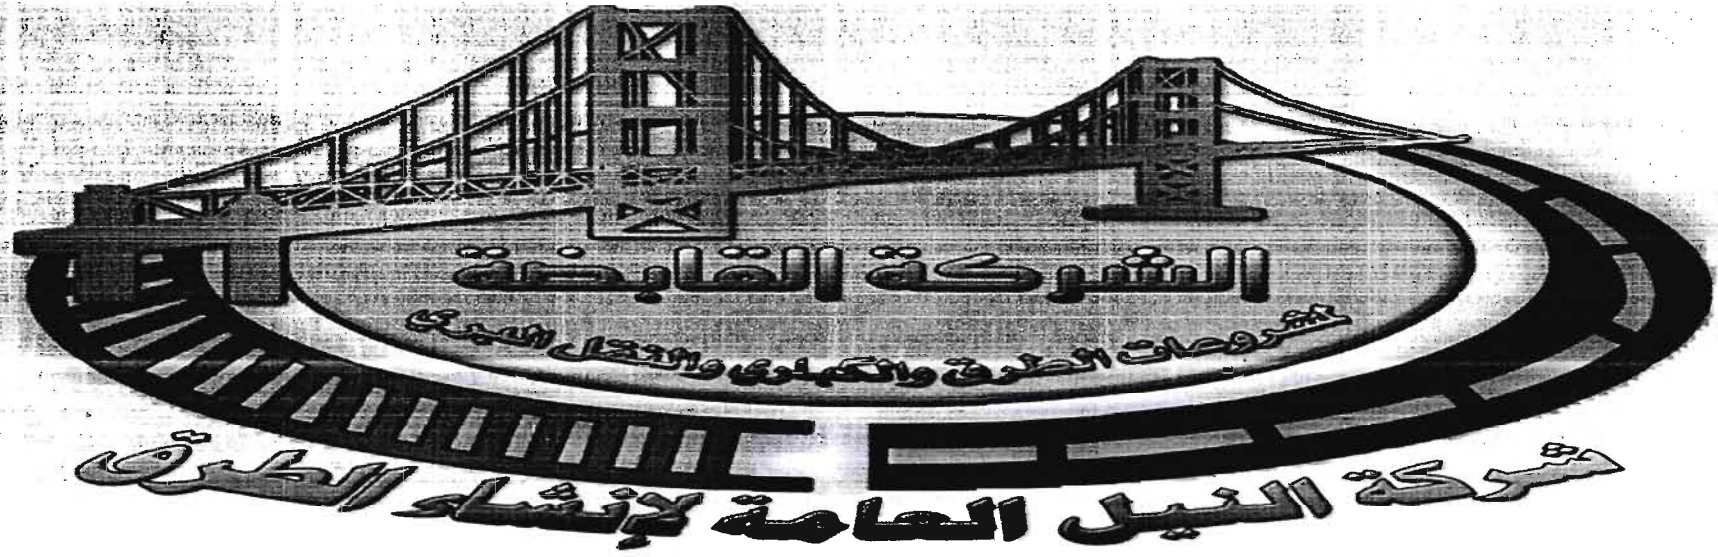

ملخص الاختبارات المعملية (للأتربة)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٥)

بيان متابعة اعمال دمك الاتربة

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج) اتجاه القصير


رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	رقم الطبقة	الموقف من القبول أو الرفض	الاتجاه	ملاحظات
			من	الى					
1	جديد	٢٢ يناير ٢٠٢٤	0	200	200	فرمة	مقبول	القصير	
2	جديد	١٧ يناير ٢٠٢٤	200	400	200	فرمة	مقبول	القصير	
3	جديد	٣٠ يناير ٢٠٢٤	400	600	200	فرمة	مقبول	القصير	
4	جديد	٥ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-3.00	مقبول	القصير	
5	جديد	٦ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-2.75	مقبول	القصير	
6	جديد	٧ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-2.50	مقبول	القصير	
7	جديد	٨ فبراير ٢٠٢٤	650	700	50	-1.75	مقبول	القصير	
8	جديد	٥ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-1.50	مقبول	القصير	
9	جديد	٦ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-1.00	مقبول	القصير	
10	جديد	٧ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-0.75	مقبول	القصير	
11	جديد	٨ مايو ٢٠٢٤	650	700	50	-0.50	مقبول	القصير	
12	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	650	700	50	-0.25	مقبول	القصير	
13	جديد	١٢ يونيو ٢٠٢٤	600	850	250	فرمة	مقبول	القصير	
14	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	1100	1400	300	فرمة	مقبول	القصير	
15	جديد	٦ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-3.50	مقبول	القصير	
16	جديد	٧ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-3.00	مقبول	القصير	
17	جديد	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-2.50	مقبول	القصير	
18	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-2.00	مقبول	القصير	
19	جديد	٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-1.50	مقبول	القصير	
20	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-1.00	مقبول	القصير	
21	جديد	١ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-0.75	مقبول	القصير	
22	جديد	٢ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-0.50	مقبول	القصير	
23	جديد	٣ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	1525	125	-0.25	مقبول	القصير	
24	جديد	٤ أكتوبر ٢٠٢٤	1400	2050	650	فرمة	مقبول	القصير	
25	جديد	١٦ ديسمبر ٢٠٢٣	1650	1975	325	فرمة	مقبول	القصير	
26	جديد	١١ يونيو ٢٠٢٤	2225	2600	375	فرمة	مقبول	القصير	
27	جديد	١٩ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-6.00	مقبول	القصير	
28	جديد	٢٠ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-5.50	مقبول	القصير	
29	جديد	٢١ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-5.00	مقبول	القصير	
30	جديد	٢٢ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-4.50	مقبول	القصير	
31	جديد	٢٣ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-4.00	مقبول	القصير	
32	جديد	٢٤ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-3.50	مقبول	القصير	
33	جديد	٢٥ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-3.00	مقبول	القصير	
34	جديد	٢٦ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-2.50	مقبول	القصير	
35	جديد	٢٧ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-2.00	مقبول	القصير	
36	جديد	٢٨ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-1.50	مقبول	القصير	
37	جديد	٢٩ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-1.00	مقبول	القصير	
38	جديد	٣٠ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-0.75	مقبول	القصير	
39	جديد	٣١ مارس ٢٠٢٥	3150	3450	300	-0.50	مقبول	القصير	
40	جديد	١ أبريل ٢٠٢٥	3150	3450	300	-0.25	مقبول	القصير	

مهندس الاشراف

م/ محمد حسنين

فني مواد الشركة

محمد صلاح




رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	رقم الطبقة	* الموقف من القبول أو الرفض	الاتجاه	ملاحظات
			من	الى					
41	جديد	٥ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-6.00	مقبول	القصير	
42	جديد	٦ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-5.75	مقبول	القصير	
43	جديد	٧ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-5.50	مقبول	القصير	
44	جديد	٨ مايو ٢٠٢٤	3425	3500	75	-5.25	مقبول	القصير	
45	جديد	٩ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-5.00	مقبول	القصير	
46	جديد	١٠ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-4.75	مقبول	القصير	
47	جديد	١١ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-4.50	مقبول	القصير	
48	جديد	١٢ مايو ٢٠٢٤	3450	3575	125	-4.25	مقبول	القصير	
49	جديد	١٣ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-4.00	مقبول	القصير	
50	جديد	١٤ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.75	مقبول	القصير	
51	جديد	١٥ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.50	مقبول	القصير	
52	جديد	١٦ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.25	مقبول	القصير	
53	جديد	١٧ مايو ٢٠٢٤	3450	3625	175	-3.00	مقبول	القصير	
54	جديد	٤ أبريل ٢٠٢٥	3450	3625	175	-2.50	مقبول	القصير	
55	جديد	٥ أبريل ٢٠٢٥	3450	3625	175	-2.00	مقبول	القصير	
56	جديد	٦ أبريل ٢٠٢٥	3450	3625	175	-1.50	مقبول	القصير	
57	جديد	٧ أبريل ٢٠٢٥	3450	3625	175	-1.00	مقبول	القصير	
58	جديد	٨ أبريل ٢٠٢٥	3450	3625	175	-0.75	مقبول	القصير	
59	جديد	٩ أبريل ٢٠٢٥	3450	3625	175	-0.50	مقبول	القصير	
60	جديد	١٠ أبريل ٢٠٢٥	3450	3625	175	-0.25	مقبول	القصير	
61	جديد	١٥ أبريل ٢٠٢٥	3625	3800	175	-3.00	مقبول	القصير	
62	جديد	١٦ أبريل ٢٠٢٥	3625	3800	175	-2.50	مقبول	القصير	
63	جديد	١٧ أبريل ٢٠٢٥	3625	3800	175	-2.00	مقبول	القصير	
64	جديد	١٨ أبريل ٢٠٢٥	3625	3800	175	-1.50	مقبول	القصير	
65	جديد	١٩ أبريل ٢٠٢٥	3625	3800	175	-1.00	مقبول	القصير	
66	جديد	٢٠ أبريل ٢٠٢٥	3625	3800	175	-0.75	مقبول	القصير	
67	جديد	٢١ أبريل ٢٠٢٥	3625	3800	175	-0.50	مقبول	القصير	
68	جديد	٢٢ أبريل ٢٠٢٥	3625	3800	175	-0.25	مقبول	القصير	
69	جديد	٢٥ أبريل ٢٠٢٥	3150	3800	650	فرمة	مقبول	القصير	
70	جديد	١٧ سبتمبر ٢٠٢٤	850	1100	250	فرمة	مقبول	القصير	
71	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	2050	2225	175	فرمة	مقبول	القصير	

مهندس الاشراف
م/ محمد حسنين

فني مواد الشركة

م/ محمد حسنين




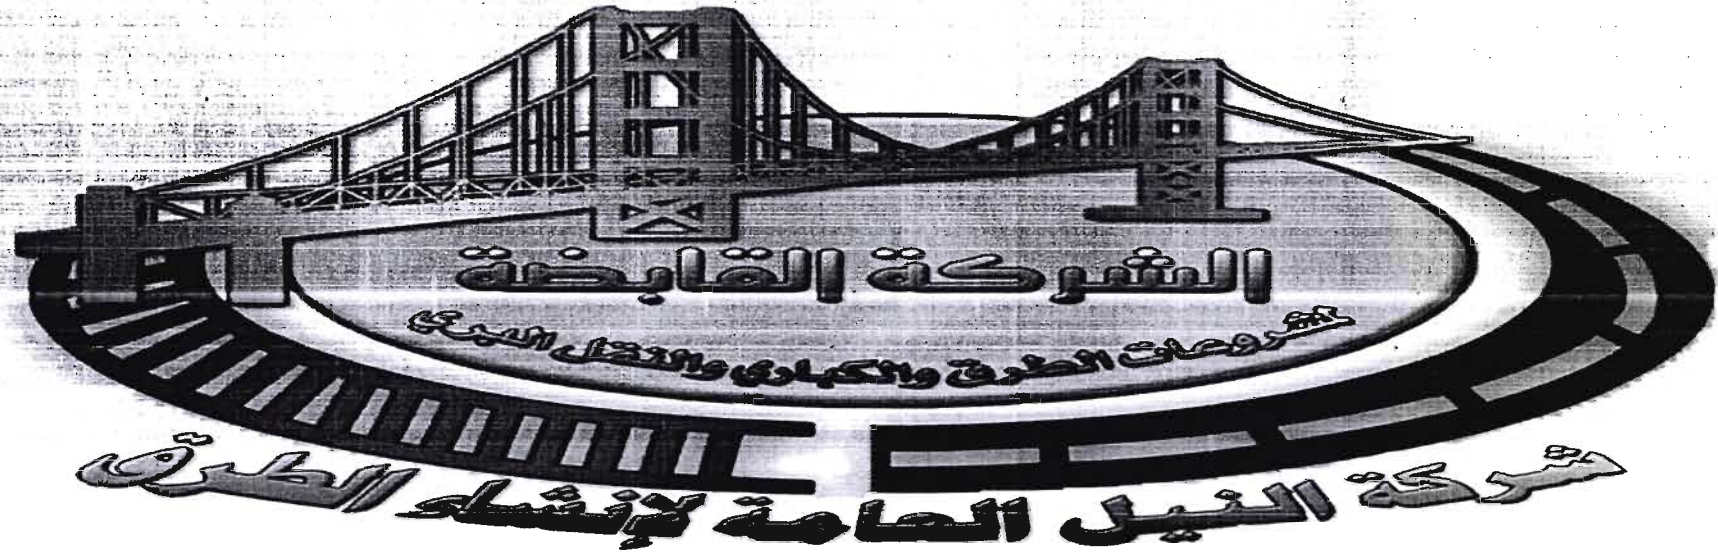

ملخص الاختبارات المعملية (الأساس)

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام
ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى
سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

جارى (٥)



بيان متابعة اعمال دمك طبقة الأساس

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

رقم الطلب	جديد / اعاده	التاريخ	الموقع الكيلو مترى		المسافة	رقم الطبقة	رقم الطبقة	الموقف من القبول أو الرفض
			من	الى				
1	جديد	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	0	600	600	س ١	القصير	مقبول
2	جديد	١١ فبراير ٢٠٢٤	650	900	250	س ١	القصير	مقبول
3	جديد	٢٢ فبراير ٢٠٢٤	900	1300	400	س ١	القصير	مقبول
4	جديد	٢١ يناير ٢٠٢٤	1325	1950	625	س ١	القصير	مقبول
5	جديد	١٠ أبريل ٢٠٢٥	375	625	250	نهائي	القصير	مقبول
6	جديد	٥ سبتمبر ٢٠٢٤	650	900	250	نهائي	القصير	مقبول
7	جديد	٨ سبتمبر ٢٠٢٤	900	1300	400	نهائي	القصير	مقبول
8	جديد	٩ سبتمبر ٢٠٢٤	1325	1950	625	نهائي	القصير	مقبول
9	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	0	900	900	أولى	سفاجا	مقبول
10	جديد	٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤	900	1300	400	أولى	سفاجا	مقبول
11	جديد	٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤	1325	1900	575	أولى	سفاجا	مقبول
12	جديد	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	1900	2300	400	أولى	سفاجا	مقبول
13	جديد	١٨ يناير ٢٠٢٤	2300	2500	200	أولى	سفاجا	مقبول
14	جديد	٢١ يناير ٢٠٢٤	2500	3050	550	أولى	سفاجا	مقبول
15	جديد	١٠ ديسمبر ٢٠٢٤	0	800	800	نهائي	سفاجا	مقبول
16	جديد	١٤ ديسمبر ٢٠٢٤	800	1300	500	نهائي	سفاجا	مقبول
17	جديد	١٨ ديسمبر ٢٠٢٤	2300	2600	300	نهائي	سفاجا	مقبول
18	جديد	٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤	2600	3050	450	نهائي	سفاجا	مقبول
19	ج	١٩ مارس ٢٠٢٥	3150	3800	650	أولى	القصير	مقبول
20	جديد	٢٥ أبريل ٢٠٢٥	3150	3800	650	نهائي	القصير	مقبول


مهندس الهيئة

م / محمد حسائين


فني مواد الشركة

عصلاح



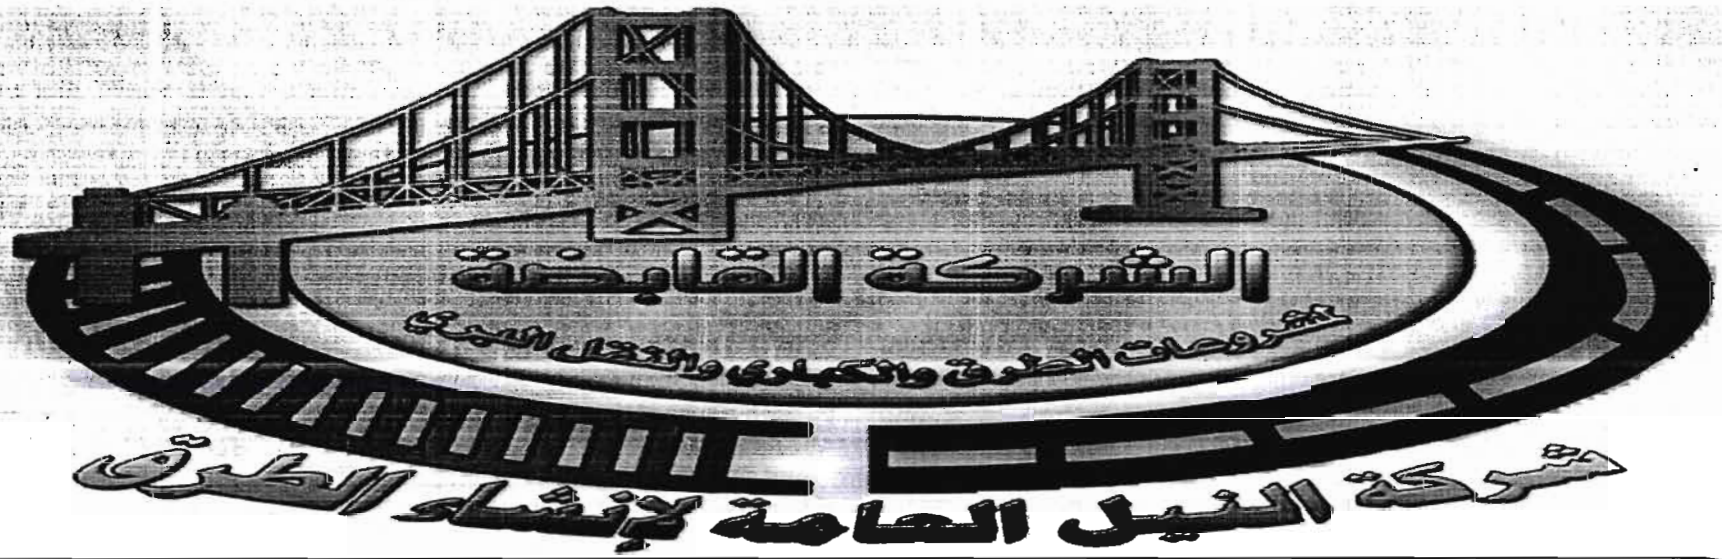

ملخص الاختبارات المعملية (الخرسانة العادية +
الحمايات الجانبية) مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي
سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة
اليحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم
(ازدواج) جارى (٥)



بيان متابعة اعمال صب وتكسير المكعبات الخرسانية

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج) .

الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية



م	الموقع	نوع الصبة	الاتجاه	نوع الخرسانة	العدد	تاريخ الصب	بعد ٧ ايام	بعد ٢٨ يوم	بعد ٧ ايام	المتوسط	بعد ٢٨ يوم	المتوسط
1	0+375	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	10/10/2023	17/10/2023	07/11/2023	167 170 172	170	222 221 225	223
2	0+625	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	11/10/2023	18/10/2023	08/11/2023	173 172 169	171	220 222 225	222
3	1+425	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	13/10/2023	20/10/2023	10/11/2023	171 161 169	167	221 222 224	222
4	2+300	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	24/10/2023	31/10/2023	21/11/2023	168 167 174	170	225 225 222	224
5	0+350	عادية اسفل المواسير	سفاجا	عادية	6	27/10/2023	03/11/2023	24/11/2023	196 209 217	207	222 224 223	223
6	0+925	عادية اسفل المواسير	سفاجا	عادية	6	28/10/2023	04/11/2023	25/11/2023	165 167 163	165	218 222 223	221
7	1+200	عادية اسفل المواسير	سفاجا	عادية	6	28/10/2023	04/11/2023	25/11/2023	168 170 169	169	221 219 222	221
8	1+425	تغليف	القصير	عادية	6	30/11/2023	07/12/2023	28/12/2023	172 177 167	172	222 224 222	223
9	0+375	تغليف	القصير	عادية	6	7/12/2023	14/12/2023	04/01/2024	167 171 168	169	220 221 222	221
10	0+625	تغليف	القصير	عادية	6	18/12/2023	25/12/2023	15/01/2024	167 165 167	166	226 222 224	224
11	1+200	تغليف	سفاجا	عادية	6	20/03/2024	27/03/2024	17/04/2024	185 180 190	185	220 218 222	220
12	0+350	تغليف	سفاجا	عادية	6	21/03/2024	28/03/2024	18/04/2024	192 187 190	190	222 224 223	223
13	0+925	تغليف	سفاجا	عادية	6	29/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	193 179 188	187	220 222 224	222
14	2+300	تغليف	القصير	عادية	6	17/10/2024	24/10/2024	14/11/2024	165 167 163	165	221 226 224	224
15	2+950	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	24/11/2024	01/12/2024	22/12/2024	170 172 171	171	221 219 222	221
16	2+650	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	25/11/2024	02/12/2024	23/12/2024	194 180 189	188	222 220 223	222




مهندس المواد الشركة المنفذة

للمحمد صلاح

مهندس الهيئة

م / محمد حسين



بيان متابعة اعمال صب وتكشير المكعبات الخرسانية

مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول 0 كم (ازدواج) .

الهيئة العامة
للشقق والكباري والنقل للمري
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق للتوسيع



م	الموقع	نوع الصبة	الاتجاه	نوع الخرسانة	العدد	تاريخ الصب	بعد ٧ ايام	بعد ٢٨ يوم	بعد ٧ ايام	المتوسط	بعد ٢٨ يوم	المتوسط
17	3+100	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	26/11/2024	03/12/2024	24/12/2024	187	182	192	187
18	2+050	عادية اسفل المواسير	القصير	عادية	6	28/11/2024	05/12/2024	26/12/2024	166	168	164	166
19	2+950	تغليف	القصير	عادية	6	27/03/2025	03/04/2025	24/04/2025	189	187	187	189
20	2+650	تغليف	القصير	عادية	6	29/04/2025	06/05/2025	27/05/2025	166	164	167	166
21	3+100	تغليف	القصير	عادية	6	12/05/2025	19/05/2025	09/06/2025	172	177	167	172
22	1750:1700	ميول جانبية (حمايات)	سفاجا	عادية	6	20/5/2025	27/05/2025	17/06/2025	177	174	178	177
23	1700:1650	ميول جانبية (حمايات)	سفاجا	عادية	6	22/05/2025	29/05/2025	19/06/2025	174	174	185	174
24	1650:1600	ميول جانبية (حمايات)	سفاجا	عادية	6	24/05/2025	31/05/2025	21/06/2025	190	203	167	190
25	1600:1550	ميول جانبية (حمايات)	سفاجا	عادية	6	26/05/2025	02/06/2025	23/06/2025	180	174	165	180
26	1500:1500	ميول جانبية (حمايات)	سفاجا	عادية	6	28/05/2025	04/06/2025	25/06/2025	175	165	175	175



مهندس الهيئه
م / محمد حسين

مهندس المواد الشركة المنفذة

فلهمد صلاح
