

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال أعمال رصف طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الأول من كم صفر حتى كم ٧ بطول ٧ كم محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية - حياة كريمة - .
عقد رقم ٥٠٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (١) سيارة بإدارة المركبات بالهيئة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



أصروا
عبد
Ahmed

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢ / ٢ / ١٥

محضر استلام موقع

عملية : استكمال أعمال رصف طريق شربين / رأس الخليج
{ القطاع الأول من كم صفر حتى كم ٧ } بطول ٧ كم محافظة الدقهلية
ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة
تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بناءً على العقد رقم ٥٠٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والمحرر بين الهيئة و مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع
مكتب الوليد للمقاولات

• المهندس / أحمد عزت
• المهندس / محمد رضا محمد

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد
عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر لهذا محضر منا بذلك ،،،

التوقيعات

المهندس / محمد رضا محمد

المهندس / أحمد عزت

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



منهجية التنفيذ

لعملية استكمال اعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم- محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة.

إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى

المقدمة

تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب / مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق بخصوص تحديد أسلوب العمل ومنهجية التنفيذ الخاصة لعملية استكمال اعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم- محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة.

الموضوع:

بالمرور والمعاينة للطريق القائم بمعرفة مندوب الهيئة والشركة المنفذة وإستشاريها وجد أن الطريق القائم بعرض أسفلت حوالى (٥,٥ - ٦,٥) متر ويوجد بعض القطاعات بها طبقات أسفلتية متهاكة كما يوجد ترعة الساحل الوسطى بكامل طول القطاع على يمين الطريق وكتل سكنية وأرض زراعية على يسار الطريق مع وجود إنهيارات بجسم الطريق جهة التربة ببعض القطاعات نتيجة لأعمال النحر بجسر التربة. ومن المستهدف الوصول بعرض للطريق الى ٧متر أسفلت و٧,٥م عرض طبقة الأساس.

الخلاصة والرأى الفنى:

نتيجة للمعاينة على الطبيعة فإنه يمكن التوصية باتباع مايلى عند تنفيذ الأعمال بجسم الطريق:

- ١- يتم تنفيذ أعمال الحماية اللازمة بجسر ترعة الساحل الوسطى بقطاعات الطريق المنهاره ووفق تعليمات جهاز الإشراف.
- ٢- يتم إزالة طبقات أسفلت المتبقية من الطريق مع إعادة تشغيل طبقة الأساس القديم بكامل القطاع مع إستكمال القطاع الإنشائى بوضع طبقات الأساس الجديدة بمتوسط سمك ٣٠سم على طبقتين مع الدمك الجيد.
- ٣- يتم حفر ترنشات المرافق حتى الوصول الى طبقة الرمال النظيفة وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف.
- ٤- يتم إستكمال القطاع الإنشائى المستهدف للطريق وفق مقاييسة الأعمال

لوجيك للإستشارات الهندسية




أ.د/ أحمد محمدى عبد الله


سجل المهندسين الاستشاريين

رقم القيد ١٢/١٥٢١ - قيد إستشارى ١/٥٩٥٤



مرفق القطاع العرضى المقترح

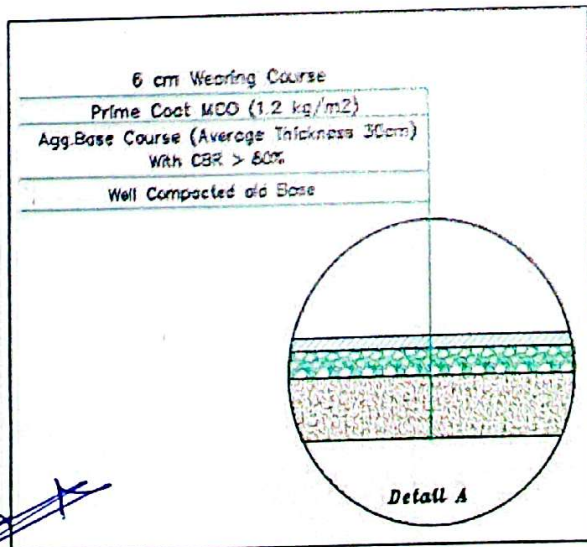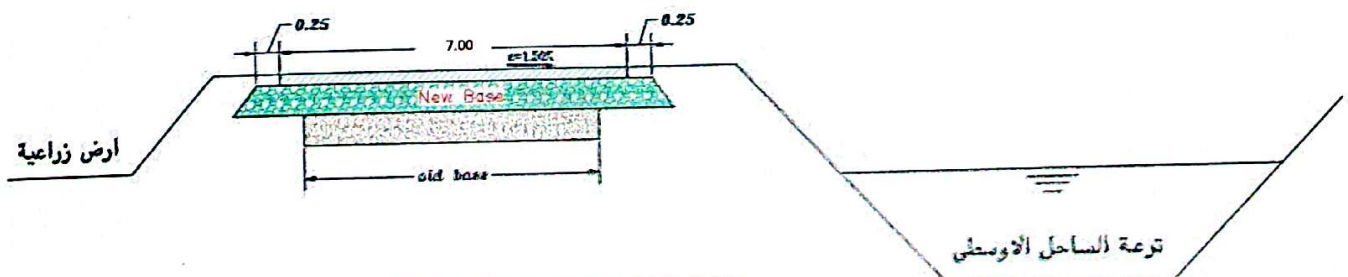



تنفيذ شركة :	الوكيد للمقاولات
--------------	------------------

بيانات إدارية :-

قام باحضار العينات : /١ محمود صالح

بيان العينات :-

عدد (٢) عينة بلاطات اسفلتيه لطبقة السطحيه (٤ج) من مواقع مختلفه .

عدد (٢) عينة مخلوط اسفلتي خلف الفنشر لطبقة السطحية (٤ج) من مواقع مختلفه .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

تحديد الثبات والانسياب للخلطه الاسفلتيه بطريقه مارشال

النتائج :-

العينات تتفق مع حدود السماح للتردد التصميمي بالمعدات ماعدا المشار إليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية . تم مقارنة النتائج بالتردد التصميمي الوارد من كلية الهندسة جامعة بنها بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ بناء على خطاب الشركة المنفذ وموافقة جهاز الاشراف

ملحوظه / العينات مسؤليه من احضرها .

ج / التكاليف

تحریر افی: ۲۰۲۴/۱۱/۲۱

مهندس المعمول / ذمات محمد دسر

مدير المعمل

مهندس ~~محمد صالح~~
منار السيد عبد الله

رئيس الاداره المركزيه
مهندس /
سلوي سامي صالح

الهيئة العامة
للسجلات والمعلومات
بوزارة الداخلية
مصر

قسم السجلات المدنية
١٩٥٦



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج - مركز شربين (حياة كريمه)
تفصيل شركه : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠٢٤

بيانات اداريه :- قام بالصب العينات : م / محمد السماحي بتاريخ : ٢٠٢٤/٨/١١

بيان العينات :- عدد (٢٤) مكعب خرسانه لزوم اعمال صب خرسانة الحائط الساند والتفاصيل بالجدول المبين :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ & ٧ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (كجم)	الابعاد (سم)	الكثافه (كجم/م ^٣)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة من الحائط الساند من ك : ١٤,٠٢٥ ١٤,٠٧٥	٢٠٢٤/٠٨/٠٥	١	٨٠٨٦	١٥*١٥*١٥	٢,٣٩٦	٢٧٠	٢٤٤	٢٠٢٤/٠٨/١٢	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨٠٩٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٢٣٢			
		٣	٨١٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٢٢٩			
		٤	٨١٣١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٩	٢٥٨	٢٥٧	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨١٢٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٨	٢٥٦			
		٦	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٥٩			
خرسانة من الحائط الساند من ك : ١٤,٠٢٥ ١٤,٠٧٥	٢٠٢٤/٠٨/٠٦	١	٨١١١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٣	٢٣٢	٢٣٣	٢٠٢٤/٠٨/١٣	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨٠٨٧	١٥*١٥*١٥	٢,٣٩٦	٢٣٢			
		٣	٨١٠٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٣	٢٣٦			
		٤	٨١١٧	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٥	٢٥٧	٢٦٠	٢٠٢٤/٠٩/٠٣	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨١٢٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٧	٢٥٩			
		٦	٨١٢٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٩	٢٦٤			
خرسانة من الحائط الساند من ك : ١٤,٠٢٥ ١٤,٠٧٥	٢٠٢٤/٠٨/٠٧	١	٨١٢٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٣٧	٢٣٣	٢٠٢٤/٠٨/١٤	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٣٢			
		٣	٨١١٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٣٠			
		٤	٨١٢٥	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٧	٢٥٧	٢٥٥	٢٠٢٤/٠٩/٠٤	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨١٢٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٧	٢٥٥			
		٦	٨١١٤	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٥٤			
خرسانة من الحائط الساند من ك : ١٤,٠٢٥ ١٤,٠٧٥	٢٠٢٤/٠٨/٠٨	١	٨١٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٢٣٣	٢٣٣	٢٠٢٤/٠٨/١٥	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨١١٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٣٤			
		٣	٨١١٨	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٥	١٣٢			
		٤	٨١٢٥	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٧	٢٦٠	٢٦٤	٢٠٢٤/٠٩/٠٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨٠٩٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٢٧٣			
		٦	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٦٠			

يتم الرجوع الي ملف العملية لمقارنة النتائج .

مواصفات

تابع تقرير رقم (٣٣١) لسنة ٢٠٢٤

ملحوظة / العينات مسؤوليه من احضرها .

قام بالكسر : / / سعيد طه .

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
صب و كسر مخب خرسانه	٢٤	١٦٧	٤٠٠٨
م. اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٤١٥٨
م. ١٥ %			٦٢٣,٧٠
ض. م. ١٠ %			٦٦٩,٤٥
الاجمالي			٥٤٥١,١٥

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٩/٠٨

مهندس المعمل / *فراخ محمد*


رئيس الاداره المركزيه
مهندس /

سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / *محمد*

منار السيد عبد الله





الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج - مركز شربين (حياة كريمة)
تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٢١٦) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/٨/٨

قام بالصب العينات : م / محمد السماحي

بيانات إدارية :-

عدد (٣٦) مكعب خرسانه لزوم اعمال صب خرسانة الحائط الساند والتفاصيل بالجدول المبين :-

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ & ٧ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (كجم)	الابعاد (سم)	الكثافه (كجم/سم ^٣)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة من الحائط الساند من ك : ١٤,٧٣٠ ١٤,٨٢٠	٢٠٢٤/٧/٢٩	١	٨١٢٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٧	٢٢٨	٢٢٧	٢٠٢٤/٠٨/٠٨	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٢٥			
		٣	٨١٣٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٩	٢٢٩			
		٤	٨١٢١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٥٦	٢٥٦	٢٠٢٤/٠٨/٢٦	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨١٣٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤١٠	٢٥٨			
		٦	٨١٣٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤١١	٢٥٤			
خرسانة من الحائط الساند من ك : ١٤,٧٣٠ ١٤,٨٢٠	٢٠٢٤/٧/٣٠	١	٨١٣٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٩	٢٢٧	٢٣٠	٢٠٢٤/٠٨/٠٨	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨١١٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٣	٢٣١			
		٣	٨١٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٢٣٢			
		٤	٨١١٢	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٥٥	٢٥٧	٢٠٢٤/٠٨/٢٧	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨١٢٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٧	٢٥٩			
		٦	٨١٢٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٨	٢٥٧			
خرسانة من الحائط الساند من ك : ١٤,٧٣٠ ١٤,٨٢٠	٢٠٢٤/٧/٣١	١	٨١١٤	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٣٠	٢٣٠	٢٠٢٤/٠٨/٠٨	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨١٢١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٢٧			
		٣	٨١١٨	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٥	٢٣٣			
		٤	٨١٢١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٥٧	٢٦٠	٢٠٢٤/٠٨/٢٨	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨١٢٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٩	٢٦١			
		٦	٨١٣٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٩	٢٦٢			
خرسانة من الحائط الساند من ك : ١٣,٢٠٠ ١٣,٢٢٠	٢٠٢٤/٠٨/٠١	١	٨١١٧	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٥	٢٢٨	٢٢٩	٢٠٢٤/٠٨/٠٨	جهد الكسر بعد ٧ ايام
		٢	٨١٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٢٢٩			
		٣	٨١١٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٣٠			
		٤	٨١١٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٥	٢٥٧	٢٥٧	٢٠٢٤/٠٨/٢٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨١١٤	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٥٤			
		٦	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٦١			

يتم الرجوع الي ملف العملية لمقارنة النتائج .

٢

ملحق تقرير رقم (٣٢٣) لسنة ٢٠٢٤

جهد الكسر بعد ٧ أيام	٢٠٢٤/٠٨/١١	٢٣٣	٢٣٢	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٢	١	٢٠٢٤/٠٨/٠٣	خرسانة من الحائط المساند من ك : ١٣,٢٠٠ ١٣,٢٢٠
			٢٣٣	٢,٤٠٥	١٥*١٥*١٥	٨١١٦	٢		
			٢٣٥	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١١٩	٣		
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٦٧	٢٥٥	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٥	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠٤	خرسانة من الحائط المساند من ك : ١٣,٢٠٠ ١٣,٢٢٠
			٢٥٩	٢,٤٠٤	١٥*١٥*١٥	٨١١٣	٥		
			٢٨٧	٢,٤٠٥	١٥*١٥*١٥	٨١١٦	٦		
جهد الكسر بعد ٧ أيام	٢٠٢٤/٠٨/١١	٢٣٥	٢٣٤	٢,٤٠٧	١٥*١٥*١٥	٨١٢٤	١	٢٠٢٤/٠٨/٠٤	خرسانة من الحائط المساند من ك : ١٣,٢٠٠ ١٣,٢٢٠
			٢٣٧	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١١٩	٢		
			٢٣٤	٢,٤٠٥	١٥*١٥*١٥	٨١١٧	٣		
جهد الكسر بعد ١٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٢٠٢٤/٠٩/٠١	٢٥٨	٢٥٧	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١٢١	٤	٢٠٢٤/٠٨/٠٤	خرسانة من الحائط المساند من ك : ١٣,٢٠٠ ١٣,٢٢٠
			٢٥٦	٢,٤٠٦	١٥*١٥*١٥	٨١١٩	٥		
			٢٦٠	٢,٤٠٧	١٥*١٥*١٥	٨١٢٣	٦		

يتم الرجوع الي ملف العملية لمقارنة النتائج .

ملحوظة / العينات مسؤوليه من احضرها .

قام بالكسر : ا/ سعيد طه .

ج/ التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
٦٠١٢	١٦٧	٣٦	صب و كسر مكعب خرسانة
١٥٠			م. اعداد تقرير
٦١٦٢			قيمة التجارب
٩٢٤,٣٠			م. ١٥%
٩٩٢,١			ض. م. ١٠%
٨٠٧٨,٤			الاجمالي

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٩/٠١

مهندس المعمل /


رئيس الاداره الجركزيه
مهندس /

سلاوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

منار السيد عبد الله



من ٢/٢



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع: رفع كفاءة طريق شربين / راس الخليج - مركز شربين (حيطة كريمة)
تأليف شركة: الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣١٥) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ: ٢٠٢٤/٨/١

قام بالصب العينات: م/ محمد السماحي

بيانات إدارية:-

عدد (٣٠) مكعب خرسانه لزوم أعمال صب الحائط الساند والتفاصيل بالجدول المبين :-

الاختبارات التي أجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨&٧ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (كجم)	الابعاد (سم)	الكثافة (كجم/م ^٣)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة لزوم القواعد ك ١٤,٤٨٠	٢٠٢٤/٧/٢٧	١	٨١٢٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٣٩	٢٣٥	٢٠٢٤/٠٨/٠٤	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٢	٨٠٩٧	١٥*١٥*١٥	٢,٣٩٩	٢٣٤			
		٣	٨١١٢	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٣٣			
		٤	٨١١٨	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٥	٢٥٥	٢٥٨	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨١٢١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٥٨			
		٦	٨١٢٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٨	٢٦١			
خرسانة لزوم القصيات ك ١٤,٤٨٠	٢٠٢٤/٧/٢٨	١	٨١١٢	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٢٤	٢٣٤	٢٠٢٤/٠٨/٠٤	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٢	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٢٩			
		٣	٨١١٥	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢١٩			
		٤	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٣٧			
		٥	٨١٢٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٣٨			
		٦	٨١٢٢	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٧	٢٤٢			
		٧	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٧٤	٢٦٤	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٨	٨١٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٢٦١			
		٩	٨١١٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٣	٣٠٢			
		١٠	٨١١٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٦٧			
		١١	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٥٧			
		١٢	٨١٢٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٧	٢٦٠			
خرسانة لزوم القواعد ك ١٤,٧٣٠	٢٠٢٤/٧/٢٧	١	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٣٣	٢٣٤	٢٠٢٤/٠٨/٠٤	جهد الكسر بعد ٧ أيام
		٢	٨١٠٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٠	٢٣٣			
		٣	٨١١٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٣	٢٣٧			
		٤	٨١١٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٤	٢٧٤	٢٦٤	٢٠٢٤/٠٨/٢٥	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢
		٥	٨١١٩	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٦	٢٥٨			
		٦	٨١٢٣	١٥*١٥*١٥	٢,٤٠٧	٢٥٩			

يتم الرجوع الي ملف العمليه لمقارنة النتائج .

تقرير المراجعة (٢٠١٨) - ١١١١

١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١	١١١١

المراجعة العامة
١١,٧٣٠

بموجب المراجعة العامة للمراجعة العامة

المراجعة العامة للمراجعة العامة
قام بالمراجعة: /

المراجعة العامة

المراجعة العامة	المراجعة العامة	المراجعة العامة	المراجعة العامة
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١
١١١١	١١١١	١١١١	١١١١

١١١١/١١/١١


المراجعة العامة

المراجعة العامة للمراجعة العامة

المراجعة العامة للمراجعة العامة

المراجعة العامة للمراجعة العامة

المراجعة العامة للمراجعة العامة




١١١١

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي انكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .


حصر كميات ما تم تنفيذه من أعمال (جاري ١)

رقم	البند	الوحده	كمية المقايسة	الكمية الاجمالية المنفذه
1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ... الخ	م٣	2000	3738
2	أعمال توريد وتشغيل أتربة (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ... الخ	م٣	1050	885
3	أعمال توريد وفرش طبقة أساس ... الخ	م٣	10000	10634
4	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) ... الخ	م٢	28000	13955
5	أعمال أعمال انشاء طبقة سطحه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم ... الخ	م٢	28000	13955
6	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) ... الخ	طن	2	4
7	أعمال توريد وصب حوائط سنده من الخرسانة العادية ... الخ	م٣	900	1746

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا).

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عشية / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) .

تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة .

اجمالي أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية

البند	الاعمال	الوحده	الاجمالي
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ... الخ	ضرنش الغاز	م ³	826.89
	FROM ST. 0+025 TO 2+900		
	ضرنش الصرف		1185.13
	FROM ST. 0+025 TO 2+900		
	أعمال التوسعة		1726.5
	FROM ST. 0+025 TO 2+900		
الاجمالي نعام			3738.52


مهندس الهيئة
م. أحمد


مهندس الشركة
م. أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الى الكم ٧٠٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش الغاز)

ST.	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
0+025	12.5	0.95	0.29	3.44
0+050	25	1	0.31	7.75
0+075	25	1.05	0.30	7.88
0+100	25	1.05	0.30	7.88
0+125	25	1	0.29	7.25
0+150	25	0.95	0.31	7.36
0+175	25	0.9	0.30	6.75
0+200	25	0.9	0.25	5.63
0+225	25	1.05	0.25	6.56
0+250	25	1.05	0.25	6.56
0+275	25	1	0.25	6.25
0+300	25	1	0.30	7.50
0+325	25	1.05	0.25	6.56
0+350	25	0.95	0.30	7.13
0+375	25	1.05	0.30	7.88
0+400	25	1.05	0.30	7.88
0+425	25	1.05	0.30	7.88
0+450	25	1.05	0.30	7.88
0+475	25	1.05	0.30	7.88
0+500	25	0.95	0.30	7.13
0+525	25	0.95	0.31	7.36
0+550	25	0.95	0.31	7.36
0+575	25	0.95	0.30	7.13
0+600	25	1	0.30	7.50
0+625	25	1.05	0.29	7.61
0+650	25	1.05	0.29	7.61
0+675	25	1.05	0.30	7.88
0+700	25	1.05	0.25	6.56
0+725	25	1.05	0.30	7.88
0+750	25	1.05	0.25	6.56

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن الميمنة الرئيسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الى الكم ٧٠٠٠٠) .
 تنفيذ / مغلب الواليد للمقاولات العامة .

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرئش الغاز)

ST.	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
1+525	25	1.05	0.30	7.88
1+550	25	0.95	0.30	7.13
1+575	25	1.05	0.30	7.88
1+600	25	1.05	0.30	7.88
1+625	25	1.05	0.30	7.88
1+650	25	1.05	0.25	6.56
1+675	25	0.95	0.30	7.13
1+700	25	1.05	0.30	7.88
1+725	25	1.05	0.30	7.88
1+750	25	1.05	0.30	7.88
1+775	25	1.05	0.25	6.56
1+800	25	0.95	0.25	5.94
1+825	25	0.9	0.25	5.63
1+850	25	1.05	0.30	7.88
1+875	25	1.05	0.30	7.88
1+900	25	0.95	0.30	7.13
1+925	25	1.05	0.25	6.56
1+950	25	0.9	0.25	5.63
1+975	25	1.05	0.30	7.88
2+000	25	1.05	0.30	7.88
2+025	25	0.95	0.30	7.13
2+050	25	0.9	0.35	7.88
2+075	25	0.95	0.30	7.13
2+100	25	1.05	0.25	6.56
2+125	25	1.05	0.30	7.88
2+150	25	1.05	0.30	7.88
2+175	25	0.95	0.30	7.13
2+200	25	1.05	0.30	7.88
2+225	25	1.05	0.30	7.88
2+250	25	1.05	0.30	7.88

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) -
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه قريه " (مركز شربين) - محافظة القليوبية .
 عسلة / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الي الكم ١٠٠٠٠٠) -
 تنفيذ / مكتب الوليد للمطاولات العامة .

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طررش الغاز)

ST.	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
2+275	25	1.05	0.30	7.88
2+300	25	1.05	0.30	7.88
2+325	25	1.05	0.30	7.88
2+350	25	1.05	0.30	7.88
2+375	25	1	0.30	7.50
2+400	25	0.95	0.30	7.13
2+425	25	0.9	0.30	6.75
2+450	25	0.9	0.30	6.75
2+475	25	0.9	0.25	5.63
2+500	25	0.9	0.25	5.63
2+525	25	0.95	0.25	5.94
2+550	25	0.95	0.30	7.13
2+575	25	0.95	0.30	7.13
2+600	25	0.95	0.30	7.13
2+625	25	1.05	0.25	6.56
2+650	25	1.05	0.25	6.56
2+675	25	1.05	0.30	7.88
2+700	25	1	0.30	7.50
2+725	25	1	0.30	7.50
2+750	25	0.9	0.25	5.63
2+775	25	0.9	0.30	6.75
2+800	25	0.85	0.30	6.38
2+825	25	0.95	0.30	7.13
2+850	25	0.95	0.30	7.13
2+875	25	0.9	0.30	6.75
2+900	12.5	0.95	0.30	3.56
الاجمالي				826.89

مهندس الشركة

مهندس الشركة

٣١٤٥٦٧٨٩

الهيئة العامة للتقني والتجاري (الوزارة المركزية) - محافظة مرقى الشفا .
 حفر و حفر التفتق ضمن الصيانة الترميمية " جود كروية " (مركز مرقى) - محافظة الشفا .
 حفر و حفر مرقى مرقى - راس الخلوخ (الصناعات الأولى من الترميم ١٩٠٠٠ الى الترميم ١٩٠٠٠) .
 حفر و حفر التفتق و حفر التفتق .

أشغال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية (حفر و حفر)

ST.	المتوسط	العرض	السمك	الإجمالي
0+575	12.5	1.2	0.28	4.20
0+580	75	1.35	0.30	10.13
0+585	75	1.3	0.31	10.08
0+590	75	1.3	0.29	9.43
0+595	25	1.45	0.27	9.79
0+600	25	1.4	0.30	10.50
0+605	25	1.4	0.28	9.80
0+610	25	1.2	0.26	7.80
0+615	25	1.35	0.31	10.46
0+620	25	1.4	0.30	10.50
0+625	25	1.45	0.30	10.88
0+630	25	1.45	0.32	11.60
0+635	25	1.4	0.33	11.55
0+640	25	1.4	0.30	10.50
0+645	25	1.5	0.30	11.25
0+650	25	1.5	0.29	10.88
0+655	25	1.5	0.28	10.50
0+660	25	1.4	0.29	10.15
0+665	25	1.3	0.27	8.78
0+670	25	1.3	0.30	9.75
0+675	25	1.2	0.29	8.70
0+680	25	1.2	0.30	9.00
0+685	25	1.2	0.29	8.70
0+690	25	1.2	0.28	8.40
0+695	25	1.3	0.28	9.10
0+700	25	1.3	0.26	8.45
0+705	25	1.35	0.30	10.13
0+710	25	1.4	0.30	10.50
0+715	25	1.4	0.31	10.85
0+720	25	1.35	0.30	10.13

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٢٠١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
 مشروعات الطرق ضمن الميكنة الرئيسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية ،
 عملية / وصف طريق شربين - رأس الخنيج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠ إلى الكم ٧٠٠٠) ،
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرئش الصرف)

ST.	الطول	العرض	السماك	الاجمالي
0+775	25	1.3	0.32	10.40
0+800	25	1.4	0.30	10.50
0+825	25	1.35	0.30	10.13
0+850	25	1.4	0.29	10.15
0+875	25	1.5	0.30	11.25
0+900	25	1.5	0.27	10.13
0+925	25	1.45	0.30	10.88
0+950	25	1.4	0.30	10.50
0+975	25	1.5	0.27	10.13
1+000	25	1.45	0.30	10.88
1+025	25	1.35	0.30	10.13
1+050	25	1.4	0.30	10.50
1+075	25	1.35	0.29	9.79
1+100	25	1.45	0.33	11.96
1+125	25	1.5	0.31	11.63
1+150	25	1.5	0.33	12.38
1+175	25	1.45	0.32	11.60
1+200	25	1.45	0.30	10.88
1+225	25	1.5	0.30	11.25
1+250	25	1.35	0.29	9.79
1+275	25	1.3	0.28	9.10
1+300	25	1.4	0.31	10.85
1+325	25	1.35	0.31	10.46
1+350	25	1.4	0.32	11.20
1+375	25	1.5	0.32	12.00
1+400	25	1.5	0.29	10.88
1+425	25	1.45	0.31	11.24
1+450	25	1.4	0.29	10.15
1+475	25	1.5	0.28	10.50
1+500	25	1.45	0.28	10.15

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٢٠١٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
مشاريع الطرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (مركز شربين) - محافظة الدقهلية ،
عملية / رصف طريق شربين - رأس الخايج (القطاع الأول من الكم 1111 إلى الكم 1112) ،
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ،

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (ملزق الحرف)

ST.	الطول	العرض	السمك	الأجمالي
1+525	25	1.35	0.27	9.11
1+550	25	1.4	0.30	10.50
1+575	25	1.4	0.30	10.50
1+600	25	1.5	0.29	10.88
1+625	25	1.5	0.30	11.25
1+650	25	1.45	0.29	10.51
1+675	25	1.35	0.31	10.46
1+700	25	1.2	0.30	9.00
1+725	25	1.4	0.30	10.50
1+750	25	1.35	0.29	9.79
1+775	25	1.3	0.31	10.08
1+800	25	1.4	0.30	10.50
1+825	25	1.45	0.25	9.06
1+850	25	1.5	0.25	9.38
1+875	25	1.45	0.25	9.06
1+900	25	1.5	0.25	9.38
1+925	25	1.45	0.30	10.88
1+950	25	1.4	0.25	8.75
1+975	25	1.5	0.31	11.63
2+000	25	1.5	0.30	11.25
2+025	25	1.5	0.30	11.25
2+050	25	1.45	0.33	11.96
2+075	25	1.4	0.30	10.50
2+100	25	1.35	0.25	8.44
2+125	25	1.35	0.30	10.13
2+150	25	1.4	0.30	10.50
2+175	25	1.5	0.30	11.25
2+200	25	1.5	0.31	11.63
2+225	25	1.45	0.30	10.88
2+250	25	1.4	0.30	10.50

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الى الكم ٧٠٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (طرنش الصرف)

ST.	الطول	العرض	السماك	الاجمالي
2+275	25	1.45	0.29	10.51
2+300	25	1.5	0.29	10.88
2+325	25	1.5	0.32	12.00
2+350	25	1.5	0.30	11.25
2+375	25	1.45	0.30	10.88
2+400	25	1.45	0.30	10.88
2+425	25	1.5	0.30	11.25
2+450	25	1.5	0.30	11.25
2+475	25	1.5	0.25	9.38
2+500	25	1.45	0.25	9.06
2+525	25	1.35	0.25	8.44
2+550	25	1.45	0.30	10.88
2+575	25	1.3	0.25	8.13
2+600	25	1.45	0.30	10.88
2+625	25	1.5	0.25	9.38
2+650	25	1.45	0.30	10.88
2+675	25	1.5	0.30	11.25
2+700	25	1.5	0.25	9.38
2+725	25	1.45	0.25	9.06
2+750	25	1.5	0.31	11.63
2+775	25	1.5	0.25	9.38
2+800	25	1.45	0.30	10.88
2+825	25	1.45	0.25	9.06
2+850	25	1.4	0.30	10.50
2+875	25	1.35	0.30	10.13
2+900	12.5	1.35	0.28	4.73
الاجمالي				1185.13

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمصلحة طرق الدلتا) ،
مشروع حلت الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
عمالية / رصف طريق شربين - راس الخايج (القطاع الأول من الكم ١٠٠٠٠ الى الكم ٧٠٠٠٠) .
تلفيد / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (لأعمال التوسعة)

ST.	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
0+025	12.5	3	0.20	7.50
0+050	25	3.1	0.20	15.50
0+075	25	3.05	0.20	15.25
0+100	25	3	0.20	15.00
0+125	25	2.9	0.20	14.50
0+150	25	2.95	0.20	14.75
0+175	25	3.1	0.20	15.50
0+200	25	3.05	0.20	15.25
0+225	25	3.1	0.20	15.50
0+250	25	3.15	0.20	15.75
0+275	25	2.9	0.20	14.50
0+300	25	2.95	0.20	14.75
0+325	25	3	0.20	15.00
0+350	25	3.1	0.20	15.50
0+375	25	3.15	0.20	15.75
0+400	25	3	0.20	15.00
0+425	25	3.05	0.20	15.25
0+450	25	3	0.20	15.00
0+475	25	3	0.20	15.00
0+500	25	3	0.20	15.00
0+525	25	3.1	0.20	15.50
0+550	25	3.1	0.20	15.50
0+575	25	2.9	0.20	14.50
0+600	25	2.9	0.20	14.50
0+625	25	2.9	0.20	14.50
0+650	25	3	0.20	15.00
0+675	25	3	0.20	15.00
0+700	25	3	0.20	15.00
0+725	25	3	0.20	15.00
0+750	25	3	0.20	15.00

مهندس الشركة

مهندس الشركة

هيئة عامة للطرق والكباري (الكثافة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) -
 مشروع طرقات ضمن السيطرة القومية * حيد غربية * (مركز شربين) - محافظة الغربية -
 صنية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم +++++ إلى الكم +++++) -
 تنفيذ / مكتب الدراسات المتكاملات العامة -

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (لأعمال التوسعة)

ST.	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
2+275	25	2.9	0.20	14.50
2+300	25	2.9	0.20	14.50
2+325	25	3	0.20	15.00
2+350	25	3	0.20	15.00
2+375	25	3	0.20	15.00
2+400	25	3.1	0.20	15.50
2+425	25	3	0.20	15.00
2+450	25	3	0.20	15.00
2+475	25	3	0.20	15.00
2+500	25	3	0.20	15.00
2+525	25	3	0.20	15.00
2+550	25	3	0.20	15.00
2+575	25	3.1	0.20	15.50
2+600	25	3.1	0.20	15.50
2+625	25	3	0.20	15.00
2+650	25	2.9	0.20	14.50
2+675	25	3	0.20	15.00
2+700	25	3	0.20	15.00
2+725	25	3	0.20	15.00
2+750	25	3	0.20	15.00
2+775	25	3	0.20	15.00
2+800	25	2.9	0.20	14.50
2+825	25	2.8	0.20	14.00
2+850	25	2.9	0.20	14.50
2+875	25	2.8	0.20	14.00
2+900	12.5	2.9	0.20	7.25
الاجمالي				1726.50

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٣ / ٤ / ٢٠١٩

[Handwritten signature]

אֲנִי מְחַיֵּה הַמֵּתִים וְהַחַיִּים וְהַיְּהוּדִים וְהַנְּחִישִׁים וְהַיְּחִידִים וְהַיְּחִידִים וְהַיְּחִידִים

Mit CamScanner gescannt

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / وصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

ST.	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
0+000	12.5	6	0.110	8.25
0+025	25	5.9	0.105	15.49
0+050	25	5.5	0.110	15.13
0+075	25	4.7	0.105	12.34
0+100	25	4.7	0.120	14.10
0+125	25	4.4	0.105	11.55
0+150	25	4.4	0.110	12.10
0+175	25	4.4	0.105	11.55
0+200	25	4.3	0.120	12.90
0+225	25	4.45	0.110	12.24
0+250	25	4.5	0.115	12.94
0+275	25	4.5	0.100	11.25
0+300	25	4.5	0.105	11.81
0+325	25	4.4	0.110	12.10
0+350	25	4.45	0.105	11.68
0+375	25	4.4	0.110	12.10
0+400	25	4.2	0.105	11.03
0+425	25	4.1	0.120	12.30
0+450	25	4.2	0.110	11.55
0+475	25	4	0.115	11.50
0+500	25	4.5	0.100	11.25
0+525	25	4.5	0.105	11.81
0+550	25	4.6	0.110	12.65
0+575	25	4.4	0.115	12.65
0+600	25	4.35	0.120	13.05
0+625	25	4.4	0.120	13.20
0+650	25	4.5	0.110	12.38
0+675	25	4.5	0.110	12.38
0+700	25	4.6	0.110	12.65
0+725	25	4.45	0.100	11.13
0+750	25	4.45	0.110	12.24

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٢٠١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

ST.	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
0+775	25	4.3	0.105	11.29
0+800	25	4.5	0.120	13.50
0+825	25	4.3	0.110	11.83
0+850	25	4	0.115	11.50
0+875	25	4.2	0.100	10.50
0+900	25	4.1	0.105	10.76
0+925	25	4.5	0.110	12.38
0+950	25	4.5	0.115	12.94
0+975	25	4.6	0.110	12.65
1+000	25	4.4	0.115	12.65
1+025	25	4.5	0.100	11.25
1+050	25	4.5	0.105	11.81
1+075	25	4.7	0.110	12.93
1+100	25	4.4	0.105	11.55
1+125	25	4.45	0.110	12.24
1+150	25	4.5	0.105	11.81
1+175	25	4.6	0.120	13.80
1+200	25	4.3	0.110	11.83
1+225	25	4.3	0.115	12.36
1+250	25	4.2	0.100	10.50
1+275	25	4.3	0.105	11.29
1+300	25	4.45	0.110	12.24
1+325	25	4.5	0.115	12.94
1+350	25	4.5	0.105	11.81
1+375	25	4.5	0.120	13.50
1+400	25	4.4	0.110	12.10
1+425	25	4.5	0.115	12.94
1+450	25	4.4	0.100	11.00
1+475	25	4.2	0.105	11.03
1+500	25	4.3	0.110	11.83
1+525	25	4.2	0.115	12.08

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

ST.	الطول	العرض	السك	الاجمالي
1+550	25	4.1	0.120	12.30
1+575	25	4.5	0.120	13.50
1+600	25	4.5	0.110	12.38
1+625	25	4.6	0.105	12.08
1+650	25	4.4	0.110	12.10
1+675	25	4.35	0.115	12.51
1+700	25	4.4	0.105	11.55
1+725	25	4.5	0.120	13.50
1+750	25	4.5	0.110	12.38
1+775	25	4.3	0.115	12.36
1+800	25	4.5	0.100	11.25
1+825	25	4.5	0.105	11.81
1+850	25	4.4	0.100	11.00
1+875	25	4.4	0.105	11.55
1+900	25	4.5	0.120	13.50
1+925	25	4.45	0.110	12.24
1+950	25	4.5	0.115	12.94
1+975	25	4.5	0.100	11.25
2+000	25	4.5	0.105	11.81
2+025	25	4.4	0.110	12.10
2+050	25	4.5	0.115	12.94
2+075	25	4.4	0.120	13.20
2+100	25	4.3	0.120	12.90
2+125	25	4.3	0.110	11.83
2+150	25	4.4	0.105	11.55
2+175	25	4.2	0.110	11.55
2+200	25	4.5	0.115	12.94
2+225	25	4.45	0.100	11.13
2+250	25	4.5	0.105	11.81
2+275	25	4.5	0.100	11.25
2+300	25	4.4	0.105	11.55

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 م. ابراهيم

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

ST.	الطول	العرض	السماك	الاجمالي
2+325	25	4.4	0.120	13.20
2+350	25	4.3	0.110	11.83
2+375	25	4.3	0.115	12.36
2+400	25	4.5	0.100	11.25
2+425	25	4.5	0.120	13.50
2+450	25	4.45	0.120	13.35
2+475	25	4.4	0.110	12.10
2+500	25	4.4	0.105	11.55
2+525	25	4.5	0.110	12.38
2+550	25	4.5	0.115	12.94
2+575	25	4.5	0.100	11.25
2+600	25	4.3	0.105	11.29
2+625	25	4.3	0.120	12.90
2+650	25	4.3	0.120	12.90
2+675	25	4.4	0.110	12.10
2+700	25	4.4	0.105	11.55
2+725	25	4.4	0.110	12.10
2+750	25	4.5	0.115	12.94
2+775	25	4.5	0.105	11.81
2+800	25	4.4	0.120	13.20
2+825	25	4.4	0.120	13.20
2+850	25	4.4	0.110	12.10
2+875	25	4.3	0.105	11.29
2+900	12.5	4.3	0.100	5.38
الاجمالي				1417.25

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
م. ابراهيم

Mit CamScanner gescannt


三才圖會


2014


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة القليوبية .
عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠+٠٠٠ الى الكم ٧٠+٠٠٠) .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وتشغيل أثرية (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%)

الاجمالي	المسطح	الطول	الاعمال
175.24	6.74	26.00	FROM ST. 13+190 TO ST 13+217
234.71	4.79	49.00	FROM ST. 14+050 TO ST 14+097
146.00	7.30	20.00	FROM ST. 14+470 TO ST 14+490
330.03	5.79	57.00	FROM ST. 14+775 TO ST 14+832
885.98	الاجمالي		


مهندس الهيئة


مهندس الشركة

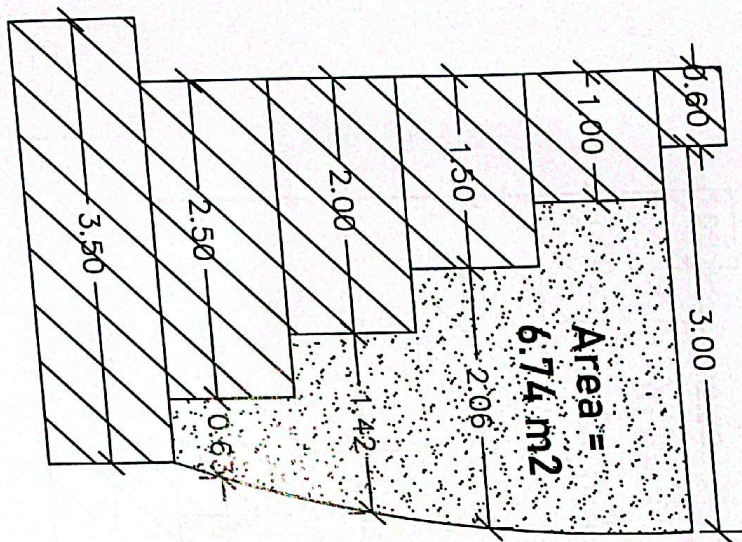


[Handwritten signature]


54315

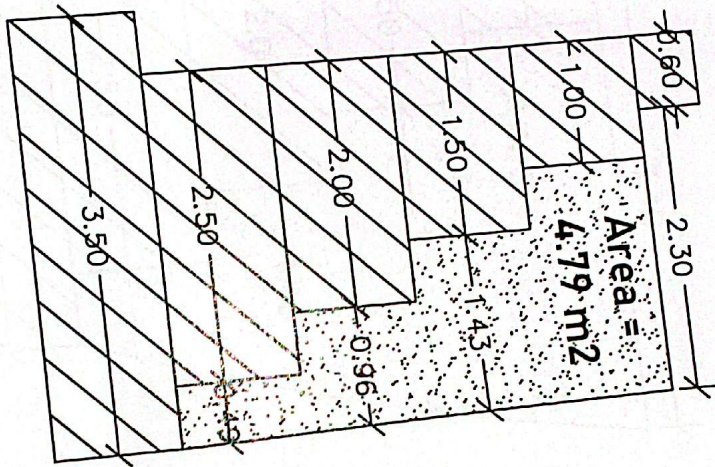


Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

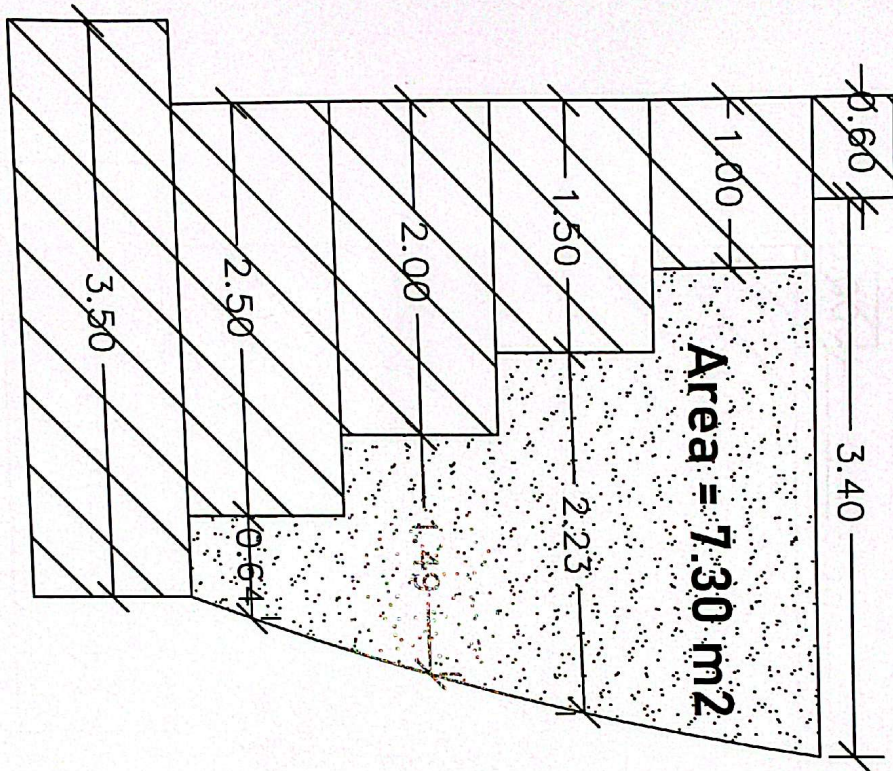

363/12

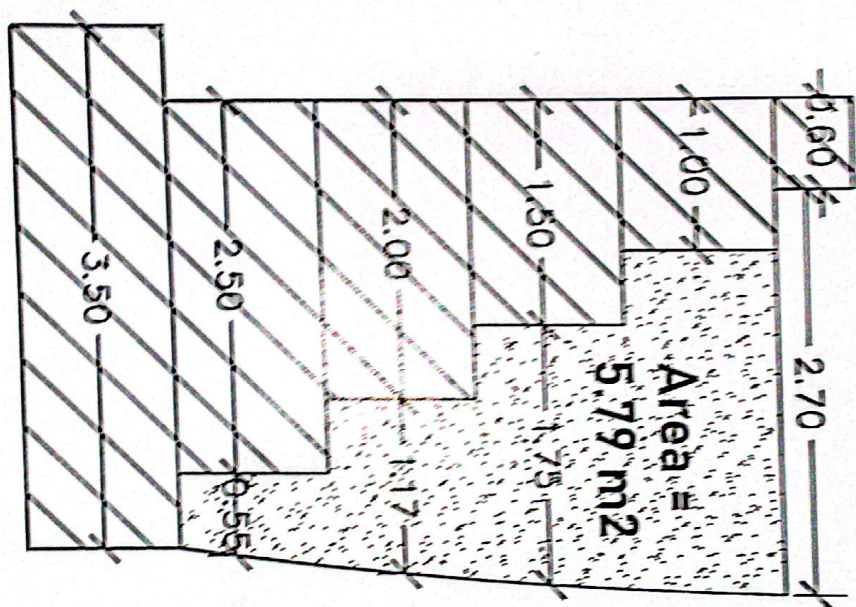

Handwritten signature or mark.

Handwritten text: 34515

الهيئة العامة للطرق والجسور (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن الميزانية " جياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 صنية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الى الكم ٧٠٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة .

اجمالي أعمال توريد وفرش طبقة أساس

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند
8622.48	م ^٢	الطريق	باعتبر الكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير التكرارات والمطابقة للمواصفات والتدريج الوارد بالإمبارطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ... الخ
826.89		طرش الغاز	
1185.13		طرش العرشف	
10634.50		FROM ST. 0+000 TO 3+500	
		FROM ST. 0+025 TO 2+900	
		FROM ST. 0+025 TO 2+900	
		الاجمالي العام	

مهندس الهيئة
 محمد البدر

مهندس الشركة
 ١٣٤٥١٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية ,
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٧٠+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

اعمال توريد وفرش طبقة أساس للطريق

ST.	الطول	العرض	السبك	الاجمالي
0+000	12.5	15.45	0.16	30.42
0+025	25	16.15	0.23	92.53
0+050	25	14.1	0.26	91.94
0+075	25	14.4	0.23	83.40
0+100	25	13.1	0.25	83.10
0+125	25	11.4	0.36	101.29
0+150	25	9.7	0.37	89.02
0+175	25	9.3	0.31	71.01
0+200	25	9.1	0.27	61.90
0+225	25	8.2	0.28	57.49
0+250	25	8.2	0.27	54.75
0+275	25	8.2	0.26	54.07
0+300	25	8	0.29	58.08
0+325	25	7.6	0.28	53.28
0+350	25	8.1	0.28	56.78
0+375	25	8.1	0.30	60.83
0+400	25	7.9	0.38	75.13
0+425	25	7.6	0.47	90.01
0+450	25	7.9	0.45	88.30
0+475	25	7.9	0.39	76.45
0+500	25	8	0.33	66.08
0+525	25	7.9	0.39	77.11
0+550	25	7.9	0.43	85.67
0+575	25	7.9	0.33	65.26
0+600	25	7.8	0.39	76.78
0+625	25	7.8	0.46	89.13
0+650	25	8	0.38	76.08
0+675	25	8	0.30	60.75
0+700	25	7.9	0.25	48.80

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 براهيم محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس للطريق

ST.	الطول	العرض	السك	الاجمالي
0+725	25	7.9	0.30	59.33
0+750	25	7.6	0.38	72.28
0+775	25	7.5	0.40	75.70
0+800	25	7.6	0.41	77.98
0+825	25	7.4	0.35	64.83
0+850	25	7.4	0.36	66.68
0+875	25	7.4	0.34	63.59
0+900	25	7.4	0.36	66.06
0+925	25	7.7	0.37	71.31
0+950	25	7.3	0.25	45.09
0+975	25	7.3	0.27	49.96
1+000	25	7.4	0.30	55.11
1+025	25	7.8	0.40	77.35
1+050	25	7.8	0.43	78.25
1+075	25	7.4	0.39	71.46
1+100	25	7.5	0.34	64.14
1+125	25	7.8	0.42	82.49
1+150	25	7.8	0.50	98.20
1+175	25	7.9	0.50	97.78
1+200	25	7.5	0.47	88.89
1+225	25	8.3	0.40	83.16
1+250	25	7.1	0.22	38.53
1+275	25	7.3	0.17	30.49
1+300	25	7.3	0.40	73.50
1+325	25	7.2	0.44	80.06
1+350	25	7.7	0.59	113.01
1+375	25	7.2	0.55	98.89
مسجد (٤٠٠+)	25	10.3	0.42	108.86
1+425	25	7.2	0.28	51.25

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 محمد محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الي الكم ٧٠٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس للطريق

ST.	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
1+450	25	7.2	0.30	54.31
1+475	25	7.3	0.43	78.79
1+500	25	7	0.50	87.98
1+525	25	7.3	0.53	97.23
1+550	25	7.1	0.49	86.28
1+575	25	7.2	0.37	67.09
1+600	25	7.2	0.22	38.77
1+625	25	7.2	0.29	52.75
1+650	25	7.4	0.39	72.41
1+675	25	7.4	0.45	84.01
1+700	25	7.7	0.50	95.78
1+725	25	8	0.44	87.80
1+750	25	7.5	0.46	86.95
1+775	25	7.7	0.48	91.47
1+800	25	7.5	0.33	61.67
1+825	25	7.4	0.31	56.64
1+850	25	7.5	0.31	58.77
1+875	25	7	0.39	67.78
1+900	25	7.2	0.31	56.63
1+925	25	7.3	0.31	56.47
1+950	25	7.4	0.32	59.52
1+975	25	7.7	0.25	48.91
2+000	25	7	0.26	44.87
2+025	25	7.2	0.24	42.37
2+050	25	7.3	0.30	54.95
2+075	25	7.5	0.27	50.64
2+100	25	7.3	0.25	45.64
2+125	25	7.7	0.23	43.46
2+150	25	7.3	0.18	32.50

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٣١

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس للطريق

ST.	الطول	العرض	السماك	الاجمالي
2+175	25	7.2	0.24	43.99
2+200	25	6.8	0.27	45.86
2+225	25	7.2	0.40	71.23
2+250	25	7.1	0.34	61.07
2+275	25	7.2	0.29	52.21
2+300	25	7.2	0.33	59.89
2+325	25	7.4	0.38	69.45
2+350	25	7.4	0.37	68.71
2+375	25	7.2	0.41	73.93
2+400	25	7.2	0.32	57.43
2+425	25	7.1	0.24	42.32
2+450	25	7.1	0.27	48.12
2+475	25	7.5	0.30	55.70
2+500	25	7.5	0.30	56.20
2+525	25	7.5	0.30	56.52
2+550	25	7.2	0.31	55.33
2+575	25	7.1	0.30	53.26
2+600	25	7.2	0.31	55.09
2+625	25	7.4	0.37	68.22
2+650	25	7.4	0.41	76.11
2+675	25	7.4	0.37	68.40
2+700	25	7.6	0.35	66.96
2+725	25	7.5	0.36	67.83
2+750	25	7.2	0.34	61.39
2+775	25	7.2	0.28	50.47
2+800	25	7.1	0.27	48.47
2+825	25	7.2	0.27	49.45
2+850	25	7.2	0.32	57.13
2+875	25	7.2	0.29	51.61

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 م. أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس للطريق

ST.	الطول	العرض	السبك	الاجمالي
2+900	25	7.2	0.25	45.49
2+925	25	7.1	0.30	52.44
2+950	25	7	0.36	63.13
2+975	25	6.7	0.17	28.04
3+000	25	6.7	0.21	35.91
3+025	25	6.7	0.19	31.34
3+050	25	6.7	0.17	29.16
3+075	25	6.7	0.21	35.75
3+100	25	7.3	0.09	16.01
3+125	25	7.1	0.12	20.49
3+150	25	7	0.15	26.91
3+175	25	7.1	0.16	27.59
3+200	25	7	0.23	39.74
3+225	25	6.9	0.20	34.46
3+250	25	7	0.17	29.41
3+275	25	7.2	0.22	38.95
3+300	25	7.2	0.15	27.86
3+325	25	7.4	0.18	33.25
3+350	25	7	0.15	26.67
3+375	25	6.7	0.24	40.05
3+400	25	6.5	0.24	38.47
3+425	25	6.5	0.18	28.72
3+450	25	6.7	0.30	49.87
3+475	25	6.7	0.33	55.62
3+500	12.5	6.8	0.38	32.56
الاجمالي				8622.48

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 م. أحمد محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخلوخ (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الى الكم ٧٠٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرئش الغاز)

ST.	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
0+025	12.5	0.95	0.29	3.44
0+050	25	1	0.31	7.75
0+075	25	1.05	0.30	7.88
0+100	25	1.05	0.30	7.88
0+125	25	1	0.29	7.25
0+150	25	0.95	0.31	7.36
0+175	25	0.9	0.30	6.75
0+200	25	0.9	0.25	5.63
0+225	25	1.05	0.25	6.56
0+250	25	1.05	0.25	6.56
0+275	25	1	0.25	6.25
0+300	25	1	0.30	7.50
0+325	25	1.05	0.25	6.56
0+350	25	0.95	0.30	7.13
0+375	25	1.05	0.30	7.88
0+400	25	1.05	0.30	7.88
0+425	25	1.05	0.30	7.88
0+450	25	1.05	0.30	7.88
0+475	25	1.05	0.30	7.88
0+500	25	0.95	0.30	7.13
0+525	25	0.95	0.31	7.36
0+550	25	0.95	0.31	7.36
0+575	25	0.95	0.30	7.13
0+600	25	1	0.30	7.50
0+625	25	1.05	0.29	7.61
0+650	25	1.05	0.29	7.61
0+675	25	1.05	0.30	7.88
0+700	25	1.05	0.25	6.56
0+725	25	1.05	0.30	7.88
0+750	25	1.05	0.25	6.56

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 م. الخياط

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش الغاز)

ST.	الطول	العرض	السبك	الاجمالي
0+775	25	1.05	0.25	6.56
0+800	25	0.95	0.25	5.94
0+825	25	0.9	0.25	5.63
0+850	25	1.05	0.25	6.56
0+875	25	1.05	0.30	7.88
0+900	25	0.95	0.30	7.13
0+925	25	0.95	0.30	7.13
0+950	25	0.95	0.30	7.13
0+975	25	1	0.25	6.25
1+000	25	1	0.30	7.50
1+025	25	1	0.30	7.50
1+050	25	0.95	0.30	7.13
1+075	25	1.05	0.31	8.14
1+100	25	1.05	0.29	7.61
1+125	25	1.05	0.30	7.88
1+150	25	0.95	0.30	7.13
1+175	25	1.05	0.30	7.88
1+200	25	0.95	0.30	7.13
1+225	25	0.95	0.30	7.13
1+250	25	1	0.26	6.50
1+275	25	1.05	0.26	6.83
1+300	25	1.05	0.30	7.88
1+325	25	1.05	0.25	6.56
1+350	25	1.05	0.25	6.56
1+375	25	1.05	0.30	7.88
1+400	25	1.05	0.30	7.88
1+425	25	1.05	0.30	7.88
1+450	25	0.95	0.30	7.13
1+475	25	0.9	0.30	6.75
1+500	25	1.05	0.30	7.88

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. الحرفي

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الي الكم ٧٠٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش الغاز)

ST.	الطول	العرض	السلك	الاجمالي
2+275	25	1.05	0.30	7.88
2+300	25	1.05	0.30	7.88
2+325	25	1.05	0.30	7.88
2+350	25	1.05	0.30	7.88
2+375	25	1	0.30	7.50
2+400	25	0.95	0.30	7.13
2+425	25	0.9	0.30	6.75
2+450	25	0.9	0.30	6.75
2+475	25	0.9	0.25	5.63
2+500	25	0.9	0.25	5.63
2+525	25	0.95	0.25	5.94
2+550	25	0.95	0.30	7.13
2+575	25	0.95	0.30	7.13
2+600	25	0.95	0.30	7.13
2+625	25	1.05	0.25	6.56
2+650	25	1.05	0.25	6.56
2+675	25	1.05	0.30	7.88
2+700	25	1	0.30	7.50
2+725	25	1	0.30	7.50
2+750	25	0.9	0.25	5.63
2+775	25	0.9	0.30	6.75
2+800	25	0.85	0.30	6.38
2+825	25	0.95	0.30	7.13
2+850	25	0.95	0.30	7.13
2+875	25	0.9	0.30	6.75
2+900	12.5	0.95	0.30	3.56
الاجمالي				826.89

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 م. ا. م. م. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن الميمنة الرئيسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - واس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرئش الصرف)

ST.	الطول	العرض	السلك	الاجمالي
0+025	12.5	1.2	0.28	4.20
0+050	25	1.35	0.30	10.13
0+075	25	1.3	0.31	10.08
0+100	25	1.3	0.29	9.43
0+125	25	1.45	0.27	9.79
0+150	25	1.4	0.30	10.50
0+175	25	1.4	0.28	9.80
0+200	25	1.2	0.26	7.80
0+225	25	1.35	0.31	10.46
0+250	25	1.4	0.30	10.50
0+275	25	1.45	0.30	10.88
0+300	25	1.45	0.32	11.60
0+325	25	1.4	0.33	11.55
0+350	25	1.4	0.30	10.50
0+375	25	1.5	0.30	11.25
0+400	25	1.5	0.29	10.88
0+425	25	1.5	0.28	10.50
0+450	25	1.4	0.29	10.15
0+475	25	1.3	0.27	8.78
0+500	25	1.3	0.30	9.75
0+525	25	1.2	0.29	8.70
0+550	25	1.2	0.30	9.00
0+575	25	1.2	0.29	8.70
0+600	25	1.2	0.28	8.40
0+625	25	1.3	0.28	9.10
0+650	25	1.3	0.26	8.45
0+675	25	1.35	0.30	10.13
0+700	25	1.4	0.30	10.50
0+725	25	1.4	0.31	10.85
0+750	25	1.35	0.30	10.13

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية ،
 عملية / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠١٠٠٠ الى الكم ٧١٠٠٠) ،
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرلش الصرف)

ST.	الطول	العرض	السمك	الاجمالي
0+775	25	1.3	0.32	10.40
0+800	25	1.4	0.30	10.50
0+825	25	1.35	0.30	10.13
0+850	25	1.4	0.29	10.15
0+875	25	1.5	0.30	11.25
0+900	25	1.5	0.27	10.13
0+925	25	1.45	0.30	10.88
0+950	25	1.4	0.30	10.50
0+975	25	1.5	0.27	10.13
1+000	25	1.45	0.30	10.88
1+025	25	1.35	0.30	10.13
1+050	25	1.4	0.30	10.50
1+075	25	1.35	0.29	9.79
1+100	25	1.45	0.33	11.96
1+125	25	1.5	0.31	11.63
1+150	25	1.5	0.33	12.38
1+175	25	1.45	0.32	11.60
1+200	25	1.45	0.30	10.88
1+225	25	1.5	0.30	11.25
1+250	25	1.35	0.29	9.79
1+275	25	1.3	0.28	9.10
1+300	25	1.4	0.31	10.85
1+325	25	1.35	0.31	10.46
1+350	25	1.4	0.32	11.20
1+375	25	1.5	0.32	12.00
1+400	25	1.5	0.29	10.88
1+425	25	1.45	0.31	11.24
1+450	25	1.4	0.29	10.15
1+475	25	1.5	0.28	10.50
1+500	25	1.45	0.28	10.15

مهندس الهبة

مهندس الشركة
 ٢١٢٢٢٢٢٢
 ٢

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الى الكم ٧٠٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وفرش طبقة أساس (طرنش الصرف)

ST.	الطول	العرض	السبك	الاجمالي
1+525	25	1.35	0.27	9.11
1+550	25	1.4	0.30	10.50
1+575	25	1.4	0.30	10.50
1+600	25	1.5	0.29	10.88
1+625	25	1.5	0.30	11.25
1+650	25	1.45	0.29	10.51
1+675	25	1.35	0.31	10.46
1+700	25	1.2	0.30	9.00
1+725	25	1.4	0.30	10.50
1+750	25	1.35	0.29	9.79
1+775	25	1.3	0.31	10.08
1+800	25	1.4	0.30	10.50
1+825	25	1.45	0.25	9.06
1+850	25	1.5	0.25	9.38
1+875	25	1.45	0.25	9.06
1+900	25	1.5	0.25	9.38
1+925	25	1.45	0.30	10.88
1+950	25	1.4	0.25	8.75
1+975	25	1.5	0.31	11.63
2+000	25	1.5	0.30	11.25
2+025	25	1.5	0.30	11.25
2+050	25	1.45	0.33	11.96
2+075	25	1.4	0.30	10.50
2+100	25	1.35	0.25	8.44
2+125	25	1.35	0.30	10.13
2+150	25	1.4	0.30	10.50
2+175	25	1.5	0.30	11.25
2+200	25	1.5	0.31	11.63
2+225	25	1.45	0.30	10.88
2+250	25	1.4	0.30	10.50

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
1+350	12.5	6.45	80.63
1+375	25	6.3	157.50
1+400	25	10.05	251.25
1+425	25	8.8	220.00
1+450	25	6.7	167.50
1+475	25	6.8	170.00
1+500	25	6.9	172.50
1+525	25	6.95	173.75
1+550	25	6.95	173.75
1+575	25	6.95	173.75
1+600	25	6.5	162.50
1+625	25	6.8	170.00
1+650	25	6.9	172.50
1+675	25	7.15	178.75
1+700	25	7.2	180.00
1+725	25	7.15	178.75
1+750	25	6.9	172.50
1+775	25	6.65	166.25
1+800	25	6.9	172.50
1+825	25	6.2	155.00
1+850	25	6.5	162.50
1+875	25	6.1	152.50
1+900	25	6.3	157.50
1+925	25	6.55	163.75
1+950	25	6.5	162.50
1+975	25	7.2	180.00
2+000	25	6.55	163.75

مهندس الهيئة
 أحمد محمد

مهندس الشركة
 أحمد محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
 أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
2+700	25	6.55	163.75
2+725	25	6.6	165.00
2+750	25	6.25	156.25
2+775	25	6.4	160.00
2+800	25	6.45	161.25
2+825	25	6.3	157.50
2+850	25	6.4	160.00
2+875	25	6.2	155.00
2+900	25	6.25	156.25
2+925	25	6.45	161.25
2+950	25	6.55	163.75
2+975	25	6.3	157.50
3+000	25	6.15	153.75
3+025	25	6.15	153.75
3+050	25	6	150.00
3+075	25	6.05	151.25
3+100	25	6.4	160.00
3+125	25	6.45	161.25
3+150	25	6.05	151.25
3+175	25	6.05	151.25
3+200	25	5.95	148.75
3+225	25	6	150.00
3+250	25	6.4	160.00
3+275	25	6.6	165.00
3+300	25	6.65	166.25
3+325	25	6.6	165.00
3+350	25	6.4	160.00

مهندس الشركة
 ٢٠٢٤

مهندس الهيئة
 ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
عملية / استكمال اعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الاول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
3+375	25	6.2	155.00
3+400	25	6.25	156.25
3+425	25	6	150.00
3+462.5	25	6	150.00
الاجمالي			13955.63

ش. الشركة
رئيس

مهندس الهيئة
رئيس

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)

اجمالي أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30)

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند
13955.63	م ^٢	للطريق	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس ... الخ
		FROM ST. 1+350 TO 4+462.5	
13955.63	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة

[Signature]
Ahmed

مهندس الشركة

[Signature]

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)

أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
1+350	12.5	6.45	80.63
1+375	25	6.3	157.50
1+400	25	10.05	251.25
1+425	25	8.8	220.00
1+450	25	6.7	167.50
1+475	25	6.8	170.00
1+500	25	6.9	172.50
1+525	25	6.95	173.75
1+550	25	6.95	173.75
1+575	25	6.95	173.75
1+600	25	6.5	162.50
1+625	25	6.8	170.00
1+650	25	6.9	172.50
1+675	25	7.15	178.75
1+700	25	7.2	180.00
1+725	25	7.15	178.75
1+750	25	6.9	172.50
1+775	25	6.65	166.25
1+800	25	6.9	172.50
1+825	25	6.2	155.00
1+850	25	6.5	162.50
1+875	25	6.1	152.50
1+900	25	6.3	157.50
1+925	25	6.55	163.75
1+950	25	6.5	162.50
1+975	25	7.2	180.00
2+000	25	6.55	163.75

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الي الكم ٧٠٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
 أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
2+025	25	6.55	163.75
2+050	25	6.75	168.75
2+075	25	6.75	168.75
2+100	25	6.6	165.00
2+125	25	6.7	167.50
2+150	25	6.7	167.50
2+175	25	6.35	158.75
2+200	25	6.25	156.25
2+225	25	6.2	155.00
2+250	25	6.5	162.50
2+275	25	6.4	160.00
2+300	25	6.55	163.75
2+325	25	6.9	172.50
2+350	25	9.7	242.50
2+375	25	6.65	166.25
2+400	25	6.35	158.75
2+425	25	6.15	153.75
2+450	25	6.15	153.75
2+475	25	6.25	156.25
2+500	25	6.35	158.75
2+525	25	6.5	162.50
2+550	25	6.7	167.50
2+575	25	6.9	172.50
2+600	25	6.9	172.50
2+625	25	6.7	167.50
2+650	25	6.55	163.75
2+675	25	6.45	161.25

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمصلحة طرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠٠٠٠ الى الكم ٧٠٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوايد للمقاولات العامة .

بلد رقم (٤)
 أعمال توريد ورش طبخة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
2+700	25	6.55	163.75
2+725	25	6.6	165.00
2+750	25	6.25	156.25
2+775	25	6.4	160.00
2+800	25	6.45	161.25
2+825	25	6.3	157.50
2+850	25	6.4	160.00
2+875	25	6.2	155.00
2+900	25	6.25	156.25
2+925	25	6.45	161.25
2+950	25	6.55	163.75
2+975	25	6.3	157.50
3+000	25	6.15	153.75
3+025	25	6.15	153.75
3+050	25	6	150.00
3+075	25	6.05	151.25
3+100	25	6.4	160.00
3+125	25	6.45	161.25
3+150	25	6.05	151.25
3+175	25	6.05	151.25
3+200	25	5.95	148.75
3+225	25	6	150.00
3+250	25	6.4	160.00
3+275	25	6.6	165.00
3+300	25	6.65	166.25
3+325	25	6.6	165.00
3+350	25	6.4	160.00

مهندس الهيئة
 [Signature]

مهندس الشركة
 [Signature]

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
عملية / استكمال اعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٤)
أعمال توريد ورش طبقة تشريب (MC30)

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
3+375	25	6.2	155.00
3+400	25	6.25	156.25
3+425	25	6	150.00
3+462.5	25	6	150.00
الاجمالي			13955.63

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٥)

اجمالي أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند
13955.63	م ٢	للطريق	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (4ج) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ ... الخ
		FROM ST. 1+350 TO 4+462.5	
13955.63	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة
 أحمد
 Ahmed

مهندس الشركة
 ٢٠٢٤/١٢/٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (٥)

أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
1+350	12.5	6.45	80.63
1+375	25	6.3	157.50
1+400	25	10.05	251.25
1+425	25	8.8	220.00
1+450	25	6.7	167.50
1+475	25	6.8	170.00
1+500	25	6.9	172.50
1+525	25	6.95	173.75
1+550	25	6.95	173.75
1+575	25	6.95	173.75
1+600	25	6.5	162.50
1+625	25	6.8	170.00
1+650	25	6.9	172.50
1+675	25	7.15	178.75
1+700	25	7.2	180.00
1+725	25	7.15	178.75
1+750	25	6.9	172.50
1+775	25	6.65	166.25
1+800	25	6.9	172.50
1+825	25	6.2	155.00
1+850	25	6.5	162.50
1+875	25	6.1	152.50
1+900	25	6.3	157.50
1+925	25	6.55	163.75
1+950	25	6.5	162.50
1+975	25	7.2	180.00
2+000	25	6.55	163.75

مهندس الهيئة
 أحمد
 Ahmad

مهندس الشركة
 أحمد
 Ahmad

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (٥)

أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
2+025	25	6.55	163.75
2+050	25	6.75	168.75
2+075	25	6.75	168.75
2+100	25	6.6	165.00
2+125	25	6.7	167.50
2+150	25	6.7	167.50
2+175	25	6.35	158.75
2+200	25	6.25	156.25
2+225	25	6.2	155.00
2+250	25	6.5	162.50
2+275	25	6.4	160.00
2+300	25	6.55	163.75
2+325	25	6.9	172.50
2+350	25	9.7	242.50
2+375	25	6.65	166.25
2+400	25	6.35	158.75
2+425	25	6.15	153.75
2+450	25	6.15	153.75
2+475	25	6.25	156.25
2+500	25	6.35	158.75
2+525	25	6.5	162.50
2+550	25	6.7	167.50
2+575	25	6.9	172.50
2+600	25	6.9	172.50
2+625	25	6.7	167.50
2+650	25	6.55	163.75
2+675	25	6.45	161.25

مهندس الهيئة
 أحمد


مهندس الشركة
 محمد


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (٥)

أعمال انشاء طبقه سطحه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
2+700	25	6.55	163.75
2+725	25	6.6	165.00
2+750	25	6.25	156.25
2+775	25	6.4	160.00
2+800	25	6.45	161.25
2+825	25	6.3	157.50
2+850	25	6.4	160.00
2+875	25	6.2	155.00
2+900	25	6.25	156.25
2+925	25	6.45	161.25
2+950	25	6.55	163.75
2+975	25	6.3	157.50
3+000	25	6.15	153.75
3+025	25	6.15	153.75
3+050	25	6	150.00
3+075	25	6.05	151.25
3+100	25	6.4	160.00
3+125	25	6.45	161.25
3+150	25	6.05	151.25
3+175	25	6.05	151.25
3+200	25	5.95	148.75
3+225	25	6	150.00
3+250	25	6.4	160.00
3+275	25	6.6	165.00
3+300	25	6.65	166.25
3+325	25	6.6	165.00
3+350	25	6.4	160.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (٥)

أعمال إنشاء طبقة سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
3+375	25	6.2	155.00
3+400	25	6.25	156.25
3+425	25	6	150.00
3+462.5	25	6	150.00
الاجمالي			13955.63



مهندس الهيئة
أحمد

مهندس الشركة
إبراهيم

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .

مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .

عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .


تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٥)


اجمالي أعمال انشاء طبقه سطحه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند
13955.63	٢م	للطريق	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (4ج) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ ... الخ
		FROM ST. 1+350 TO 4+462.5	
13955.63	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الاول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (٥)

أعمال انشاء طبقه سطحه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
1+350	12.5	6.45	80.63
1+375	25	6.3	157.50
1+400	25	10.05	251.25
1+425	25	8.8	220.00
1+450	25	6.7	167.50
1+475	25	6.8	170.00
1+500	25	6.9	172.50
1+525	25	6.95	173.75
1+550	25	6.95	173.75
1+575	25	6.95	173.75
1+600	25	6.5	162.50
1+625	25	6.8	170.00
1+650	25	6.9	172.50
1+675	25	7.15	178.75
1+700	25	7.2	180.00
1+725	25	7.15	178.75
1+750	25	6.9	172.50
1+775	25	6.65	166.25
1+800	25	6.9	172.50
1+825	25	6.2	155.00
1+850	25	6.5	162.50
1+875	25	6.1	152.50
1+900	25	6.3	157.50
1+925	25	6.55	163.75
1+950	25	6.5	162.50
1+975	25	7.2	180.00
2+000	25	6.55	163.75

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (٥)

أعمال انشاء طبقه سطحه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
2+025	25	6.55	163.75
2+050	25	6.75	168.75
2+075	25	6.75	168.75
2+100	25	6.6	165.00
2+125	25	6.7	167.50
2+150	25	6.7	167.50
2+175	25	6.35	158.75
2+200	25	6.25	156.25
2+225	25	6.2	155.00
2+250	25	6.5	162.50
2+275	25	6.4	160.00
2+300	25	6.55	163.75
2+325	25	6.9	172.50
2+350	25	9.7	242.50
2+375	25	6.65	166.25
2+400	25	6.35	158.75
2+425	25	6.15	153.75
2+450	25	6.15	153.75
2+475	25	6.25	156.25
2+500	25	6.35	158.75
2+525	25	6.5	162.50
2+550	25	6.7	167.50
2+575	25	6.9	172.50
2+600	25	6.9	172.50
2+625	25	6.7	167.50
2+650	25	6.55	163.75
2+675	25	6.45	161.25

مهندس الهيئة
 أحمد محمد

مهندس الشركة
 أحمد محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمصلحة شروق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ١٠٠٠٠ الى الكم ٧٠٠٠٠) بطول ٧ كم .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (٥)

أعمال إنشاء طبقه سطحه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
2+700	25	6.55	163.75
2+725	25	6.6	165.00
2+750	25	6.25	156.25
2+775	25	6.4	160.00
2+800	25	6.45	161.25
2+825	25	6.3	157.50
2+850	25	6.4	160.00
2+875	25	6.2	155.00
2+900	25	6.25	156.25
2+925	25	6.45	161.25
2+950	25	6.55	163.75
2+975	25	6.3	157.50
3+000	25	6.15	153.75
3+025	25	6.15	153.75
3+050	25	6	150.00
3+075	25	6.05	151.25
3+100	25	6.4	160.00
3+125	25	6.45	161.25
3+150	25	6.05	151.25
3+175	25	6.05	151.25
3+200	25	5.95	148.75
3+225	25	6	150.00
3+250	25	6.4	160.00
3+275	25	6.6	165.00
3+300	25	6.65	166.25
3+325	25	6.6	165.00
3+350	25	6.4	160.00

مهندس الهيئة
 أحمد

مهندس الشركة
 أحمد

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
عملية / استكمال أعمال رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) بطول ٧ كم .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند (٥)

أعمال إنشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٦ سم

ST.	الطول	العرض	الاجمالي
3+375	25	6.2	155.00
3+400	25	6.25	156.25
3+425	25	6	150.00
3+462.5	25	6	150.00
الاجمالي			13955.63

مهندس الهيئة
١٣/٤/٢٠٢٠

مهندس الشركة
١٣/٤/٢٠٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية /رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

اجمالي أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية

البند	الاعمال	الوحده	الاجمالي
بالطن أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد ... الخ	FROM ST. 13+190 TO ST 13+217	بالطن	4.22
	FROM ST. 14+050 TO ST 14+097		
	FROM ST. 14+470 TO ST 14+490		
	FROM ST. 14+775 TO ST 14+832		
الاجمالي العام			4.22


مهندس الشركة
 م. ا. ع. د.
 م. ا. ع. د.


مهندس الشركة
 م. ا. ع. د.
 م. ا. ع. د.


الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية /رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الإنشائية

الاعمال	الطول	الارتفاع	عدد الاسياخ	قطر السبخ	الوزن بالكم للمتر الطولي	الاجمالي
حديد الحائط						
FROM ST. 13+225 TO ST 13+251	26	5.00	5	Φ 10	0.617	401.05
			4			320.84
FROM ST. 14+028 TO ST 14+075	49	5.00	5	Φ 10	0.617	755.83
			4			604.66
FROM ST. 14+470 TO ST 14+490	20	5.00	5	Φ 10	0.617	308.50
			4			246.80
FROM ST. 14+775 TO ST 14+832	57	5.00	5	Φ 10	0.617	879.23
			4			703.38
الاجمالي العام (بالكم)						
4220.23						
الاجمالي العام (بالطن)						
4.22						

مهندس


مهندس الشركة

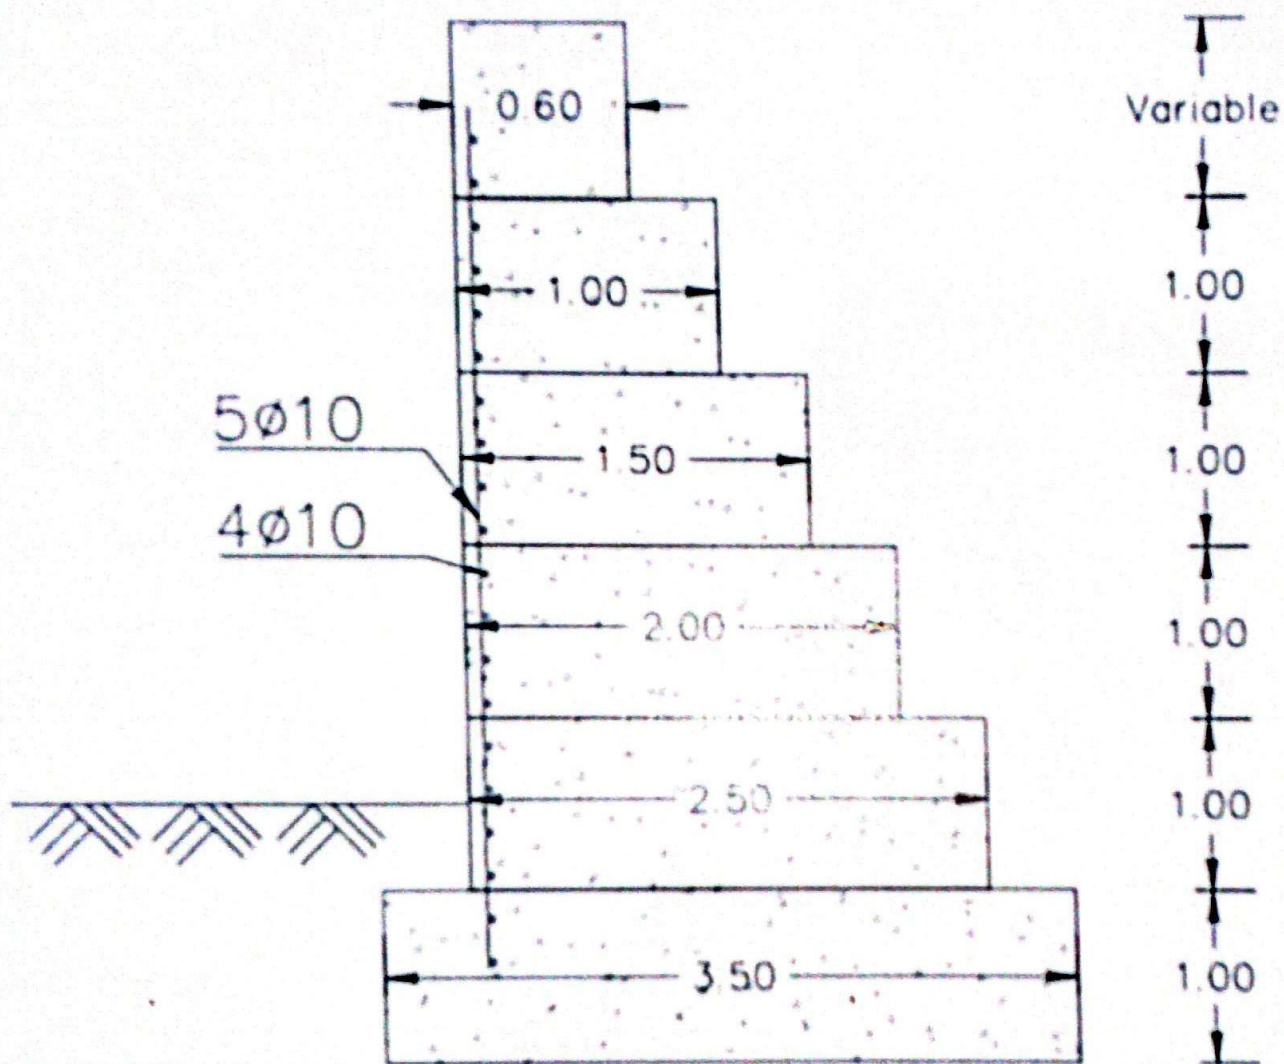


[Handwritten signature]


م. ا. غ. د

الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

اجمالي أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند
301.80	م ^٣	FROM ST. 13+190 TO ST 13+217	المتر المكعب أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية م علي ان تكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الا تقل المقاومه المميزه للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوي الاسمنت عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ ... الخ
550.20		FROM ST. 14+050 TO ST 14+097	
237.00		FROM ST. 14+470 TO ST 14+490	
657.12		FROM ST. 14+775 TO ST 14+832	
1746.12	الاجمالي العام		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية /رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠)
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية (FROM ST. 13+190 TO ST 13+217)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
98.00	1.00	3.50	28	القدمة
70.00	1.00	2.50	28	القضبة الاولى
56.00	1.00	2.00	28	القضبة الثانية
42.00	1.00	1.50	28	القضبة الثالثة
28.00	1.00	1.00	28	القضبة الرابعة
7.80	0.50	0.60	26	القضبة الخامسة
301.80	الاجمالي			

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الاداره المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .


أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية (FROM ST. 14+050 TO ST 14+097)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
178.50	1.00	3.5	51.00	القدمة
127.50	1.00	2.5	51.00	القضية الاولى
102.00	1.00	2	51.00	القضية الثانية
76.50	1.00	1.5	51.00	القضية الثالثة
51.00	1.00	1	51.00	القضية الرابعة
14.70	0.50	0.6	49.00	القضية الخامسة
550.20	الاجمالي			

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - راس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وصب حوائط سنده من الخرسانة العادية (FROM ST. 14+470 TO ST 14+490)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
77.00	1.00	3.50	22	القدمة
55.00	1.00	2.50	22	القضية الاولى
44.00	1.00	2.00	22	القضية الثانية
33.00	1.00	1.50	22	القضية الثالثة
22.00	1.00	1.00	22	القضية الرابعة
6.00	0.50	0.60	20	القضية الخامسة
237.00	الاجمالي			

مهندس الشركة
 م. محمد

مهندس الهيئة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز شربين) - محافظة الدقهلية .
 عملية / رصف طريق شربين - رأس الخليج (القطاع الأول من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٧+٠٠٠) .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

أعمال توريد وصب حوائط سائده من الخرسانة العادية (FROM ST. 14+775 TO ST 14+832)

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	الاعمال
206.50	1.00	3.50	59	القدمة
147.50	1.00	2.50	59	القضبة الاولى
118.00	1.00	2.00	59	القضبة الثانية
88.50	1.00	1.50	59	القضبة الثالثة
59.00	1.00	1.00	59	القضبة الرابعة
37.62	1.10	0.60	57	القضبة الخامسة
657.12	الاجمالي			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 ٢٠١٤

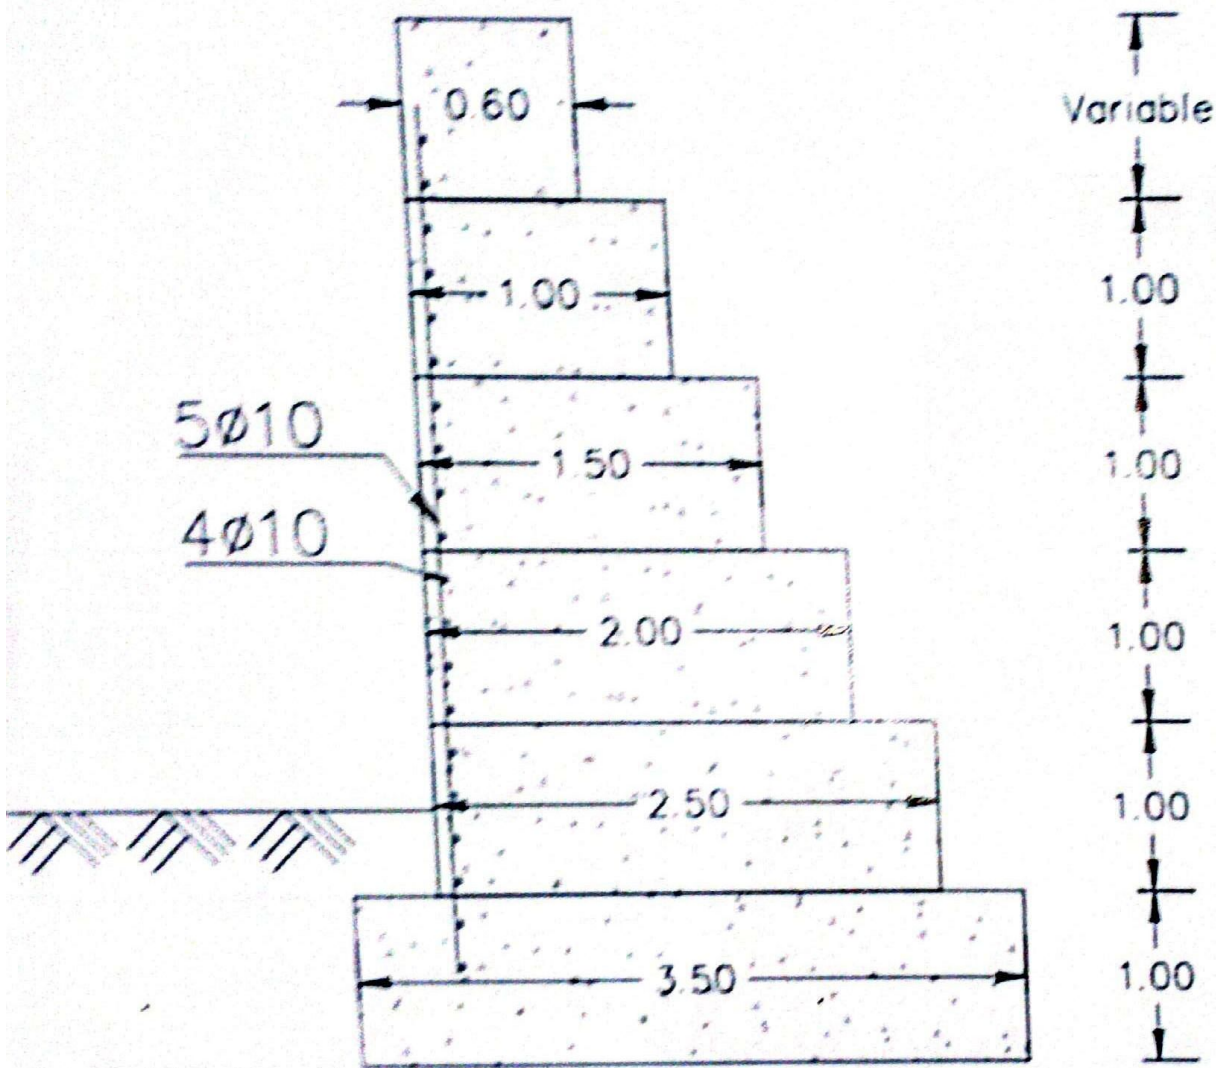

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
