

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العقود
ملف رقم : ١٣ / ١ / ١٣٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكرى مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية - حياة كريمة - عقد رقم ٢٤٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد سيارة المنطقة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا محاببتهم بقبول خائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



م/الكم



اسم المشروع : استكمال ورفع كفاءة طريق سعود / المناجاة مطار الصالحية بطول ١٢,٨ كم

تنفيذ شركة : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٥٥) لسنة ٢٠٢٤

بيانات إدارية :- قام بإحضار العينات : م / احمد سمير

بين العينات :-

عدد (٦) عينة مخلوط اسفلتي طبقة سطحية (ح١)

تعليمات الترخيص عليها :-

التدرج و الاستخلاص و تحديد نسبة الاسفلت و تحديد الشبات و الانسياب بطريقة مارشال

طبقة سطحية (ح١)

النتائج :-

المواصفات (ح١)	التدرج التصميمي		ك ٦,٣٠٠ تشغيل ٢٠٢٤/٩/١٩	ك ٥,٧٠٠ تشغيل ٢٠٢٤/٩/١٨	المعدات
	100	100	100	100	
100	80	96	86	97	مهزة سعة 1"
80	60	71.9	61.9	71	3/4"
65	48	52.6	48	51	3/8"
50	35	40.9	35	40	#4
30	19	24	19	22	#8
23	13	16.1	13	14	30#
15	7	10.2	7.2	8.8	50#
8	3	7.2	4.2	4.8	100#
		5.75	5.25	5.52	200#
لا يقل عن 12.0				1315	نسبة الاسفلت %
2-4				3.0	الشبات بالمجم
300-500				438	الانسياب بالمص
				416	الجسور بالمجم / مم

العينات تخرج عن حدود السماحية للتدرج التصميمي في المعدات المشار إليها

العينة تتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم الموافقة بالتدرج التصميمي لطبقة السطحية بالتصميم الوارد من كلية الهندسة جامعة بنها بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٠ بإماما على خانات الترخيص
المعلقة و موافقة جهاز الاشراف

ملاحظة :-

العينات مسئولية من احضرها

التكاليف

الاجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	التجارب
960	480	2	مخاروط اسفلتي
600	150	4	قالب مارشال
150			م اعداد تقرير
1710			أبناء التجارب
256.5			م 1٥١ %
778.35			م ١١ %
2211.85			الاجمالي

مصدر
٢٩٥٥
٢٠٢٤/٩/٢٠

٢٠٢٤/٠٩/٢١

مدير المعمل /

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
إدارة المعامل وضبط الجودة

المعامل
إدارة المعامل وضبط الجودة
1999/11/11

اسم المشروع : استكمال ورقع كفاءة طريق سعود / المتجاه مطر الساحلية بطول ١١,٨ كم
تأليف شركة : التويد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢

بيانات الادارية :- قام باحضار العينات : م / احمد مسير
بيان العينات :-

عدد (١) عينات رمال التربة حصوية طينيات لعل سائجة
الاختبارات التي اجريت عليها :-

الذليل المشلى و ثوابت التبرج و الصلابة و الازان النوعية و الامتصاص و التحلل و الماء الامثل و نسبة تحمل كاليفورنيا و التماسك
التنسيق : صلاحية رمال

المواصفات	النتائج	التجارب
	99	مهزة سعة ٢/١ "
	98	مهزة سعة ٨/٣ "
	86	مهزة رقم ٨
	70	4
	67	10
	45	40
	14	200
	تأريفة	مجال القوة
	A1-b	التصنيف
	2.13	النسبة مائة جافة طن / م ³
	7.5	نسبة المياه الملائمة %
	26	نسبة تحمل كاليفورنيا % الانفخاخ %

يتم الرجوع للمواصفات المشروع

بمؤازرة العينات مسؤولة من احضرها

ج / التكاليف

الكمية	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان البنات
1290	1290	1	صلاحية رمال
150			م اخذت تقرير
1440			نيجة التجارب
216			م ١٥١ %
231.85			م ١٤ %
1887.85			الاجمالي

مدير المعامل
2022/09/26

مدير المعامل / م / احمد مسير

ديوان الإدارة المركزية

اسم المشروع : استكمال ورفع كفاءة طريق سعود / المناجاة سطار الصالحية بطول ١٢,٨ كم

تاريخ شروعه : الوعيد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٥٦) لسنة ٢٠٢٤

بيانات الدورية :- قام باحضار العينات : م / احمد سمير

بتاريخ : ١٠/١٤/٢٠٢٤

بيان العينات :-

عدد (٢) عينة مخلوط اسفلتي طبقة سطحية (ج٤)

نتائج التحريات عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد النيات والاسباب بطريقة مارشال

طبقة سطحية (ج٤)

النتائج :-

المواصفات (ج٤)	تدرج التصميم	ك ٢,٤٠٠	ك ٦,٩٠٠	المهزات
100	100	100	100	مهزة سعة 1"
100	80	96	99	3/4"
80	60	71.9	73	3/8"
65	48	52.6	49	#4
50	35	40.9	39	#8
30	19	24	22	30#
23	13	16.1	15	50#
15	7	10.2	8.3	100#
8	3	7.2	4.8	200#
	5.75	5.25	5.44	نسبة الاسفلت %
			1320	النيات بالكجم
			3.2	الانسياب بالمم
			413	الجبساءه بالكجم / مم

العينات تخرج عن حدود السملحية للتدرج التصميمي في المهزات المشار اليها

العينة تتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

تم المقارنة بالتدرج التصميمي لطبقة السطحية بالتصميم الوارد من كلية الهندسة جامعه بنها بتاريخ ١٠/١٤/٢٠٢٤ بناء على خطاب الترخيص
مرفقة :-

المنفذة و موافقة جهاز الاشراف

العينات مسنوية من احضرها

ج/ التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
مخلوط اسفلتي	2	480	960
نشاب مارشال	4	150	600
م. ا. ا. تقرير			150
قيمة التجارب			1710
م. ا. ا. %			256.5
م. ا. ا. %			275.35
الإجمالي			2241.85



١٠/١٤/٢٠٢٤

م. ا. ا. م. ا. ا.

مهندس المعمل / مدير المعمل

إدارة الإدارة المركزية

المعقول

م. ا. ا.

استكمال ورفع كفاءة طريق شعوب / المتاحجه مطار المساعبة بطول 12.8 كم

تاريخ العمل: 2011

تقرير معتمدين رقم (22) لسنة 2011

رقم باعتماد العينات: م / اعداد معتمدين
تاريخ: 2011/12/23

عدد (3) عينة مقلوب اسفلت طبقة سطحية (ج1)

الدرج و الاستخلاص و تحديد نسبة الاسفلت و تحديد الثبات و الاستبعاد بطريقة مارتش

طبقة سطحية (ج1)

الدرجات	ك 3,100	ك 2,600	ك 1,100	التدرج التصميم	المواصفات (ج1)
درج 1	100	100	100	100	100
3/4"	98	96	98	96	100
3/8"	74	73	71	71.9	60
#4	51	50	49	52.6	40
#8	39	39	39	40.9	35
#20	22	23	22	24	19
#60	15	15	15	16.1	13
1000	8.5	8.1	9.1	10.2	7
2000	4.9	4.5	4.9	7.2	4
نسبة الاسفلت %	5.60	5.47	5.58	5.25	5.25
الثبات بالكم	1350	1365	1335		
الاستبعاد بالعم	3.1	3.2	3.1		
المواصفات بالكم / عم	435	427	431		

العينات تدرج من حدود السماحية للتدرج التصميم في العينات العشوائية


العينه تفلق في نسبة الاسفلت مع نسبة التصميمية

تم المقارنة بالتدرج التصميمي لطبقة السطحية بالتصميم المراد من جهة الهندسة جامعه بنها بتاريخ 2011/12/23 بقا على انطباق المواصفات المعتمدة و موافقة جهات الاشراف

العينات مسؤولة من احضرها

ج/ التكاليف

الاجراء	عدد الوحدات	معر الوحدة	الاجمالي
مقايير اسفلت	3	480	1440
ثبات مارتش	6	150	900
تقرير			150
فرقة الاجراء			2490
م 1 + 1 %			473.5
م 1 + 1 %			400.50
الاجمالي			3264.10



رئيس الادارة المركزية

تقرير في: 2011/12/23
مدير المعامل / م / م
مدير المعامل

اسم المشروع : استكمال و رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة مطار الصالحية بطول ١٢,٨ كم

تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات

تقرير معطى رقم (٣٤٨) لسنة ٢٠٢٤

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : / / سعيد طه

بتاريخ : ١٠/١١/٢٠٢٤

بيان العينات :-

عدد (٢) عينة مخلوط اسفلتي طبقة سطحية (١ ج)

ختبارات التي اجريت عليها :-

التكرج و الاستخلاص و تحديد نسبة الاسفلت و تحديد الثبات و الانسياب بطريقة مارشال

النتائج :- طبقة سطحية (١ ج)

المواصفات (١ ج)	التكرج التصميمي	ك ٥,١٥٠	ك ٤,٧٠٠	المعدات
100	100	100	100	مجهز سعة 1"
30	80	96	96	3/4"
80	60	71.9	73	3/8"
65	48	52.6	50	#4
50	35	40.9	39	8#
30	19	24	23	30#
23	13	16.1	15	50#
15	7	10.2	8.0	100#
8	3	7.2	4.7	200#
		5.75	5.59	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن 1200 ك		1335	1320	الثبات بالجزم
2-4		3.1	3.0	الانسياب بالمم
300-500		431	440	الجمامة بالجزم / مم

العينات تُخرج عن حدود السماحية للتدرج التصميمي في المعدات العشر البها

العينة تتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

ملاحظة :- تم المقارنة بالتدرج التصميمي لطبقة السطحية بالتصميم الوارد من كلية الهندسة جامعه فيها بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣٠ بناء على خطاب الوزارة المنفذ و موافقة جهاز الاشراف

العينات مسنولة من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	2	480	960
قالب مارشال	4	150	600
م اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			1710
م ا ١٥ %			256.5
ضرب في م ١٤ %			275.35
الاجمالي			2241.85

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



٢٠٢٤/٠٩/١٩

تحريراً في :

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

مدير المعمل



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
الإدارة العامة للمعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : استكمال ورفع كفاءة طريق سعود / المتجاه مطار الصالحية بطول ١٢,٨ كم
تنفيذ شركته : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٣٣٨) لسنة ٢٠٢٤

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : م / احمد سمير
بتاريخ : ٢٠٢٤/٩/٨

بيان العينات :-
الاختبارات التي اجريت عليها :-
عدد (٥) عينة مخلوط اسفلتي لطبقة السطحية (٤ ج) من مواقع مختلفة .

الترج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المواصفات (ج٤)	الترج التصميمي	ك ٢,٤٥٠	ك ١,٩٥٠	ك ١,٤٥٠	ك ٠,٩٥٠	ك ٠,٤٥٠	المعدات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
٨٠	٩٦	٩٦	١٠٠	٩٨	٩٦	٩٨	٣/٤"
٦٥	٨٦	٧١	٧٣	٧١	٧١	٧٤	٣/٨"
٥٠	٧١,٩	٥٠	٥١	٥٠	٥٠	٥٠	١#
٣٥	٤٨	٣٥	٣٨	٤٠	٣٨	٤٠	٨#
٢٥	٤٠,٩	٢٦	٢٦	٢٣	٢٢	٢٣	٣٠#
٢٣	٢٤	١٤	١٤	١٥	١٥	١٦	٥٠#
١٥	١٦,١	٨	٩	٨	٩	٨	١٠٠#
٨	٧,٢	١,٧٩	٤,٢٢	٤,٨٣	٤,٩	٤,٨٩	٢٠٠#
٢	١,٢	٥,٤٥	٥,٤٤	٥,٥٣	٥,٥٨	٥,٦١	نسبة الاسفلت %
٥,٧٥	٥,٢٥	١٣٠٥	١٢٩٥	١٢٨٨	١٢٨٠	١٣٠٠	الثبات بالكجم
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم		٣,١	٣	٣	٢,٩	٣	الانسياب بالمم
٢-٤		٤٢١	٤٣٢	٤٢٩	٤٤١	٤٣٣	الوجاهه كجم/م
٥٠٠-٣٠٠							

العينات تتفق مع حدود السماحية للترج التصميمي بالمعدات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية .
تم مقارنة النتائج بالترج التصميمي الوارد من كلية الهندسة جامعة بنها بتاريخ ٢٠٢٤/١٣/٢٠ بناء على خطاب الشركة المتفاده وموافقة جهاز الاشراف .

محقوقه / العينات مسؤوليه من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد للوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٥	٤٨٠	٢٤٠٠
مارشال	١٠	١٥٠	١٥٠٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			٤٠٥٠
م ا ١٥ %			٦٠٧,٥
ض.ق.م ١٤ %			٦٥٢,١
الاجمالي			٥٣٠٩,٦

تقرير الممر ٢٠٢٤/٠٩/١٦

رئيس الاداره المركزيه
مهندس /
سلوي سامي صالح

مهندس المعمل /
٤٦٦٩
٤٤٢٩/٩/١٧

مدير المعمل
مهندس /
مشر السيد عبد الله

١٢



الهيئة العامة للشرق والشرق والشرق والشرق
 الإدارة المركزية لمنطقة حرس العجوة
 مكتبه الوليد للمطابقة العامة ورسد العجوة.

مقايمة مبندة لعملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري مركز الحسينية محافظة الشرقية - ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرأسية " حياة كريمة "

رقم الترخيص	المدة	الكمية	الاجمالي	الوصف
١٣١٦-٤٩	٢٠,٣٠	٦٤٨٣٠	٢م	بالمتر المستطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (٣٠٠٠ R.C) بمعدل ٤٠ كجم / ٢م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها ونظفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
١٧٨٩٨٢٦٦,٤٠	٢٧٦,٠٨	٦٤٨٣٠	٢م	بالمتر المستطح أعمال الشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن لدرج (٤ج) بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة لاجح لكسور الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ وورد شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
٥٥٥٨٣١	٢٠٤,٥٠	٢٧١٨	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالعباء الأسولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق ثلثا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المرذحة أو المرور على مناطق للوصول الموقع وذلك طبقا لإفادة طاقم الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل -مسافة النقل ٩٠ كم - السعر لا يشمل المادة المحجرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر.
١٩٧٧-١٤٦,٤٠				اجمالي قيمة المقايمة
قيمة الكارئات لعملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري مركز الحسينية محافظة الشرقية - ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرأسية " حياة كريمة "				
رقم الترخيص	المدة	الكمية	الاجمالي	الوصف
٣٥٣٢٤	١٣	٢٧١٨	٣م	أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل ... الخ
١٩٤٤٩٠	٣	٦٤٨٣٠	٢م	أعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن لدرج (٤ج) بسبك ٥ سم ... الخ
٢٢٩٨٢٤				اجمالي قيمة الكارئات
١٩٩٩٩٧٠,٤٠				اجمالي قيمة الكارئات + المقايمة

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

أ. م. رضا
 ك

محضر استلام موقع

عملية : استكمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨ كم
من المناجاة اتجاه المطار العسكرى مركز الحسينية محافظة الشرقية
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بناءً على العقد رقم ٣٤٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ و المحرر بين الهيئة و مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع
مكتب الوليد للمقاولات العامة

• المهندس / أحمد سمير حسن
• السيد المهندس / محمد رضا محمد

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الخميس الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ والرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد
عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضرنا بذلك ،،،

الوقيعان

المهندس/ محمد رضا محمد

المهندس / أحمد سمير حسن

يعتمد
مكتب الإدارة المركزية
سليمان سامى صالح

محضر مسافات نقل المواد (اترية)

لأعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من
المناجاة اتجاه المطار العسكري مركز الحسينية محافظة الشرقية - ضمن المرحلة الأولى المبادرة
الرائسية " حياة كريمة "

قطاع تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات العامة

- بالمرور والمعانة للطريق من محاجر الاترية وصولا للمشروع المشار عليه بمعرفة الشركة المنفذة
ومهندس الهيئة وكان المسار من المحاجر وصولا الى موقع المشروع بالحسينية - قرية سعود / المناجاة /
المطار وكانت المسافة ٩٠ كم .



منهجية التنفيذ

لإستكمال أعمال رفع كفاءه طريق سعود - المناجاه - مطار الصالحية بطول ١٢,٨ كم من المناجاه
إتجاه المطار العسكري - مركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه
جهاه الإشراف/الهيئة العامة للطرق والكبارى - منطقة شرق الدلتا بالزقازيق
تنفيذ /مكتب الوليد للمقاولات

بالمروور والمعانة للطريق القائم بمعرفة مندوب الهيئة والشركة المنفذة وإستشاريها وجد أن القطاع المشار إليه تم رفع كفاءته وتم الإكتفاء بفرش طبقة أسفلتية رابطة وذلك وفق مقايسة الاعمال التى تم طرحها سابقا وأن القطاع بحاجة الى إستكمال القطاع الإنشائى (طبقة أسفلتية سطحية) وذلك للحفاظ على الطبقة الحالية والوصول للعمر التصميمى المستهدف للطريق، وعليه يتم التوصية باتباع مايلى:

- ١- يتم تنظيف السطح الحالى جيدا(الطبقة الأسفلتية الرابطة) وتوفير المعدات اللازمه وإتباع تعليمات جهاز الإشراف.
- ٢- يتم تنفيذ طبقة لاصقة RC وفق مقايسة الأعمال.
- ٣- يتم تنفيذ طبقة أسفلتية سطحية وفق مقايسة الأعمال.

تحريرا فى: ٢٠٢٤/١٠/٢٦

لوجيك للإستشارات الهندسية
أ.د/ أحمد محمدى عبدالله

سجل المهندسين الاستشاريين

رقم القيد ١٢/١٥٢١ - قيد إستشارى ١/٥٩٥٤



لوجيك
للإستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكهرباء (الأدلة المركزية لمنطقته شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئسية " جاهد كريمة " (مركز الصنيدية) - محافظة الشرقية .
 عملية استعمال أصل رفع كفاءة طريق سويذ / المتجاها / مطرر الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المتجاها الجاه المطار المسكري
 تنفيذ / مكتب الريه للمقاولات العامة .

حصر كميات ما تم تنفيذه من أعمال مستخلص جاري (١)

رقم	البند	الوحده	كمية المتأدية المتأدية	الكمية الإجمالية المتأدية
1	أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البتومين السائل سريع التصلب (R.C ٣٠٠) ... الخ	م ^٢	64830	64873
2	أعمال إنشاء طبقه سطحية تدريج (ج 4) بسبك ٥ سم ... الخ	م ^٢	64830	64823

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكباري (الاوره المركزيه لمنطقه شرق الدثا) .
 مشروعات الطرق ضمن الميمنة الرئيسية " حياه كريمة " (مركز الصنبيه) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال اصملا رفع كفاءة طريق سعود / المناجاه / مطر الصنبيه بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاه اتجاه المطر المسوري
 تنفيذ / مكتب الوريد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

اجمالي أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التصلب (R.C ٣٠٠٠)

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند
64823.13	٢م	للاطريق FROM ST. 0+000 TO 7+800	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التصلب (R.C ٣٠٠٠) بمعدل ٠,٤ كجم / ٢م ... الخ
64823.13			الاجمالي العام

مهندس الهيئة


مهندس الشركة
 ١٢ كم رضاي


الهيئة العامة للطرق والبحري (الامارة المركزيه لمنطقه شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / الملاجاء / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من الملاجاء اتجاه المطار العسكري
 تملّذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)


أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠)

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+000	0	9.25	9.25	0.00
0+025	25	8.1	8.675	216.88
0+050	25	7.8	7.95	198.75
0+075	25	7.05	7.425	185.63
0+100	25	6.95	7	175.00
0+125	25	7.25	7.1	177.50
0+150	25	7.8	7.525	188.13
0+175	25	7.2	7.5	187.50
0+200	25	7.65	7.425	185.63
0+225	25	8	7.825	195.63
0+250	25	7.9	7.95	198.75
0+275	25	7.9	7.9	197.50
0+300	25	7.45	7.675	191.88
0+325	25	7.75	7.6	190.00
0+350	25	7.5	7.625	190.63
0+375	25	7.85	7.675	191.88
0+400	25	8.2	8.025	200.63
0+425	25	7.9	8.05	201.25
0+450	25	7.5	7.7	192.50
0+475	25	7.5	7.5	187.50
0+500	25	8.1	7.8	195.00
0+525	25	8	8.05	201.25
0+550	25	8.2	8.1	202.50
0+575	25	7.5	7.85	196.25
0+600	25	8.05	7.775	194.38
0+625	25	8.45	8.25	206.25
0+650	25	8.15	8.3	207.50
0+675	25	8.4	8.275	206.88
0+700	25	8.35	8.375	209.38
0+725	25	8.2	8.275	206.88

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

١٢ محمد رضا


الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز المسيلية) - محافظة الشرقية .
 صلبة استكمال أعمال رفع لقناة طريق سعود / المشاهة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المشاهة تجاه المطار العسكري
 تليد / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C٣٠٠٠)

الاجمالي	متوسط العرض	العرض	الطول	ST.
203.13	8.125	8.05	25	0+750
203.13	8.125	8.2	25	0+775
205.63	8.225	8.25	25	0+800
202.50	8.1	7.95	25	0+825
204.38	8.175	8.4	25	0+850
211.25	8.45	8.5	25	0+875
211.25	8.45	8.4	25	0+900
211.25	8.45	8.5	25	0+925
208.75	8.35	8.2	25	0+950
206.25	8.25	8.3	25	0+975
208.75	8.35	8.4	25	1+000
211.25	8.45	8.5	25	1+025
211.25	8.45	8.4	25	1+050
210.00	8.4	8.4	25	1+075
219.38	8.775	9.15	25	1+100
254.38	10.175	11.2	25	1+125
263.13	10.525	9.85	25	1+150
236.25	9.45	9.05	25	1+175
223.13	8.925	8.8	25	1+200
220.63	8.825	8.85	25	1+225
213.13	8.525	8.2	25	1+250
207.50	8.3	8.4	25	1+275
213.75	8.55	8.7	25	1+300
217.50	8.7	8.7	25	1+325
219.38	8.775	8.85	25	1+350
220.63	8.825	8.8	25	1+375
220.63	8.825	8.85	25	1+400
225.00	9	9.15	25	1+425
228.75	9.15	9.15	25	1+450
219.38	8.775	8.4	25	1+475

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٣ أكتوبر ٢٠٢٠ م

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الصينبية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصحاحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري
 تلغيد / مكتب الوايد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠)

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
1+500	25	8.5	8.45	211.25
1+525	25	8.9	8.7	217.50
1+550	25	8.6	8.75	218.75
1+575	25	9	8.8	220.00
1+600	25	8.65	8.825	220.63
1+625	25	8.3	8.475	211.88
1+650	25	8.4	8.35	208.75
1+675	25	8.7	8.55	213.75
1+700	25	8.75	8.725	218.13
1+725	25	8.8	8.775	219.38
1+750	25	8.75	8.775	219.38
1+775	25	8.75	8.75	218.75
1+800	25	8.55	8.65	216.25
1+825	25	8.4	8.475	211.88
1+850	25	8.3	8.35	208.75
1+875	25	8.15	8.225	205.63
1+900	25	8.25	8.2	205.00
1+925	25	8.5	8.375	209.38
1+950	25	8.7	8.6	215.00
1+975	25	9.35	9.025	225.63
2+000	25	10	9.675	241.88
2+025	25	9.9	9.95	248.75
2+050	25	8.8	9.35	233.75
2+075	25	8.45	8.625	215.63
2+100	25	8.15	8.3	207.50
2+125	25	8.3	8.225	205.63
2+150	25	8.05	8.175	204.38
2+175	25	8.2	8.125	203.13
2+200	25	7.9	8.05	201.25
2+225	25	8	7.95	198.75

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

أحمد محمد شاكر
 م

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) ،
 مشروعات الطرق ضمن الميمنة الرئيسية " حياة تروية " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المنجاش / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المنجاش اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للتقويات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠٠)

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
2+250	25	8.35	8.175	204.38
2+275	25	8.5	8.425	210.63
2+300	25	8.3	8.4	210.00
2+325	25	8.3	8.3	207.50
2+350	25	8.1	8.2	205.00
2+375	25	8.05	8.075	201.88
2+400	25	8.1	8.075	201.88
2+425	25	8.55	8.325	208.13
2+450	25	8.45	8.5	212.50
2+475	25	8.15	8.3	207.50
2+500	25	8.2	8.175	204.38
2+525	25	8	8.1	202.50
2+550	25	8.15	8.075	201.88
2+575	25	7.8	7.975	199.38
2+600	25	8	7.9	197.50
2+625	25	8.2	8.1	202.50
2+650	25	8.2	8.2	205.00
2+675	25	8	8.1	202.50
2+700	25	8.05	8.025	200.63
2+725	25	8.1	8.075	201.88
2+750	25	8.25	8.175	204.38
2+775	25	8.1	8.175	204.38
2+800	25	7.9	8	200.00
2+825	25	8.3	8.1	202.50
2+850	25	8.35	8.325	208.13
2+875	25	8.25	8.3	207.50
2+900	25	8.25	8.25	206.25
2+925	25	7.9	8.075	201.88
2+950	25	7.75	7.825	195.63
2+975	25	8	7.875	196.88

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

١٣ أكتوبر ٢٠٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن العبارة الرئاسية " جناه كريمة " (مركز الصينبة) - محافظة الشرقية .
 صلية استعمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصحبة بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.T.٠٠٠)

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
3+000	25	7.95	7.975	199.38
3+025	25	7.95	7.95	198.75
3+050	25	8.2	8.075	201.88
3+075	25	7.8	8	200.00
3+100	25	7.5	7.65	191.25
3+125	25	7	7.25	181.25
3+150	25	7.7	7.35	183.75
3+175	25	7.85	7.775	194.38
3+200	25	7.5	7.675	191.88
3+225	25	7.6	7.55	188.75
3+250	25	7.8	7.7	192.50
3+275	25	7.75	7.775	194.38
3+300	25	7.55	7.65	191.25
3+325	25	7.95	7.75	193.75
3+350	25	7.9	7.925	198.13
3+375	25	8.25	8.075	201.88
3+400	25	8.4	8.325	208.13
3+425	25	8.4	8.4	210.00
3+450	25	8.4	8.4	210.00
3+475	25	8.25	8.325	208.13
3+500	25	8.05	8.15	203.75
3+525	25	8.6	8.325	208.13
3+550	25	8.8	8.7	217.50
3+575	25	9.15	8.975	224.38
3+600	25	9.2	9.175	229.38
3+625	25	9.15	9.175	229.38
3+650	25	9.15	9.15	228.75
3+675	25	9.35	9.25	231.25
3+700	25	9	9.175	229.38
3+725	25	8.4	8.7	217.50

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

٢٢ كبريها



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصححية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار المصري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.T . . .)

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
3+750	25	8.25	8.325	208.13
3+775	25	8.5	8.375	209.38
3+800	25	8.3	8.4	210.00
3+825	25	8.6	8.45	211.25
3+850	25	9	8.8	220.00
3+875	25	9.15	9.075	226.88
3+900	25	9.1	9.125	228.13
3+925	25	9.35	9.225	230.63
3+950	25	9.05	9.2	230.00
3+975	25	8.75	8.9	222.50
4+000	25	8.85	8.8	220.00
4+025	25	8.25	8.55	213.75
4+050	25	8.1	8.175	204.38
4+075	25	8.05	8.075	201.88
4+100	25	8	8.025	200.63
4+125	25	8	8	200.00
4+150	25	8.2	8.1	202.50
4+175	25	8.05	8.125	203.13
4+200	25	7.8	7.925	198.13
4+225	25	7.9	7.85	196.25
4+250	25	7.95	7.925	198.13
4+275	25	8.2	8.075	201.88
4+300	25	8.1	8.15	203.75
4+325	25	7.95	8.025	200.63
4+350	25	8.45	8.2	205.00
4+375	25	7.9	8.175	204.38
4+400	25	7.95	7.925	198.13
4+425	25	8.45	8.2	205.00
4+450	25	9	8.725	218.13
4+475	25	8.7	8.85	221.25

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

١٣٠٠٠٠٠٠



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المتحاذ / مطار الصحاح بطول ١٢,٨٠ كم من المتحاذ اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠٠)

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الإجمالي
4+500	25	8.55	8.625	215.63
4+525	25	8.2	8.375	209.38
4+550	25	8.25	8.225	205.63
4+575	25	8.2	8.225	205.63
4+600	25	8.85	8.525	213.13
4+625	25	8.5	8.675	216.88
4+650	25	8.6	8.55	213.75
4+675	25	8.4	8.5	212.50
4+700	25	8	8.2	205.00
4+725	25	8	8	200.00
4+750	25	8.05	8.025	200.63
4+775	25	7.95	8	200.00
4+800	25	7.95	7.95	198.75
4+825	25	7.75	7.85	196.25
4+850	25	7.95	7.85	196.25
4+875	25	8.1	8.025	200.63
4+900	25	8.2	8.15	203.75
4+925	25	8.35	8.275	206.88
4+950	25	8.05	8.2	205.00
4+975	25	8.35	8.2	205.00
5+000	25	8.15	8.25	206.25
5+025	25	8.3	8.225	205.63
5+050	25	8.2	8.25	206.25
5+075	25	7.95	8.075	201.88
5+100	25	7.9	7.925	198.13
5+125	25	7.8	7.85	196.25
5+150	25	8.05	7.925	198.13
5+175	25	8.3	8.175	204.38
5+200	25	8.2	8.25	206.25
5+225	25	8.2	8.2	205.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

محمد محمد محمد



الهيئة العامة لتطرق والنهري (الامارة المركزية لمنطقة شرق الفلنا) ،
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئسية " حياة تحريمة " (مركز الحسنية) - محافظة الشرقية ،
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق مسعود / المشاه / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المشاه اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب التوحيد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠٠)

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
5+250	25	8.35	8.275	206.88
5+275	25	8.45	8.4	210.00
5+300	25	8.2	8.325	208.13
5+325	25	7.95	8.075	201.88
5+350	25	8.3	8.125	203.13
5+375	25	8.2	8.25	206.25
5+400	25	7.85	8.025	200.63
5+425	25	8.1	7.975	199.38
5+450	25	8.35	8.225	205.63
5+475	25	8.2	8.275	206.88
5+500	25	8.2	8.2	205.00
5+525	25	8.3	8.25	206.25
5+550	25	8.2	8.25	206.25
5+575	25	8.2	8.2	205.00
5+600	25	8.05	8.125	203.13
5+625	25	8.2	8.125	203.13
5+650	25	7.9	8.05	201.25
5+675	25	7.95	7.925	198.13
5+700	25	8.1	8.025	200.63
5+725	25	8.8	8.45	211.25
5+750	25	9	8.9	222.50
5+775	25	8.85	8.925	223.13
5+800	25	8	8.425	210.63
5+825	25	8.5	8.25	206.25
5+850	25	8	8.25	206.25
5+875	25	8.75	8.375	209.38
5+900	25	8.55	8.65	216.25
5+925	25	8.8	8.675	216.88
5+950	25	8.95	8.875	221.88
5+975	25	9.15	9.05	226.25

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. محمد احمد



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية = حياة كريمة = (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع تقانة طريق مسعود / الملاياه / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوايد للمحولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠٠)

الاجمالي	متوسط العرض	العرض	الطول	ST.
226.88	9.075	9	25	6+000
218.75	8.75	8.5	25	6+025
213.13	8.525	8.55	25	6+050
211.88	8.475	8.4	25	6+075
207.50	8.3	8.2	25	6+100
206.25	8.25	8.3	25	6+125
205.63	8.225	8.15	25	6+150
206.88	8.275	8.4	25	6+175
212.50	8.5	8.6	25	6+200
208.75	8.35	8.1	25	6+225
201.88	8.075	8.09	25	6+250
198.75	7.95	7.85	25	6+275
200.00	8	8.15	25	6+300
204.38	8.175	8.2	25	6+325
207.50	8.3	8.4	25	6+350
206.88	8.275	8.15	25	6+375
204.38	8.175	8.2	25	6+400
206.25	8.25	8.3	25	6+425
206.25	8.25	8.2	25	6+450
206.88	8.275	8.35	25	6+475
210.00	8.4	8.45	25	6+500
209.38	8.375	8.3	25	6+525
206.88	8.275	8.25	25	6+550
205.00	8.2	8.15	25	6+575
206.88	8.275	8.4	25	6+600
223.13	8.925	9.45	25	6+625
220.63	8.825	8.2	25	6+650
205.63	8.225	8.25	25	6+675
206.88	8.275	8.3	25	6+700
209.38	8.375	8.45	25	6+725

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

١٢/١٢/٢٠٢٠



الهيئة العامة للطرق والكباري (الاتحاد المركزيه لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري
 تلغيف / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طيقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠)

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الإجمالي
6+750	25	8.55	8.5	212.50
6+775	25	8.75	8.65	216.25
6+800	25	8.55	8.65	216.25
6+825	25	9.05	8.8	220.00
6+850	25	9.05	9.05	226.25
6+875	25	9.3	9.175	229.38
6+900	25	9.05	9.175	229.38
6+925	25	8.15	8.6	215.00
6+950	25	8.05	8.1	202.50
6+975	25	8.2	8.125	203.13
7+000	25	8.2	8.2	205.00
7+025	25	8	8.1	202.50
7+050	25	8.3	8.15	203.75
7+075	25	8.15	8.225	205.63
7+100	25	8.1	8.125	203.13
7+125	25	8.2	8.15	203.75
7+150	25	8.2	8.2	205.00
7+175	25	8.2	8.2	205.00
7+200	25	8.2	8.2	205.00
7+225	25	8.3	8.25	206.25
7+250	25	8.35	8.325	208.13
7+275	25	8.6	8.475	211.88
7+300	25	8.65	8.625	215.63
7+325	25	8.55	8.6	215.00
7+350	25	8.45	8.5	212.50
7+375	25	8.45	8.45	211.25
7+400	25	8.8	8.625	215.63
7+425	25	8.8	8.8	220.00
7+450	25	8.45	8.625	215.63
7+475	25	8.2	8.325	208.13

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


١٢٠٠٠٠٠٠٠

الهيئة العامة للطرق والكهرباء (الاتحاد المركزيه لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن الميادرة الرئيسية " حياه كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استعمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المتجاه / مطار الصالحية بطول ١٢.٨٠ كم من الاتجاه تجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (١)

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠٠)

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
7+500	25	8.15	8.175	204.38
7+525	25	8	8.075	201.88
7+550	25	8	8	200.00
7+575	25	8	8	200.00
7+600	25	8.05	8.025	200.63
7+625	25	7.9	7.975	199.38
7+650	25	7.8	7.85	196.25
7+675	25	8.05	7.925	198.13
7+700	25	8.1	8.075	201.88
7+725	25	8	8.05	201.25
7+750	25	8	8	200.00
7+775	25	8	8	200.00
7+800	25	8.3	8.15	203.75
الاجمالي				64823.13

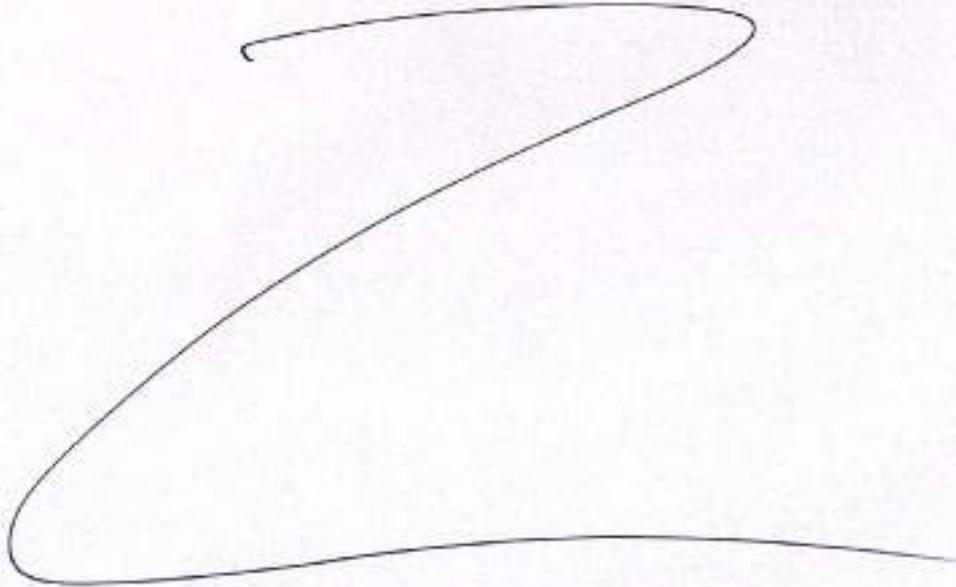

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

اجمالي أعمال انشاء طبقه سطحية تدرج (4ج) بسمك ٥ سم

الاجمالي	الوحده	الاعمال	البند
64823.13	٢م	للطريق FROM ST. 0+000 TO 7+800	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (4ج) بسمك ٥ سم ... الخ
64823.13		الاجمالي العام	

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن الميادنة الرئيسية " حياء كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المتاجاه / مطار الصحاح بطول ١٢,٨٠ كم من المتاجاه اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)


أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (4 ج) بسمك ٥ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
0+000	0	9.25	9.25	0.00
0+025	25	8.1	8.675	216.88
0+050	25	7.8	7.95	198.75
0+075	25	7.05	7.425	185.63
0+100	25	6.95	7	175.00
0+125	25	7.25	7.1	177.50
0+150	25	7.8	7.525	188.13
0+175	25	7.2	7.5	187.50
0+200	25	7.65	7.425	185.63
0+225	25	8	7.825	195.63
0+250	25	7.9	7.95	198.75
0+275	25	7.9	7.9	197.50
0+300	25	7.45	7.675	191.88
0+325	25	7.75	7.6	190.00
0+350	25	7.5	7.625	190.63
0+375	25	7.85	7.675	191.88
0+400	25	8.2	8.025	200.63
0+425	25	7.9	8.05	201.25
0+450	25	7.5	7.7	192.50
0+475	25	7.5	7.5	187.50
0+500	25	8.1	7.8	195.00
0+525	25	8	8.05	201.25
0+550	25	8.2	8.1	202.50
0+575	25	7.5	7.85	196.25
0+600	25	8.05	7.775	194.38
0+625	25	8.45	8.25	206.25
0+650	25	8.15	8.3	207.50
0+675	25	8.4	8.275	206.88
0+700	25	8.35	8.375	209.38
0+725	25	8.2	8.275	206.88

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكهرباء (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن الميمنة الرملية " حياة تريمية " (مركز الصينينة) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول 12.80 كم من المناجاة تجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (4 ج) بسبك ٥ سم

الاجمالي	متوسط العرض	العرض	الطول	ST.
203.13	8.125	8.05	25	0+750
203.13	8.125	8.2	25	0+775
205.63	8.225	8.25	25	0+800
202.50	8.1	7.95	25	0+825
204.38	8.175	8.4	25	0+850
211.25	8.45	8.5	25	0+875
211.25	8.45	8.4	25	0+900
211.25	8.45	8.5	25	0+925
208.75	8.35	8.2	25	0+950
206.25	8.25	8.3	25	0+975
208.75	8.35	8.4	25	1+000
211.25	8.45	8.5	25	1+025
211.25	8.45	8.4	25	1+050
210.00	8.4	8.4	25	1+075
219.38	8.775	9.15	25	1+100
254.38	10.175	11.2	25	1+125
263.13	10.525	9.85	25	1+150
236.25	9.45	9.05	25	1+175
223.13	8.925	8.8	25	1+200
220.63	8.825	8.85	25	1+225
213.13	8.525	8.2	25	1+250
207.50	8.3	8.4	25	1+275
213.75	8.55	8.7	25	1+300
217.50	8.7	8.7	25	1+325
219.38	8.775	8.85	25	1+350
220.63	8.825	8.8	25	1+375
220.63	8.825	8.85	25	1+400
225.00	9	9.15	25	1+425
228.75	9.15	9.15	25	1+450
219.38	8.775	8.4	25	1+475

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أ. م. أحمد رضا حسن

الهيئة العامة للطرق والكباري (الامارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 صلحية استعمال اصالح رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة الجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (4 ج) بسبك ٥ سم

الاجمالي	متوسط العرض	العرض	الطول	ST.
211.25	8.45	8.5	25	1+500
217.50	8.7	8.9	25	1+525
218.75	8.75	8.6	25	1+550
220.00	8.8	9	25	1+575
220.63	8.825	8.65	25	1+600
211.88	8.475	8.3	25	1+625
208.75	8.35	8.4	25	1+650
213.75	8.55	8.7	25	1+675
218.13	8.725	8.75	25	1+700
219.38	8.775	8.8	25	1+725
219.38	8.775	8.75	25	1+750
218.75	8.75	8.75	25	1+775
216.25	8.65	8.55	25	1+800
211.88	8.475	8.4	25	1+825
208.75	8.35	8.3	25	1+850
205.63	8.225	8.15	25	1+875
205.00	8.2	8.25	25	1+900
209.38	8.375	8.5	25	1+925
215.00	8.6	8.7	25	1+950
225.63	9.025	9.35	25	1+975
241.88	9.675	10	25	2+000
248.75	9.95	9.9	25	2+025
233.75	9.35	8.8	25	2+050
215.63	8.625	8.45	25	2+075
207.50	8.3	8.15	25	2+100
205.63	8.225	8.3	25	2+125
204.38	8.175	8.05	25	2+150
203.13	8.125	8.2	25	2+175
201.25	8.05	7.9	25	2+200
198.75	7.95	8	25	2+225

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الصنيدية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المتناجاه / مطار الصحاحية بطول ١٢,٨٠ كم من المتناجاه اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوايد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)


أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (4 ج) بسبك ٥ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
2+250	25	8.35	8.175	204.38
2+275	25	8.5	8.425	210.63
2+300	25	8.3	8.4	210.00
2+325	25	8.3	8.3	207.50
2+350	25	8.1	8.2	205.00
2+375	25	8.05	8.075	201.88
2+400	25	8.1	8.075	201.88
2+425	25	8.55	8.325	208.13
2+450	25	8.45	8.5	212.50
2+475	25	8.15	8.3	207.50
2+500	25	8.2	8.175	204.38
2+525	25	8	8.1	202.50
2+550	25	8.15	8.075	201.88
2+575	25	7.8	7.975	199.38
2+600	25	8	7.9	197.50
2+625	25	8.2	8.1	202.50
2+650	25	8.2	8.2	205.00
2+675	25	8	8.1	202.50
2+700	25	8.05	8.025	200.63
2+725	25	8.1	8.075	201.88
2+750	25	8.25	8.175	204.38
2+775	25	8.1	8.175	204.38
2+800	25	7.9	8	200.00
2+825	25	8.3	8.1	202.50
2+850	25	8.35	8.325	208.13
2+875	25	8.25	8.3	207.50
2+900	25	8.25	8.25	206.25
2+925	25	7.9	8.075	201.88
2+950	25	7.75	7.825	195.63
2+975	25	8	7.875	196.88

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / الملاجاء / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من الملاجاء اتجاه المطار العسكري
 تليد / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بلد رقم (٢)


أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (4 ج) بسمك ٥ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الإجمالي
3+000	25	7.95	7.975	199.38
3+025	25	7.95	7.95	198.75
3+050	25	8.2	8.075	201.88
3+075	25	7.8	8	200.00
3+100	25	7.5	7.65	191.25
3+125	25	7	7.25	181.25
3+150	25	7.7	7.35	183.75
3+175	25	7.85	7.775	194.38
3+200	25	7.5	7.675	191.88
3+225	25	7.6	7.55	188.75
3+250	25	7.8	7.7	192.50
3+275	25	7.75	7.775	194.38
3+300	25	7.55	7.65	191.25
3+325	25	7.95	7.75	193.75
3+350	25	7.9	7.925	198.13
3+375	25	8.25	8.075	201.88
3+400	25	8.4	8.325	208.13
3+425	25	8.4	8.4	210.00
3+450	25	8.4	8.4	210.00
3+475	25	8.25	8.325	208.13
3+500	25	8.05	8.15	203.75
3+525	25	8.6	8.325	208.13
3+550	25	8.8	8.7	217.50
3+575	25	9.15	8.975	224.38
3+600	25	9.2	9.175	229.38
3+625	25	9.15	9.175	229.38
3+650	25	9.15	9.15	228.75
3+675	25	9.35	9.25	231.25
3+700	25	9	9.175	229.38
3+725	25	8.4	8.7	217.50

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمطابقه شرق الدلتا) ،
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة الجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال الشاء طبقه سطحية تدرج (4 ج) بسمك ٥ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
3+750	25	8.25	8.325	208.13
3+775	25	8.5	8.375	209.38
3+800	25	8.3	8.4	210.00
3+825	25	8.6	8.45	211.25
3+850	25	9	8.8	220.00
3+875	25	9.15	9.075	226.88
3+900	25	9.1	9.125	228.13
3+925	25	9.35	9.225	230.63
3+950	25	9.05	9.2	230.00
3+975	25	8.75	8.9	222.50
4+000	25	8.85	8.8	220.00
4+025	25	8.25	8.55	213.75
4+050	25	8.1	8.175	204.38
4+075	25	8.05	8.075	201.88
4+100	25	8	8.025	200.63
4+125	25	8	8	200.00
4+150	25	8.2	8.1	202.50
4+175	25	8.05	8.125	203.13
4+200	25	7.8	7.925	198.13
4+225	25	7.9	7.85	196.25
4+250	25	7.95	7.925	198.13
4+275	25	8.2	8.075	201.88
4+300	25	8.1	8.15	203.75
4+325	25	7.95	8.025	200.63
4+350	25	8.45	8.2	205.00
4+375	25	7.9	8.175	204.38
4+400	25	7.95	7.925	198.13
4+425	25	8.45	8.2	205.00
4+450	25	9	8.725	218.13
4+475	25	8.7	8.85	221.25

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٣
 ٥
 ٥

الهيئة العامة للطرق والكباري (الامارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الصينينة) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب التوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (4 ج) بسمك ٥ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
4+500	25	8.55	8.625	215.63
4+525	25	8.2	8.375	209.38
4+550	25	8.25	8.225	205.63
4+575	25	8.2	8.225	205.63
4+600	25	8.85	8.525	213.13
4+625	25	8.5	8.675	216.88
4+650	25	8.6	8.55	213.75
4+675	25	8.4	8.5	212.50
4+700	25	8	8.2	205.00
4+725	25	8	8	200.00
4+750	25	8.05	8.025	200.63
4+775	25	7.95	8	200.00
4+800	25	7.95	7.95	198.75
4+825	25	7.75	7.85	196.25
4+850	25	7.95	7.85	196.25
4+875	25	8.1	8.025	200.63
4+900	25	8.2	8.15	203.75
4+925	25	8.35	8.275	206.88
4+950	25	8.05	8.2	205.00
4+975	25	8.35	8.2	205.00
5+000	25	8.15	8.25	206.25
5+025	25	8.3	8.225	205.63
5+050	25	8.2	8.25	206.25
5+075	25	7.95	8.075	201.88
5+100	25	7.9	7.925	198.13
5+125	25	7.8	7.85	196.25
5+150	25	8.05	7.925	198.13
5+175	25	8.3	8.175	204.38
5+200	25	8.2	8.25	206.25
5+225	25	8.2	8.2	205.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

م. انور رضا



الهيئة العامة للطرق والكباري (الامارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري
 تلفة / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال انشاء طبقة سطحية تدرج (ج 4) بسبك ٥ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
5+250	25	8.35	8.275	206.88
5+275	25	8.45	8.4	210.00
5+300	25	8.2	8.325	208.13
5+325	25	7.95	8.075	201.88
5+350	25	8.3	8.125	203.13
5+375	25	8.2	8.25	206.25
5+400	25	7.85	8.025	200.63
5+425	25	8.1	7.975	199.38
5+450	25	8.35	8.225	205.63
5+475	25	8.2	8.275	206.88
5+500	25	8.2	8.2	205.00
5+525	25	8.3	8.25	206.25
5+550	25	8.2	8.25	206.25
5+575	25	8.2	8.2	205.00
5+600	25	8.05	8.125	203.13
5+625	25	8.2	8.125	203.13
5+650	25	7.9	8.05	201.25
5+675	25	7.95	7.925	198.13
5+700	25	8.1	8.025	200.63
5+725	25	8.8	8.45	211.25
5+750	25	9	8.9	222.50
5+775	25	8.85	8.925	223.13
5+800	25	8	8.425	210.63
5+825	25	8.5	8.25	206.25
5+850	25	8	8.25	206.25
5+875	25	8.75	8.375	209.38
5+900	25	8.55	8.65	216.25
5+925	25	8.8	8.675	216.88
5+950	25	8.95	8.875	221.88
5+975	25	9.15	9.05	226.25

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٣
 ١٣
 ١٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (الأمانة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 صلبة استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار الصالحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)

أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (4 ج) بسمك ٥ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
6+000	25	9	9.075	226.88
6+025	25	8.5	8.75	218.75
6+050	25	8.55	8.525	213.13
6+075	25	8.4	8.475	211.88
6+100	25	8.2	8.3	207.50
6+125	25	8.3	8.25	206.25
6+150	25	8.15	8.225	205.63
6+175	25	8.4	8.275	206.88
6+200	25	8.6	8.5	212.50
6+225	25	8.1	8.35	208.75
6+250	25	8.05	8.075	201.88
6+275	25	7.85	7.95	198.75
6+300	25	8.15	8	200.00
6+325	25	8.2	8.175	204.38
6+350	25	8.4	8.3	207.50
6+375	25	8.15	8.275	206.88
6+400	25	8.2	8.175	204.38
6+425	25	8.3	8.25	206.25
6+450	25	8.2	8.25	206.25
6+475	25	8.35	8.275	206.88
6+500	25	8.45	8.4	210.00
6+525	25	8.3	8.375	209.38
6+550	25	8.25	8.275	206.88
6+575	25	8.15	8.2	205.00
6+600	25	8.4	8.275	206.88
6+625	25	9.45	8.925	223.13
6+650	25	8.2	8.825	220.63
6+675	25	8.25	8.225	205.63
6+700	25	8.3	8.275	206.88
6+725	25	8.45	8.375	209.38

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

١٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / مطار المساحية بطول ١٢,٨٠ كم من المناجاة اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوايد للمقاولات العامة .

بند رقم (٢)


أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (4 ج) بسمك ٥ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الإجمالي
6+750	25	8.55	8.5	212.50
6+775	25	8.75	8.65	216.25
6+800	25	8.55	8.65	216.25
6+825	25	9.05	8.8	220.00
6+850	25	9.05	9.05	226.25
6+875	25	9.3	9.175	229.38
6+900	25	9.05	9.175	229.38
6+925	25	8.15	8.6	215.00
6+950	25	8.05	8.1	202.50
6+975	25	8.2	8.125	205.13
7+000	25	8.2	8.2	205.00
7+025	25	8	8.1	202.50
7+050	25	8.3	8.15	203.75
7+075	25	8.15	8.225	205.63
7+100	25	8.1	8.125	203.13
7+125	25	8.2	8.15	203.75
7+150	25	8.2	8.2	205.00
7+175	25	8.2	8.2	205.00
7+200	25	8.2	8.2	205.00
7+225	25	8.3	8.25	206.25
7+250	25	8.35	8.375	208.13
7+275	25	8.6	8.475	211.88
7+300	25	8.65	8.625	215.63
7+325	25	8.55	8.6	215.00
7+350	25	8.45	8.5	212.50
7+375	25	8.45	8.45	211.25
7+400	25	8.8	8.625	215.63
7+425	25	8.8	8.8	220.00
7+450	25	8.45	8.625	215.63
7+475	25	8.2	8.325	208.13

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا) .
 مشروعات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " (مركز الصينيه) - محافظة الشرقية .
 عملية استكمال أعمال رفع كفاءة طريق سعود / المتجاه / مطار الصحاحه بطول ١٢,٨٠ كم من المتجاه اتجاه المطار العسكري
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامه .

بند رقم (٢)
 أعمال انشاء طبقه سطحية تدرج (ج) بسماك ٥ سم

ST.	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي
7+500	25	8.15	8.175	204.38
7+525	25	8	8.075	201.88
7+550	25	8	8	200.00
7+575	25	8	8	200.00
7+600	25	8.05	8.025	200.63
7+625	25	7.9	7.975	199.38
7+650	25	7.8	7.85	196.25
7+675	25	8.05	7.925	198.13
7+700	25	8.1	8.075	201.88
7+725	25	8	8.05	201.25
7+750	25	8	8	200.00
7+775	25	8	8	200.00
7+800	25	8.3	8.15	203.75
الاجمالي				64823.13

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
