

بخصوص :- المستخلص رقم (١) جارى عن
عملية : اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب
الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (١) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع. ح بقيمة المستخلص وبيانة كالاتى :-

جملة الأعمال ٥٥٧.٠٠٠,٠٠

سابق صرفة .

٥٥٧.٠٠٠,٠٠

الاستقطاعات

قرش	جنية	
٠٠	٢٧٨٥٠٠	٥٪ لحسن سير العمل
٨٠	١٣٤٠٧٨	عادى و اضافى
٤٠	—	توقيع وموارد
٠٠	٢٥٠٦٥	نسبة ٥,٤٥ ٪ قيمة العمالة غير المنتظمة
٠٠	٢٥٠٦٥	نسبة ٥,٤٥ ٪ قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

جملة الاستقطاعات

٤٦٢٧٠٩,٢٠

٥١٠٧٢٩٠,٨٠

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبدالعال حسين)



٣٧٦١٣

عملية : أعمال إزالة الكتبان الرملية بطريق الخارجة / باريس / درب الاربعين
في المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة) (الوادي الجديد)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية عشر
بالوادي الجديد



عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٠٣


تنفيذ: شركة محمد علي أحمد محمود

محضر استلام الموقع

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٥ وبحضور كلاً من :

- ١- السيد المهندس / هاني محمد ابراهيم
 - ٢- السيد المهندس / مصطفى جاد علي
 - ٣- السيد المهندس / مصطفى احمد غازي
 - ٤- السيد المهندس / شعبان جابر حسين
- (مندوب الشركة)
- تم المرور على العملية وجد ان الموقع خالياً من العوائق وعليه تم تسليم الموقع للشركة ويعتبر هذا هو تاريخ البدء العمل .
وهذا محضر منا بذلك ”

التوقيع

()
()
()
()

الاسم

- ١- السيد المهندس / شعبان جابر حسين
- ٢- السيد المهندس / مصطفى احمد غازي
- ٣- السيد المهندس / مصطفى جاد علي
- ٤- السيد المهندس / هاني محمد ابراهيم



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية




علاء عبد العال حسين

مهندس /



تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٢٥



عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «الرجل الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضررا»

عهد من الشر كة

T. Child



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين
المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٠٣).

مستخلص رقم ١ جارى

البند	بيان الأعمال	كمية الحصر
١	بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها لمسافة لاتقل عن ٥٠٠ م من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفه باستخدام المكانس الميكانيكية والفئة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٨٥٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لايقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة بمنهاجية تثبيت الغرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية باستخدام المعدات اللازمة مع الرش بالمياه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم	
	يتم زيادة مبلغ ٦ جنيه فى حالة استخدام البلدوزر فى التحجير وذلك للارض المتماسكة طبقا لتحليل التربة	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





بيان المعدات

التاريخ : ٢٠٢٥-١-١٢

اسم المشروع : عن عملية اعمال إزالة الكشبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادى الجديد)

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة محمد احمد على محمود رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٠٣) لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

المعدة	العدد
لودر	٢
عربية قلاب	٦
تانك مياه	١
سيارات خدمة	٢
هراس	٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





أعمال إزالة الكشبان الرملية بطريق الخارجة / باريس / درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) إلى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد))

بيان الكميات بندق رقم (1) إزالة الكشبان الرملية المستخلص رقم (1) جاري لشركة محمد على احمد محمود

م	البند	الى		الكمية	ملاحظات
1	إزالة الكشبان الرملية	تربة رقم 7-8-9-10	52995.05		
2	إزالة الكشبان الرملية	تربة رقم 1	3883.09		
3	إزالة الكشبان الرملية	تربة رقم 3	5963.88		
4	إزالة الكشبان الرملية	تربة رقم 4	10056.56		
5	إزالة الكشبان الرملية	تربة رقم 5	11201.6		
6	إزالة الكشبان الرملية	تربة رقم 6	5687.4		
الإجمالي الى					89787.58

مهندس الهيئة

التوقيع

١٤٨٣٧٢٢٢





اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تنية رقم 7&8&9&10)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
158+436.00	0.130	0.000	0.000
158+450.00	8.510	62.460	62.460
158+475.00	9.530	234.410	296.870
158+500.00	60.420	864.760	1161.640
158+525.00	96.580	1962.550	3124.180
158+550.00	127.880	2805.740	5929.930
158+575.00	180.870	3957.200	9887.130
158+600.00	217.680	4981.860	14868.980
158+625.00	13.650	2891.660	17760.640
158+650.00	6.030	252.520	18013.170
158+675.00	4.970	131.210	18144.380
158+700.00	11.060	205.870	18350.240
158+725.00	11.740	281.580	18631.820
158+750.00	8.470	257.500	18889.320
158+775.00	3.740	149.870	19039.190
158+800.00	4.270	102.250	19141.440
158+825.00	12.190	202.970	19344.410
158+850.00	7.440	245.370	19589.780
158+875.00	15.710	296.370	19886.160
158+900.00	32.340	600.520	20486.680
158+925.00	19.610	641.620	21128.300
158+950.00	23.200	535.110	21663.410
158+975.00	39.260	780.820	22444.230
159+000.00	48.470	1116.310	23560.540
159+025.00	83.910	1654.720	25215.260
159+050.00	91.540	2320.690	27535.960
159+075.00	74.420	2143.160	29679.110
159+100.00	48.320	1589.740	31268.860
159+125.00	70.520	1485.520	32754.380
159+150.00	60.590	1685.090	34439.470
159+175.00	24.410	1062.480	35501.950
159+200.00	1.020	317.920	35819.870
159+225.00	0.000	12.880	35832.750
159+250.00	0.020	0.240	35832.990

مهندس الهيئة
Coud



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس / درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 7&8&9&10)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
159+275.00	0.010	0.390	35833.380
159+300.00	0.000	0.170	35833.550
159+325.00	0.010	0.090	35833.640
159+350.00	0.050	0.740	35834.380
159+375.00	0.010	0.780	35835.160
159+400.00	0.040	0.640	35835.800
159+425.00	0.000	0.520	35836.320
159+450.00	0.010	0.110	35836.430
159+475.00	0.000	0.120	35836.550
159+500.00	0.000	0.020	35836.570
159+525.00	12.030	152.500	35989.070
159+550.00	14.320	329.480	36318.560
159+575.00	17.640	404.010	36722.570
159+600.00	66.100	1059.800	37782.370
159+625.00	160.290	2718.970	40501.340
159+650.00	98.820	3285.200	43786.540
159+675.00	23.340	1526.990	45313.520
159+700.00	0.000	291.780	45605.300
159+725.00	0.000	0.000	45605.300
159+750.00	0.000	0.000	45605.300
159+775.00	0.000	0.000	45605.300
159+800.00	0.000	0.000	45605.310
159+825.00	0.000	0.010	45605.320
159+850.00	0.000	0.010	45605.330
159+875.00	0.000	0.030	45605.360
159+900.00	70.940	903.180	46508.540
159+925.00	163.320	2928.270	49436.820
159+950.00	0.000	2041.510	51478.320
159+975.00	52.540	649.400	52127.720
159+999.50	18.260	867.330	52995.050

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس / درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة
(الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 1)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.350	0.000	0.000
0+025.00	32.360	408.880	408.880
0+050.00	59.380	1163.080	1571.960
0+075.00	59.440	1485.190	3057.150
0+100.00	6.320	822.030	3879.170
0+101.19	0.250	3.920	3883.090

مهندس الهيئة




مهندس الشركة

شركة
مصرية
للتنفيذ
والتشييد
بض ٥٧٩ / ٨٠٧ / ١٧٢

اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادى الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 3)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.380	0.000	0.000
0+025.00	26.030	330.140	330.140
0+050.00	51.650	970.980	1301.120
0+075.00	102.580	1927.890	3229.010
0+100.00	54.700	1966.050	5195.060
0+125.00	3.760	712.440	5907.500
0+140.40	3.560	56.380	5963.880

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة





حصہ کمیات من کم 146 الی کم 160 (تبیۃ رقم 4)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.430	0.000	0.000
0+025.00	31.780	396.160	396.160
0+050.00	34.790	846.070	1242.220
0+075.00	44.460	980.770	2223.000
0+100.00	55.040	1243.770	3466.770
0+125.00	52.430	1324.800	4791.560
0+150.00	50.110	1314.030	6105.600
0+175.00	80.600	1607.120	7712.720
0+200.00	56.450	1713.080	9425.800
0+222.35	0.000	630.760	10056.560

مهندس الهيئة
محمد أحمد علي

مهندس الشركة



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس /درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)


حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 5)

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	0.000	0.000	0.000
0+025.00	12.530	156.660	156.660
0+050.00	36.810	594.390	751.050
0+075.00	30.520	870.170	1621.220
0+100.00	57.600	1125.230	2746.450
0+125.00	58.590	1436.790	4183.240
0+150.00	65.370	1572.230	5755.480
0+175.00	55.050	1505.180	7260.650
0+200.00	64.440	1550.770	8811.420
0+225.00	70.070	1681.400	10492.820
0+245.23	0.000	708.780	11201.600

مهندس الهيئة
م. علي



مهندس الشركة



اعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة / باريس / درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)

حصر كميات من كم 146 الى كم 160 (تبية رقم 6)


Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
0+000.00	1.730	0.000	0.000
0+025.00	34.310	450.510	450.510
0+050.00	77.190	1488.930	1939.450
0+075.00	9.740	1072.130	3011.580
0+100.00	7.140	208.650	3220.230
0+125.00	45.600	669.950	3890.190
0+150.00	41.440	1070.140	4960.330
0+175.00	10.280	657.570	5617.900
0+185.09	3.490	69.510	5687.400

مهندس الهيئة
عليه المحض



٣٧٦٣

مهندس الشركة
م. ق. ١٧٨ / ٥٧٩ / ٨٠٧ / ١٧٢
م. ق. ١٧٨ / ٥٧٩ / ٨٠٧ / ١٧٢



بيان كميات بند رقم (2) توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية المستخلص رقم (1) جاري لشركة محمد علي احمد محمود

ملاحظات	الكمية	القطاع		البند	م
		الى	من		
	106980	تبه رقم 3-5-6-9		توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية	1
	106980			الاجم الى	

التوقيع / مكي الحفاني

مهندس الشركة



اعمال التطفيل بطريق الخارجة / باريس/درب الأربعين المسافة من كم (١٤٦) الى كم (١٦٠) (حد المنطقة (الوادي الجديد)

حصر مسطح التطفيل تبة 9 & 6 & 5 & 3


المسطح	العرض	الطول	رقم التبة
26450.000	115.000	230.000	9
26250.000	125.000	210.000	6
23760.000	120.000	198.000	5
30520.000	140.000	218.000	3

مهندس الهيئة

أحمد عيسى

مهندس الشركة

أحمد عيسى



أحمد عيسى



مشروع:- اعمال إزالة الكثبان الرملية فى بعض قطاعات طريق الخارجة /
باريس /درب الاربعين من الكم ١٤٦+٠٠٠ الى الكم ١٦٠+٠٠٠ حد منطقة
محافظة الوادى الجديد


تنفيذ : شركة محمد على أحمد محمود
التقرير الأسبوعي





البيانات الأساسية


مشروع: اعمال ازالة الكشبان الرملية فى بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس /درب الاربعين من الكم
الى الكم ١٤٦٠٠٠ حـ منطقة محافظة الوادى الجديد

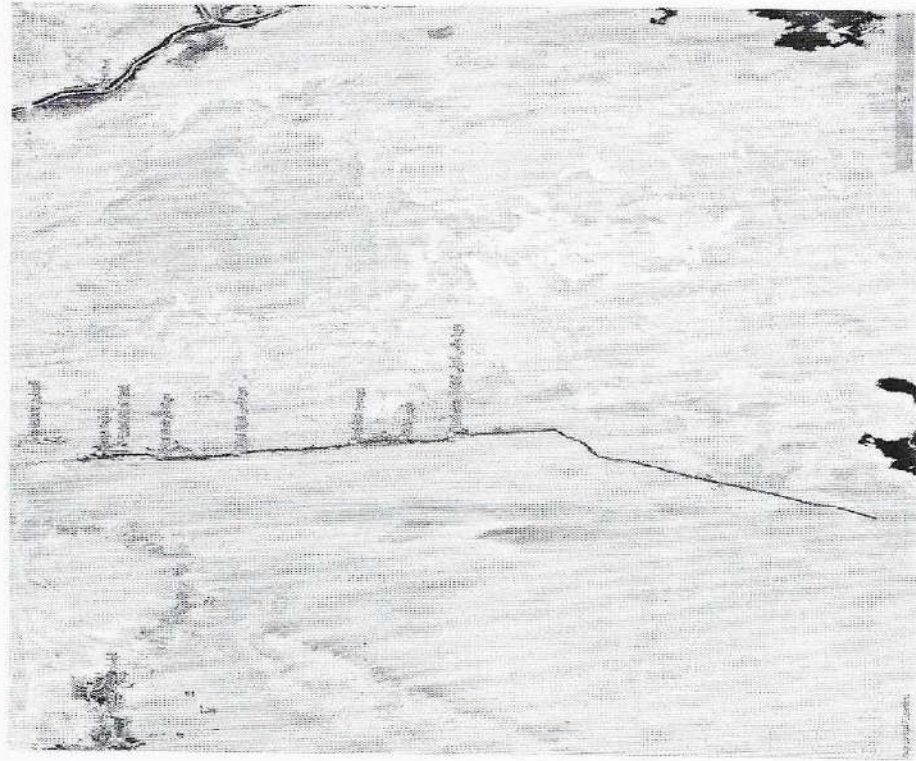


الهيئة العامة للطرق والكبارى	الجهة المصرفة
شركة محمد على احمد محمود	الشركة المنفذة
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٠٣	رقم العقد
١١٨٥١٠٠٠	قيمة العقد
٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٥	تاريخ بدء العمل
%٥١,١٠	نسبة التنفيذ
.	المصرف
	مكونات المشروع



* اعمال ازالة الكشبان الرملية اعلي الطريق والتي تعيق حرية المرور وتوريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكشبان الرملية





الكمية الاجمالية	نسبة التنفيذ %	الوحدة	البند
١١٥٠٠	%٧٣.٦	٣م	١ اعمال ازالة الرمال السائفة
٣٥٠٠٠٠	%٢٨.٦	٢م	٢ توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكتبان الرملية







مشروع: اعمال ازالة الكتلان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس /ارب الاربعين من الكم
١٤٦+٠٠٠ الى ١٦٠+٠٠٠ حد منطقة محافظة الوادي الجديد

صور المشروع ازالة الرمال وتوريد وفرش تربة

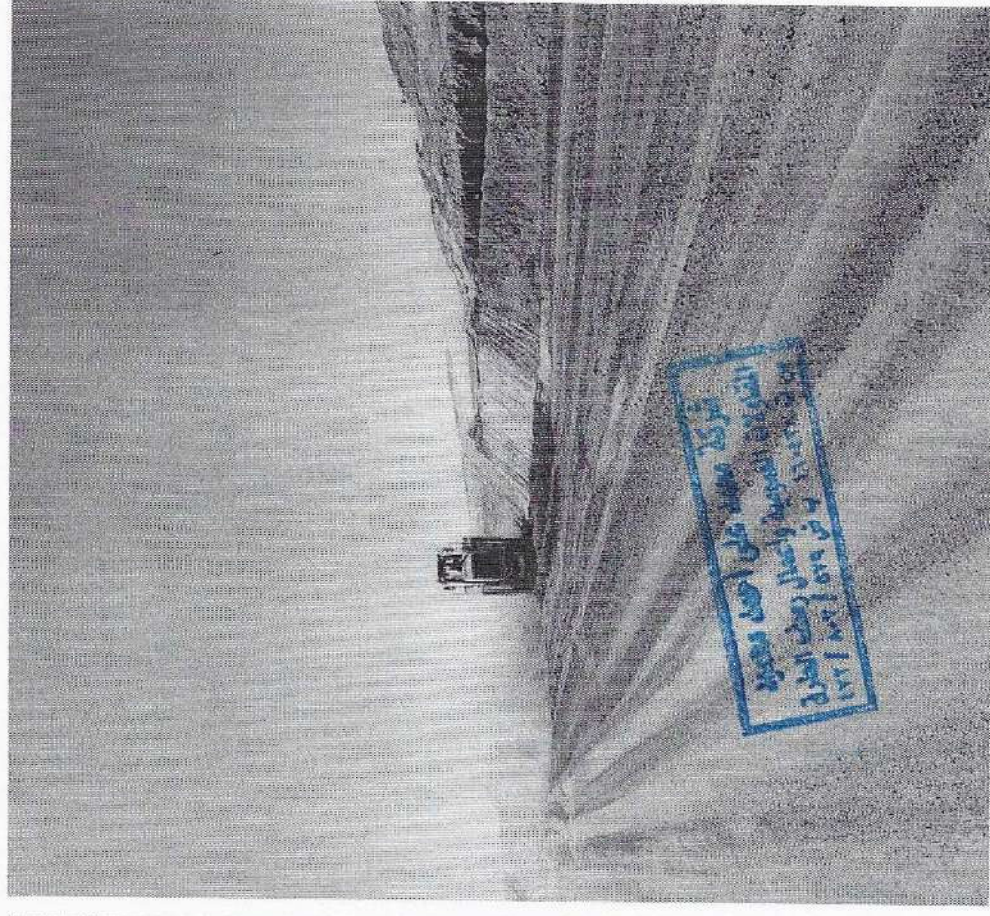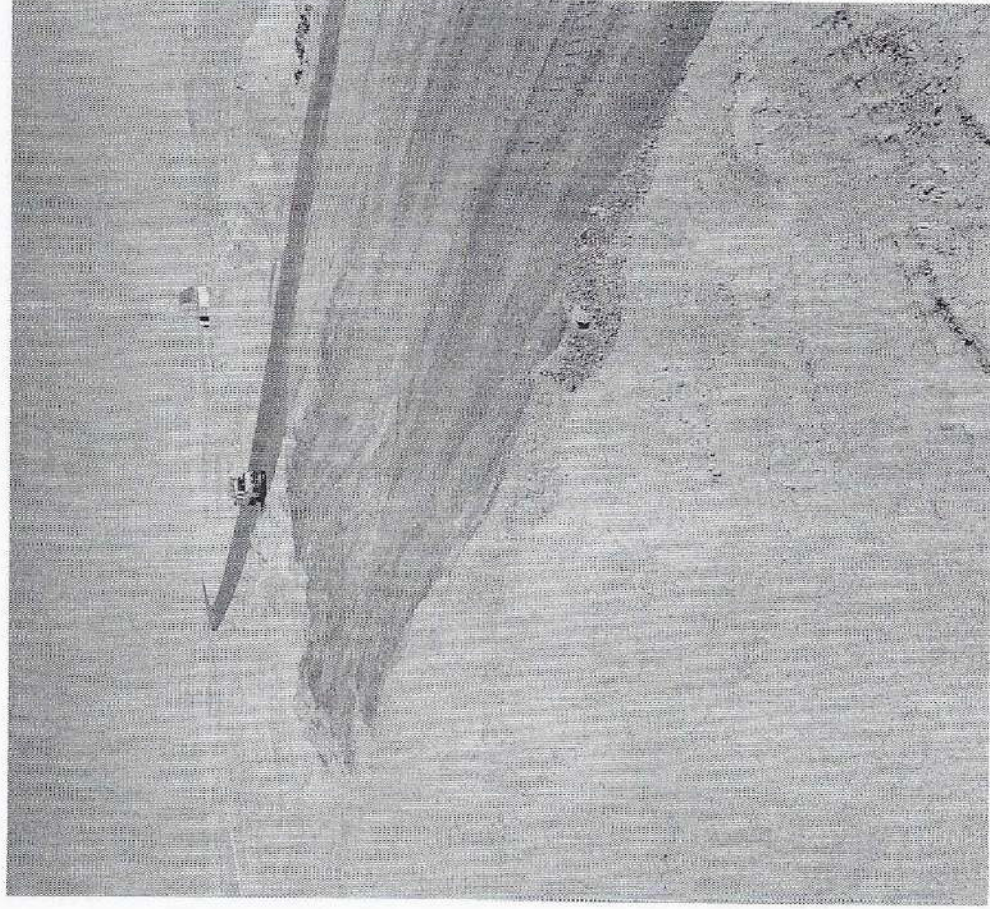

صور المشروع إزالة الرمال وتوريد وفرش تربة

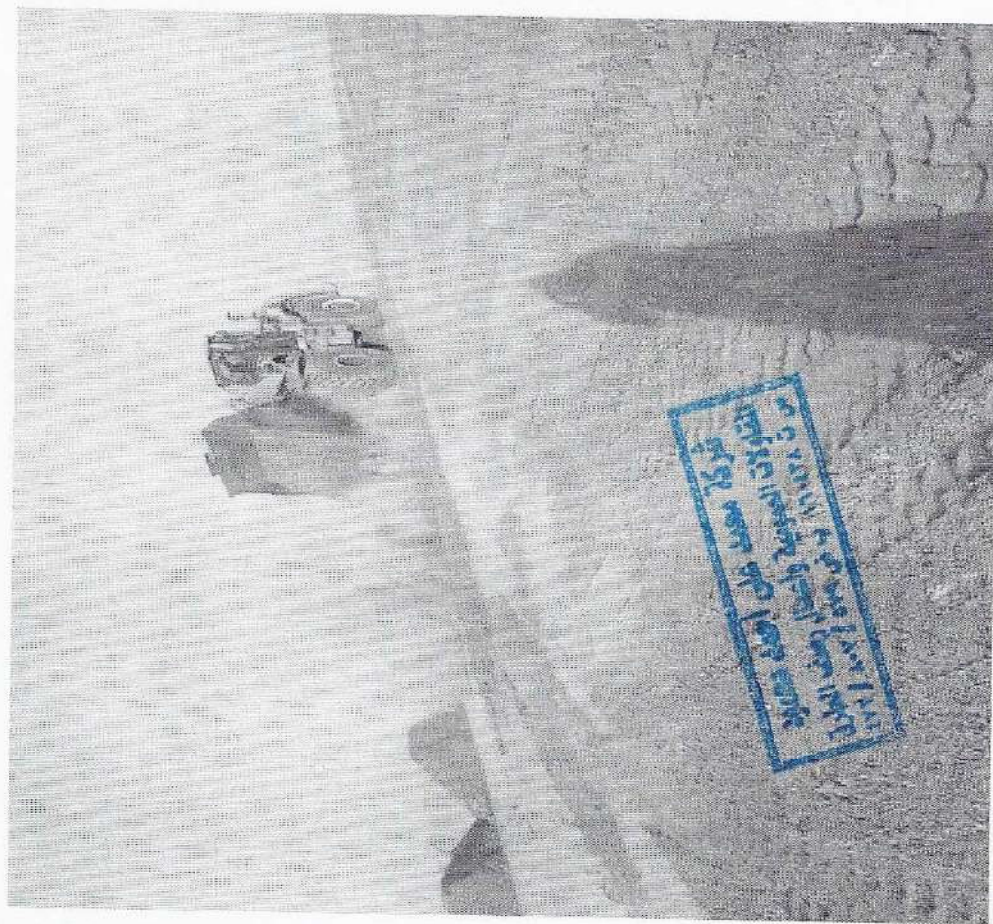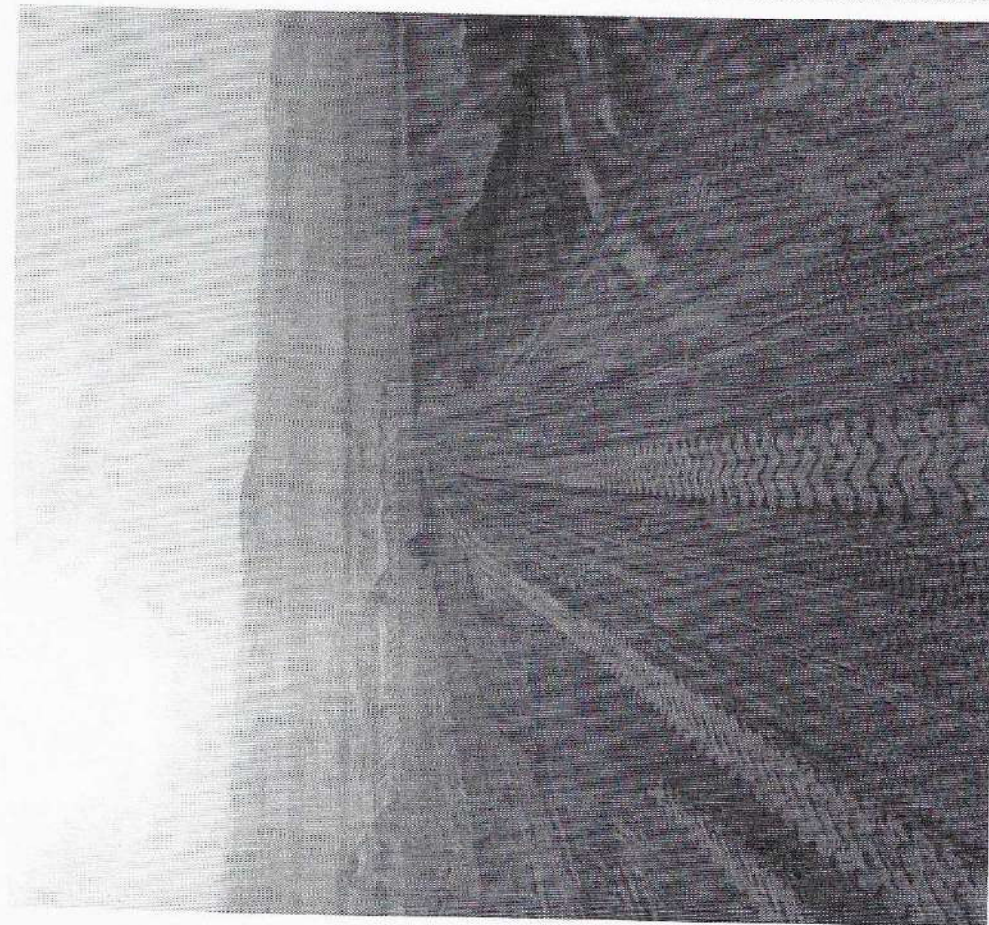

مشروع- ازالة الكتلان الرملية في بعض قطاعات طريق الخارجة / باريس /درب الاربعين من الكم
١٤٦+٠٠٠ الى الكم ١٦٠+٠٠٠ حد منطقة محافظة الوادي الجديد

صور المشروع ازالة الرمال وتوريد وفرش تربة

