

رفع كفاءة طريق الحسنية / عزبه ابوالعلا / ابوشوشة / النشوية / ابوالنيل (القطاع الثالث)

الرضوان للمقاولات

اسم المشروع :

تفصيل شركة :

تقرير معمل رقم (٤١٧) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ : ٢٠٢٣/٨/١٤

قام باحضار العينات : ا/ محمود صالح

عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية ك ٢٠٠٤

عدد (١) عينات دمك نهائي اساس

بيانات ادارية

بيان العينات

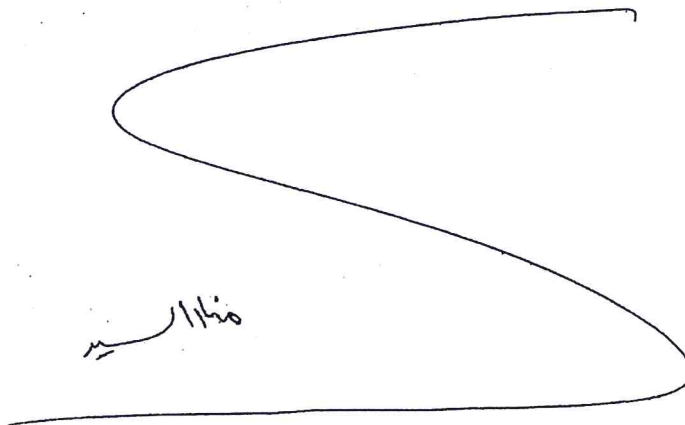
الاجتهادات التي اجريت عليها :

التحليل الشكلي وثوابت اثربرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

اولا : صلاحية سن ٦

المواصفات (تدرج ب)	ك ٢٠٠٤	التحليل
100	100	مهمه لنتجه ٢
70-100	96	1.5"
55-85	66	1"
50-80	48	3/4"
40-70	42	3/8"
30-60	33	مهمه رقم ٤
20-50	24	10"
10-30	15	40"
5-15	8.4	200"
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال اللدونة %
—	7	نسبة السن الطبيعي
لا يزيد عن ٤٥%	30	الصلابة %
—	2.381	الوزن النوعي الكلي
—	2.457	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	2.577	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	3.2	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.6	التحلل %
—	2.23	اقصى كثافة جافة طن/م ^٣
—	7.0	نسبة المياه الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	87	CBR %
—	—	الانتفاخ %

العيته تتفق مع حدود المواصفات ماعدا الممهزه المشار اليها


 مناد

تابع تقرير معلمي رقم (٤١٧) لسنة ٢٠٢٣

عينات الدمك

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	99	4.8	2.21	طبعة اولي اساس

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٣ طن/م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٠ %

ملحوظة: العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العنات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	1	505	505
بن اضلاحي	1	2025	2025
م ا حلال بقرير			150
طبقة التخرات			2680
م. ١٠٥٠ %			402.00
ض ق. م. ١٤ %			431.50
الإجمالي			3513.50

٢٠٢٣/٠٨/٢٠

تقريراً في:

مهندسين التنفيذ / هذا السيد عبدالل

ب

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

مدير المعمل

حازم عبدالمنعم محمد

مهندس /

الهيئة العامة
لإدارة الطرق
والمواصلات
بمحافظة القاهرة
٢٠٢٣/٠٨/٢٠

من ٢/٢

عملية : طريق فاقوس / الحسينية (عزبة أبو العلا/ أبوشوشه / النشويه / ابوالنيل) حتي طريق الحسينيه/فاقوس (القطاع الثالث)
بطول 4.5 كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
إشراف : (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

					رقم المستخلص : (١)	
م	رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المنفذة	اجمالي الحصر السابق	اجمالي الحصر الحالي
١	٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة ... (بالمتر المكعب)	م ³	٧٩٠	.	٧٩٠
٢	٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم... (بالمتر المكعب)	م ³	٥٤	.	٥٤
٣	٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات... (بالمتر المكعب)	م ³	٣٧٤٤	.	٣٧٤٤

مهندس الهيئة

أحمد محمد عبد الله

مهندس الاستشاري

بازل كامل

مهندس الشركة المنفذة

محمد عبد الله

عديلة : طريق فلقوس / الحسينية / مزرية ابو العلال / أبو شوشبة / اللثوية / ابو النبل / حتى طريق الحسينية / فلقوس (القطاع الثالث)
بطول 5.4 كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبنية حياة كريمة
إشراف : (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

حصار أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره... (بالتر المسكب)

Station	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	الكمية (م ³)
0+000	12.50	5.00	0.11	6.88
0+025	25.00	5.00	0.11	13.75
0+050	25.00	5.00	0.11	13.75
0+075	25.00	4.30	0.11	11.83
0+100	25.00	4.30	0.10	10.75
0+125	25.00	4.30	0.11	11.83
0+150	25.00	4.70	0.12	14.10
0+175	25.00	5.00	0.12	15.00
0+200	25.00	5.00	0.13	16.25
0+225	25.00	5.30	0.13	17.23
0+250	25.00	5.30	0.13	17.23
0+275	25.00	5.40	0.13	17.55
0+300	25.00	5.50	0.13	17.88
0+325	25.00	5.20	0.12	15.60
0+350	25.00	5.50	0.12	16.50
0+375	25.00	5.30	0.12	15.90
0+400	25.00	5.20	0.11	14.30
0+425	25.00	5.30	0.11	14.58
0+450	25.00	5.50	0.12	16.50
0+475	25.00	5.50	0.12	16.50
0+500	25.00	5.50	0.12	16.50
0+525	25.00	5.60	0.12	16.80
0+550	25.00	5.60	0.12	16.80
0+575	25.00	5.70	0.12	17.10
0+600	25.00	5.70	0.12	17.10
0+625	25.00	5.30	0.13	17.23
0+650	25.00	5.70	0.13	18.53
0+675	25.00	5.30	0.13	17.23
0+700	25.00	6.00	0.13	19.50
0+725	25.00	5.90	0.13	19.18
0+750	25.00	5.80	0.12	17.40
0+775	25.00	5.40	0.12	16.20
0+800	25.00	4.50	0.12	13.50
0+825	25.00	4.80	0.12	14.40
0+850	25.00	5.00	0.12	15.00
0+875	25.00	5.10	0.12	15.30
0+900	25.00	5.30	0.12	15.90
0+925	25.00	5.30	0.12	15.90
0+950	25.00	4.90	0.12	14.70
0+975	25.00	5.50	0.12	16.50
1+000	25.00	5.80	0.12	17.40
1+025	25.00	5.80	0.12	17.40
1+050	25.00	5.80	0.12	17.40
1+075	25.00	6.00	0.12	18.00
1+100	25.00	5.60	0.11	15.40
1+125	25.00	5.00	0.11	13.75
1+150	25.00	5.20	0.11	14.30
1+175	25.00	5.30	0.11	14.58
1+200	25.00	5.20	0.11	14.30
1+225	25.00	5.00	0.12	15.00
1+250	12.50	5.00	0.12	7.50
اجمالي الحصر الحالي				790
اجمالي الحصر السابق				0
اجمالي الكمية المنقذة				790

مهندس الهيئة

مهندس الإستشارى

مهندس الشركة المنقذة

[Signature]

[Signature]

[Signature]

عملية : طريق فائقس / الحسينية / عزبة أبو العلا / أبو شوشه / النشويه / أبو النيل (حتى طريق الحسينية / فائقس) (القطاع الثالث)
بطول 4.5 كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
إشراف : (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

حصر كميات أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم... (بالمتر المكعب)

tation	المناسيب قبل الردم		المناسيب بعد الردم		سمك Right (م)	سمك CL (م)	متوسط سمك الردم (م)	المريض (م)	الطول (م)	كمية الردم (3م)
	Right	CL	Right	CL						
+000	28.89	28.98	29.11	29.21	0.22	0.23	0.225	5.5	12.5	15.47
+025	29.02	28.99	29.19	29.2	0.17	0.21	0.19	5.5	25	26.13
+050	28.93	28.92	29.11	29.11	0.18	0.19	0.185	5.5	12.5	12.72

اجمالي الحصر الحالي

54

اجمالي الحصر السابق

0

اجمالي الكمية المنفذة

54

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

بالد كامل

مهندس الشركة المنفذة

حسنة

عملية : طريق فاقوس / الحسينية / عزبة أبو العلا أبو شوشة / النشوية / أبو النيل (حتى طريق الحسينية/فاقوس (القطاع الثالث)
بطول 4.5كم (مركز الحسينية) - (محافطة الشرقية) - (مبادرة حياة كريمة
إبرلاف : (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات ... (بالمتر المكعب)

station	مناخيب الأرض الطبيعية						مناخيب طبقة الأسس النهائية						(السمك (د))				(المرض (د))	(الطول (د))	(الكمية (د))
	Right	CL	Left	Right	CL	Left	Right	CL	Left	Right	CL	Left	مقسمة القطاع						
0+000	29.00	29.05	29.10	29.23	29.30	29.35	0.23	0.25	0.25	0.24	8.80	0.00	0.00						
0+025	29.10	29.13	29.22	29.37	29.41	29.51	0.27	0.28	0.29	0.28	9.40	25.00	65.80						
0+050	29.25	29.27	29.30	29.51	29.52	29.61	0.26	0.25	0.31	0.27	9.90	25.00	67.65						
0+075	29.40	29.40	29.38	29.63	29.65	29.65	0.23	0.25	0.27	0.25	9.00	25.00	56.25						
0+100	29.38	29.38	29.43	29.61	29.61	29.71	0.23	0.23	0.31	0.28	9.15	25.00	56.43						
0+125	29.35	29.35	29.40	29.61	29.66	29.71	0.26	0.31	0.31	0.29	9.10	25.00	66.73						
0+150	29.30	29.30	29.38	29.61	29.61	29.69	0.31	0.31	0.31	0.31	9.10	25.00	70.52						
0+175	29.31	29.31	29.32	29.61	29.62	29.63	0.30	0.31	0.31	0.31	8.00	25.00	61.33						
0+200	29.25	29.25	29.28	29.52	29.53	29.58	0.27	0.28	0.30	0.28	9.20	25.00	65.17						
0+225	29.20	29.15	29.15	29.45	29.45	29.40	0.25	0.30	0.25	0.27	9.50	25.00	63.33						
0+250	29.15	29.14	29.14	29.39	29.41	29.42	0.24	0.27	0.28	0.26	9.50	25.00	62.54						
0+275	29.10	29.14	29.12	29.33	29.41	29.43	0.23	0.27	0.31	0.27	9.20	25.00	62.10						
0+300	29.09	29.11	29.15	29.34	29.39	29.44	0.25	0.28	0.29	0.27	9.10	25.00	62.18						
0+325	29.10	29.15	29.17	29.41	29.45	29.49	0.31	0.30	0.32	0.31	10.00	25.00	77.50						
0+350	29.10	29.13	29.20	29.41	29.44	29.51	0.31	0.31	0.31	0.31	9.90	25.00	76.72						
0+375	29.02	29.10	29.15	29.32	29.36	29.41	0.30	0.26	0.26	0.27	10.00	25.00	68.33						
0+400	29.00	29.02	29.08	29.31	29.32	29.36	0.31	0.30	0.28	0.30	9.50	25.00	70.46						
0+425	29.03	29.05	29.07	29.31	29.31	29.36	0.28	0.26	0.29	0.28	9.30	25.00	64.32						
0+450	29.10	29.06	29.13	29.38	29.38	29.43	0.28	0.32	0.30	0.30	9.30	25.00	69.75						
0+475	29.13	29.16	29.20	29.40	29.41	29.48	0.27	0.25	0.28	0.27	9.40	25.00	62.67						
0+500	29.23	29.21	29.25	29.48	29.52	29.55	0.25	0.31	0.30	0.29	8.30	25.00	59.48						
0+525	29.18	29.18	29.26	29.50	29.50	29.55	0.32	0.32	0.29	0.31	8.10	25.00	62.78						
0+550	29.28	29.28	29.25	29.60	29.55	29.57	0.32	0.27	0.32	0.30	9.70	25.00	73.56						
0+575	29.31	29.28	29.28	29.55	29.60	29.60	0.24	0.32	0.32	0.29	9.10	25.00	66.73						
0+600	29.28	29.36	29.36	29.55	29.60	29.65	0.27	0.24	0.29	0.27	9.30	25.00	62.00						
0+625	29.28	29.33	29.35	29.57	29.61	29.65	0.29	0.28	0.30	0.29	9.00	25.00	65.25						
0+650	29.27	29.28	29.30	29.58	29.58	29.60	0.31	0.30	0.30	0.30	9.00	25.00	68.25						
0+675	29.33	29.28	29.30	29.59	29.55	29.62	0.26	0.27	0.32	0.28	9.20	25.00	65.17						
0+700	29.33	29.28	29.33	29.60	29.54	29.65	0.27	0.26	0.32	0.28	9.60	25.00	68.00						
0+725	29.23	29.21	29.23	29.50	29.50	29.60	0.27	0.29	0.27	0.28	10.80	25.00	74.70						
0+750	29.23	29.22	29.26	29.50	29.51	29.52	0.27	0.29	0.26	0.27	9.50	25.00	64.92						
0+775	29.21	29.18	29.28	29.50	29.51	29.55	0.29	0.33	0.27	0.30	9.40	25.00	69.72						
0+800	29.18	29.18	29.21	29.47	29.47	29.52	0.29	0.29	0.31	0.30	9.80	25.00	72.68						
0+825	29.20	29.21	29.29	29.47	29.47	29.57	0.27	0.26	0.28	0.27	9.60	25.00	64.80						
0+850	29.21	29.21	29.31	29.47	29.50	29.59	0.26	0.29	0.28	0.28	9.30	25.00	64.32						
0+875	29.16	29.21	29.21	29.42	29.49	29.50	0.26	0.28	0.29	0.28	9.70	25.00	67.09						
0+900	29.16	29.22	29.21	29.41	29.47	29.51	0.25	0.25	0.30	0.27	9.70	25.00	64.67						
0+925	29.16	29.21	29.26	29.40	29.45	29.50	0.24	0.24	0.24	0.24	10.00	25.00	60.00						
0+950	29.11	29.11	29.11	29.37	29.40	29.42	0.26	0.29	0.31	0.29	9.70	25.00	69.52						
0+975	29.11	29.16	29.21	29.41	29.44	29.47	0.30	0.28	0.26	0.28	9.85	25.00	68.95						
1+000	29.11	29.21	29.21	29.43	29.45	29.52	0.32	0.24	0.31	0.29	9.40	25.00	68.15						
1+025	29.19	29.20	29.26	29.46	29.47	29.49	0.27	0.27	0.23	0.26	9.80	25.00	62.88						
1+050	29.11	29.11	29.16	29.34	29.35	29.40	0.23	0.24	0.24	0.24	9.30	25.00	55.03						
1+075	29.06	29.06	29.09	29.30	29.32	29.39	0.24	0.26	0.30	0.27	9.30	25.00	62.00						
1+100	28.99	28.98	29.05	29.30	29.29	29.34	0.31	0.31	0.29	0.30	9.00	25.00	68.25						
1+125	29.00	29.01	29.01	29.29	29.26	29.29	0.29	0.25	0.28	0.27	8.10	25.00	55.35						
1+150	29.11	29.11	29.01	29.37	29.36	29.30	0.26	0.25	0.29	0.27	8.70	25.00	58.00						
1+175	29.14	29.08	29.03	29.37	29.33	29.30	0.23	0.25	0.27	0.25	8.30	25.00	51.88						
1+200	29.12	29.08	29.06	29.35	29.34	29.38	0.23	0.26	0.32	0.27	8.30	25.00	56.03						
1+225	29.11	29.07	29.12	29.34	29.34	29.39	0.23	0.27	0.27	0.26	7.80	25.00	50.05						
1+250	29.10	29.06	29.16	29.34	29.36	29.40	0.24	0.30	0.24	0.26	7.00	25.00	45.50						

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة المقطرة

عملية : طريق فاقوس / الحسينية (عزبة أبو العلا/ أبو شوشه / النشوية / ابو النيل) حتى طريق الحسينية/فاقوس (القطاع الثالث)
بطول 5.4 كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) - مبادرة حياة كريمة
إشراف : (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

طريق فرعى (قرية نجع عبدالسلام)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات ... (بالمتر المكعب)

station	مناشيب الأرض الطبيعية						مناشيب طبقة الأساس النهائية						السمك (م)				العرض (م)	الطول (م)	الكمية (م)
	Right	CL	Left	Right	CL	Left	Right	CL	Left	متوسط القطاع									
1+250	29.16	29.14	29.16	29.30	29.29	29.30	0.14	0.15	0.14	0.14	4.80	0.00	0.00						
1+275	29.12	29.13	29.14	29.25	29.26	29.27	0.13	0.13	0.13	0.13	4.80	25.00	15.60						
1+300	29.05	29.07	29.10	29.27	29.28	29.29	0.22	0.21	0.19	0.21	4.74	25.00	24.49						
1+325	29.04	29.09	29.10	29.26	29.28	29.28	0.22	0.19	0.18	0.20	4.90	25.00	24.09						
1+350	29.02	29.05	29.06	29.22	29.25	29.25	0.20	0.20	0.19	0.20	5.50	25.00	27.04						
1+375	29.03	29.03	29.03	29.21	29.22	29.22	0.18	0.19	0.19	0.19	3.90	25.00	18.20						
1+400	29.01	29.01	29.04	29.21	29.21	29.23	0.20	0.20	0.19	0.20	4.20	25.00	20.65						
1+425	29.00	28.99	28.98	29.17	29.16	29.15	0.17	0.17	0.17	0.17	4.00	25.00	17.00						
1+450	29.01	29.00	28.99	29.17	29.16	29.16	0.16	0.16	0.17	0.16	3.50	25.00	14.29						
1+475	28.98	28.97	28.96	29.18	29.17	29.16	0.20	0.20	0.20	0.20	4.00	25.00	20.00						
1+500	28.98	28.96	28.93	29.18	29.16	29.16	0.20	0.20	0.23	0.21	4.30	25.00	22.58						
1+525	29.00	28.95	28.95	29.21	29.20	29.19	0.21	0.25	0.24	0.23	5.40	25.00	31.50						
1+550	29.04	29.05	29.06	29.25	29.27	29.28	0.21	0.22	0.22	0.22	5.00	25.00	27.08						
1+575	29.16	29.16	29.13	29.35	29.35	29.34	0.19	0.19	0.21	0.20	5.00	25.00	24.58						
1+600	29.23	29.20	29.18	29.42	29.41	29.40	0.19	0.21	0.22	0.21	4.80	25.00	24.80						
1+625	29.27	29.23	29.23	29.47	29.47	29.46	0.20	0.24	0.23	0.22	4.30	25.00	24.01						
1+650	29.30	29.30	29.31	29.50	29.50	29.51	0.20	0.20	0.20	0.20	4.10	25.00	20.50						
1+675	29.40	29.39	29.33	29.55	29.54	29.53	0.15	0.15	0.20	0.17	4.30	25.00	17.92						
1+700	29.28	29.28	29.30	29.51	29.51	29.50	0.23	0.23	0.20	0.22	4.80	25.00	26.40						
1+725	29.31	29.32	29.29	29.50	29.51	29.51	0.19	0.19	0.22	0.20	4.80	25.00	24.00						
1+750	29.27	29.27	29.27	29.47	29.47	29.48	0.20	0.20	0.21	0.20	4.40	25.00	22.37						
1+775	29.22	29.23	29.25	29.45	29.46	29.47	0.23	0.23	0.22	0.23	3.90	25.00	22.10						
1+800	29.25	29.23	29.28	29.45	29.45	29.46	0.20	0.22	0.18	0.20	5.50	25.00	27.50						
+835	29.26	29.26	29.27	29.41	29.41	29.42	0.15	0.15	0.15	0.15	6.00	35.00	31.50						

اجمالى الحصر الحالى

3744

اجمالى الحصر السابق

0

اجمالى الكمية المنفذة

3744

مهندس ا.م

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة المنفذة
