



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



الشركة

شركة الال فوزي عبده للمقاولات العموميه

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر

مقاولة / شركه ال فوزي عبده للمقاولات العموميه

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/ 6 / 2022

شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2025-03-28

2025-7-2

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالمة 15/7/2022	كمية البند بالمقايصة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليقولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردھا على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشھا بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم زيادة أو نقصان- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة قبل (2022-07-15)	375.00	35005.00	م ³	35003.67	0.00	35003.87	جاري	0.00	13126451.25	13126451.25	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد 7- المحملات تراجع بمعلوماته قطاع التنفيذ و المناطق 8 - كرفانات جهاز الاشراف متواجده بالموقع
11-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليقولانيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردھا على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشھا بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - إحتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم زيادة أو نقصان و ذلك حتي مسافه نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم زياده عن مسافه نقل 100 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة بعد (2022-07-15)	396.00	39520.00	م ³	37631.00	0.00	37631.00	جاري	0.00	14901876.00	14901876.00	
11-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	145.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	13853590.00	13853590.00	
11-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	153.00	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	12498264.00	12498264.00	
11-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	158.00	325956.00	م ²	185677.00	32418.00	218095.00	جاري	5122044.00	34459010.00	34459010.00	
3-8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفتره بعد 15/7/2022	140.00	615000.00	م ²	497246.00	0.00	497246.00	جاري	0.00	69614440.00	69614440.00	
2-7	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم / 2م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفتره بعد 15/7/2022	9.20	615000.00	م ²	494067.00	0.00	494067.00	جاري	0.00	4545416.40	4545416.40	

أقر بصحة ذلك
(شركة المقاولات العموميه)

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مدير المشروع

م / محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع

م / مكاريوس ميلاد

مهندس المشروع

احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



الشركة

شركة الال فوزي عبده للمقاولات العموميه

مستخلص جاري (17)
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر

مقاوله / شركه ال فوزي عبده للمقاولات العموميه

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 6 / 12 / 2022

شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2025-03-23

2025 - 7 - 2

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالمقاوضة وقالنه 15/7/2022	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرءه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
1-7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة قبل (2022-04-21)	25.00	95542.00	م ²	95542.00	0.00	95542.00	جاري	0.00	2388550.00	2388550.00	
1-7ب	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)	27.50	81688.00	م ²	81688.00	0.00	81688.00	جاري	0.00	2246420.00	2246420.00	
1-7ج	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد (2022-07-15)	27.50	325956.00	م ²	188856.00	32418.00	221274.00	جاري	891495.00	6085035.00	6085035.00	
2-9	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بأرتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشار 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة قبل (2022-07-15)	485.00	13262.00	م.ط	13262.00	0.00	13262.00	جاري	0.00	6432070.00	6432070.00	
12-9	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى) وجه واحد بأرتفاع 90سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشار 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف في الفترة بعد (2022-07-15)	500.00	14979.978	م.ط	4101.00	0.00	4101.00	جاري	0.00	2050500.00	2050500.00	
1-9	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفاير جلاس (نيوجرسى) وجهين بأرتفاع 90سم أعلي الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشار 10 Ø 16 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022	685.00	8000.00	م.ط	5041.00	0.00	5041.00	جاري	0.00	3453085.00	3453085.00	

أقر بصحة ذلك

(شركة المقاولات العموميه)

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مدير المشروع

م / محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع

م / مكاريوس ميلاد


مهندس المشروع

احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد

شركة المقاولات العموميه
مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه
مدير مشروعات القطاع الجنوبي



الشركة

شركة ال فوزى عبده للمقاولات العموميه

مستخلص جاری (17)

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري
حول القاهره الكبرى

في المسافه من تقاطع طريق القاهره / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
بالأمر المباشر

مقاولة / شركة ال فوزى عبده للمقاولات العمومية

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12 / 6 / 2022

شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2025-03-23

~~2025-7-2~~

م البند	نوع العمل	الفئة بالمفاوضة وقالنه 15/7/2022	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراهه	مقدار العمل عن هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الاعمال التي تمت إلى الان	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات .
3-4	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحمايه مواسير البراخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم /م ³ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي الاقل اجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم/م ³ مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصنعاة و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند يجمع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1450.00	8499.92	م ³	1777.00	0.00	1777.00	جاري	0.00	2576650.00	2576650.00	
1	بالمقطوعه عمل خزان صرف صحى طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل : 1- حفر 2- خرسانة عاديه 3- خرسانة مسلحة 4- عزل وتر ستوب 5- عزل من ألواح البوليم 6- مباتى كسوة للمادة العازلة 7- محارة للحوائط الداخلية وذلك طبقا للرسومات الموضحة .	400000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	400000.00	400000.00	
2	بالمقطوعه تحويل مسار غرفة تجميع الصرف الطبيعي والصرف الصناعى	50000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	50000.00	50000.00	
3	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير 6 بوصة ضغط 10 بار مع كافة ما يلزم من الحفر فى الأسفلت وإعادة الوضع الى ما كان عليه	350.00	100.00	م.ط	100.00	0.00	100.00	جاري	0.00	35000.00	35000.00	
4	بالعدد عمل غرفة تفقيش من الخرسانة المسلحة طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل الغطاء المعتمد 12 و 25 طن	10000.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	80000.00	80000.00	
5	بالمقطوعه نقل أعدة إنارة مع تغير الخطوط وربطها بشبكة المحطة مع المحافظة عليها والكشافات الخاصة بها	6200.00	8.00	مقطوعه	8.00	0.00	8.00	جاري	0.00	49600.00	49600.00	
6	بالمقطوعه نقل الID الخاص بالمحطة مع تغير التالف من القارة أو ألواح الكلادينج أثناء نقل وتنفيذ القاعدة	65000.00	1.00	مقطوعه	1.00	0.00	1.00	جاري	0.00	65000.00	65000.00	
	طبقا للقائمة الموحدة يوليو2022 وتحميل الكارتات على البند رقم 5	25.00		م ³	64212.87	0.00	64212.87	جاري	0.00	1605321.75	1605321.75	
	طبقا للقائمة الموحدة يوليو2022 وتحميل الموازين على البند رقم 8	3.00		م ²	338610.00	0.00	338610.00	جاري	0.00	1015830.00	1015830.00	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه											191532109.40
	المصروف عن المستخلص السابق											185518570.40
	قيمه المستخلص المستحقه عن هذه المده											6013539.00

تحرر في 20/ 05/ 2025

تحریر فی 20/ 05/ 2025

أقر بصفة ذلك
(شركة المقاولات العمومية)

مهندس المشروع

احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السید

شركة المقاولات اليومية
توزي عبده علي وشركاه
شروع نوسسات الدائري

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مهندس المشروع

م / مکاریوس میلاد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / أحمد عبد الحماد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله





الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة

تحية طيبة ... وبعد ...

بالأحالة الي مشروع تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٨ كم بالأمر المباشر تنفيذ (شركة ال فوزي عبده علي للمقاولات العمومية) .

عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٠١ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٣) اصل من مستخلص جارى (١٧) من بداية العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٢ وكذا استمارة ٥٠ ح.ع بمبلغ ٦٠١٣٥٣٩ (فقط وقدره ستة مليون وثلاثة عشر الف وخمسمائه وتسعه وثلاثون جنيهه لا غير ..)
يرجي التفضل بالاحاطه والتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مرفقات:

عدد (٣) مستخلص ١٧ جارى

عدد (٣) حصر اعمال


عدد (٣) بيان اعمال

عدد ١ استمارة ٥٠ ح.ع

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /

مشيرة السيد عبد الله



الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة

تحية طيبة وبعد ..

بالإحالة إلى مشروع أعمال الإسفلت والنيوجيرسي والدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٨ كم بالأمر المباشر

تنفيذ شركه (ال فوزي عبد علي للمقاولات العموميه) عقد رقم (١٢٠١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

بتاريخ (١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٢)

وبالإشارة إلى تواجد العمال طبقا للمشروع عاليه ..

نحيط سيادتكم علما بعدم تواجد العمال بالمشروع بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتي تاريخه
برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

تحريرا في ٠٧/٠٧/٢٠٢٥

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة/

مشيرة السيد عبد الله



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزيه للتنفيذ والصيانة

تحية طيبة وبعد ,,,

بالاحاله الي مشروع اعمال الاسفلت و النيوجيرسي والدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٨ كم بالامر المباشر .

تنفيذ شركه (ال فوزي عبد علي للمقاولات العموميه) رقم (١٢٠١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ (١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٢)

وبالاشاره الي المحملات الخاصه طبقا للمشروع عاليه

نحيط سيادتكم بأن جميع المحملات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق منذ بدايه المشروع وحتى تاريخه وغير متواجد اي محملات بالاداره المركزيه للطريق الدائري ومحاوره .

برجاء التكرم بالاحاطه و التنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير ,,

تحريرا في ٢٠٢٥/٠٧/٠٧

يعتمد ,,,

رئيس الادارة المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة/

مشيرة السيد عبد الله


الصفحة ١٠

١- الوصف = [١٣٥٣٩ - ٧.١٣٥٣٩] ...

١٣٥٣٩ = ٧.١٣٥٣٩

٣.٧٧٧٩٥ = ٣.٧٧٧٩٥

٣.٧٧٧٩٥ = ٣.٧٧٧٩٥



بيان أعمال الموقع

[illegible]

ملاحظات	البلد										المحطة	
							طريقه اسلح	طريقه MCO	اسلحت سطحية	الى	من	
							تشغيل					
							تشغيل					
							516	3179	3179	0+525	0+150	

كميات جاري ١٧ عن هذه المدة

نورچرسی وچوین	نورچرسی وایه وایه	طیبه اساس	قسمه الیول	طیبه MCO	RC	اسانت سطحیه	طیبه اسانت راپنه	الیند
0	0	0	0	32418	0	0	32418	سی چلب این وایس :

اجمالي الكميات حتى تاريخه

نمبر الرجسٲر	نمبر الوحدة	طابقه اساسي	قدسه المبنيول	طابقه MCO	RC	امكانت سطحية	طابقه امكانت رابطة	النبد
5041	17363	72634.9	1777.55	398504	492076	495255	395325	الراجسٲر : والندس :

م/ المكتب الفني :

مدير الموقع للمالك :

[illegible]

بيان أعمال الموقع

[illegible]

كميات تجارية ١٧ عن هذه المدقة

نوع جرحي	نوع جرحي واحد	طريقه اسس	قسمه السور	طريقه MCO	RC	طريقه اسفلت رابطہ	البيد
نوع جرحي وجرحين	0	0	0	32418	0	32418	الاجمال : المساوي جانب ايمين

اجمالي الكميات حتى تاريخه

نمبر جرمي وچين	نمبر جرمي واحد	طبقة الاسس	قسمه البيوت	مبنى MCO	RC	اسم الطريقه والمبنى	البلد
5041	17363	726349	1777.55	398504	492076	395325 395325	البحرين البحرين

مدير مشروع الشركة المنفذة :

مدير الموقع للمالك :

شركة افاق اوليات وخدمات
فوق حد صيانة على وشركاه
مشروع توسيعات الدارافري

مدير مشروع الشركة المنفذ : []

2

الاتجاه الأيمن من مشروع الطريق الداعم للطريق الدائري

ملاحظات	البيد										المعطى		
			قائمة بيوت	نيجريسي واجهين	نيجريسي واحد	طيلة اسكن		طبقه MCO	RC	اسفلت سطحيه	اسفلت رابطه	من الى	
						توريدي & تشغيل	طيلة اسكن						
حصص المنيهيه							1682.00					0+204	0+000
			134	1485	4205	5901		79798	107855	107855	79798	2+800	00+00
				2284	2900	24770	1510	72541	81982	81982	72541	5+100	2+800
			175		2027			28816	43900	43900	28816	7+000	5+800
			489	1092	50	350						7+100	6+200
								20000			20000	7+100	0+000
			798	4841	9182		34193	201155	233737	233737	201155		الاجمل

طرية، الكتبية

ملاحظات	البيد										المحتة	
							طيفه MCO	طيفه اسم	اسم سطحية	من	الى	
								تشغيل توريد & تشغيل				
							3179	516	3179	0+625	0+150	

كميات جاری ۱۷ عن هذه المدة

نمبر جيڪي وڃين	نمبر جيڪي واجه واعد	طبقة اساسى	قسمه البيوت	طبقة MCO	RC	اسلٽ مطبوعه	طبقة اسلٽ رابطہ	البنو
0	0	0	0	32418	0	0	32418	الايجانسي وايسر : چاب ايون

اجمالي الكميات حتى تاريخه

نوبت ردیف	نیزدیرسی وچین	نیزدیرسی واچ و احد	طبقه اساس	قدسه السیول	طبقه MCQ	RC	اسلالت سطحیه	اسلالت رابطه	البنه
5041	17363	72634.9		1777.55	396504	492076	495255	3965325	الاجماله وايسر : جنب ايرن

مدير هذا : شركة المائدة

در باب الغنى :

شركة القابضة للصناعات
فوزي حيدر علي وشركاه
مستورع قيسم

97

بيان أعمال الموقع

[illegible]

ملاحظات	طريق سبيح										البلد		المحلة		٢
							طبقة اساس	طبقة MCO	امقلت مطبوعة	من	إلى	من			
							توريد & تشغيل								
							516		3179		3179		0+625	0+150	

كميات جاري ١٧ عن هذه المدة

نویزجیسی وچین	نویزجیسی واحد	طبیکه اساس	قیمه التیول	طبیکه MCO	RC	اسلکت سطحیه	طبیکه اسلکت رابطہ	البتد
0	0	0	0	32418	0	0	32418	الاجزاء : وایسر

اجمالی الكمیات حتی تاریخہ

نمبر جي وچين	نمبر جي واچو واحد	طبقه اساس	قسمه نيول	طبقه MCO	RC	اسمات سطحه	طبقه اسمات رابطہ	نيلد
5041	17363	72634.9	1777.55	398504	492076	495255	395325	الجدال وانيس : جالب امين

مدير مشروع الشركة المنفذة :

مدير الموقع للمالك :

شركة القوقاز للصناعات
الغذائية والكيماويات
مستوحات من الطبيعة

م/ المكتب الفني :



شركة جي سي سي لمطارات العمومية

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت والبترجي والدرج ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق السلاوي
حول القاهرة الكبرى
في المساحة من تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم
مقاوله / شركة ال فوري عبيد للمقاولات العمومية
عقد رقم 1201/2022 بتاريخ 12/ 6 / 2022
شامل المدة من بداية التعاقد وحتى تاريخ 28-11-2024



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية للطرق والكباري وساحرة

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاعات	قيمة الاتصال في تحت ال اذن	قيمة الاعمال التي تحت خلال	طلة اعمدة قاعد	قيمه اعمدة التاي تحت خلال	جاري اتم	جمله طلة الاعمال التي تحت حتى الان	مقدار العمل السابق لاجراءه	الرصعة	كمية البند بالمتابعة	القيمة المتأخرجة 15/7/2022	نوع العمل	رقم البند
	2188550.00	2188550.00	0.00	جاي	جاي	جاي	95542.00	95542.00	م	95542.00	25.00	بالتفصيل اعمال توريد ريش طيبة لشرب من البتونين اسفل مشرب التنايلر MC30 بمعدل 1.2 كم/ 24/ توريد لول طيبة الاسفلت بعد تمام عملي وتنظيفها جيبا وتوريد التنايلر طيبا للتقاطعات العرجية المتواجدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتوريد بجمع مستعجلة حيا لوصول الصيانة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفيذات الهيئة العامة للطرق والكباري	27
	2246420.00	2246420.00	0.00	جاي	جاي	جاي	81688.00	81688.00	م	81688.00	27.50	بالتفصيل اعمال توريد ريش طيبة لشرب من البتونين اسفل مشرب التنايلر MC30 بمعدل 1.2 كم/ 24/ توريد لول طيبة الاسفلت بعد تمام عملي وتنظيفها جيبا وتوريد التنايلر طيبا للتقاطعات العرجية المتواجدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتوريد بجمع مستعجلة حيا لوصول الصيانة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفيذات الهيئة العامة للطرق والكباري	27
	5193540.00	5193540.00	155680.00	جاي	جاي	جاي	188556.00	6732.00	م	323956.00	27.50	بالتفصيل اعمال توريد ريش طيبة لشرب من البتونين اسفل مشرب التنايلر MC30 بمعدل 1.2 كم/ 24/ توريد لول طيبة الاسفلت بعد تمام عملي وتنظيفها جيبا وتوريد التنايلر طيبا للتقاطعات العرجية المتواجدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتوريد بجمع مستعجلة حيا لوصول الصيانة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفيذات الهيئة العامة للطرق والكباري	27
	6432070.00	6432070.00	0.00	جاي	جاي	جاي	137862.00	0.00	م	137862.00	485.00	بالتفصيل اعمال توريد ريش طيبة لشرب من البتونين اسفل مشرب التنايلر MC30 بمعدل 1.2 كم/ 24/ توريد لول طيبة الاسفلت بعد تمام عملي وتنظيفها جيبا وتوريد التنايلر طيبا للتقاطعات العرجية المتواجدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتوريد بجمع مستعجلة حيا لوصول الصيانة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفيذات الهيئة العامة للطرق والكباري	28
	2050500.00	2050500.00	0.00	جاي	جاي	جاي	4101.00	0.00	م	14978.978	500.00	بالتفصيل اعمال توريد ريش طيبة لشرب من البتونين اسفل مشرب التنايلر MC30 بمعدل 1.2 كم/ 24/ توريد لول طيبة الاسفلت بعد تمام عملي وتنظيفها جيبا وتوريد التنايلر طيبا للتقاطعات العرجية المتواجدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتوريد بجمع مستعجلة حيا لوصول الصيانة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفيذات الهيئة العامة للطرق والكباري	29
	3453085.00	3453085.00	0.00	جاي	جاي	جاي	5941.00	0.00	م	8000.00	685.00	بالتفصيل اعمال توريد ريش طيبة لشرب من البتونين اسفل مشرب التنايلر MC30 بمعدل 1.2 كم/ 24/ توريد لول طيبة الاسفلت بعد تمام عملي وتنظيفها جيبا وتوريد التنايلر طيبا للتقاطعات العرجية المتواجدة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتوريد بجمع مستعجلة حيا لوصول الصيانة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنفيذات الهيئة العامة للطرق والكباري	30

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري"


أقر بصحة ذلك
شركة المقاولات العمومية

مدير مشروعات القطاع الجنوبي
م/ ممدوح سليمان

مدير المشروع
م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير المشروع
اسلام صابر السيد

مدير المشروع
اسلام صابر السيد



شركة آل فوزي عبده للمقاولات العمومية،

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

ملاحظات .	البيانات بعد الاستقطاعات	قيمة الإرسال التي تمت إلى الآن	قيمة الأصول التي تمت خلال الفترة المدة	جاري أم نهائي	جولة عمل الإرسال التي تمت حتى الآن	جولة عمل الإرسال التي تمت حتى الآن	معدل العمل من قبل الشركة	الوحدة	كمية الجهد بالعمالة	تاريخ الانتهاء 15/7/2022	نوع العمل	رقم البند
شامل المدة من بداية التعاقد وحتى تاريخ 2024-11-28	2376550.00	2376550.00	0.00	جاري	1777.00	0.00	1777.00	3م	8493.32	1450.00	بناء وتشطيب أعمال زينة وحوض غسيل مياه الشرب في الطابق الأرضي من مبنى سكني 250 كم	34
	400000.00	400000.00	0.00	جاري	1.00	0.00	1.00	مطابق	1.00	400000.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34
	50000.00	50000.00	0.00	جاري	1.00	0.00	1.00	مطابق	1.00	50000.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34
	35000.00	35000.00	0.00	جاري	100.00	0.00	100.00	مطابق	100.00	350.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34
	80000.00	80000.00	0.00	جاري	8.00	0.00	8.00	مطابق	8.00	10000.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34
	49600.00	49600.00	0.00	جاري	8.00	0.00	8.00	مطابق	8.00	6200.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34
	65000.00	65000.00	0.00	جاري	1.00	0.00	1.00	مطابق	1.00	65000.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34
	100321.75	100321.75	0.00	جاري	64212.87	0.00	64212.87	مطابق	1.00	25.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34
	1015830.00	1015830.00	0.00	جاري	338610.00	0.00	338610.00	مطابق	1.00	2.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34
	185218570.40	185218570.40	0.00	جاري	338610.00	0.00	338610.00	مطابق	1.00	2.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34
33831883.60	33831883.60	0.00	جاري	338610.00	0.00	338610.00	مطابق	1.00	2.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34	
3706586.80	3706586.80	0.00	جاري	338610.00	0.00	338610.00	مطابق	1.00	2.00	تشييد جدران لحدود المنطقة المحيطة بالمبنى السكني على طول الجدار الغربي للحيات مع 200 كم من أجل الإضاءة الزخرفية ويتم تنفيذ جدران الإسفلت والاسفلت المتكاملة المصنوعة المصنوعة وتحتوي على جدران الإسفلت الزخرفية المصنوعة و	34	

تحریر: 11 / 28

(شركة المقاولات العمومية)
انقر بصفحة ذلك

اسلام صابر السيد
مدير المشروع

احمد عبد العزيز
مهندس المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح
مدير المشروع

م/ ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
/ / أحمد عبد الجواد

رئيس الإدارة المركزية
يعتمد

للطريق الدائري
مكتبة / مكتبة السيد عبد الله

اسلام صابر السید

احمد عبد الصمد

1

0

طلب فحص

إسم مقدم الطلب : المهندس فوزى عبده توقيعه : [Signature] موقع العمل : الدائري
رقم الطلب : _____ تاريخ صدوره : 2025 / 3 / 27 تاريخ إستلامه : _____ / _____ / _____

رقم البند	وصف البند	الإتجاه	الموقع		الطول	العرض	الإرتفاع	العدد	الكمية
			من المحطة	الى المحطة					
	me	المنطقة الداخلية	7+200	8+500					20000 m ²

المهندس المدني : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

التوقيع :

مهندس المواد : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق


التوقيع :

مهندس المساحة : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

التوقيع :

مدير المشروع : ☒ موافق ☐ غير موافق

التوقيع :

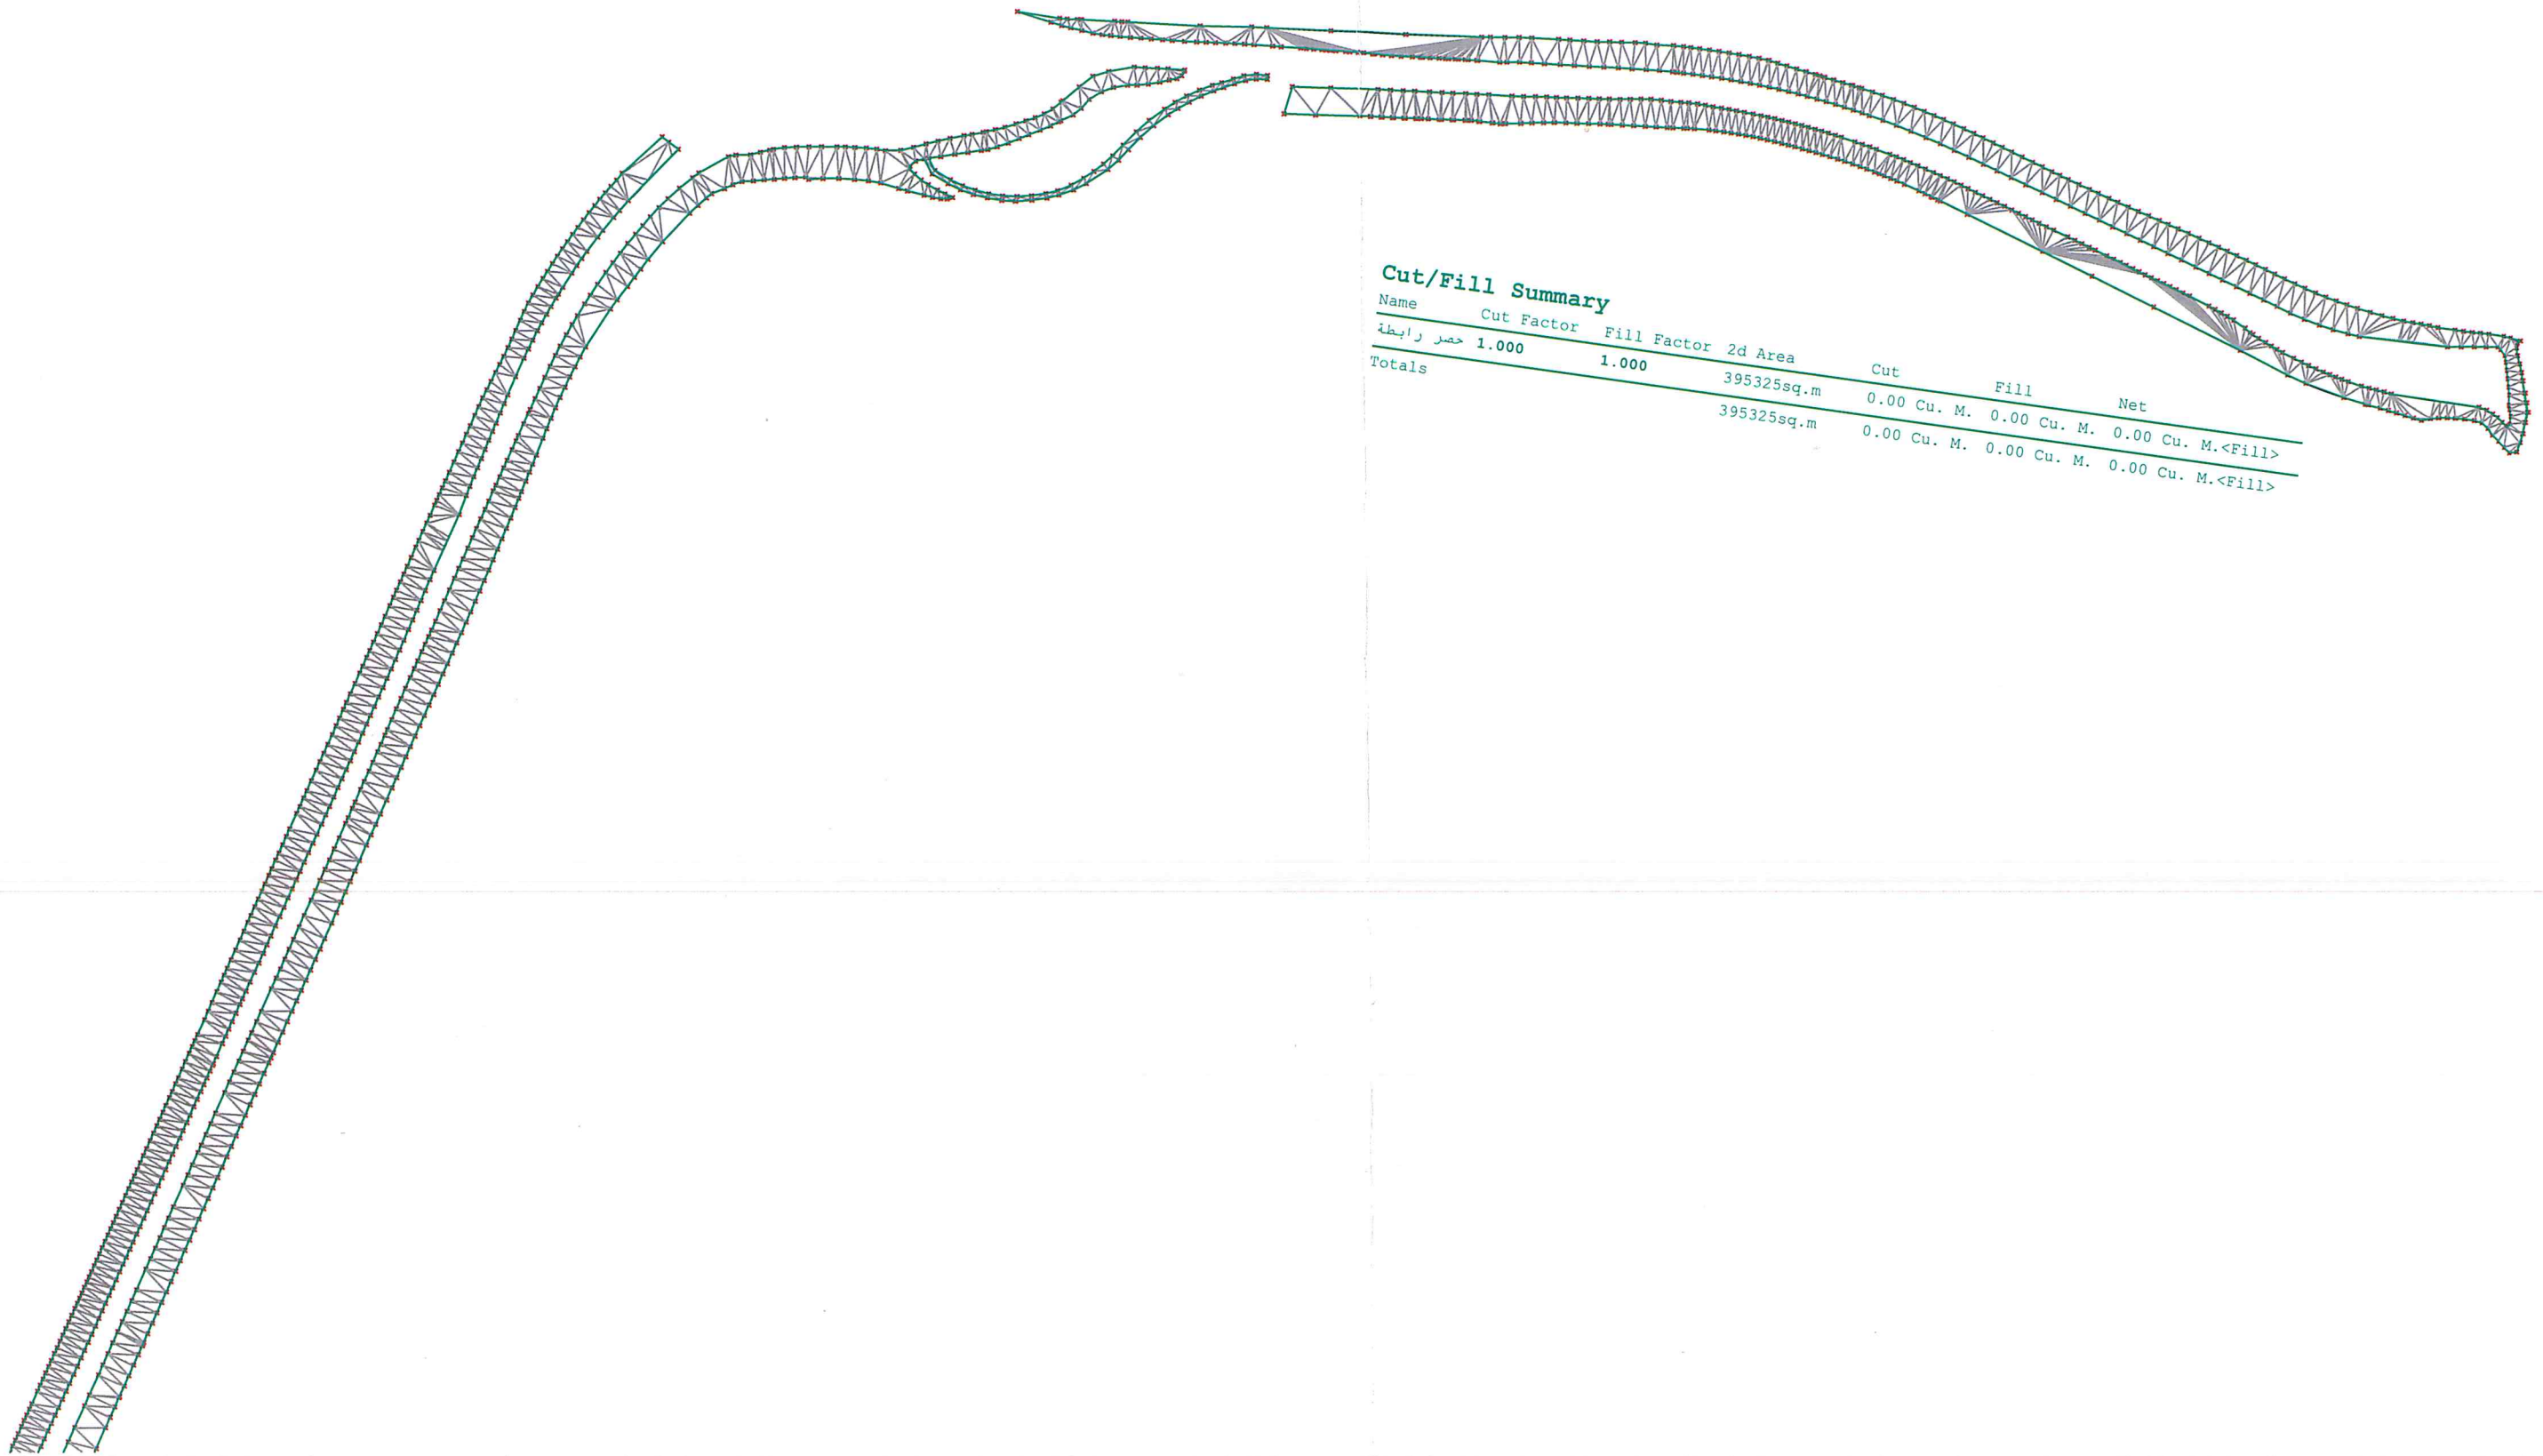

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
حصر رابطة	1.000	1.000	395325sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>
Totals			395325sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>

طالب فحص

اسم مقدم الطلب : المهندس فوزى توقيعه : [Signature] موقع العمل : الدائري
رقم الطلب : تاريخ صدوره : 23 / 3 / 2025 تاريخ استلامه :

رقم البند	وصف البند	الاتجاه	الموقع		الطول	العرض	الارتفاع	العدد	الكمية
			من المحطة	الى المحطة					
	رابعه	لايس	٥٠٥٥٥	٧٨٥٥					٢٥٥٥٥ م ^٢

المهندس المدني : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

التوقيع :

مهندس المواد : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق


التوقيع :

مهندس المساحة : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

التوقيع :

مدير المشروع : ☒ موافق ☐ غير موافق

التوقيع :

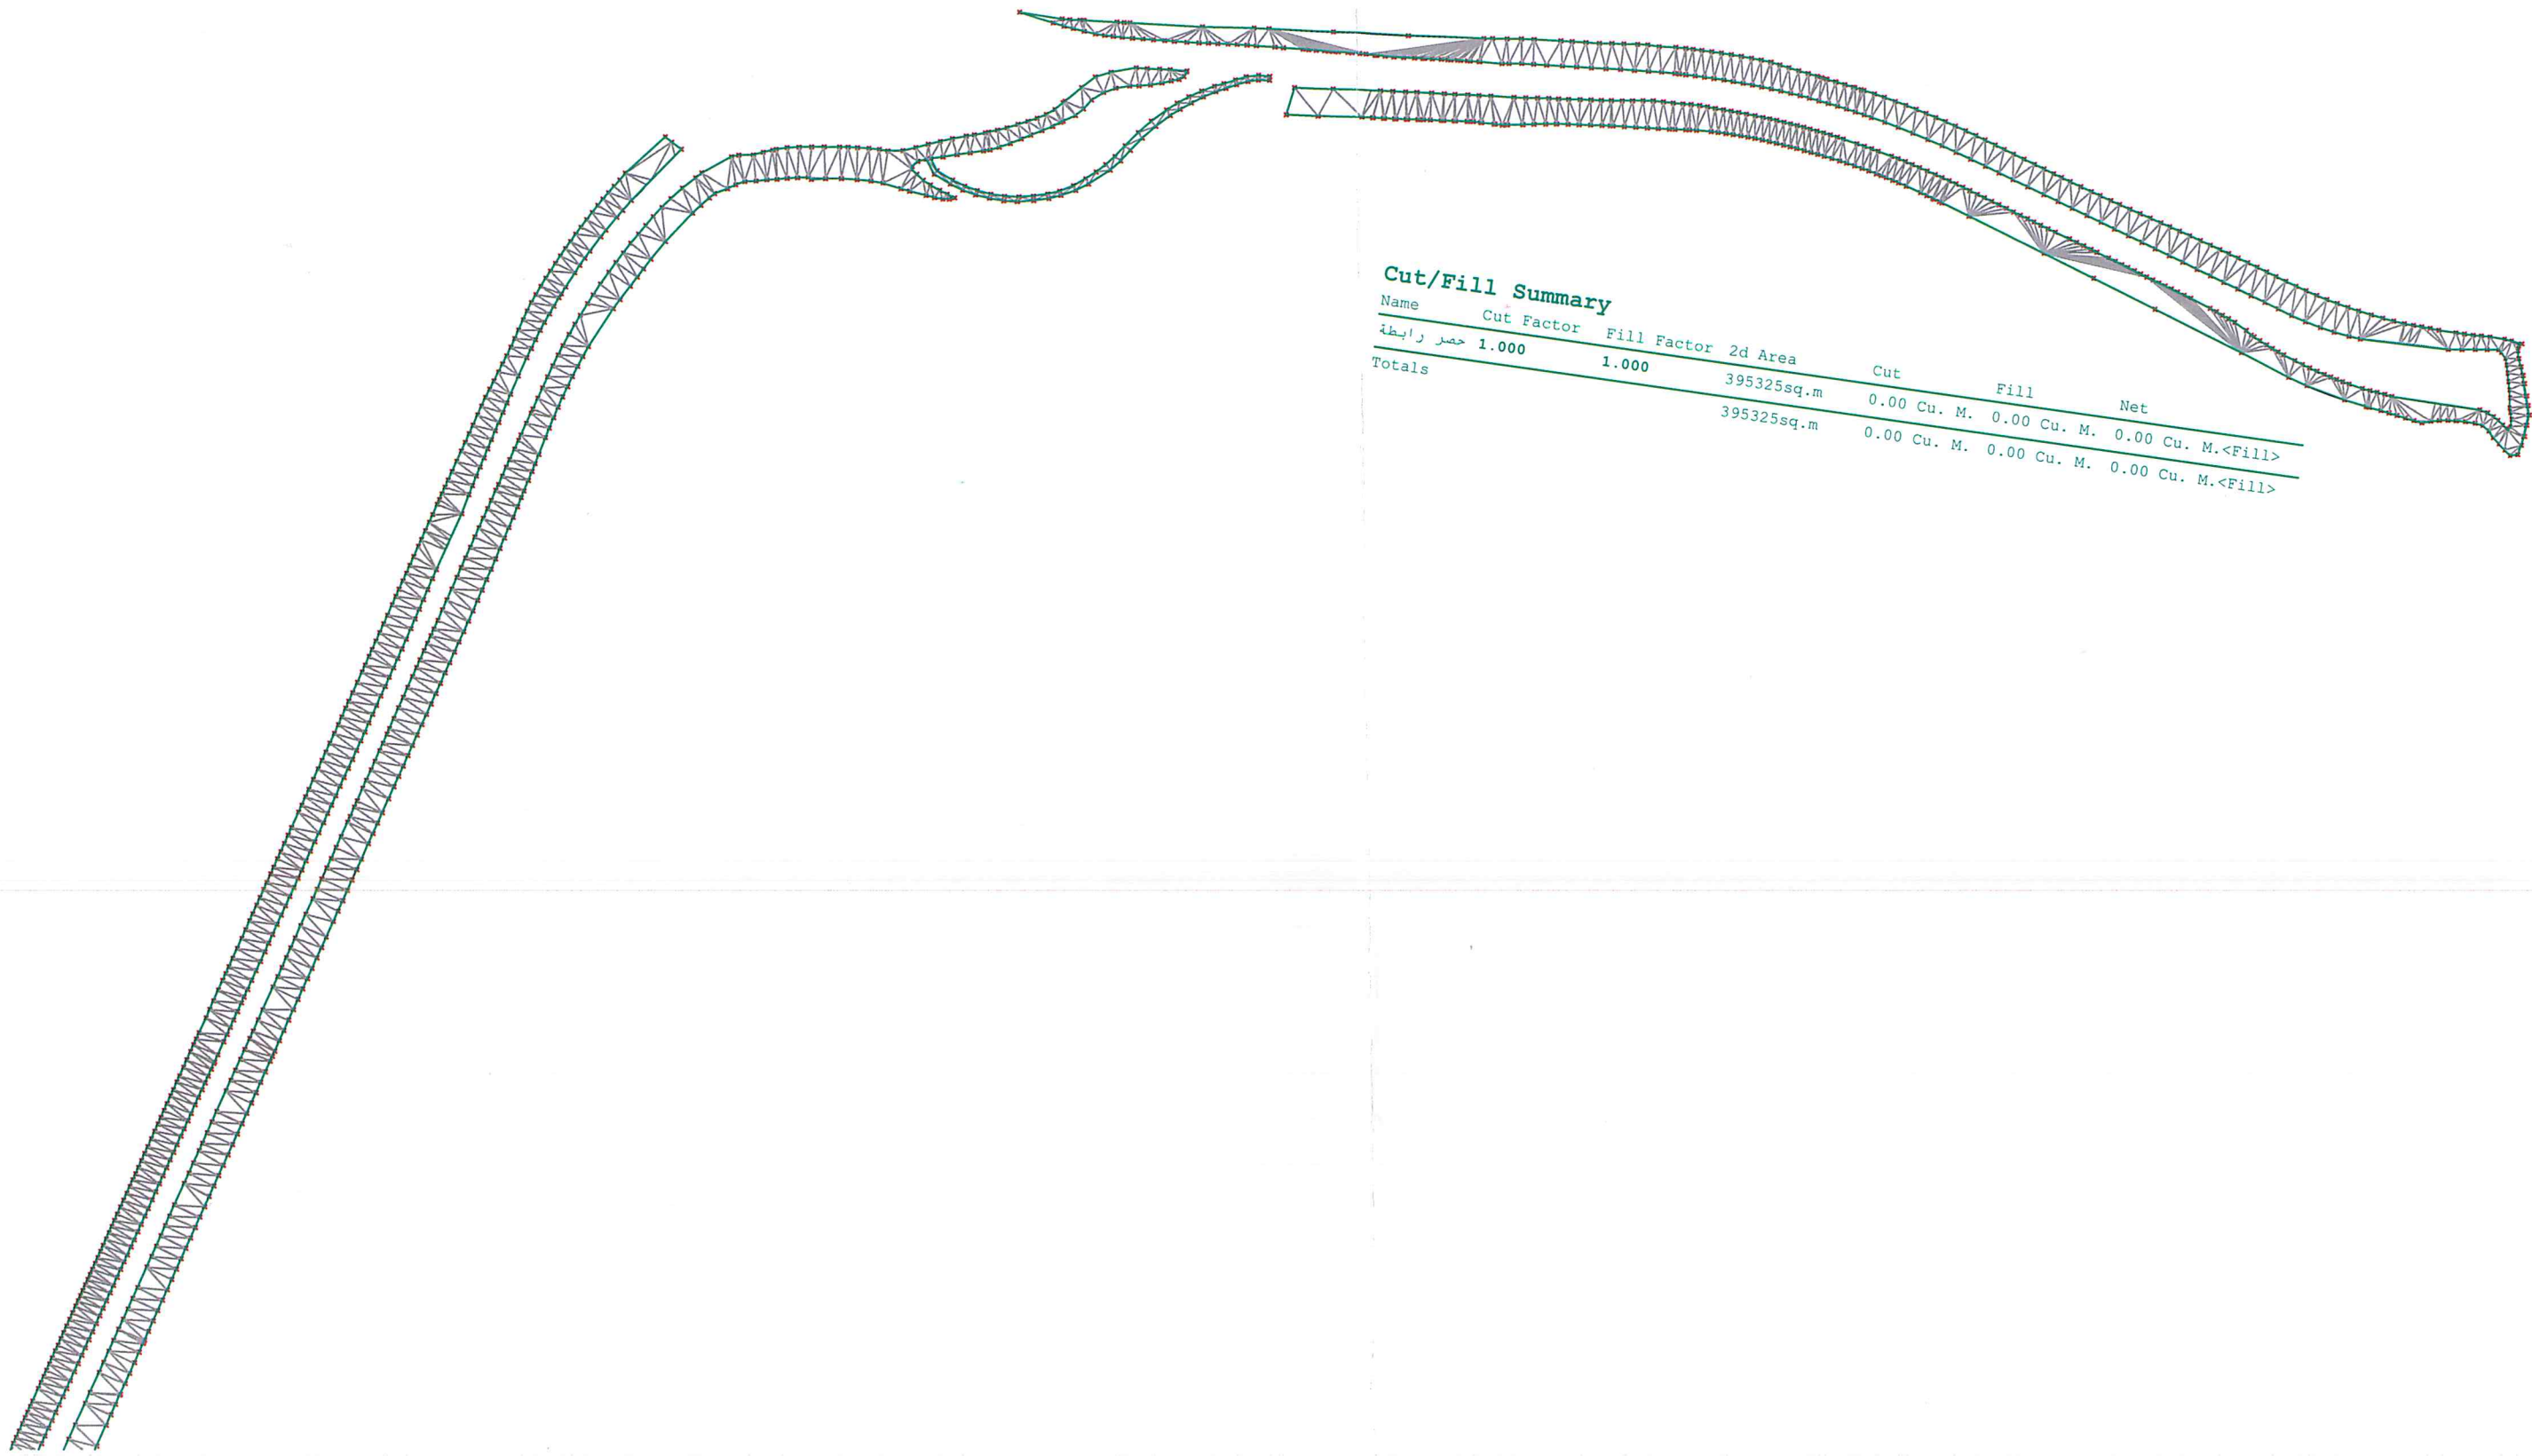

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
حصر رابطة	1.000	1.000	395325sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>
Totals			395325sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>

طلب فحص

إسم مقدم الطلب : أحمد عبدالعزیز توقيعه : [Signature] موقع العمل : السد
رقم الطلب : 17011 تاريخ صدوره : 2023/3/2 تاريخ إستلامه : 2023/3/3

رقم البند	وصف البند	الإتجاه	الموقع		الطول	العرض	الإرتفاع	العدد	الكمية
			من المحطة	الى المحطة					
١-٦٦	مستوية التربة								6323.73 m2
	(MC) link								6094.43 m2

المهندس المدني : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

التوقيع : [Signature]
12418 m2 = المساحة

مهندس المواد : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق


التوقيع :

مهندس المساحة : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

التوقيع :


مدير المشروع : ☐ موافق ☐ غير موافق

التوقيع :

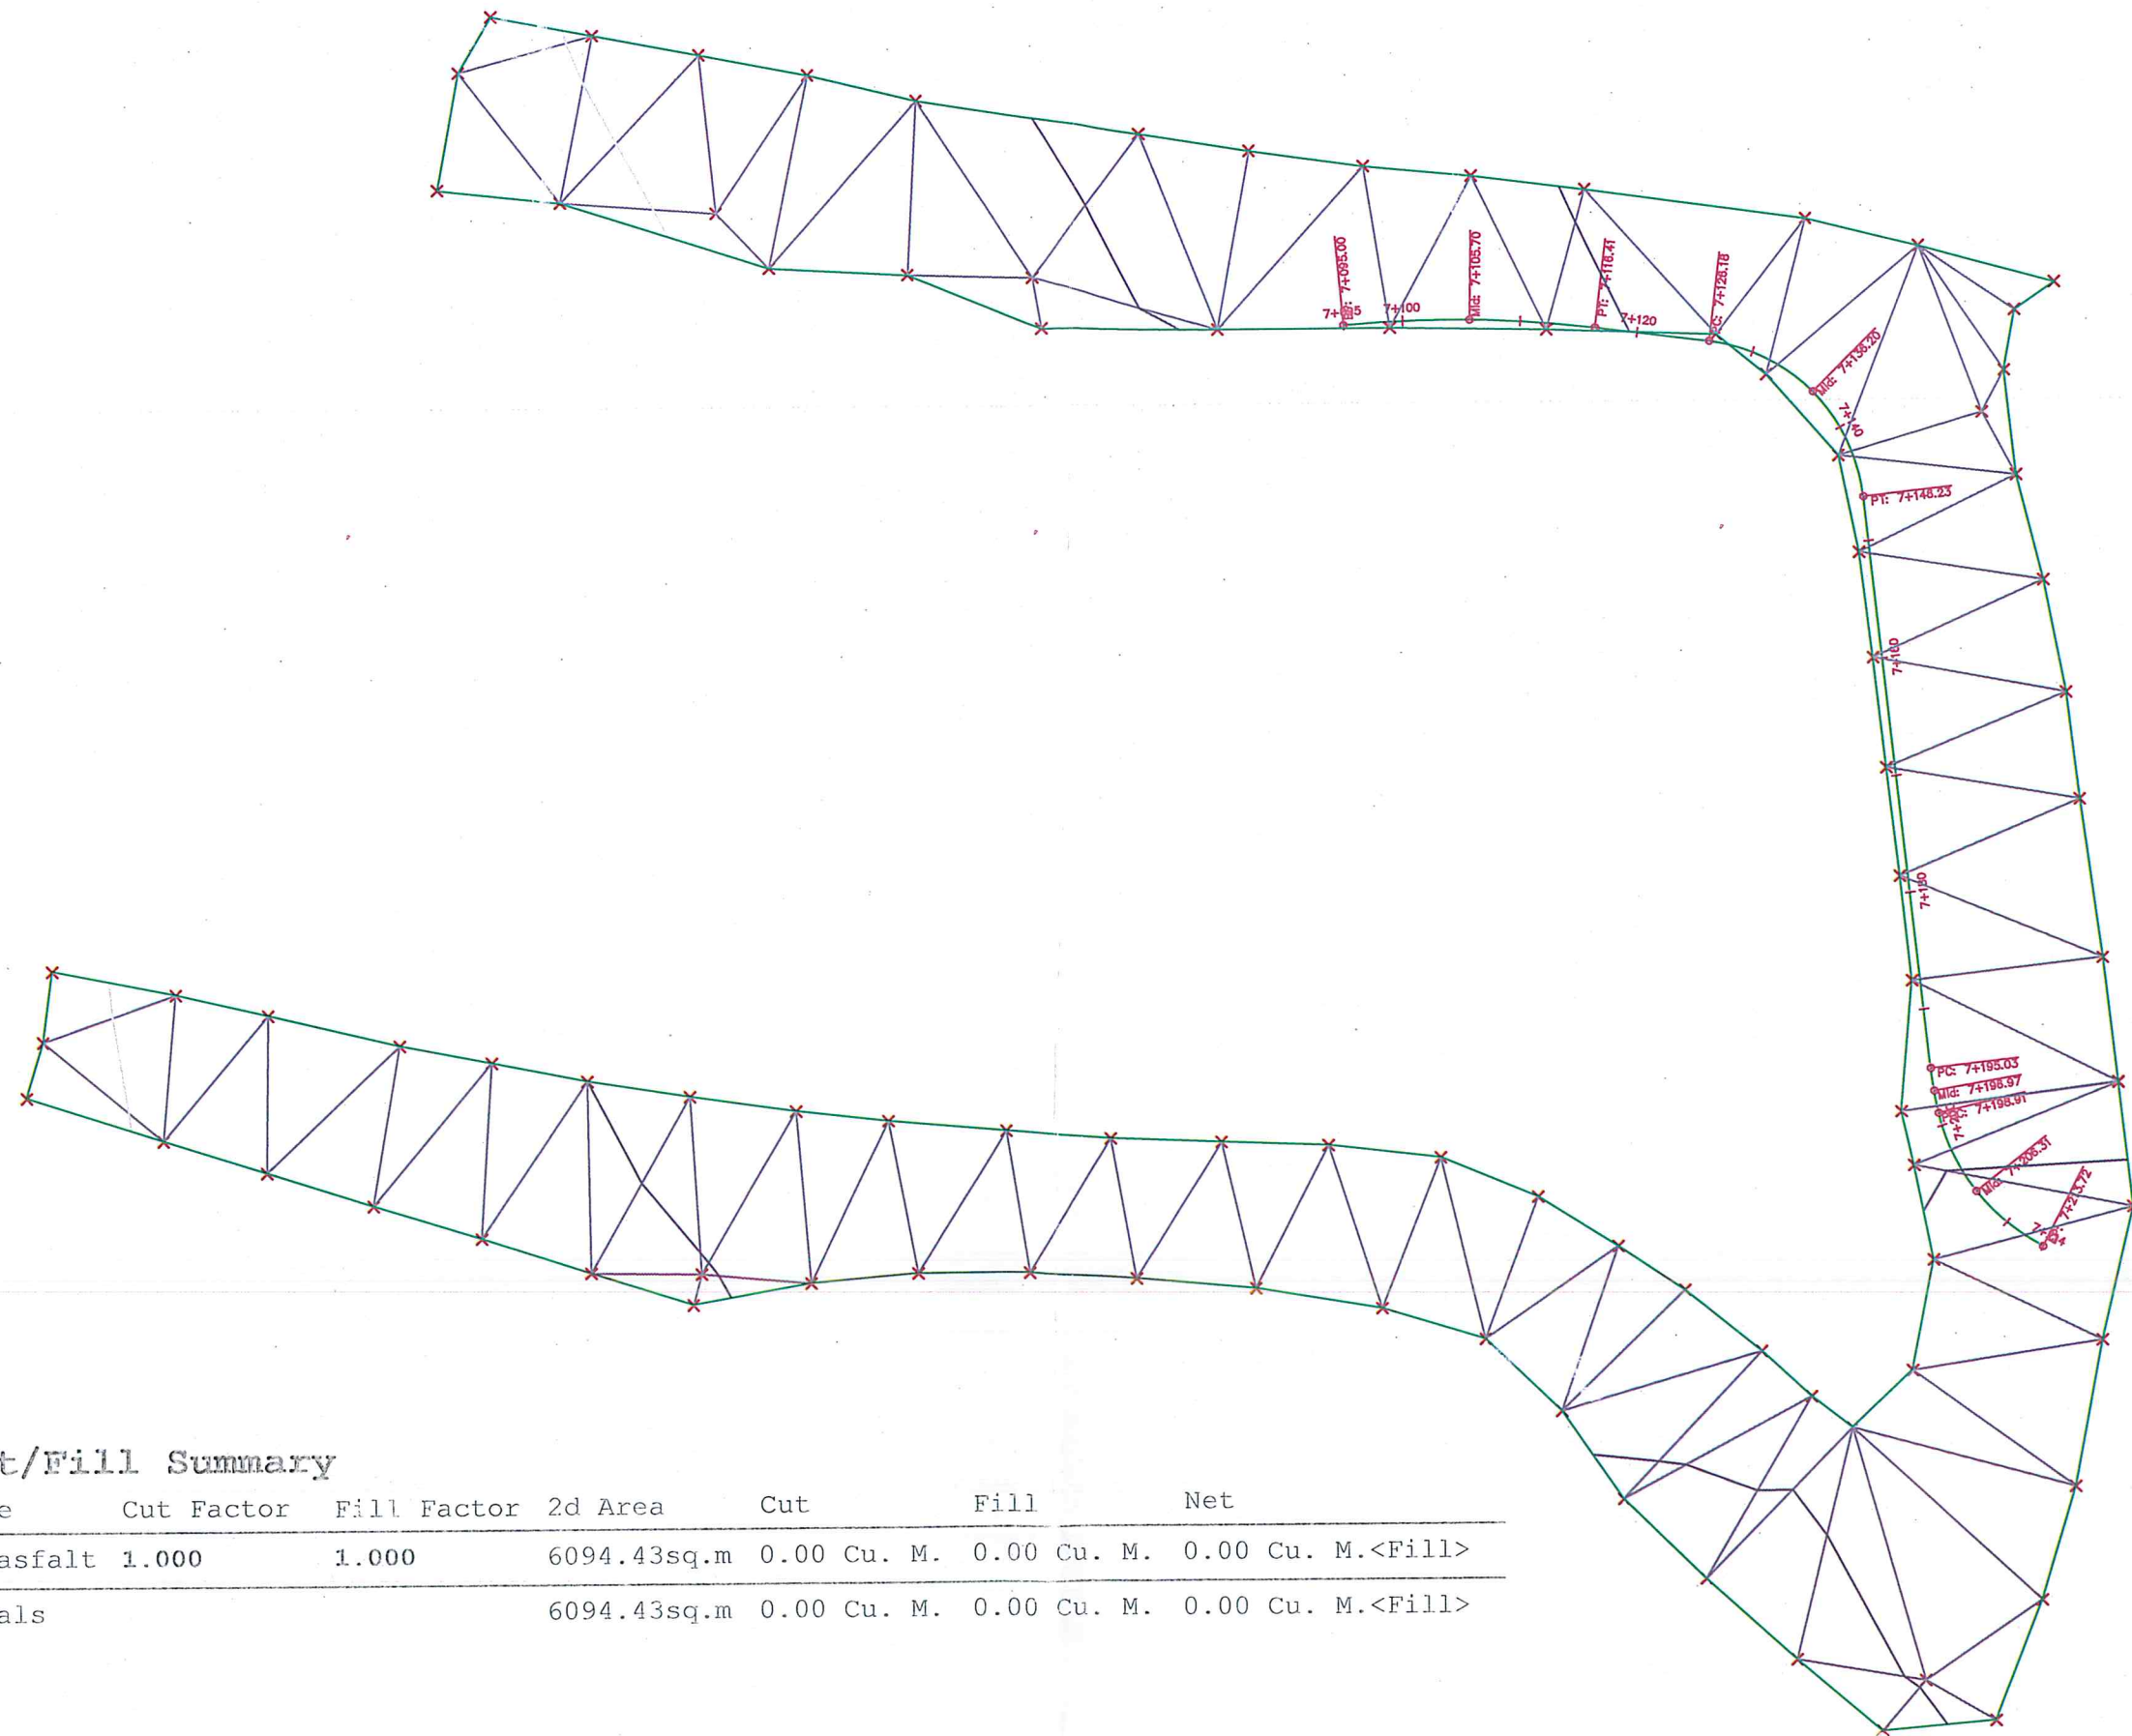

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
qu asfalt	1.000	1.000	6094.43sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>
Totals			6094.43sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>

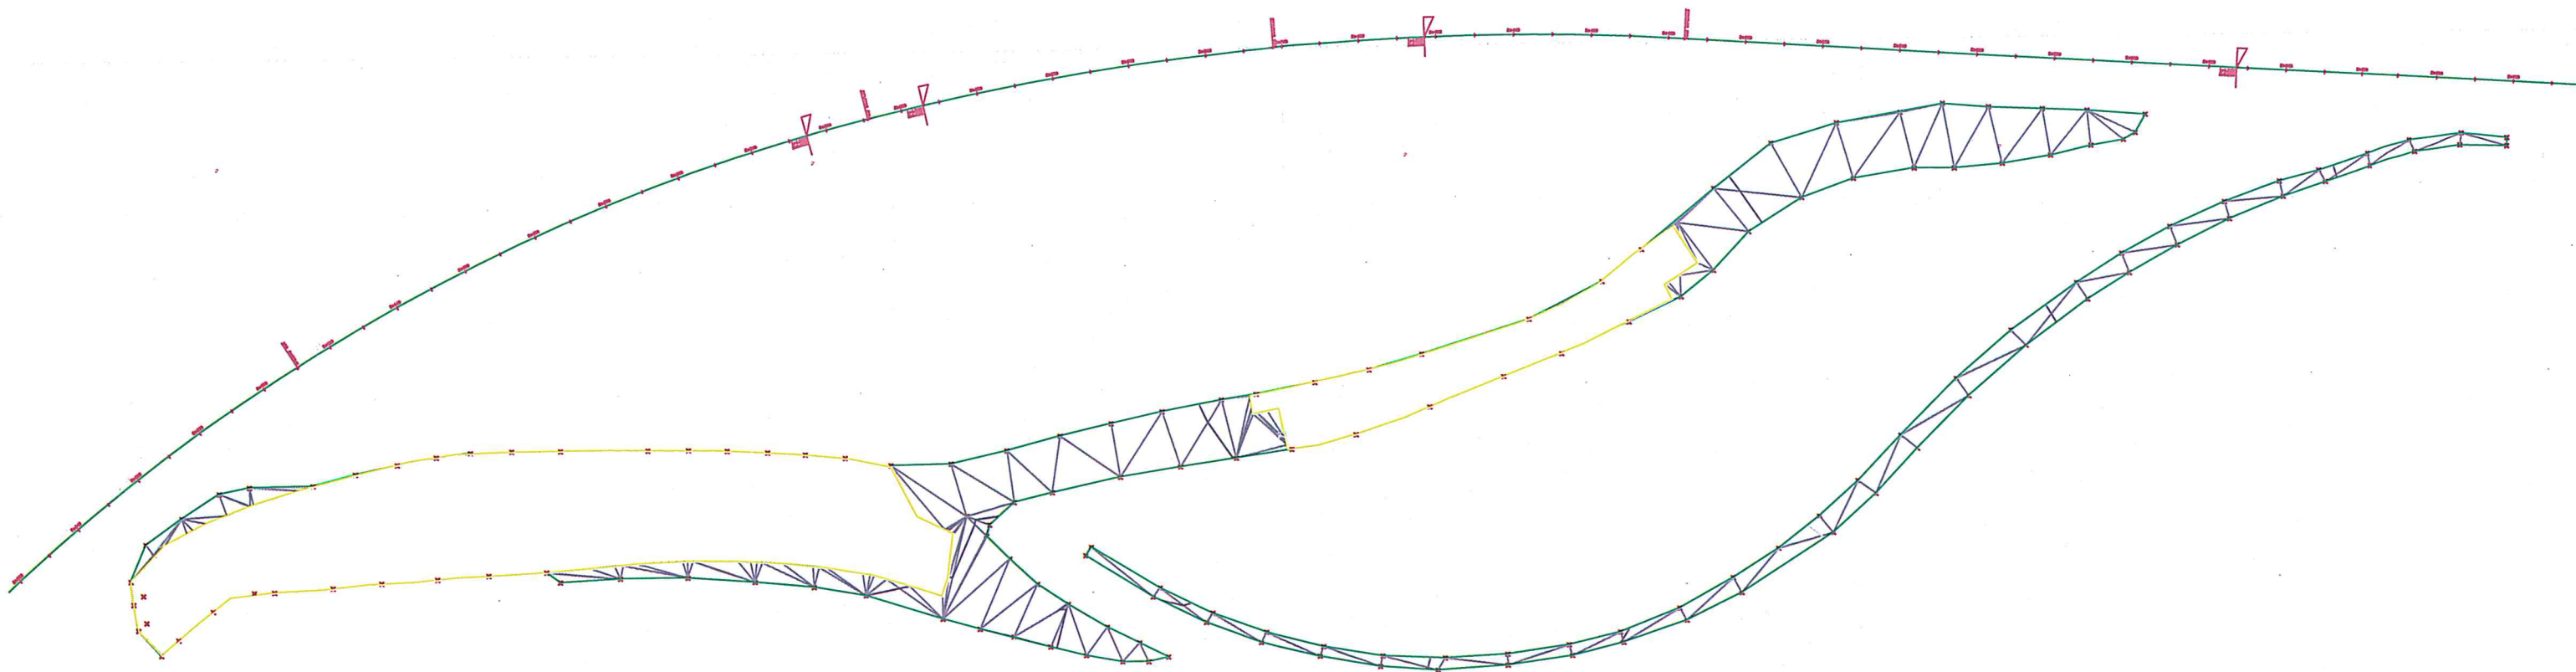

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
qu asphalt	1.000	1.000	6323.73sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>
Totals			6323.73sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>

طلب فحص

إسم مقدم الطلب : أحمد عبد العزيز توقيع : أحمد عبد العزيز موقع العمل : الدائري
رقم الطلب : ١٧ تاريخ صدوره : 2025/3/23 تاريخ إستلامه : 2025/3/23

رقم البند	وصف البند	الإتجاه	الموقع		الطول	العرض	الإرتفاع	العدد	الكمية
			من المحطة	الى المحطة					
28-8	طيس رابطة اسفلت	القول							6323.73 m ²
	Link								6094.43 m ²

المهندس المدني : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

12418 m² = 12418

التوقيع :

مهندس المواد : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق


التوقيع :

مهندس المساحة : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

التوقيع :

مدير المشروع : ☐ موافق ☐ غير موافق

التوقيع :

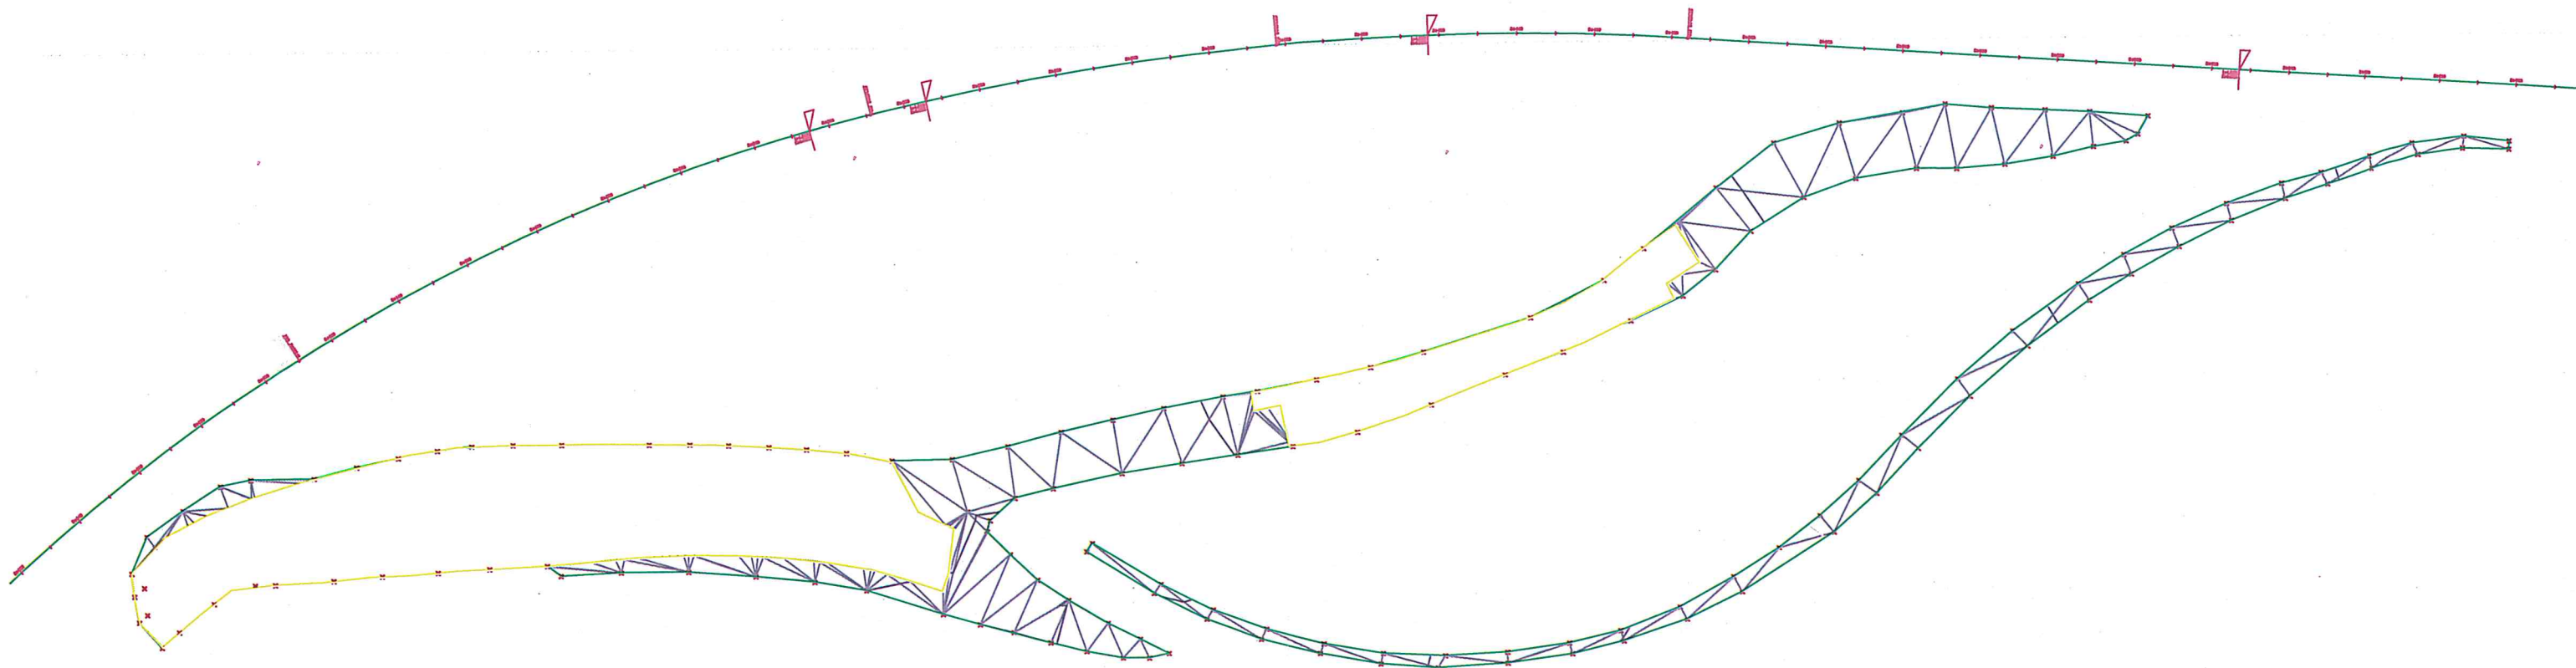

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
qu asphalt	1.000	1.000	6323.73sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>
Totals			6323.73sq.m	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.	0.00 Cu. M.<Fill>
