

147
1
O/CA

مهلة إضافية

واردة من منطقة :- المنطقة الثامنة (قنا)

اسم العملية :- اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان / ابو سمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الخامس (قوص / ادفو) المسافة من الكم ٦٦٠ الي الكم ٦٦٤ بطول ٤ كم .

اسم الشركة المنفذة :- شركة المستقبل للمقاولات العمومية محمد كرم سليم "

عقد العملية :- (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٤

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٣/٧/١١

تاريخ النھو طبقا للعقد :- ٢٠٢٤/٣/١٠

المطلوب

- مد مدة العملية مدة قدرها (٦ أشهر) طبقا لما ورد بكتاب المنطقة المشرفة ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٤/٩/١٠ .

المبررات

- بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بالموافقة علي تعديل البند رقم (١) من الكتاب الدوري بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية .
وكذلك للأسباب الآتية :-

- تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
- نقص الدعم الدولارى بالاسواق .
- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .

إعداد مهندس:

مدير عام (صيانة / التنفيذ)

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية

رأى الشئون القانونية

رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق




محضر اعتماد كميات


إسم المشروع: مشرع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (6 أكتوبر - اسوان - ابوسمبل)
القطاع الخامس (قوص - أرمنت)

قامت شركة بريليانت كونسلت للاستشارات المساحية (إستشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري) :
باعتماد الكميات المنفذه الخاصه بشركة المستقبل للمقاولات العمومية حتي تاريخ 2024/9/2
حصولها على الاعمال ٣٢٨٧٠٠٠٠
رقم العقد : (2024/2023/5) (د) مستخلص جاري (2)

كميات قطاع من المحطة 658+840 الي المحطة 662+820

أعمال القطع بالمتر المكعب			اعمال الردم بالمتر المكعب		
اجمالي	بعد 2024-3-22	قبل 2024-3-22	اجمالي	بعد 2024-3-22	قبل 2024-3-22
358160.10	0.00	358160.1	445525.20	11014.90	434510.30



مقاييسه معدلة				
    				
أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل) القطاع الخامس (قوص /ادفو) من كم 660+000 الى كم 664+000 بطول 4 كم الشريحة (د)				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة
1	اعمال الردم Embankment			
1-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.	م3		
	علاوة بعد سبتمبر 2023 وقبل 22/3/2024		139,470.0	71.70
	الأجمالي			10,000,000

عن الهيئة
التوقيع /
المهندس /

مدير مشروع استشارى اسبكتروم
التوقيع /
المهندس /

مهندس الشركة المنفذة
شركة المستقل للبحوث والدراسات الهندسية
التوقيع /
ب. المهندس /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /
المهندس / عماد حسين



مصارف عامی اعمال مردم شرکۃ التبیل للمصارف الخصوصیہ

392.19 659+540
شركة المستقبل المقاولات العمومية
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧
١٦٢٢٧



مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	(د) (2024/2023/5)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
	2024/09/02		اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (77)	198,586.39	FERMA	7,984.95	406.30	659+560
			7,891.62	382.86	659+580
			7,506.03	367.74	659+600
			7,296.87	361.94	659+620
			6,974.33	335.49	659+640
			6,439.66	308.48	659+660
			5,843.43	275.87	659+680
			5,231.37	247.27	659+700
KM-UE (70)			4,754.85	228.22	659+720
			4,380.88	209.87	659+740
			4,000.98	190.23	659+760
			3,529.69	162.74	659+780
			3,165.54	153.81	659+800
			2,867.86	132.98	659+820
			2,521.00	119.12	659+840
			2,248.87	105.76	659+860
KM-UE (55)			2,129.97	107.23	659+880
			2,014.22	94.19	659+900
			1,805.71	86.38	659+920
			1,650.29	78.65	659+940
			1,508.08	72.16	659+960

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإتفاق




مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	(د) (2024/2023/5)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
	2024/09/02		اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (50)	198,586.39	FERMA	1,295.42	57.38	659+980
			1,111.45	53.76	660+000
			1,139.01	60.14	660+020
			1,146.66	54.53	660+040
			1,074.89	52.96	660+060
			1,118.57	58.90	660+080
			1,156.05	56.71	660+100
			1,123.97	55.69	660+120
			1,063.54	50.66	660+140
			1,028.37	52.17	660+160
1,082.83			56.11	660+180	
1,170.84			60.97	660+200	
1,151.18			54.15	660+220	
1,072.72			53.13	660+240	
1,055.38			52.41	660+260	
1,027.76			50.36	660+280	
1,091.10			58.75	660+300	
1,430.84			84.34	660+320	
1,542.44			69.90	660+340	
1,327.71			62.87	660+360	
1,229.65	60.10	660+380			
KM-UE (54)					

3/9
HSP-BlueLine-sec
مشروع الأعمال الساحية بالقطاع الرابع

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧




مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	(د) (2024/2023/5)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
	2024/09/02		اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (54)	198,586.39	FERMA	1,215.91	61.49	660+400
			1,230.20	61.53	660+420
			1,153.21	53.79	660+440
			1,067.74	52.98	660+460
			1,019.67	48.99	660+480
			1,075.27	58.54	660+500
KM-UE (52)A			1,181.49	59.61	660+520
			1,164.31	56.82	660+540
			1,182.12	61.39	660+560
			1,302.13	68.82	660+580
			1,442.51	75.43	660+600
			1,531.85	77.76	660+620
			1,453.44	67.59	660+640
			1,273.20	59.73	660+660
			1,208.42	61.11	660+680
			1,237.10	62.60	660+700
KM-UE (53)A			1,270.59	64.46	660+720
			1,368.00	72.34	660+740
			1,386.40	66.30	660+760
			1,324.74	66.18	660+780
			1,320.02	65.82	660+800

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

البلدية كونسالت الإنشائية
HSE-Dir-ino-sec: 05
الاستشارات الهندسية



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطر الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2

رقم العقد (2024/2023/5) (د)

تنفيذ شركة : المستقبل للمقاولات العمومية

2024/09/02


اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (105)	198,586.39	FERMA	1,271.40	61.32	660+820
			1,224.63	61.15	660+840
			1,281.29	66.98	660+860
			1,428.83	75.90	660+880
			1,521.46	76.25	660+900
			1,572.23	80.98	660+920
			1,633.15	82.34	660+940
			1,635.28	81.19	660+960
			1,643.00	83.11	660+980
			1,652.67	82.16	661+000
			1,671.20	84.96	661+020
			1,926.07	107.64	661+040
KM-UE (101)			2,111.62	103.52	661+060
			2,019.03	98.39	661+080
			2,058.11	107.43	661+100
			2,156.26	108.20	661+120
			2,135.47	105.35	661+140
			2,111.61	105.81	661+160
			2,145.65	108.75	661+180
KM-UE (101)R			2,195.84	110.83	661+200
			2,191.52	108.32	661+220

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	(د) (2024/2023/5)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
		2024/09/02	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (101)R	198,586.39	FERMA	2,162.03	107.88	661+240
KM-UE-(72)	5,952.66	-0.25	0.00	102.33	661+240
			2,018.23	99.49	661+260
			1,967.36	97.25	661+280
			1,967.07	99.46	661+300
KM-UE-(103)	9,974.75	-1.00	0.00	87.33	661+300
			1,779.35	90.61	661+320
			1,792.37	88.63	661+340
			1,715.31	82.90	661+360
			1,623.64	79.46	661+380
			1,562.56	76.79	661+400
			1,501.52	73.36	661+420
KM-UE-(104)	9,080.16	-0.75	0.00	77.92	661+420
			1,517.04	73.78	661+440
			1,486.70	74.89	661+460
			1,546.10	79.72	661+480
			1,565.53	76.83	661+500
			1,510.20	74.19	661+520
			1,454.59	71.27	661+540



شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	رقم العقد	
	(د) (2024/2023/5)	
	تنفيذ شركة : المستقبل للمقاولات العمومية	
اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		2024/09/02

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE-(84)R	12,311.55	-1.25	0.00	60.51	661+540
			1,314.16	70.91	661+560
			1,568.25	85.91	661+580
			1,647.90	78.88	661+600
			1,812.19	102.34	661+620
			2,026.86	100.34	661+640
			1,927.59	92.42	661+660
			2,014.60	109.04	661+680
KM-UE (96)	43,195.94	-1.00	0.00	115.25	661+680
			2,171.76	101.93	661+700
			2,054.69	103.54	661+720
			2,228.43	119.31	661+740
			2,647.00	145.39	661+760
			2,585.43	113.15	661+780
			2,177.51	104.60	661+800
			2,062.90	101.69	661+820
KM-UE (89)R			1,872.08	85.52	661+840
			1,719.84	86.46	661+860
			1,770.28	90.56	661+880
			2,056.46	115.08	661+900

استشارى الأعمال
Blue Line-sec-05
بالقطاع الخامس

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإتفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2

(د) (2024/2023/5)

رقم العقد

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (89)R	43,195.94	-1.00	2,543.22	139.24	661+920
			2,767.85	137.54	661+940
			2,769.46	139.40	661+960
			2,733.15	133.91	661+980
			2,695.26	135.61	662+000
			2,905.77	154.96	662+020
			3,434.85	188.52	662+040
KM-UE (93)	39,917.83	-1.25	0.00	182.32	662+040
			3,401.21	157.80	662+060
			3,108.69	153.07	662+080
			3,024.85	149.42	662+100
			2,902.57	140.84	662+120
			3,176.87	176.85	662+140
			3,504.05	173.56	662+160
			3,105.38	136.98	662+180
			2,669.97	130.02	662+200
			2,551.83	125.16	662+220
			2,486.51	123.49	662+240
			2,477.92	124.31	662+260
			2,557.95	131.49	662+280

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	رقم العقد		(د) (2024/2023/5)
	تنفيذ شركة :		المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		2024/09/02

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (93)	39,917.83	-1.25	2,575.17	126.03	662+300
			2,374.86	111.46	662+320
KM-UE(253)	7,623.47	-1.50	0.00	105.07	662+320
			2,080.17	102.95	662+340
			1,823.13	79.36	662+360
			1,514.94	72.13	662+380
			1,286.07	56.48	662+400
			919.16	35.44	662+420
KM-UE(92)	838.35	-2.50	0.00	8.69	662+420
			248.66	16.18	662+440
			328.41	16.66	662+460
			261.28	9.47	662+480


445,525.20

الاجمالي

مهندس استشاري الهيئة
(مستشار)



مهندس استشاري المساحة

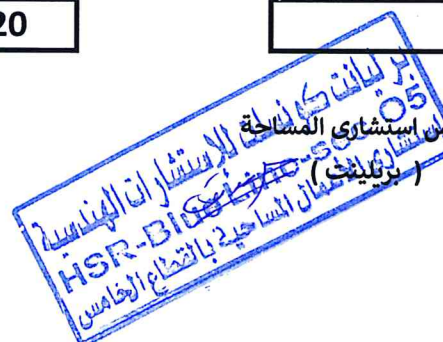

مهندس الشركة

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ك: ١٦٣٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



مشروع القطر الكهربائي السريع
حصري اجمالي اعمال الصلح سركم لستقبل للمقاولات العوميه

مستخلص جاري 2	رقم العقد	(د) (2024/2023/5)
	تنفيذ شركة :	المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ	2024/09/02

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة

Notse	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030

البيانات كوكيل الاستشارات الهندسية
Blue Line-sec. 05
الاستشارات الهندسية

سركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٨٨.٩٥
ب.ن: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



شركة المستقبل للمقاولات المعمارية
662-710
1,273.79
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	رقم العقد	(د) (2024/2023/5)
	تنفيذ شركة :	المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ	
	2024/09/02	

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة

Notse	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
	358,160.1	الاجمالي		





توضيح اعمال الحصر

شركة المستقبل للمقاولات العمومية

بيان الكميات بالشهور من المواقف التنفيذية ومحاضر الحصر

الشهر	كمياتالموقف التنفيذي	كميات الحصر	الفرق بين الكميات	كمية الصخر	صخر اجهاد (٥٠٠٠٠٠٠)	كمية شديدة التماسك	كمية التربة المتماسكة
مايو-٢٣	15000		15000				
يونيو-٢٣	35000		20000				
يوليو-٢٣		222035.37	187035.37				
أغسطس-٢٣	234800.00		12764.63				
أكتوبر-٢٣		296305.06	61505.06				
نوفمبر-٢٣		335614.19	39309.13				
يناير-٢٤		358164.21	22550.02				
أغسطس-٢٤		358160.1					
الاجمالي		358160.1	358160.10	25000	25000	2442	330718.10

يعتمد من مهندس الهيئة

مستشاري الهيئة

مهندس الشركة المنقذة



شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

محضر معاينة لتصنيف تربة القطع

مشروع القطار السريع - المرحلة الثانية 6 أكتوبر ابو سمبل - القطاع الخامس (قوص - ارمنت)

قطاع شركة :- المستقبل للمقاولات العمومية.

بالإشارة الى مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم 658+840 الى الكم 662+820 بطول 3.98 كم

لتنفيذ المشروع عالية :-

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2024 / 8 / 5 بحضور كلا من :-

- 1 - م / أحمد عبد الباسط ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 2 - م / محمد عبد الحميد ممثل مكتب الاستشارى (سبكتروم)
- 3 - م / عبد الله محمد ممثل مكتب برليانت للاستشارات الهندسية
- 4 - م / محمود حمادة ممثل الشركة المنفذة (المستقبل للمقاولات العمومية)

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع الموضح بعالية وذلك لتحديد نوع التربة المدرجة بالكمية الحالية وكانت كالتالى :-


ملاحظات	TO		FROM		TO		FROM		النطاق
	662+820		662+560		659+060		658+840		
	تربة صخرية	تربة شديدة التماسك	تربة متماسكة	تربة صخرية	تربة شديدة التماسك	تربة متماسكة	نوع التربة		
	10.357 %	1.012 %	88.632%	0%	0 %	100 %	النسبة		
	25000	2442	213950.98	0	0	116767.08	الكمية		
	241392.98			116767.08			الكمية الإجمالية		
358160.06	330718.06			اجمالي تربة متماسكة					
	2442			اجمالي تربة شديدة متماسكة					
	25000			اجمالي تربة صخرية					

الاسم :
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكبارى

سبكتروم
Spectrum
استشارى
التوقيع :
مكتب استشارى سبكتروم

برليانت
برليانت للاستشارات
HSE-Dir-sec.05
التوقيع :
مكتب استشارى برليانت

شركة المستقبل
شركة المستقبل للمقاولات العمومية
التوقيع :
شركة المستقبل



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة متماسكة)

المستقبل للمقاولات العمومية



تنفيذ شركة :


2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة المتماسكة

Notse	تربة متماسكة Cum	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	12,349.51	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	24,885.36	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	36,747.76	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	48,230.39	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	58,865.56	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	68,303.21	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	76,845.30	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	84,461.51	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	90,948.99	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	96,167.28	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	99,988.62	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	102,657.22	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	104,397.34	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	105,537.38	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	106,743.89	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	108,309.43	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	110,065.55	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	111,950.22	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	113,872.68	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030
	115,439.90	115,439.90	1,567.22	124.50	659+040
	116,373.88	116,373.88	933.98	62.30	659+050
	116,767.08	116,767.08	393.20	16.34	659+060
	0.00	0.00	0.00	82.58	662+560
	1,004.93	1,133.82	1,133.82	144.18	662+570
	2,639.79	2,978.38	1,844.56	224.73	662+580
	5,075.99	5,727.05	2,748.67	325.00	662+590
	8,454.91	9,539.36	3,812.31	437.46	662+600
	12,845.94	14,493.60	4,954.24	553.39	662+610

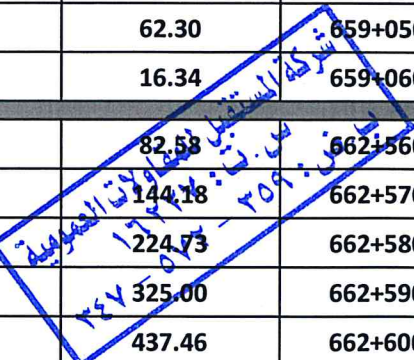



الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TABALA
(NAT)



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة متماسكة)

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة المتماسكة

Notse	تربة متماسكة CUVA	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	18,316.70	20,666.05	6,172.45	681.10	662+620
	24,862.72	28,051.69	7,385.64	796.03	662+630
	32,333.81	36,481.04	8,429.35	889.84	662+640
	40,604.40	45,812.44	9,331.40	976.44	662+650
	49,505.62	55,855.36	10,042.92	1,032.15	662+660
	58,723.27	66,255.29	10,399.93	1,047.84	662+670
	68,188.09	76,934.10	10,678.81	1,087.92	662+680
	78,271.06	88,310.34	11,376.24	1,187.33	662+690
	89,106.26	100,535.30	12,224.96	1,257.67	662+700
	100,324.64	113,192.58	12,657.28	1,273.79	662+710
	111,388.23	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	121,938.45	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	131,968.69	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	141,755.89	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	151,619.65	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	161,657.10	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	171,861.60	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	182,263.98	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	192,799.82	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	203,382.80	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	213,950.98	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
		330,718.060	الاجمالي		


مهندس استشاري الهيئة

(سبكتروم)

التوقيع:



التوقيع:



التوقيع:



الهيئة القومية للإنفاق

NATIONAL AUTHORITY FOR SPENDING



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة شديدة التماسك)

المستقبل للمقاولات العمومية


تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة شديدة التماسك

Notse	تربة شديدة التماسك Cum	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	0.00	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	0.00	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	0.00	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	0.00	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	0.00	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	0.00	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	0.00	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	0.00	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	0.00	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	0.00	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	0.00	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	0.00	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	0.00	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	0.00	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	0.00	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	0.00	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	0.00	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	0.00	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	0.00	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030
	0.00	115,439.90	1,567.22	124.50	659+040
	0.00	116,373.88	933.98	62.30	659+050
	0.00	116,767.08	393.20	16.34	659+060
	0.00	0.00	0.00	82.58	662+560
	11.47	1,133.82	1,133.82	144.18	662+570
	30.13	2,978.38	1,844.56	224.73	662+580
	57.94	5,727.05	2,748.67	325.00	662+590
	96.50	9,539.36	3,812.31	437.46	662+600
	146.62	14,493.60	4,954.24	553.39	662+610



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمالي القطع المنفذة (تربة شديدة التماسك)

المستقبل للمقاولات العمومية



تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة شديدة التماسك

Notse	تربة شديدة التماسك cu > 25	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	209.06	20,666.05	6,172.45	681.10	662+620
	283.78	28,051.69	7,385.64	796.03	662+630
	369.05	36,481.04	8,429.35	889.84	662+640
	463.45	45,812.44	9,331.40	976.44	662+650
	565.05	55,855.36	10,042.92	1,032.15	662+660
	670.26	66,255.29	10,399.93	1,047.84	662+670
	778.29	76,934.10	10,678.81	1,087.92	662+680
	893.37	88,310.34	11,376.24	1,187.33	662+690
	1,017.04	100,535.30	12,224.96	1,257.67	662+700
	1,145.09	113,192.58	12,657.28	1,273.79	662+710
	1,271.37	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	1,391.78	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	1,506.27	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	1,617.98	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	1,730.56	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	1,845.13	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	1,961.60	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	2,080.33	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	2,200.58	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	2,321.38	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	2,442.00	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
2,442.000		الاجمالي			

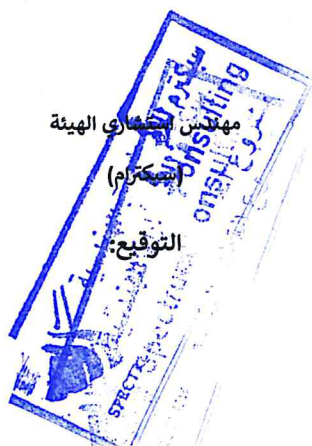



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال اعمال القطع المنفذة (صخر)

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة الصخرية

Notse	تربة صخرية	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	0.00	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	0.00	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	0.00	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	0.00	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	0.00	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	0.00	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	0.00	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	0.00	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	0.00	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	0.00	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	0.00	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	0.00	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	0.00	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	0.00	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	0.00	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	0.00	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	0.00	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	0.00	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	0.00	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030
	0.00	115,439.90	1,567.22	124.50	659+040
	0.00	116,373.88	933.98	62.30	659+050
	0.00	116,767.08	393.20	16.34	659+060
	0.00	0.00	0.00	82.58	662+560
	117.42	1,133.82	1,133.82	144.18	662+570
	308.46	2,978.38	1,844.56	224.73	662+580
	593.13	5,727.05	2,748.67	325.00	662+590
	987.95	9,539.36	3,812.31	437.46	662+600
	1,501.04	14,493.60	4,954.24	553.39	662+610



اجمالی حصر التربة الصخرية

2/2

Report

1. Evaluation and representation of results.
2. Load Settlement curve.
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate.
 - Measuring device used - Type of soil.
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition.
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test .
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve.
 - Description of the soil condition below the plate after testing.

Report

- Type of soil : Upper Embankment
- Job requirer : $E_{v2} > 60 \text{ MPa}$

Item	Descriptions
Type of bedding material below the plate	Natural Soil
Plate Diameter (mm)	300
date of measurement	: 20/07/2024
Unusual observation made during test	NO
Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		Locallion	Level (m)	First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
	From	To			E_{v1} (MPa)	E_{v2} (Mpa)	
1	661+040	661+090	: 661+060	: 0.0M	82.8	184.3	2.23

Location and Level determined by : شركة الاستشارات
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
Lab Eng. : مكتب معاميل الاستشارات الهندسية
مشاريع الاستشارات الهندسية
Signal 000 - 001 : رقم التسجيل المرفوع
الدولة : مصر - القاهرة

313 Malok El Sidat Street
Zamalek, Cairo
Tel & Fax : 27367433 - 27367434

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

شركة الاستشارات
الهندسية
معاميل
الاستشارات
الهندسية
القاهرة - مصر

Company Name : شركة لاس
Project : Electric Express Train - Sector (5) - Gous to Arment
Test Date : 20/07/2024
report date : 21/07/2024
Station : 661+060
Test No. : 01
Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Loading Stage (1)

Loading	Stress	Kg/cm ²	Dial 1		Dial 2		Average
			Settlement	mm	Settlement	mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
1	0.63	19.80	0.20	19.84	0.16	0.16	0.18
2	1.66	19.59	0.41	19.63	0.37	0.37	0.39
3	2.50	19.36	0.64	19.40	0.60	0.60	0.62
4	3.33	19.14	0.86	19.18	0.82	0.82	0.84
5	4.17	18.92	1.08	18.98	1.02	1.02	1.05
6	5.00	18.72	1.28	18.76	1.24	1.24	1.26

Unloading Stage (1)

Loading	Stress	Kg/cm ²	Dial 1		Dial 2		Average
			Settlement	mm	Settlement	mm	
1	2.50	18.84	1.16	18.87	1.13	1.13	1.15
2	1.25	19.08	0.92	19.09	0.91	0.91	0.92
3	0.100	19.40	0.60	19.42	0.58	0.58	0.59


Loading Stage (2)

Loading	Stress	Kg/cm ²	Dial 1		Dial 2		Average
			Settlement	mm	Settlement	mm	
0	0.83	19.29	0.71	19.32	0.68	0.68	0.70
1	1.66	19.17	0.83	19.21	0.79	0.79	0.81
2	2.50	19.09	0.91	19.12	0.88	0.88	0.90
3	3.33	18.98	1.02	19.01	0.99	0.99	1.01
4	4.17	18.87	1.13	18.90	1.10	1.10	1.12



Company Name : شركة لتسليم
Project : Electric Express Train - Sector (S) - Gous to Arment.
Test Date : 20/07/2024
Report date : 21/07/2024
Station : 661+060
Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

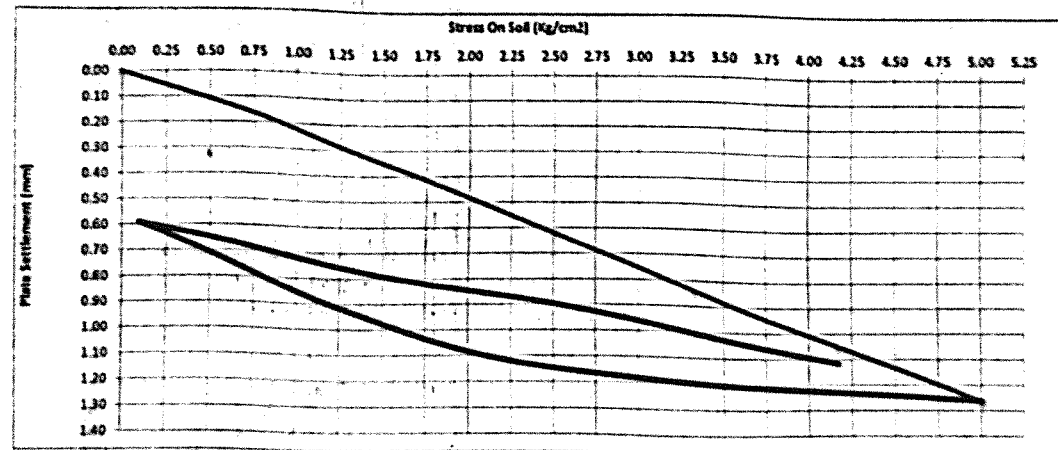

Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	666	1172.8	1766.26	2362.65	2946.11	3532.6
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.83	1.66	2.50	3.33	4.17	5.00
Settlement (mm)	0.00	0.18	0.39	0.62	0.84	1.05	1.26

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	3533	1766	884	71
Stress (Kg/cm2)	5.00	2.50	1.250	0.10
Settlement (mm)	1.26	1.15	0.92	0.58


D (mm) =	300	S1 (mm) =	0.36	S2 (mm) =	0.88	ΔS =	0.53
Ev1 (MPa) =	$(0.76 \cdot D^2 \cdot \Delta S) / \Delta S$						

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	666.395	1172.8	1766.26	2362.65	2946.11
Stress (Kg/cm2)	0.10	0.83	1.66	2.50	3.33	4.17
Settlement (mm)	0.59	0.70	0.81	0.90	1.01	1.12

Ev2/Ev1 = 2.23

D (mm) =	300	S1 (mm) =	0.79	S2 (mm) =	1.03	ΔS =	0.24
Ev2 (MPa) =	$(0.76 \cdot D^2 \cdot \Delta S) / \Delta S$						

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the unloading stage.
D = Plate diameter (mm)
ΔS = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



8 El Maadi El Akhla Street
Zamalek, Cairo.
Tel/Fax: 2736/2031 - 2736/2032



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant : Spectrum Engineering Consultants (مكتب د. عماد نبيل)
Company Name : شركة المسنجل
Testing Dat : 18/07/2024
Soil type : Upper Embankment
Location : ST from 661+040 To 661+180 (140m)
Level : 0.0 M
Report No. : 176

Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556

Test #	Station	Test Hole Volume cm ³	Bulk Density gm/cm ³	Moisture Content %	Dry Density (gm/ cm ³)	Degree of Compaction (%)	Acceptance
1	661+060	1609	2.214	6.4	2.081	95.5%	Comply
2	661+080	1571	2.206	6.4	2.073	95.1%	Comply
3	661+100	1527	2.303	6.4	2.164	99.3%	Comply
4	661+120	1496	2.306	6.4	2.168	99.4%	Comply
5	661+140	1464	2.210	6.4	2.077	95.3%	Comply
6	661+160	1482	2.300	6.4	2.161	99.1%	Comply
7	661+170	1603	2.207	6.4	2.074	95.1%	Comply

Degree of compaction based on proctor test dated At

- Max. dry density = 2.18 gm/cm³
- At optimum moisture content = 6.4%

Consultant Eng. /


Name : محمد عبد الحليم

Sign. : 

Laboratories Eng. /

Name


Sign.



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

ش.م.م. الملك الأفندي
الزمالك - القاهرة
تليفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٧٢٣٢
فاكس : ٢٧٣٦٣٠٩٣



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armani
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13


Dear Gentleman,

Attached here with the delivered on 12 / 02 / 2024

This sample is representative for 5.000 M³

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Signature / 



3 El Malek E. Most Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax 2736724 27362093



تمت
تاريخ
موقع

Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Sieve Size (IN)	Passing %
50	2	97.5
37.5	1.5	92.8
25	1	86.9
19	3/4	75.6
12.50	1/2	67.5
9.50	3/8	58.5
4.75	4	53.9
2.00	10	48.3
0.425	40	26.9


Signature /
.....



Company Name : شركة المستقبل
 Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
 Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
 Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
 Delivery Date : 12/02/2024
 Reporting Date : 17/02/2024
 Reporting No. : 05-13

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
By washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	7.5

Signature / ... 



CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب استشارات الهندسية ومختبرات

Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	0
Plastic Limit	0
Plasticity Index	0

Signature / ...

CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب استشارات الهندسية ومختبرات
مشروعات (سوهاج و قنا)
رقم التسجيل الضريبي: 537 - 991 - 219
المركز الرئيسي ٢ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax: 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Arman
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Soil Classification According To Project Specs :

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs		
• Group Classification	- (A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)	(A-2-4)
2.00 mm (No.10).	48.3	Max 50 %	-----	-----
0.425 mm (No. 40).	26.9	Max 30 %	Max 50 %	-----
0.075 mm (No. 200).	7.5	Max 15 %	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)				
Liquid Limit	-----	-----	-----	-----
Plasticity index	0	Max 6 %	Max 6 %	Max 10 %

The test results are (☐ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 



3 El Malek El Afila Street
Zaraka, Cairo
Tel: 2735777 - 2735295



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب استشارات الهندسية

Company Name : شركة المسكيت
Project : Electric Express Train - HSR From Qous To Arman
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3638
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Moisture - Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.18
- Optimum moisture content % : 6.4 %

Signature /



3 E. Mersa El Ahad Street
Joukha, Cairo
Tel: 27368933



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Arman
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	0.96
1.27	0.050	2.03
1.91	0.075	2.73
2.54	0.100	3.49
3.18	0.125	4.05
3.81	0.150	4.56
4.45	0.175	5.01
5.08	0.200	5.27
6.35	0.250	5.57

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 02 inch (5.08 mm) penetration	St. Value	Sample results	51.1 %
	10.30	5.27	

Notes:

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of = 2.18 (gm /cm³)
At = 6.4 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.
- 4- CBR > 10 for middle and lower embankments according project spec page No 36.

Signature /


3 E Maek E Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax: 21367231 - 21367093



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train - HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883

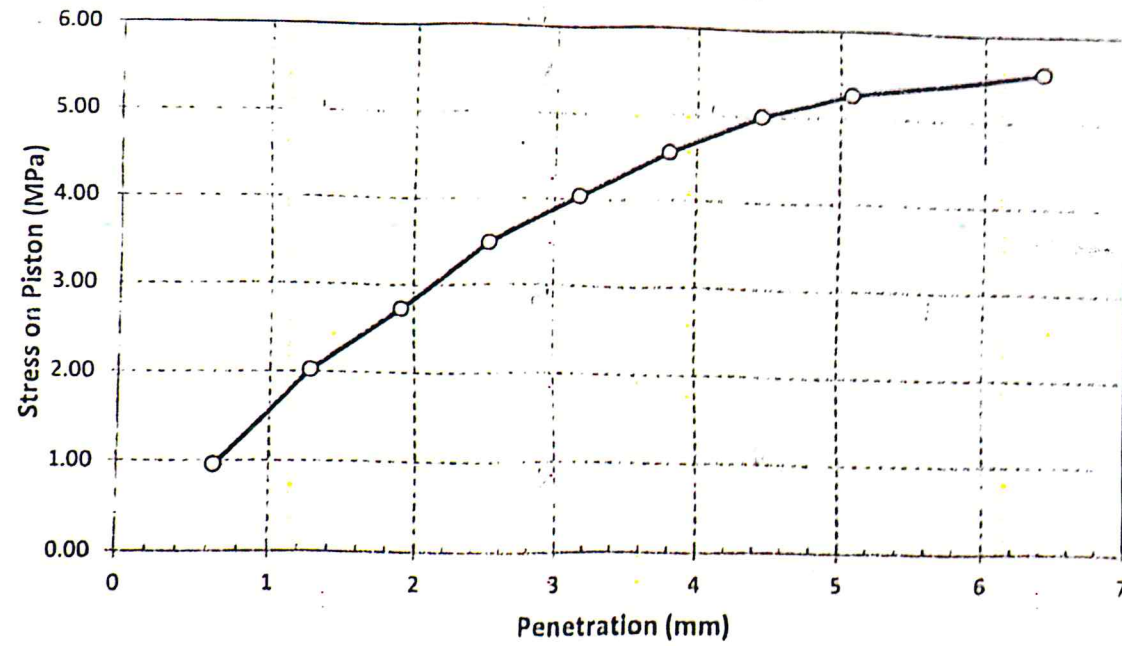

Signature / ...



3 El Marek El Afzal Street
Zamalek, Cairo
Tel & Fax: 27364701 - 27363093



مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الخامس)

من الكم 658+840 حتى الكم 662+820 بطول 3.98 كم

بيان اعمال توضيحي

م	العقد	قيمة العقد	المستخلص	كميات حفر في تربة عادية	كميات حفر في تربة شديدة التماسك بمحضر نسب تصنيف	كميات حفر في تربة صخرية بمحضر نسب تصنيف	كميات ردم سابقة	اجمالي كميات الردم السابقة	كميات ردم حالية	ما تم ترحيله من الردم	ملاحظات			
											النسبة %	كمية القطع بالمقايسة	النسبة %	
1	(ب) (2024\2023\3)	10,000,000	جارى 1	0.00	-59831.00	0.00	0.00	-115123.00	0.0000	-22527.0960	93990.1841	103892.0000	مستخلص صفري % 100	
			جارى 2	0.00	-44061.00	0.00	92595.9040							
			جارى 3	0.00	0.00	0.00								
			جارى 4		103892.00									
2	(هـ) (2024\2023\6)	10,000,000	جارى 1	0.00	0.00	0.00	-100567.00	-159936.00	138075.8494	-21860.1506	139470.0139	0.0000	مستخلص صفري % 99	
			جارى 2	0.00	0.00	0.00	-59369.00							
			جارى 3	0.00	0.00	0.00								
3	(ا) (2024\2023\2)	10,000,000	جارى 1	0.00	-140000.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	11957.2518	35744.4756	171926.5000	95%	
			جارى 2	0.00	0.00	0.00	-23330.00	0.00						
			جارى 3	0.00	0.00	0.00	-22000.00	33957.2518						
			جارى 4		140000.00		23330.00							
4	(ج) (2024\2023\4)	10,000,000	جارى 1	0.00	-86826.00	0.00	0.00	-24955.00		0.00	94960.95	97000.00	89.51%	
			جارى 2		86826.00			24955	-24955.00					
5	(د) (2024\2023\5)	10,000,000	جارى 1	0.00	0.00	0.00	-107675.00	-107675.00	130336.2288	22661.2288	139470.0140	0.0000	0.00%	
			جارى 2											
				0.00	330718.00	2442.00	25000.00	445525.20	445525.20	445525.20				اجمالي كميات تم حصره
				0.00	330718.00	0.00	23330.00	-429689.00	419920.23	-9768.77				اجمالي كميات تم صرفها
				0.00		2442.00	1670.00		25604.97	94.253%				المتبقى من الكميات

مهندس هيئة الطرق
المهندس/
التوقيع/

استشاري المساحة (برلمان)
المهندس/
التوقيع/

استشاري الهيئة (شيكترام)
المهندس/
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة
شركة المستقبل للمقاولين
س.ت: ٣٧٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧
