

مشروع طريق الفرافرة / عثمان  
بن عفان - الكفاح القطاع  
الثالث بطول 2.5 كم

تقرير - اسبوعي / شهري / تقرير  
شهري مصور

شهر نوفمبر

شهر ديسمبر



مشروع طريق الفرافرة / عثمان  
بن عفان القطاع الثالث بطول  
2.5 كم

تقرير-اسبوعي / شهري / تقرير  
شهري مصور

شهر نوفمبر

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد

قسم المشتريات: امداد رفع كفاءة فريق  
الفرارة / عمال بن عمال - الكفاح الصناعي  
الذات منارة - حيازة كريمة بليون 2.5 كم

09/11/2023

شركة البصر الاحمر العالمية للمقاولات

مبلغ صرفه	0
قيمة اجمالي الحساب	4,039,082.30

10,822,615	09/11/2023	شركة البصر الاحمر العالمية للمقاولات
09/11/2023	شركة البصر الاحمر العالمية للمقاولات	شركة البصر الاحمر العالمية للمقاولات
09/11/2023	شركة البصر الاحمر العالمية للمقاولات	شركة البصر الاحمر العالمية للمقاولات
17,235	شركة البصر الاحمر العالمية للمقاولات	شركة البصر الاحمر العالمية للمقاولات

المشتريات	نسبة التكلفة	الكمية المزمرة	الكمية المفعلة	القيمة المفعلة	القيمة المزمرة	الرقم	الرد	رقم
2 حزيران	0.00%	20,000	0	20000	31.5	1	الرد (من المورد)	1
2 حزيران	0.00%	0	0	500	20	2	مورد محلي %100	2
2 تموز	88.61%	10,079	9,921.80	20000	208	3	الرد مبالغ اقسائية (100%)	3
2 تموز	11.39%	486	518	1000	0.1	4	مورد محلي %100	4
1 ايلول	72.45%	0	25,356	20000	29	5	الرد مبالغ اقسائية (100%)	5
1 ايلول		0	0	2,536	31.5	6	مورد محلي %100	6
1 ايلول	0.00%	35,000	0	35000	158	7	الرد مبالغ اقسائية (100%)	7
3 تموز	0.00%	0	0	20000	166.35	8	مورد محلي %100	8
3 تموز	0.00%	35,000	0	35000	20	9	الرد مبالغ اقسائية (100%)	9
3 تموز	0.00%	0	0	20000	166.35	10	مورد محلي %100	10
3 تموز	0.00%	0	0	35000	158	11	الرد مبالغ اقسائية (100%)	11
3 تموز	0.00%	0	0	10000	161.35	12	مورد محلي %100	12

شركة البصر الاحمر العالمية للمقاولات

البصر الاحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرانكوا الجديد



اسم المشروع: اعمال رفع كفاءة طريق  
الرافورة / بستان بن عثمان - الكساح الفلاح  
المات سابقة حصة كريمة بطون 2.5 كم

25/11/2023

فحص ميداني

شركة ايجي الايجو العالمية للمقاولات

رقم مرسد	0
قيمة اجمالي المثل	4,072,029.50

10,122,615	26/11/2023
المحل	09/11/2023
37.63%	

قيمة ايجو الايجو	10,122,615
حصة المثل	26/11/2023
حصة المرسد	09/11/2023
حصة ايجو الايجو	37.63%

المواد	نسبة المثل	كمية المثل	ايجو المثل	ايجو كلفة المثل	المثل	الاجل	رقم
2024	0.00%	20,000	0	20000	21.5	ايجو 120	1
2024	0.00%	0	0	0	20	ايجو 500	2
2024	58.18%	9,975	10,025.00	20000	200	ايجو 120	3
2024	51.59%	484	516	1000	81	ايجو 500	4
2024	72.62%	0	0	35000	23	ايجو 120	5
2024	0.00%	0	2,536	30000	31.5	ايجو 500	6
2024	0.00%	0	0	30000	158	ايجو 120	7
2024	0.00%	0	0	30000	184	ايجو 500	8
2024	0.00%	0	0	30000	168.25	ايجو 120	9
2024	0.00%	0	0	30000	10	ايجو 500	10
2024	0.00%	0	0	30000	20.6	ايجو 120	11
2024	0.00%	0	0	30000	10.35	ايجو 500	12
2024	0.00%	0	0	30000	120	ايجو 120	13
2024	0.00%	0	0	30000	159	ايجو 500	14
2024	0.00%	0	0	30000	148.25	ايجو 120	15

موقع ايجو الايجو

الاجل



اسم المشروع: ايجال رفيع كلفة طريق  
الغرفية / ايجال بن مائة - ايجال الملاح الملاح  
الثالث بتاريخ حيازة كريمة بليون 2.5 كم

30/11/2023

الحسين بوقرف

شركة ايجال الاحمر العالمية للمقاولات

10,832,613  
08/11/2023  
الغرفية  
09/11/2023  
17,83%

شركة ايجال الاحمر العالمية للمقاولات  
شركة ايجال الاحمر العالمية للمقاولات  
شركة ايجال الاحمر العالمية للمقاولات  
شركة ايجال الاحمر العالمية للمقاولات

مبلغ صرفه	0
قيمة ايجال الملاح	4,072,029.50

الاصناف	نسبة ايجال	قيمة ايجال	ايجال ايجال						
2-جوز	0.00%	20,000	0	20000	31.5	1	ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
2-جوز	0.00%	0	0	500	29	2	ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
2-كاتب مياة	50.13%	9,975	10,025.00	28008	288	3	ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
2-كاتب	51.59%	686	318	1000	61	4	ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
2-كاتب	72.40%	0	0	39000	29	5	ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
ايجال ايجال	0.00%	35,000	2,516	0	129		ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
ايجال ايجال	0.00%	0	0	80000	166		ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
ايجال ايجال	0.00%	0	0	0	168.25		ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
ايجال ايجال	0.00%	35,000	0	0	18		ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
ايجال ايجال	0.00%	0	0	39008	10.6	7	ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
ايجال ايجال	0.00%	0	0	0	18.25		ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
ايجال ايجال	0.00%	35,000	0	0	288		ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
ايجال ايجال	0.00%	0	0	0	168		ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال
ايجال ايجال	0.00%	0	0	19008	103.25	8	ايجال ايجال	ايجال ايجال	ايجال ايجال

مجلس ايجال :

01

ايجال الاحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرانكوفون  
ايجال الاحمر العالمية للمقاولات



وزارة النقل



شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

## تقرير عن سير الاعمال نوفمبر 2023

بمشروع : انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة/ عثمان بن عفان -  
الكفاح القطاع الثالث بطول 2.5 كم

مقاوله : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

### تعريف بالمشروع :

فى اطار جهود الدولة لتنمية منطقة الفرافرة تقوم وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتطوير طريق الفرافرة / النهضة القطاع الثانى بطول 5 كم حيث تم تكليف عدد من الشركات المشهود لها بسرعة وكفاءة التنفيذ بتنفيذ المشروع ومن ضمنهم شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات ليتم تكليفها بالجزء الواقع من

- من كم 8+000 الى 10+500 كم

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد





تقرير رقم 1484 تاريخ التقرير 14/05/2019  
 (تقرير التفتيش - محطة التوليد - محطة تحلية المياه)  
 (محطة التحلية على الموقع الجديد)

رقم تقرير	المساحة	نوع الأصل		وصف
		قرش	بنية	
5	2م <sup>2</sup> 1500	10	10	يقتدر المنتج أعمال توريد وقرش مادة التبريد من التيوبين المسال متحمل لتقلبات (NCC) 10000 كجم/م <sup>3</sup> توش فوق طبقة الأسفلت بعد دعام تمكينا وتثبيتها جيدا ويتم التفتيش مادة اللصقات القوية السوية والرسومات التفصيلية المتبعة والماد بموجب مشتملكه طبقاً لاصول المتبعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات الميكنيس المتعارف . (قطب تسعة عشر ألفا وبمستطحة متر مسطح لا غير )
6	2م <sup>2</sup> 1500	10	10	يقتدر المنتج أعمال توريد وقرش مادة وتلك من الخرسانة الإنشائية وسلكه سمك 6م بعد التمسك باستخدام أبعاد صلبة ناتج تجميع كالمعتاد والتيوبين الصلب 70/100 ووزن شركة النصر بالنسبة أو ما يماثلها وبالكافيه تشمل إخراج التجارب المسجلة والتعليق على الصلابة وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للتطبيقات المعتمدة المتواجدة والرسومات التفصيلية المتبعة والماد بموجب مشتملكه طبقاً لاصول المتبعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات الميكنيس المتعارف . (قطب تسعة عشر ألفا وبمستطحة متر مسطح لا غير )
7	2م <sup>2</sup> 1500	10	10	يقتدر المنتج أعمال توريد وقرش مادة لتصله من التيوبين المسال بموجب لتقلبات RC1000 سمك 4.0 كجم/م <sup>3</sup> توش فوق طبقة الإنشائية بعد شام تمكينا وتثبيتها جيداً ويتم التفتيش طبقاً للتطبيقات القوية السوية والرسومات التفصيلية المتبعة والماد بموجب مشتملكه طبقاً لاصول المتبعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات الميكنيس المتعارف . (قطب تسعة عشر ألفا وبمستطحة متر مسطح لا غير )
8	2م <sup>2</sup> 1500	10	10	يقتدر المنتج أعمال توريد وقرش مادة سطحية من الخرسانة الإنشائية على أبعاد مسلكه سمك 6م بعد التمسك باستخدام أبعاد صلبة ناتج تجميع كالمعتاد والتيوبين الصلب 70/100 ووزن شركة النصر بالنسبة أو ما يماثلها وبالكافيه تشمل إخراج التجارب المسجلة والتعليق على الصلابة وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للتطبيقات المعتمدة المتواجدة والرسومات التفصيلية المتبعة والماد بموجب مشتملكه طبقاً لاصول المتبعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات الميكنيس المتعارف . (قطب تسعة عشر ألفا وبمستطحة متر مسطح لا غير )

محمد وشيخ وشرف كافي  
 مدير الاحمر العالمية للتجارة  
 ب.ع. 11511  
 رقم الهاتف: 011-4444444  
 رقم الفاكس: 011-4444444

14/05/2019  
 All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.



# الموقف التنفيذي



## المكتب الفني

مشروع ميناء وميناء لتزويد الوقود والبيئة والطاقة (1+1) بحرين صيدية  
 31/3/2023  
 من بداية العمل إلى إلى



المتر	المتر	المتر
0+000	0+000	0+000
0+020	0+020	0+020
0+040	0+040	0+040
0+060	0+060	0+060
0+080	0+080	0+080
0+100	0+100	0+100
0+120	0+120	0+120
0+140	0+140	0+140
0+160	0+160	0+160
0+180	0+180	0+180
0+200	0+200	0+200
0+220	0+220	0+220
0+240	0+240	0+240
0+260	0+260	0+260
0+280	0+280	0+280
0+300	0+300	0+300
0+320	0+320	0+320
0+340	0+340	0+340
0+360	0+360	0+360
0+380	0+380	0+380
0+400	0+400	0+400
0+420	0+420	0+420
0+440	0+440	0+440
0+460	0+460	0+460
0+480	0+480	0+480
0+500	0+500	0+500
0+520	0+520	0+520
0+540	0+540	0+540
0+560	0+560	0+560
0+580	0+580	0+580
0+600	0+600	0+600
0+620	0+620	0+620
0+640	0+640	0+640
0+660	0+660	0+660
0+680	0+680	0+680
0+700	0+700	0+700
0+720	0+720	0+720
0+740	0+740	0+740
0+760	0+760	0+760
0+780	0+780	0+780
0+800	0+800	0+800
0+820	0+820	0+820
0+840	0+840	0+840
0+860	0+860	0+860
0+880	0+880	0+880
0+900	0+900	0+900
0+920	0+920	0+920
0+940	0+940	0+940
0+960	0+960	0+960
0+980	0+980	0+980
1+000	1+000	1+000

المتر	المتر	المتر
1+020	1+020	1+020
1+040	1+040	1+040
1+060	1+060	1+060
1+080	1+080	1+080
1+100	1+100	1+100
1+120	1+120	1+120
1+140	1+140	1+140
1+160	1+160	1+160
1+180	1+180	1+180
1+200	1+200	1+200
1+220	1+220	1+220
1+240	1+240	1+240
1+260	1+260	1+260
1+280	1+280	1+280
1+300	1+300	1+300
1+320	1+320	1+320
1+340	1+340	1+340
1+360	1+360	1+360
1+380	1+380	1+380
1+400	1+400	1+400
1+420	1+420	1+420
1+440	1+440	1+440
1+460	1+460	1+460
1+480	1+480	1+480
1+500	1+500	1+500
1+520	1+520	1+520
1+540	1+540	1+540
1+560	1+560	1+560
1+580	1+580	1+580
1+600	1+600	1+600
1+620	1+620	1+620
1+640	1+640	1+640
1+660	1+660	1+660
1+680	1+680	1+680
1+700	1+700	1+700
1+720	1+720	1+720
1+740	1+740	1+740
1+760	1+760	1+760
1+780	1+780	1+780
1+800	1+800	1+800
1+820	1+820	1+820
1+840	1+840	1+840
1+860	1+860	1+860
1+880	1+880	1+880
1+900	1+900	1+900
1+920	1+920	1+920
1+940	1+940	1+940
1+960	1+960	1+960
1+980	1+980	1+980
2+000	2+000	2+000

المتر	المتر	المتر
2+020	2+020	2+020
2+040	2+040	2+040
2+060	2+060	2+060
2+080	2+080	2+080
2+100	2+100	2+100
2+120	2+120	2+120
2+140	2+140	2+140
2+160	2+160	2+160
2+180	2+180	2+180
2+200	2+200	2+200
2+220	2+220	2+220
2+240	2+240	2+240
2+260	2+260	2+260
2+280	2+280	2+280
2+300	2+300	2+300
2+320	2+320	2+320
2+340	2+340	2+340
2+360	2+360	2+360
2+380	2+380	2+380
2+400	2+400	2+400
2+420	2+420	2+420
2+440	2+440	2+440
2+460	2+460	2+460
2+480	2+480	2+480
2+500	2+500	2+500
2+520	2+520	2+520
2+540	2+540	2+540
2+560	2+560	2+560
2+580	2+580	2+580
2+600	2+600	2+600
2+620	2+620	2+620
2+640	2+640	2+640
2+660	2+660	2+660
2+680	2+680	2+680
2+700	2+700	2+700
2+720	2+720	2+720
2+740	2+740	2+740
2+760	2+760	2+760
2+780	2+780	2+780
2+800	2+800	2+800
2+820	2+820	2+820
2+840	2+840	2+840
2+860	2+860	2+860
2+880	2+880	2+880
2+900	2+900	2+900
2+920	2+920	2+920
2+940	2+940	2+940
2+960	2+960	2+960
2+980	2+980	2+980
3+000	3+000	3+000

المتر	المتر	المتر
3+020	3+020	3+020
3+040	3+040	3+040
3+060	3+060	3+060
3+080	3+080	3+080
3+100	3+100	3+100
3+120	3+120	3+120
3+140	3+140	3+140
3+160	3+160	3+160
3+180	3+180	3+180
3+200	3+200	3+200
3+220	3+220	3+220
3+240	3+240	3+240
3+260	3+260	3+260
3+280	3+280	3+280
3+300	3+300	3+300
3+320	3+320	3+320
3+340	3+340	3+340
3+360	3+360	3+360
3+380	3+380	3+380
3+400	3+400	3+400

المهندس الأستاذ أحمد العالبي للتقانات  
 موقع الفراولة الجديد

# البرنامج الزمني

## البرنامج الزمني



الجمهورية العربية السعودية  
المملكة العربية السعودية  
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  
Kingdom of Saudi Arabia  
Ministry of Planning, Economic and Social Development

شركة محمد وثية وشركاه لبحر الأحمر العالمية  
للشؤون

جدول زمني لمشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق البراري بامتداد بن عتبان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم.  
حدا كريمة



الجمهورية العربية السعودية  
المملكة العربية السعودية  
وزارة النقل والخدمات اللوجستية  
Kingdom of Saudi Arabia  
Ministry of Transport, Logistics and Road Safety

الهيئة العامة للطرق والكباري والجسور بمنطقة تبوك غير

فترة توزيع الأعمال على مدة المشروع ( شهور )

بيان الأعمال	2023	
	ديسمبر	نوفمبر
وحدة		
بيان الأعمال		
الأعمال المصاحبة		
أعمال قطع ورألة		
أعمال		
MCO		
ربطية		
RC2		
مسطحة		
إدم لويمة (مطبات)		

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشرايفرة الجديد

*(Handwritten signature)*

# كشف المعدات بالموقع

الشركة المتفحذة		العالمية		المشروع
شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات Red Sea International O. Contractors 100 شارع الملك عبدالعزيز - جدة 21581 011 4663 1111		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الجوي General Authority for Road and Bridges and Air Transport 100 شارع الملك عبدالعزيز - جدة 21581 011 4663 1111		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القاهرة / عمان بن عمان - الكناح (القطاع الثالث) سائر حياه كريمة ال 20 كم
رقم	شرح البند	نوع الخدمة	العدد المطلوب	ملاحظات
1	معمل اختبار إسفلت مركزية	1	1	
2	رافع التربة (لودر)	1	1	
3	معمل إسفلت وسواد	1	1	
4	حركات تحميل بيكوسين	لا تقل عن 100 طن	1	
5	حزام M.C	30 متر	40	
6	حزام R.C	30 متر	40	
7	مخسبة سواد	1	1	
8	موزع مياه خردول	2	2	
9	ماكينة نشر اسبرج لا تقل عن 50 لتر وادب	3	3	
10	رافع التربة	1	1	
11	كشال	2	2	
12	لوادر	1	1	
13	حركات تحميل إسفلت (في حالة وجود مساحات خرسانية بالمشروع)	بطاقة لا تقل عن 800 طن	1	
14	رافع التربة (لودر)	1	1	
15	موزعات مياه	3	3	
16	جرادير	3	3	
17	حراس تربة	3	3	
18	بالموتير على حادير	1	1	
19	عربة قلاب	4	4	
20	لودر	1	1	
21	عربة قلاب	4	4	
22	مخسبة سواد	1	1	
23	جرادير مزود بمخسبات لوزر جديد أو بمخسبة جديدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات حراس اساس 240 طن ووزنه في حدود 24 طن حديدية بمخسبة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	3	1	
24	جرادير مزود بمخسبات لوزر جديد أو بمخسبة جديدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات حراس اساس 240 طن ووزنه في حدود 24 طن حديدية بمخسبة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	2	2	
25	جرادير مزود بمخسبات لوزر جديد أو بمخسبة جديدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات حراس اساس 240 طن ووزنه في حدود 24 طن حديدية بمخسبة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	2	2	
26	جرادير مزود بمخسبات لوزر جديد أو بمخسبة جديدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات حراس اساس 240 طن ووزنه في حدود 24 طن حديدية بمخسبة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	2	2	
27	جرادير مزود بمخسبات لوزر جديد أو بمخسبة جديدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات حراس اساس 240 طن ووزنه في حدود 24 طن حديدية بمخسبة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	2	2	
28	جرادير مزود بمخسبات لوزر جديد أو بمخسبة جديدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات حراس اساس 240 طن ووزنه في حدود 24 طن حديدية بمخسبة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	2	2	
29	جرادير مزود بمخسبات لوزر جديد أو بمخسبة جديدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات حراس اساس 240 طن ووزنه في حدود 24 طن حديدية بمخسبة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	2	2	

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
 موقع الضمارة - جدة

صور للاعمال المنفذة



شركة الأهرام العالمية للتقانة  
مكتبه الشارقة الجديد



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشارقة الجديد



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفراقرة الجديد



البحر الأحمر العالمية للتقاولات  
موقع الضرافة الجديد



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضراقة الجديد



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضرافرة الجديد



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشارقة الجديد

مشروع طريق الفرافرة / عثمان  
بن عفان القطاع الثالث بطول  
2.5 كم

تقرير- اسبوعي /  
شهري / تقرير  
شهري مصور

شهر ديسمبر

البحر الأحمر العالمية للمتاولات  
موقع الفرافرة الجديد

اسم المشتري: ايمان ربح كندا طريق  
الخورقة / عثمان بن عفان - الكفاح القطيع  
معلومات مشاركة حصة كريمة بتاريخ 2.5 كم

07/12/2023

المدين المبراني

شركة اليمس الاحمر العالمية للمقاولات

مبلغ صرفه	0
قيمة اجتهاد كاشف	4,301,801.56

10,822,013
00/11/2023
القطيع
00/11/2023
39,779

قيمة من الاستد
قيمة الصافي
حصة المشتري
قيمة استلام الحصة
اسم المشتري

المشتري	نسبة الحصة	قيمة الحصة	اجتهاد قيمة الحصة	اجتهاد القيمة وقيمة	عدد	البيانات	رقم
2- جزيير	0.00%	20,000	0	20000	21.5	اجتهاد قيم 100	1
2- جزيير	0.00%	0	0	500	20	اجتهاد قيم 500	2
2- جزيير	52.40%	9,521	10,479.25	20000	700	اجتهاد قيم 1000	3
2- جزيير	51.59%	486	516	1000	02	اجتهاد قيم 1000	4
1- جزيير	79.65%	0	27,876	20000	31	اجتهاد قيم 1000	5
1- جزيير	0.00%	0	2,730	20000	18	اجتهاد قيم 1000	6
3- جزيير	0.00%	0	0	20000	18	اجتهاد قيم 1000	7
3- جزيير	0.00%	0	0	20000	10.6	اجتهاد قيم 1000	8
3- جزيير	0.00%	0	0	20000	16.71	اجتهاد قيم 1000	9
3- جزيير	0.00%	0	0	20000	130	اجتهاد قيم 1000	10
3- جزيير	0.00%	0	0	20000	139	اجتهاد قيم 1000	11
3- جزيير	0.00%	0	0	20000	181.25	اجتهاد قيم 1000	12

مجلس المدين:

مجلس الشركة:

شركة اليمس الاحمر العالمية للمقاولات  
مجلس المدين  
07/12/2023

اسم المشروع: ايجل رفيع كلفة طريق  
الغزارة / عمان بن عمان - الكناح الصناعي  
البنات متطورة حبة كريمة بطول 2.5 كم

14/12/2023  
المجلس الإداري

شركة الأيجر الاحمر المتطورة للمقاولات

0	مبلغ صرفه
11,570,085.06	قيمة ايجل المثلث

10,802,815	قيمة في ايجر
08/11/2023	تاريخ ايجل
6	عدد ايجر
09/11/2023	تاريخ ايجل المشروع
107,87%	نسبة ايجل

الاصناف	نسبة ايجل	قيمة ايجل (المبلغ)	ايجل ايجل	ايجل ايجل	ايجل ايجل	ايجل	قيمة	رقم
2-جوانبر	0.00%	20,000	0	2000	31.5	10	ايجل ايجل	1
2-جوانبر	0.00%	0	0	500	30	10	ايجل ايجل	2
2-كناح عمان	52.40%	9,521	10,679.23	10000	388	10	ايجل ايجل	3
			1,608				ايجل ايجل	
2-بور	51.59%	484	516	1000	61	10	ايجل ايجل	4
2-البنات	79.03%	0	0	3500	31	10	ايجل ايجل	5
		0	27,876		31.5	10	ايجل ايجل	
		0	2,788		358	10	ايجل ايجل	
		0	0	3500	384	10	ايجل ايجل	
		0	27,876		166.25	10	ايجل ايجل	
1-ايجل ايجل	79.03%	0	27,876	3500	384	10	ايجل ايجل	6
		0	2,788		358	10	ايجل ايجل	
		35,000	0	3500	38.6	10	ايجل ايجل	
		0	12,000		10.75	10	ايجل ايجل	
3-ايجل ايجل	34.29%	0	0	3500	39	10	ايجل ايجل	7
		35,000	0	3500	39	10	ايجل ايجل	
		0	0	3500	39	10	ايجل ايجل	
		-12,000	12,000		38.25	10	ايجل ايجل	
		34,29%	12,000		38.25	10	ايجل ايجل	
		-12,000	12,000		38.25	10	ايجل ايجل	
		1,200	1,200				ايجل ايجل	

مجلس ايجل :

المجلس الإداري  
موقع النفاذة الجليل  
1



## تقرير عن سير الاعمال ديسمبر 2023

بمشروع : انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة/ عثمان بن عفان -  
الكفاح القطاع الثالث بطول 2.5 كم

مقاوله : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

### تعريف بالمشروع :

فى اطار جهود الدولة لتنمية منطقة الفرافرة تقوم وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتطوير طريق الفرافرة / النهضة القطاع الثانى بطول 5 كم حيث تم تكليف عدد من الشركات المشهود لها بسرعة وكفاءة التنفيذ بتنفيذ المشروع ومن ضمنهم شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات ليتم تكليفها بالجزء الواقع من

– من كم 8+000 الى 10+500 كم

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد





تقرير دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في المنطقة الصناعية بـ (الرياض) - ٢٠٢٤  
 (دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع - دراسة الجدوى الاقتصادية)  
 المنطقة الصناعية بـ (الرياض)

رقم الترخيص	المساحة	بيان الأصل		القيمة	رقم الترخيص
		مبنى	أرض		
١٤٥٧٥٠٠	٤٤٠٥		مبنى	٢٠١٤٥٠٠	٥
١٤٥٧٧٥٠	١٣٧٠		مبنى	٢٠١٤٥٠٠	٦
١٤٦٧٥٠	١٠٨٥		مبنى	٢٠١٤٥٠٠	٧
١٤٥٨٧٥٠	١٧٥٥		مبنى	٢٠١٤٥٠٠	٨

١٤٨٧٧٥٠٠

موقع المنطقة الصناعية بـ (الرياض) - ٢٠٢٤  
 دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع - دراسة الجدوى الاقتصادية

محمّد وسّام الكعبي  
 مدير الأحياء العامة بمحافظات البحارة  
 رقم الترخيص: ١٤٥٧٧٥٠٠ - ١٤٥٧٧٥٠٠  
 Page 5 of 5

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
 موقع الصرافرة الجديد

# الموقف التنفيذي



المكتب الفني

31/3/2023

اليوم

من بداية العمل إلى

مشروع ميناء كريمة بحرين طريق البر شرق المدينة (قطاع جنوبى) - (طريق سائفة)



المتر	المتر	المتر
Station	Station	Station
0+000	2+000	0+000
0+020	2+020	0+020
0+040	2+040	0+040
0+060	2+060	0+060
0+080	2+080	0+080
0+100	2+100	0+100
0+120	2+120	0+120
0+140	2+140	0+140
0+160	2+160	0+160
0+180	2+180	0+180
0+200	2+200	0+200
0+220	2+220	0+220
0+240	2+240	0+240
0+260	2+260	0+260
0+280	2+280	0+280
0+300	2+300	0+300
0+320	2+320	0+320
0+340	2+340	0+340
0+360	2+360	0+360
0+380	2+380	0+380
0+400	2+400	0+400
0+420	2+420	0+420
0+440	2+440	0+440
0+460	2+460	0+460
0+480	2+480	0+480
0+500	2+500	0+500
0+520	2+520	0+520
0+540	2+540	0+540
0+560	2+560	0+560
0+580	2+580	0+580
0+600	2+600	0+600
0+620	2+620	0+620
0+640	2+640	0+640
0+660	2+660	0+660
0+680	2+680	0+680
0+700	2+700	0+700
0+720	2+720	0+720
0+740	2+740	0+740
0+760	2+760	0+760
0+780	2+780	0+780
0+800	2+800	0+800
0+820	2+820	0+820
0+840	2+840	0+840
0+860	2+860	0+860
0+880	2+880	0+880
0+900	2+900	0+900
0+920	2+920	0+920
0+940	2+940	0+940
0+960	2+960	0+960
0+980	2+980	0+980
1+000	2+000	1+000

المتر	المتر	المتر
Station	Station	Station
1+000	2+000	1+000
1+020	2+020	1+020
1+040	2+040	1+040
1+060	2+060	1+060
1+080	2+080	1+080
1+100	2+100	1+100
1+120	2+120	1+120
1+140	2+140	1+140
1+160	2+160	1+160
1+180	2+180	1+180
1+200	2+200	1+200
1+220	2+220	1+220
1+240	2+240	1+240
1+260	2+260	1+260
1+280	2+280	1+280
1+300	2+300	1+300
1+320	2+320	1+320
1+340	2+340	1+340
1+360	2+360	1+360
1+380	2+380	1+380
1+400	2+400	1+400
1+420	2+420	1+420
1+440	2+440	1+440
1+460	2+460	1+460
1+480	2+480	1+480
1+500	2+500	1+500
1+520	2+520	1+520
1+540	2+540	1+540
1+560	2+560	1+560
1+580	2+580	1+580
1+600	2+600	1+600
1+620	2+620	1+620
1+640	2+640	1+640
1+660	2+660	1+660
1+680	2+680	1+680
1+700	2+700	1+700
1+720	2+720	1+720
1+740	2+740	1+740
1+760	2+760	1+760
1+780	2+780	1+780
1+800	2+800	1+800
1+820	2+820	1+820
1+840	2+840	1+840
1+860	2+860	1+860
1+880	2+880	1+880
1+900	2+900	1+900
1+920	2+920	1+920
1+940	2+940	1+940
1+960	2+960	1+960
1+980	2+980	1+980
2+000	2+000	2+000

المتر	المتر	المتر
Station	Station	Station
2+000	2+000	2+000
2+020	2+020	2+020
2+040	2+040	2+040
2+060	2+060	2+060
2+080	2+080	2+080
2+100	2+100	2+100
2+120	2+120	2+120
2+140	2+140	2+140
2+160	2+160	2+160
2+180	2+180	2+180
2+200	2+200	2+200
2+220	2+220	2+220
2+240	2+240	2+240
2+260	2+260	2+260
2+280	2+280	2+280
2+300	2+300	2+300
2+320	2+320	2+320
2+340	2+340	2+340
2+360	2+360	2+360
2+380	2+380	2+380
2+400	2+400	2+400
2+420	2+420	2+420
2+440	2+440	2+440
2+460	2+460	2+460
2+480	2+480	2+480
2+500	2+500	2+500
2+520	2+520	2+520
2+540	2+540	2+540
2+560	2+560	2+560
2+580	2+580	2+580
2+600	2+600	2+600
2+620	2+620	2+620
2+640	2+640	2+640
2+660	2+660	2+660
2+680	2+680	2+680
2+700	2+700	2+700
2+720	2+720	2+720
2+740	2+740	2+740
2+760	2+760	2+760
2+780	2+780	2+780
2+800	2+800	2+800
2+820	2+820	2+820
2+840	2+840	2+840
2+860	2+860	2+860
2+880	2+880	2+880
2+900	2+900	2+900
2+920	2+920	2+920
2+940	2+940	2+940
2+960	2+960	2+960
2+980	2+980	2+980
3+000	2+000	3+000

المتر	المتر	المتر
Station	Station	Station
3+000	2+000	3+000
3+020	2+020	3+020
3+040	2+040	3+040
3+060	2+060	3+060
3+080	2+080	3+080
3+100	2+100	3+100
3+120	2+120	3+120
3+140	2+140	3+140
3+160	2+160	3+160
3+180	2+180	3+180
3+200	2+200	3+200
3+220	2+220	3+220
3+240	2+240	3+240
3+260	2+260	3+260
3+280	2+280	3+280
3+300	2+300	3+300
3+320	2+320	3+320
3+340	2+340	3+340
3+360	2+360	3+360
3+380	2+380	3+380
3+400	2+400	3+400

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشراة الجديد

## البرنامج الزمني

Reference: 0001  
 شركة محمد وهبة وشركه البحر الأحمر العالمية  
 للمقاولات



جدول زمني مشروع إنشاء ورفع كفاءة طرق القروية (متمثلين على الطابع الثالث) بطول 25 كم -  
 جازة كريمة

## البرنامج الزمني



الهيئة العامة للطرق والكباري والممرات المنطقة الثالثة عشر

توزيع الأعمال على مدة المشروع (شهور)		2023		2023		2023		2023	
نوع العمل	بيان الأعمال	1	2	3	4	5	6	7	8
1	الإعمال المساحية								
2	أعمال قطع وإزالة								
3	تأسيس								
4	NICO								
5	رصف								
6	RC2								
7	مسطحة								

البحر الأحمر العالمية مقاولات  
 موقع الفرقة الجديد

21



صور للاعمال المنفذة




البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضراقة الجديد




البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الصرافة الجديد



البحر الأحمر العالمية للتداولات  
موقع الشراشرة الجديد

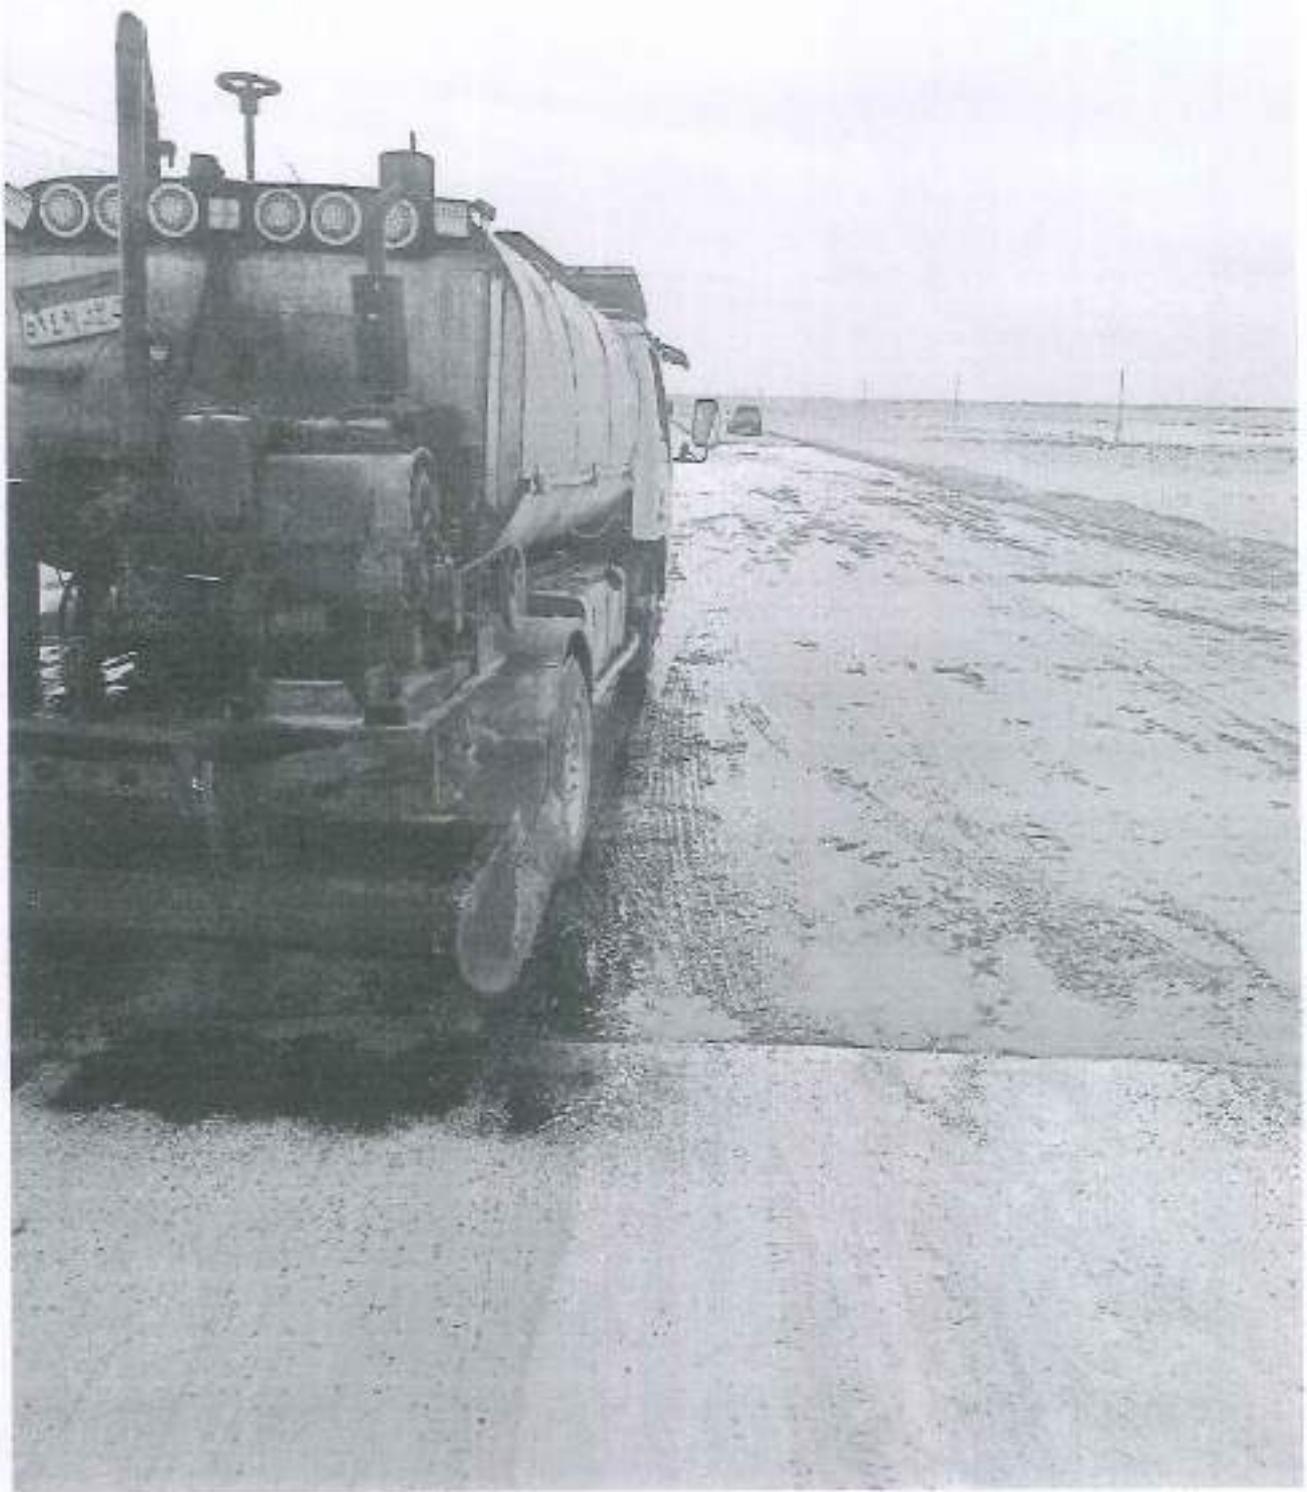

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضرافرة الجديد

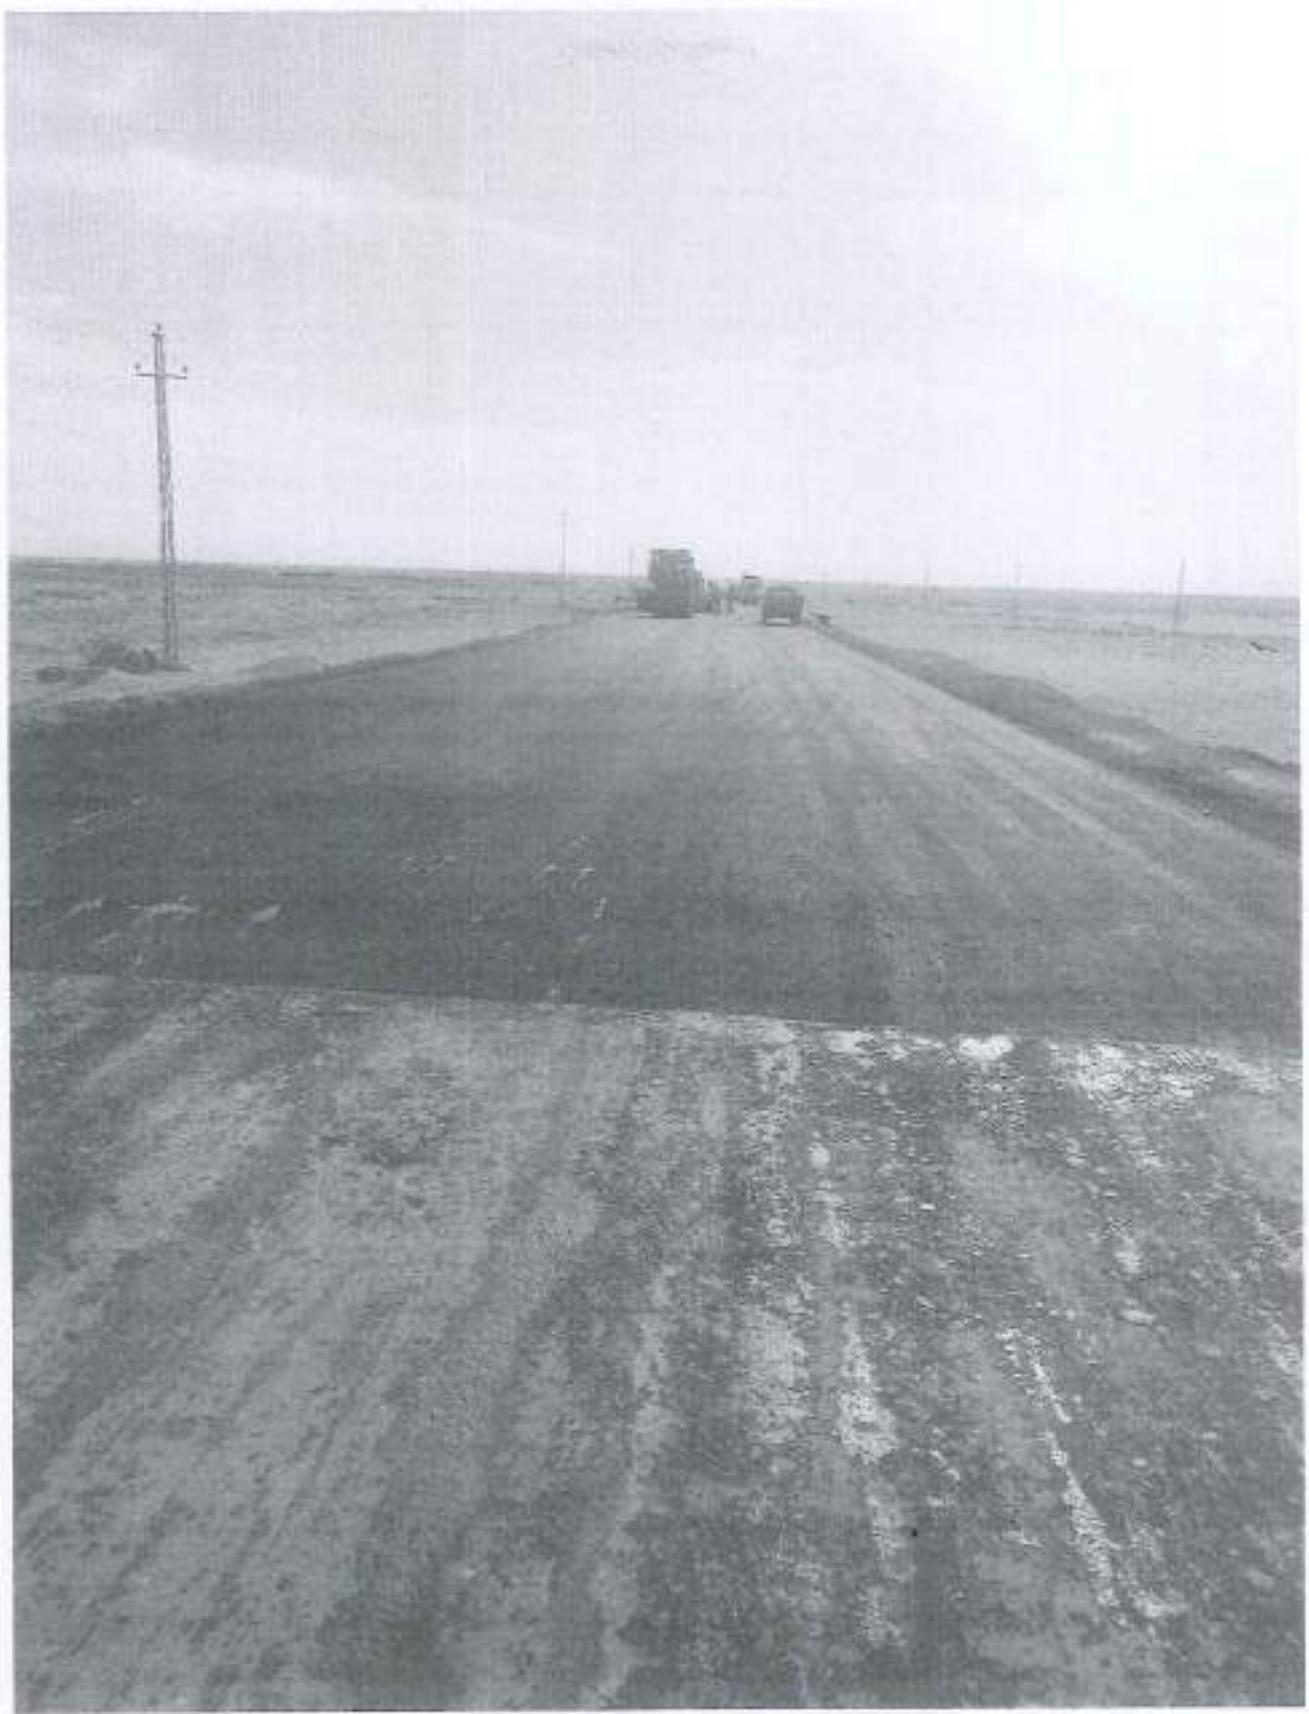

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضافرة الجديد



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضرافرة الجديد



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضرافرة الجديد



البحر الأحمر العالمية للمتاولات  
موقع الضافرة الجديد

**حصص المستخلص كامل من  
بداية العمل حتى تاريخه**

**مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة  
/ عثمان بن عفان ( القطاع الثالث )  
بطول 2.5 كم**



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد

# حصص القطع والإزالة




البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضرافة الجديد

# اجمالي كميات إزالة الاسفلت القديم

288.00	كمية حتى 10/12/2023
0	ما تم صرفه

مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة /عثمان  
بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم



AI

المشروع	المالك	الشركة المنفذة
مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القرافرة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )	شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة
مركز القرافرة - محافظة الوادى الجديد - ميانة حياة كريمة	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT CORP. LTD. شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة	Red Sea International S. Contractors شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة R S I

ملاحظات	الكمية	الطول (م)	نوع العربة	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م
				الي	من			
مستخلص 1	16.5	20	ازالة اسفلت قديم	8+940	8+920	2023-01-03	143	1
مستخلص 1	57.75	70	ازالة اسفلت قديم	8+140	8+070	2023-01-03	144	2
مستخلص 1	16.5	20	ازالة اسفلت قديم	8+230	8+210	2023-01-03	145	3
مستخلص 1	24.75	30	ازالة اسفلت قديم	8+420	8+390	2023-02-03	146	4
مستخلص 1	173.25	210	ازالة اسفلت قديم	9+650	9+440	2023-02-03	147	5
288.75		الاجمالى						

مجال التوقيع



مهندس الشركة المنفذة  
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
موقع القرافرة الجديد

# حصص الاثربة



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشرفية الجبلية

# اجمالي كميات الاتربة (طبانات)

13174.00	كمية حتى 30/12/2023
0	ما تم صرفه

مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم




*[Handwritten signature]*

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديدة

الشركة المنفذة		المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الواطرة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم	
				مركز الغفارة - محافظة الوادى الجديد - حيادى حرة كريمة	
30/12/2023	الى تاريخ	بداية العمل	1		الحصر الهندسي لكميات الاتربة ( طبقات )
			مستخلصين قائم	نوع المستخلص	
ملاحظات	الكمية المنفذة	الكمية الكلية	المساحة	المحطة	م
	107.958	107.958	4.84	8+000	1
	100.434	100.434	3.97	8+020	2
	90.63	90.63	3.98	8+040	3
	77.862	77.862	2.85	8+060	4
	71.022	71.022	3.38	8+080	5
	75.696	75.696	3.26	8+100	6
	67.488	67.488	2.66	8+120	7
	59.622	59.622	2.57	8+140	8
	73.53	73.53	3.88	8+160	9
	97.584	97.584	4.68	8+180	10
	92.112	92.112	3.4	8+200	11
	62.016	62.016	2.04	8+220	12
	65.322	65.322	3.69	8+240	13
	84.702	84.702	3.74	8+260	14
	92.682	92.682	4.39	8+280	15
	90.288	90.288	3.53	8+300	16
	88.806	88.806	4.26	8+320	17
	96.102	96.102	4.17	8+340	18
	81.51	81.51	2.98	8+360	19
	64.182	64.182	2.65	8+380	20
	51.87	51.87	1.9	8+400	21
	36.366	36.366	1.29	8+420	22
	50.844	50.844	3.17	8+440	23
	76.038	76.038	3.5	8+460	24
	81.624	81.624	3.66	8+480	25
	91.656	91.656	4.38	8+500	26
	99.294	99.294	4.33	8+520	27
	92.91	92.91	3.82	8+540	28
	83.562	83.562	3.51	8+560	29
	88.806	88.806	4.28	8+580	30
	107.274	107.274	5.13	8+600	31
	102.486	102.486	3.86	8+620	32
	99.75	99.75	4.89	8+640	33
	140.562	140.562	7.44	8+660	34
	145.578	145.578	5.33	8+680	35
	102.03	102.03	3.62	8+700	36
	96.558	96.558	4.85	8+720	37
	104.424	104.424	4.31	8+740	38
	96.672	96.672	4.17	8+760	39
	98.268	98.268	4.45	8+780	40
	103.626	103.626	4.64	8+800	41
	91.314	91.314	3.37	8+820	42
	78.09	78.09	3.48	8+840	43
	74.784	74.784	3.08	8+860	44
	68.856	68.856	2.96	8+880	45
	59.736	59.736	2.28	8+900	46
	48.108	48.108	1.94	8+920	47
	38.532	38.532	1.44	8+940	48
	61.446	61.446	3.95	8+960	49
	102.03	102.03	5	8+980	50
	147.858	147.858	7.97	9+000	51
	171.57	171.57	7.08	9+020	52
	148.2	148.2	5.92	9+040	53
	164.844	164.844	8.54	9+060	54
	193.8	193.8	8.46	9+080	55




البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
 شركة البحر الاحمر العالمية  
 مهندس مسئول

الشركة المنفذة		المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق المراقبة لرحمان بن عثمان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم	
				مركز المراقبة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة	
30/12/2023	الى تاريخ	بداية العمل	انحصار الهندسي لكميات الاتربة ( طينات )		
			% جارى	مستخلص رقم نوع المستخلص	
156.408	156.408	5.26	9+100	56	
140.79	140.79	7.09	9+120	57	
179.778	179.778	8.68	9+140	58	
133.38	133.38	3.02	9+160	59	
94.962	94.962	5.31	9+180	60	
102.6	102.6	3.69	9+200	61	
92.454	92.454	4.42	9+220	62	
151.278	151.278	8.85	9+240	63	
238.488	238.488	12.07	9+260	64	
421.344	421.344	24.89	9+280	65	
527.706	527.706	21.4	9+300	66	
578.664	578.664	29.36	9+320	67	
686.964	686.964	30.9	9+340	68	
695.856	695.856	30.14	9+360	69	
596.106	596.106	22.15	9+380	70	
452.808	452.808	17.57	9+400	71	
310.422	310.422	9.66	9+420	72	
171.798	171.798	5.41	9+440	73	
84.474	84.474	2	9+460	74	
43.662	43.662	1.83	9+480	75	
27.132	27.132	0.55	9+500	76	
9.576	9.576	0.29	9+520	77	
6.042	6.042	0.24	9+540	78	
4.674	4.674	0.17	9+560	79	
5.016	5.016	0.27	9+580	80	
14.136	14.136	0.97	9+600	81	
14.136	14.136	0.27	9+620	82	
8.436	8.436	0.47	9+640	83	
34.77	34.77	2.58	9+660	84	
73.302	73.302	3.85	9+680	85	
92.226	92.226	4.24	9+700	86	
78.66	78.66	2.66	9+720	87	
56.886	56.886	2.33	9+740	88	
52.326	52.326	2.26	9+760	89	
46.398	46.398	1.81	9+780	90	
56.202	56.202	3.12	9+800	91	
73.986	73.986	3.37	9+820	92	
67.83	67.83	2.58	9+840	93	
56.772	56.772	2.4	9+860	94	
50.274	50.274	2.01	9+880	95	
47.88	47.88	2.19	9+900	96	
62.358	62.358	3.28	9+920	97	
124.032	124.032	7.6	9+940	98	
130.986	130.986	3.89	9+960	99	
71.136	71.136	2.35	9+980	100	
76.722	76.722	4.38	10+000	101	
96.711	96.71	5.29	10+020	102	
96.083	96.08	4.32	10+040	103	
96.173	96.17	5.30	10+060	104	
102.214	102.21	4.92	10+080	105	
102.851	102.85	5.36	10+100	106	
112.760	112.76	5.91	10+120	107	
113.964	113.96	5.48	10+140	108	
106.128	106.13	5.13	10+160	109	
106.019	106.02	5.47	10+180	110	
13174	13174				




البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة  
 الاجمالى  
 مهندس الشركة الهندسة المدنية والخرسانة  
 مهندسة الشركة الهندسة المدنية والخرسانة

الشركة المنفذة	المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )	مشروع انشاء ورفق كفاءة طريق الفرافرة /عثمان بن عفان ( ) القطاع الثالث   بطول 2.5 كم
 Red Sea International S. Contractors Main Building P.O. Box 100000000 Jeddah, Saudi Arabia  البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنطقة - الفرافرة - جازان رقم 10000000000000000000 Jeddah, Saudi Arabia	 الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى Red Sea International S. Contractors Main Building P.O. Box 100000000 Jeddah, Saudi Arabia	مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة

30/12/2023		ال تاريخ	من بداية العمل		1	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المساحية لأعمال طبقة أتربة (طبقات)				
					جاري	نوع المستخلص	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م
ملاحظات	الكمية	سمك الطبقة	الطول (م)	المكان	نوع الطبقة	الى	من				
مستخلص 1	466.50	متغير	500	الطريق الرئيسي	أتربة	8+500	8+000	2023/12/05	192	1	
مستخلص 1	466.50	متغير	500	الطريق الرئيسي	أتربة	9+000	8+500	2023/12/06	193	2	
مستخلص 1	466.50	متغير	500	الطريق الرئيسي	أتربة	9+500	9+000	2023/12/07	194	3	
مستخلص 1	466.50	متغير	680	الطريق الرئيسي	أتربة	10+180	9+500	2023/12/07	197	4	



البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
مؤيد الشرافرة الجديد

الشركة المتفذة	المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )	مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة /عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
 Red Sea International & Contractors 19869, Suif, Sudan P. O. BOX 19869 Suif, Sudan Tel: +967 51 2211111 Fax: +967 51 2211111	 الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT SUDBANK	 مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة

30/12/2023		الى تاريخ		من بداية العمل		I		مستخلص رقم		بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المعملية لأعمال طبقة التربة (طبقات)		
						جاري		نوع المستخلص				
ملاحظات	نسبة الدمك %	سمك الطبقة	الطول (م)	المكان	نوع الطبقة	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م		
						الى	من					
مستخلص 1	98.30%	متغير	500	الطريق الرئيسي	أتربة	8+500	8+000	2023/12/05	192	1		
مستخلص 1	98.10%	متغير	500	الطريق الرئيسي	أتربة	9+000	8+500	2023/12/06	193	2		
مستخلص 1	98.50%	متغير	500	الطريق الرئيسي	أتربة	9+500	9+000	2023/12/07	194	3		
مستخلص 1	98.20%	متغير	680	الطريق الرئيسي	أتربة	10+180	9+500	2023/12/07	197	4		



مهندس الزميلة  
**البحر الاحمر العالمية للمقاولات**  
**مؤقتة**  
**مهندسة الشرافرة الجديد**

# حصر طبقات الاساس



البيشر الأحمر العالمية للمتاولات  
موقع الشرافة الجديد

# اجمالي كمية طبقات الأساس

الكميات المنفذة حتى تاريخ 10 / 12 / 2023	
6217.14	طبقة أساس أولى
4272.66	طبقي أساس ثانية
10489.80	الاجمالي
0.00	ما تم صرفه

مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة  
/عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول  
2.5 كم



*(Handwritten signature)*

المبشر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد


# أساس أولي



البحر الأحمر العالمية للمتاويات  
موقع الشارقة الجديد

الشركة المنفذة				المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرطرة /معتاد بن عثمان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
Red Sea International K. Contractors 10000, Dhahran, Saudi Arabia 10000, Dhahran, Saudi Arabia 10000, Dhahran, Saudi Arabia		 البحر الاحمر العالمية للمقاولات 10000, Dhahran, Saudi Arabia 10000, Dhahran, Saudi Arabia 10000, Dhahran, Saudi Arabia		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى 10000, Dhahran, Saudi Arabia 		مركز الفرطرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة
2023/12/10	الى تاريخ	الى تاريخ	بتاريخ العمل	مستخلص رقم		البحر الهندسى لكميات طبقة الأساس ( أساس أولى )
				جاري	نوع المستخلص	
ملاحظات		الكمية المنقذة أساس أولى	الكمية الكلية	المساحة	المحطة	م
		0.000	0	4.890	8+000	1
		56.800	95.6	4.670	8+020	2
		49.300	88.1	4.140	8+040	3
		37.200	76	3.460	8+060	4
		27.400	66.2	3.160	8+080	5
		24.300	63.1	3.150	8+100	6
		26.100	64.9	3.340	8+120	7
		25.900	64.7	3.130	8+140	8
		51.000	89.8	5.850	8+160	9
		90.500	129.8	7.080	8+180	10
		67.900	106.7	3.390	8+200	11
		26.800	65.6	2.970	8+220	12
		32.700	71.5	4.180	8+240	13
		53.300	92.1	5.030	8+260	14
		77.500	116.3	6.600	8+280	15
		89.000	127.8	6.180	8+300	16
		84.300	123.1	6.130	8+320	17
		85.600	124.4	6.310	8+340	18
		73.600	112.4	4.930	8+360	19
		41.500	80.3	3.100	8+380	20
		21.600	60.4	2.940	8+400	21
		20.000	58.8	2.940	8+420	22
		26.800	65.6	3.620	8+440	23
		37.900	76.7	4.050	8+460	24
		40.800	79.6	3.910	8+480	25
		42.700	81.5	4.240	8+500	26
		47.400	86.2	4.380	8+520	27
		49.600	88.4	4.460	8+540	28
		49.900	88.7	4.410	8+560	29
		56.600	95.4	5.130	8+580	30
		67.100	105.9	5.460	8+600	31
		67.800	106.6	5.200	8+620	32
		70.600	109.4	5.740	8+640	33
		72.400	111.2	5.380	8+660	34
		52.700	91.5	3.770	8+680	35
		35.800	74.6	3.690	8+700	36
		35.300	74.1	3.720	8+720	37
		36.600	75.4	3.820	8+740	38
		40.500	79.3	4.110	8+760	39
		42.000	80.8	3.970	8+780	40
		50.700	89.5	4.980	8+800	41
		59.600	98.4	4.860	8+820	42
		53.400	92.2	4.360	8+840	43

الشركة المنفذة				المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الغرابية / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
البحر الاحمر العالمية للمقاولات شركة مقاولات عالمية 100% مملوكة 100% مملوكة 100% مملوكة				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى 100% مملوكة 100% مملوكة		مركز الغرابية - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة
2023/12/15	الى تاريخ	الى تاريخ	بدأية العمل	مستخلص رقم		الحصر الهندسي لكميات طبقة الأساس ( أساس أولي )
				جاري	نوع المستخلص	
		53.000	91.8	4.820	8+860	44
		58.200	97	4.880	8+880	45
		51.200	90	4.120	8+900	46
		32.400	71.2	3.000	8+920	47
		22.500	61.3	3.130	8+940	48
		44.500	83.3	5.200	8+960	49
		65.000	103.8	5.180	8+980	50
		73.600	112.4	6.060	9+000	51
		75.900	114.7	5.410	9+020	52
		73.600	112.4	5.830	9+040	53
		75.000	113.8	5.550	9+060	54
		68.100	106.9	5.140	9+080	55
		63.900	102.7	5.130	9+100	56
		62.300	101.1	4.980	9+120	57
		52.900	91.7	4.190	9+140	58
		36.600	75.4	3.350	9+160	59
		26.000	64.8	3.130	9+180	60
		30.790	69.59	3.829	9+200	61
		41.080	79.88	4.159	9+220	62
		68.680	107.48	6.589	9+240	63
		110.880	149.68	8.379	9+260	64
		137.540	176.34	9.255	9+280	65
		155.014	193.814	10.126	9+300	66
		165.928	204.728	10.346	9+320	67
		171.028	209.828	10.636	9+340	68
		169.528	208.328	10.196	9+360	69
		159.328	198.128	9.616	9+380	70
		124.528	163.328	6.716	9+400	71
		79.928	118.728	5.156	9+420	72
		57.028	95.828	4.426	9+440	73
		48.928	87.728	4.346	9+460	74
		43.928	82.728	3.926	9+480	75
		26.825	73.0885	3.382	9+500	76
		28.85	67.65	3.38	9+520	77
		28.85	67.65	3.38	9+540	78
		28.85	67.65	3.38	9+560	79
		28.85	67.65	3.38	9+580	80
		28.85	67.65	3.38	9+600	81
		28.85	67.65	3.38	9+620	82
		28.85	67.65	3.38	9+640	83
		36.35	75.15	4.13	9+660	84
		73.85	112.65	7.13	9+680	85
		104.75	143.55	7.22	9+700	86
		85.05	123.85	5.16	9+720	87
		55.25	94.05	4.24	9+740	88

الشركة المنفذة				المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان   القطاع الثالث   بطول 2.5 كم
 Red Sea International G. Contractors P.O. Box 1000, Jeddah, Saudi Arabia T. +966 11 4611 1111 E. info@redseaintern.com www.redseaintern.com		 الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )		 مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة		
2023/12/10	الى تاريخ	الى تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	البحر الهندسى لكميات طبقة الأساس ( أساس أولي )
				جاري	نوع المستخلص	
		44.85	83.65	4.12	9+760	89
		38.25	77.05	3.58	9+780	90
		56.45	95.25	5.94	9+800	91
		79.45	118.25	5.88	9+820	92
		71.65	110.45	5.16	9+840	93
		59.05	97.85	4.62	9+860	94
		48.65	87.45	4.12	9+880	95
		40.65	79.45	3.82	9+900	96
		41.47	80.27	4.20	9+920	97
		55.47	94.27	5.22	9+940	98
		56.05	94.85	4.26	9+960	99
		42.85	81.65	3.90	9+980	100
		45.39	84.19	4.52	10+000	101
		45.17	83.97	3.88	10+020	102
		38.80	77.60	3.88	10+040	103
		38.80	77.60	3.88	10+060	104
		38.80	77.60	3.88	10+080	105
		38.80	77.60	3.88	10+100	106
		38.80	77.60	3.88	10+120	107
		38.80	77.60	3.88	10+140	108
		38.80	77.60	3.88	10+160	109
		38.80	77.60	3.88	10+180	110
		6217.136		إجمالي الكمية المنفذة م3		



ممثل الهيئة

N/S

البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشركة الجديدة

الشركة المتفئة		العقد		المشروع							
شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهيئة العامة للغزل والكرازة والنقل البرية		مشروع إنشاء وبيع وحدة مرص الشرفاء بامتداد من طابق (الطابق الثالث) بطول 2.8 كم							
Red Sea International G. Contractors 9 Makky St., Doha, Qatar, Egypt Tel.: +974 339 19 888 / +974 339 19 199 Website: redseacontractors.com.qa		المجلس الأعلى للمقاولات المقاولات البحرية العامة - مقره - شارع البحرية العامة - رقم 100 - 100 القاهرة - مصر - 11511 - 11511 Phone: +202 2334 4444		شركة المستط للحفر والبناء والتكاسير و التفاسط الكهربي RED SEA CONTRACTORS شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة							
2023 / 12 / 16		من بداية العمل		2		مستخلص رقم		بناء متابعة تطورات أعمال الأعمال المساحة وأعمال الاستغلت لعلقة ( أساس استبدال - أساس أولي )			
ال تاريخ		ال الطول (م)		رقم الطبقة		نوع العليقة		نوع المستخلص		تاريخ تقديم التصاميم	
ملاحظات		مقاس		م		م		م		م	
ملاحظات	0.5	مقاس	50	1-3	استبدال	8+200	8+150	03-03-23	148	1	
ملاحظات	0.5	مقاس	80	1-3	استبدال	8+350	8+270	03-03-23	149	2	
ملاحظات	0.5	مقاس	180	1-3	استبدال	9+120	8+560	05-05-23	150	3	
ملاحظات	0.5	مقاس	190	1-3	استبدال	9+300	8+240	03-05-23	151	4	
ملاحظات	0.5	مقاس	30	1-3	استبدال	8+850	8+800	06-03-23	152	5	
ملاحظات	0.5	مقاس	430	1-2	أساس أولي	8+430	8+000	09-03-23	153	6	
ملاحظات	0.5	مقاس	480	1-3	أساس أولي	8+500	8+430	03-09-23	154	7	
ملاحظات	0.5	مقاس	590	1-3	أساس أولي	9+590	8+910	15-03-23	157	8	
ملاحظات	0.5	مقاس	680	1-3	أساس أولي	10+180	9+900	17-03-23	158	9	



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع: الشارقة الجديدة

الشركة المنقولة	المالك	المشاريع
شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة	الهيئة العامة للغمر والكهرباء ونقل البحر	مشروع قناة دمام كالمناجير المرفأوات من موانئ (قطاع الثالث) بموانئ 2.0 كم
	المنطقة الثانية عشر (الواحد الجديدة)	
Red Sea International S. Contractors 8324246 M. - 2062421, Giza, Egypt TEL: 0020 20 79420 1340-7942 001 74 190 Email: info@redseainternational.com	الرجوع إلى الإحصائيات الشهرية للمنشآت لائحة المرجع: مكتب الغمر - الشركة العامة للغمر والكهرباء ونقل البحر القطاع الثالث - المنطقة الثانية عشر (الواحد الجديدة) 2014-2015	مركز المرفأوات - محافظة قوس، الجديدة - محافظة سيوة كريمة

2023 12/10		في تاريخ	من بداية العمل		1	مستخلص رقم		بيان متابعة طرقات تسليم الأعمال المنجزة لأعمال الاستكمال (أساس استبدال - أساس أول)		
ملاحظات	نسبة التسليم	حالة العنق	الطول (م)	رقم العنق	نوع العنق	نوع المستخلص		تاريخ تقديم الطلب	رقم العنق	م
						القطاع				
						إلى	من			
مستخلص 1	98.00%	مكتمل	30	1-0	استبدال	8-203	8-150	03-03-23	148	1
مستخلص 2	98.60%	مكتمل	90	1-0	استبدال	8-390	8-270	03-03-23	149	2
مستخلص 3	98.10%	مكتمل	100	1-0	استبدال	9-110	8-980	03-05-23	150	3
مستخلص 1	99.40%	مكتمل	100	1-0	استبدال	9-390	9-240	03-05-23	151	4
مستخلص 1	98.40%	مكتمل	10	1-0	استبدال	8-850	9-000	06-03-23	152	5
مستخلص 1	99.50%	مكتمل	490	1-2	أساس أول	8-490	8-000	03-03-23	153	6
مستخلص 1	99.70%	مكتمل	460	1-2	أساس أول	8-910	8-430	03-03-23	154	7
مستخلص 1	98.50%	مكتمل	580	1-2	أساس أول	9-900	8-910	15-03-23	157	8
مستخلص 1	98.30%	مكتمل	680	1-2	أساس أول	20-180	9-560	17-03-23	158	9



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
توقيع المراقب الجديد

# أساس تانية



مركز الأحرار العالمية للمنازل  
موقع الضافة الجليل

الشركة المنفذة		المالك		المشروع		
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )		مشروع إنشاء ورنج كفاءة طريق الفرطرة / رمضان بن عثمان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم		
 Red Sea International S. Co. Sdn. Bhd. 10th Floor, Al-Farooq Building, 10000 10000, Al-Farooq Building, 10000 10000, Al-Farooq Building, 10000		 الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )		مركز الفرطرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة		
2023/12/10	الي تاريخ	الي تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	الحصر الهندسي لكميات طبقة الأساس ( أساس ثانية )
			جاري	نوع المستخلص		
ملاحظات	الكمية المنفذة أساس ثانية	الكمية الكلية	المساحة	المحطة	م	
	0.000	0	4.890	8+000	1	
	38.800	95.6	4.670	8+020	2	
	38.800	88.1	4.140	8+040	3	
	38.800	76	3.460	8+060	4	
	38.800	66.2	3.160	8+080	5	
	38.800	63.1	3.150	8+100	6	
	38.800	64.9	3.340	8+120	7	
	38.800	64.7	3.130	8+140	8	
	38.800	89.8	5.850	8+160	9	
	38.800	129.3	7.080	8+180	10	
	38.800	106.7	3.590	8+200	11	
	38.800	65.6	2.970	8+220	12	
	38.800	71.5	4.180	8+240	13	
	38.800	92.1	5.030	8+260	14	
	38.800	116.3	6.600	8+280	15	
	38.800	127.8	6.180	8+300	16	
	38.800	123.1	6.130	8+320	17	
	38.800	124.4	6.310	8+340	18	
	38.800	112.4	4.930	8+360	19	
	38.800	80.3	3.100	8+380	20	
	38.800	60.4	2.940	8+400	21	
	38.800	58.8	2.940	8+420	22	
	38.800	65.6	3.620	8+440	23	
	38.800	76.7	4.050	8+460	24	
	38.800	79.6	3.910	8+480	25	
	38.800	81.5	4.240	8+500	26	
	38.800	86.2	4.380	8+520	27	
	38.800	88.4	4.460	8+540	28	
	38.800	88.7	4.410	8+560	29	
	38.800	95.4	5.130	8+580	30	
	38.800	105.9	5.460	8+600	31	
	38.800	106.6	5.200	8+620	32	
	38.800	109.4	5.740	8+640	33	
	38.800	111.2	5.380	8+660	34	
	38.800	91.5	3.770	8+680	35	
	38.800	74.6	3.690	8+700	36	
	38.800	74.1	3.720	8+720	37	
	38.800	75.4	3.820	8+740	38	
	38.800	79.3	4.110	8+760	39	
	38.800	80.8	3.970	8+780	40	
	38.800	89.5	4.980	8+800	41	
	38.800	98.4	4.860	8+820	42	
	38.800	92.2	4.360	8+840	43	



ممثل الهيئة

البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة  
موقع الشركة الجديد

الشركة المنفذة				المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )		مشروع انشاء ورفق كفاية طريق الفرافرة /عشمان بن صفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
Midei Red Sea International C. Contractors P.O. Box 1000, Bahariya, Egypt T: +972 10 2000 7000 Fax: +972 10 2000 7000 Email: info@redseaintern.com		 البحر الاحمر العالمية للمقاولات P.O. Box 1000, Bahariya, Egypt T: +972 10 2000 7000 Fax: +972 10 2000 7000 Email: info@redseaintern.com		مؤسسة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى P.O. Box 1000, Bahariya, Egypt T: +972 10 2000 7000 Fax: +972 10 2000 7000 Email: info@redseaintern.com		مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة
2023/12/10	الى تاريخ	الى تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	الحصر الهندسى لكميات طبقة الأساس ( أساس ثانية )
				جاري	نوع المستخلص	
		38.800	91.8	4.820	8+860	44
		38.800	97	4.880	8+880	45
		38.800	90	4.120	8+900	46
		38.800	71.2	3.000	8+920	47
		38.800	61.3	3.130	8+940	48
		38.800	83.3	5.200	8+960	49
		38.800	103.8	5.180	8+980	50
		38.800	112.4	6.060	9+000	51
		38.800	114.7	5.410	9+020	52
		38.800	112.4	5.830	9+040	53
		38.800	113.8	5.550	9+060	54
		38.800	106.9	5.140	9+080	55
		38.800	102.7	5.130	9+100	56
		38.800	101.1	4.980	9+120	57
		38.800	91.7	4.190	9+140	58
		38.800	75.4	3.350	9+160	59
		38.800	64.8	3.130	9+180	60
		38.800	69.59	3.829	9+200	61
		38.800	79.88	4.159	9+220	62
		38.800	107.48	6.589	9+240	63
		38.800	149.68	8.379	9+260	64
		38.800	176.34	9.255	9+280	65
		38.800	193.814	10.126	9+300	66
		38.800	204.728	10.346	9+320	67
		38.800	209.828	10.636	9+340	68
		38.800	208.328	10.196	9+360	69
		38.800	198.128	9.616	9+380	70
		38.800	163.328	6.716	9+400	71
		38.800	118.728	5.156	9+420	72
		38.800	95.828	4.426	9+440	73
		38.800	87.728	4.346	9+460	74
		38.800	82.728	3.926	9+480	75
		38.800	73.0885	3.382	9+500	76
		38.80	67.65	3.38	9+520	77
		38.80	67.65	3.38	9+540	78
		38.80	67.65	3.38	9+560	79
		38.80	67.65	3.38	9+580	80
		38.80	67.65	3.38	9+600	81
		38.80	67.65	3.38	9+620	82
		38.80	67.65	3.38	9+640	83
		38.80	75.15	4.13	9+660	84
		38.80	112.65	7.13	9+680	85
		38.80	143.55	7.22	9+700	86
		38.80	123.85	5.16	9+720	87
		38.80	94.05	4.24	9+740	88



ممثل الهيئة



الشركة المنفذة				المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( ) القطاع الثالث ( بطول 2.5 كم
 Red Sea International S. Contractors 11888 Al-Doha, Doha, Qatar Phone: +974 4412 7270 Fax: +974 4412 7271 Email: info@redseacontractors.com				 الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى P.O. Box 10000, Doha, Qatar Phone: +974 4412 7270 Fax: +974 4412 7271 Email: info@raab.gov.qa		مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة
2023/12/10	الى تاريخ	الى تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	الحصر الهندسي لكميات طبقة الأساس ( أساس ثانية )
				جاري	نوع المستخلص	
		38.80	83.65	4.12	9+760	89
		38.80	77.05	3.58	9+780	90
		38.80	95.25	5.94	9+800	91
		38.80	118.25	5.88	9+820	92
		38.80	110.45	5.16	9+840	93
		38.80	97.85	4.62	9+860	94
		38.80	87.45	4.12	9+880	95
		38.80	79.45	3.82	9+900	96
		38.80	80.27	4.20	9+920	97
		38.80	94.27	5.22	9+940	98
		38.80	94.85	4.26	9+960	99
		38.80	81.65	3.90	9+980	100
		38.80	84.19	4.52	10+000	101
		38.80	83.97	3.88	10+020	102
		38.80	77.60	3.88	10+040	103
		38.80	77.60	3.88	10+060	104
		38.80	77.60	3.88	10+080	105
		38.80	77.60	3.88	10+100	106
		38.80	77.60	3.88	10+120	107
		38.80	77.60	3.88	10+140	108
		38.80	77.60	3.88	10+160	109
		38.80	77.60	3.88	10+180	110
		43.46			مدخل الكفاح	111
		4272.664			الاجمالي لطبقة أساس ثانية	



ممثل الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

الشركة المنفذة		المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	مشروع الشفا، وادج كفاءة طريق الغرافرة /علمان بن سلطان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
		المحافظة الثانية عشر ( الوادى الجديد )	
Red Sea International S. Contractors 11 Hekka St., Dekki, Giza, Egypt Tel: +00202 3371 426 / Fax: +00202 3371 348 Email: info@redsea.com.eg		المس: الأحمر العالمية للمقاولات مشاريع طرق - الجوز - الجيزه تلفون: +00202 3371 426 الفاكس: +00202 3371 348 البريد الإلكتروني: info@redsea.com.eg	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES, TUNNELS AND TRANSPORT DEVELOPMENT 
		مركز الغرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة	

2023 / 12 / 10		الى تاريخ	من بداية العمل		1	مستخلص رقم		بيان متبناه طيات تسليم الأعمال المساحية لأعمال الاستئمت لعلته ( اساس تالية )		
					جاري	نوع المستخلص				
ملاحظات	العرض	سمك الطبقة	الطول (م)	رقم الطبقة	نوع الطبقة	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م
						الى	من			
	9.5	0.2	320	2-2	اساس	8+320	8+000	2023-03-17	159	1
	9.5	0.2	580	2-2	اساس	8+900	8+320	2023-03-18	160	2
	9.5	0.2	500	2-2	اساس	9+400	8+900	2023-03-21	161	3
	9.5	0.2	400	2-2	اساس	9+800	9+400	2023-03-24	162	4
	9.5	0.2	380	2-2	اساس	10+180	9+800	2023-03-25	163	5
	مغفر ( مدخل الكفاح )	0.24		1-1	اساس	مدخل الكفاح		2023-05-02	187	6



مسئول الهيئة

البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
مجلس شركة المصنعة الضرفرة الجديدة

الشركة المنفذة		المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان   القطاع الثالث   بطول 2.5 كم
		المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )	
Red Sea International G. Contractors P. 10013 St. Thani, Giza, Egypt Tel. +02 357 71 425 - 02 357 307 71 38 Email info@redseain.com		البحر الاحمر العالمية للمقاولات 1 شارع محمد ناصر - القاهرة - ج. م. ج شماره تليفون: 02 357 71 425 Email: info@redseain.com	مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة

2023 12 / 10		الى تاريخ	من بداية العمل		1	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الاعمال المعملية لاصحاب الاسفلت لطريقه ( اساس تالية )				
					جاري	نوع المستخلص	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م
ملاحظات	نسبة الدمك %	سمك الطبقة	الطول (م)	رقم الطبقة	نوع الطبقة	الى	من				
	98.60%	0.2	320	2-2	اساس	8+320	8+000	2023-03-17	159	1	
	98.60%	0.2	580	2-2	اساس	8+900	8+320	2023-03-18	160	2	
	98.60%	0.2	500	2-2	اساس	9+400	8+900	2023-03-21	161	3	
	98.70%	0.2	400	2-2	اساس	9+800	9+400	2023-03-24	162	4	
	98.30%	0.2	380	2-2	اساس	10+180	9+800	2023-03-25	163	5	
	98.60%	0.24		1-1	اساس	مدخل الكفاح		2023-05-02	187	6	



البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد

# حصر MCO



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشرافة الجديد

# اجمالي كميات MCO

18500.00	الكمية المنفذة حتى 10/12/2023
0	ما تم صرفه

مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم



*(Handwritten signature)*

البحر الأحمر العالية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد

المشروع	المالك	الشركة المنفذة
مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )	شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة
مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة	المشروع من الصفر المشروع من الصفر	Red Sea International & Contracting شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات التجارة والتجارة

2023/12/10	الي تاريخ	بداية العمل	مستخلص رقم		الحصر الهندسي لكميات طبقة الرش ( MCO )	
			1	نوع المستخلص		
			جاري			
ملاحظات	المسطح المنفذ	المساحة	الوحدة	المحطة		
	0	0	2م	8+000	1	
	0	180	2م	8+020	2	
	0	180	2م	8+040	3	
	0	180	2م	8+060	4	
	0	180	2م	8+080	5	
	0	180	2م	8+100	6	
	0	180	2م	8+120	7	
	140	180	2م	8+140	8	
	180	180	2م	8+160	9	
	180	180	2م	8+180	10	
	180	180	2م	8+200	11	
	180	180	2م	8+220	12	
	180	180	2م	8+240	13	
	180	180	2م	8+260	14	
	180	180	2م	8+280	15	
	180	180	2م	8+300	16	
	180	180	2م	8+320	17	
	180	180	2م	8+340	18	
	180	180	2م	8+360	19	
	180	180	2م	8+380	20	
	180	180	2م	8+400	21	
	180	180	2م	8+420	22	
	180	180	2م	8+440	23	
	180	180	2م	8+460	24	
	180	180	2م	8+480	25	
	180	180	2م	8+500	26	
	180	180	2م	8+520	27	
	180	180	2م	8+540	28	
	180	180	2م	8+560	29	
	180	180	2م	8+580	30	
	180	180	2م	8+600	31	
	180	180	2م	8+620	32	
	180	180	2م	8+640	33	
	180	180	2م	8+660	34	
	180	180	2م	8+680	35	
	180	180	2م	8+700	36	
	180	180	2م	8+720	37	
	180	180	2م	8+740	38	
	180	180	2م	8+760	39	
	180	180	2م	8+780	40	
	180	180	2م	8+800	41	
	180	180	2م	8+820	42	
	180	180	2م	8+840	43	
	180	180	2م	8+860		



43- البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
مهندس التركيب الكهربي  
موقع الفراولة الجديد



2023/12/10	الي تاريخ	بداية العمل	مستخلص رقم		الحصر الهندي لكميات طبقة الرش (MCO)
			1	نوع المستخلص	
			جاري		
	180	180	2م	8+880	45
	180	180	2م	8+900	46
	180	180	2م	8+920	47
	180	180	2م	8+940	48
	180	180	2م	8+960	49
	180	180	2م	8+980	50
	180	180	2م	9+000	51
	180	180	2م	9+020	52
	180	180	2م	9+040	53
	180	180	2م	9+060	54
	180	180	2م	9+080	55
	180	180	2م	9+100	56
	180	180	2م	9+120	57
	180	180	2م	9+140	58
	180	180	2م	9+160	59
	180	180	2م	9+180	60
	180	180	2م	9+200	61
	180	180	2م	9+220	62
	180	180	2م	9+240	63
	180	180	2م	9+260	64
	180	180	2م	9+280	65
	180	180	2م	9+300	66
	180	180	2م	9+320	67
	180	180	2م	9+340	68
	180	180	2م	9+360	69
	180	180	2م	9+380	70
	180	180	2م	9+400	71
	180	180	2م	9+420	72
	180	180	2م	9+440	73
	180	180	2م	9+460	74
	180	180	2م	9+480	75
	180	180	2م	9+500	76
	180	180	2م	9+520	77
	180	180	2م	9+540	78
	180	180	2م	9+560	79
	180	180	2م	9+580	80
	180	180	2م	9+600	81
	180	180	2م	9+620	82
	180	180	2م	9+640	83
	180	180	2م	9+660	84
	180	180	2م	9+680	85
	180	180	2م	9+700	86
	180	180	2م	9+720	87
	180	180	2م	9+740	88
	180	180	2م	9+760	89
	180	180	2م	9+780	90
	180	180	2م	9+800	91
	180	180	2م	9+820	92
	180	180	2م	9+840	93
	180	180	2م	9+860	94



بمصر الهندي للمقاربات  
مهندس محمد احمد الجديده



2023/12/10	الي تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	الحصر الهندسي لكميات طبقة الرش ( MCO )
			جاري	نوع المستخلص	
	180	180	2م	9+880	95
	180	180	2م	9+900	96
	180	180	2م	9+920	97
	180	180	2م	9+940	98
	180	180	2م	9+960	99
	180	180	2م	9+980	100
	180	180	2م	10+000	101
	180	180	2م	10+020	102
	180	180	2م	10+040	103
	180	180	2م	10+060	104
	180	180	2م	10+080	105
	180	180	2م	10+100	106
	180	180	2م	10+120	107
	180	180	2م	10+140	108
	180	180	2م	10+160	109
	180	180	2م	10+180	110
	0	180	2م	مدخل الكفاح	111
		19800	الإجمالي الكلي		
	18500	إجمالي الكمية المتفذة م2			



ممثل الهيئة

*(Handwritten signature)*

مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء  
موقع الفرادة الجديد

الشركة المنفذة		المالك		المشروع						
شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهدية العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفراقرة كعثمان بن عفان ( القطع الثالث ) بطول 2.5 كم						
		المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )								
<p>Red Sea International G. Contractors Wadi El-Raihi, Giza, Egypt Tel: +966 11 5661 1171 Fax: +966 11 5661 1172</p>  <p>البحر الأحمر العالمية للمقاولات التجارة والتجارة العالمية للبنية التحتية والخدمات Red Sea International G. Contractors</p>		<p>الهيئة العامة للتق و الكباري و النقل البري GENERAL AUTHORITY FOR ROAD TRANSPORT DEVELOPMENT AND MAINTENANCE</p> 		<p>مركز الفراقرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة</p>						
30/12/2023	ال تاريخ	من بداية العمل		1	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المساحية لأعمال لطبقة رش MC				
				جاري	نوع المستخلص					
ملاحظات		الكمية	الطول (م)	العرض (م)	نوع الطبقة	القطع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م
						الي	من			
مستخلص 1		9000	1000	9	رش MC	9+000	8+000	2023/11/23	168	1
مستخلص 1		10620	1180	9	رش MC	10+180	9+000	2023/11/25	169	2



البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات والتجارة

الشركة المنفذة	المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )	مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
Red Sea International G. Contractors R.S.I 99301 S. Taha, Giza, Egypt Tel: 00210 11001 4400000 Email: info@redseacontractors.com	البحر الاحمر العالمية للمقاولات المشروع: انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم Email: info@redseacontractors.com	الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى GENERAL AUTHORITY FOR ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORT CONNECTIVITY
		مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - ميانرة حياة كريمة

2023 / 12 / 15	ال تاريخ	من بداية العمل	1	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المعملية لأعمال لطبقة رش MC				
			جاري	نوع المستخلص					
ملاحظات	معدل الرش (جم/م <sup>2</sup> )	الطول (م)	العرض (م)	نوع الطبقة	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م
					الى	من			
مستخلص 1	1214	1000	9	رش MC	9+000	9+000	2023-01-04	168	1
مستخلص 2	1208	1180	9	رش MC	10+180	9+000	2023-02-04	169	2



ممثل الهيئة

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
مهندس الشركة المنفذة  
مواقع الفرافرة الجديد

# حصص الرباطة



*[Handwritten signature]*

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشرايفات الجديد

# اجمالي كميات رابطة

18500.00	الكمية المنفذة حتى 10/12/2023
0	ما تم صرفه

مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم



*(Handwritten signature)*

بمقر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرازة الجديد

الشركة المنفذة			المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )		مشروع الشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
 Red Sea International B. Contractors 1994400, JARH, 5123, 5123 P.O. BOX 11180, SA-11511, SA Jeddah, Saudi Arabia			 الهيئة العامة للطرق، والكبارى، و المخطط الحضرى والمنطقة الثانية عشر الوادى الجديد Jeddah, Saudi Arabia		مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة
10-12-23	الى تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	انصر الهندسي لكليات طبقة أسفقت الربطة
			جاري	نوع المستخلص	
ملاحظات	المسطح المنفذ	المساحة	الوحدة	المحطة	م
	0	0	2م	8+000	1
	0	180	2م	8+020	2
	0	180	2م	8+040	3
	0	180	2م	8+060	4
	0	180	2م	8+080	5
	0	180	2م	8+100	6
	0	180	2م	8+120	7
	140	180	2م	8+140	8
	180	180	2م	8+160	9
	180	180	2م	8+180	10
	180	180	2م	8+200	11
	180	180	2م	8+220	12
	180	180	2م	8+240	13
	180	180	2م	8+260	14
	180	180	2م	8+280	15
	180	180	2م	8+300	16
	180	180	2م	8+320	17
	180	180	2م	8+340	18
	180	180	2م	8+360	19
	180	180	2م	8+380	20
	180	180	2م	8+400	21
	180	180	2م	8+420	22
	180	180	2م	8+440	23
	180	180	2م	8+460	24
	180	180	2م	8+480	25
	180	180	2م	8+500	26
	180	180	2م	8+520	27
	180	180	2م	8+540	28
	180	180	2م	8+560	29
	180	180	2م	8+580	30
	180	180	2م	8+600	31
	180	180	2م	8+620	32
	180	180	2م	8+640	33
	180	180	2م	8+660	34
	180	180	2م	8+680	35
	180	180	2م	8+700	36
	180	180	2م	8+720	37
	180	180	2م	8+740	38
	180	180	2م	8+760	39
	180	180	2م	8+780	40
	180	180	2م	8+800	41
	180	180	2م	8+820	42
	180	180	2م	8+840	43
	180	180	2م	8+860	44



المهندس احمد العالمية للمقاولات  
 موضح الشركة المنفذة الجديد

الشركة المنفذة		المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العامية للتقاولات والتجارة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )		مشروع الماء ورواح كنفه طريق طوارق / عثمان بن عفان ( الطماع الثلاث ) بطول 2.5 كم	
				مركز الطوارق - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة	
10-12-22	الى تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم نوع المستخلص	احمر الهندسي لكرات طبقة اسفلت الاربعة
			جاري		
	180	180	2م	8+880	45
	180	180	2م	8+900	46
	180	180	2م	8+920	47
	180	180	2م	8+940	48
	180	180	2م	8+960	49
	180	180	2م	8+980	50
	180	180	2م	9+000	51
	180	180	2م	9+020	52
	180	180	2م	9+040	53
	180	180	2م	9+060	54
	180	180	2م	9+080	55
	180	180	2م	9+100	56
	180	180	2م	9+120	57
	180	180	2م	9+140	58
	180	180	2م	9+160	59
	180	180	2م	9+180	60
	180	180	2م	9+200	61
	180	180	2م	9+220	62
	180	180	2م	9+240	63
	180	180	2م	9+260	64
	180	180	2م	9+280	65
	180	180	2م	9+300	66
	180	180	2م	9+320	67
	180	180	2م	9+340	68
	180	180	2م	9+360	69
	180	180	2م	9+380	70
	180	180	2م	9+400	71
	180	180	2م	9+420	72
	180	180	2م	9+440	73
	180	180	2م	9+460	74
	180	180	2م	9+480	75
	180	180	2م	9+500	76
	180	180	2م	9+520	77
	180	180	2م	9+540	78
	180	180	2م	9+560	79
	180	180	2م	9+580	80
	180	180	2م	9+600	81
	180	180	2م	9+620	82
	180	180	2م	9+640	83
	180	180	2م	9+660	84
	180	180	2م	9+680	85
	180	180	2م	9+700	86
	180	180	2م	9+720	87
	180	180	2م	9+740	88
	180	180	2م	9+760	89



الشركة المنفذة			المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الغرابية / مشاة بن عثمان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
 <p>Red Sea International Q. Contractors شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد ) المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد ) www.redseacontractors.com</p>			 <p>الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد ) www.gar.gov.sa</p>		مركز القرافة - محافظة الوادى الجديد - ميادة حبالا كريمة
10-12-23	الي تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	البحر الهندسى لخدمات شبكات أسفلات الرباطة
			جاري	نوع المستخلص	
	180	180	2م	9+780	90
	180	180	2م	9+800	91
	180	180	2م	9+820	92
	180	180	2م	9+840	93
	180	180	2م	9+860	94
	180	180	2م	9+880	95
	180	180	2م	9+900	96
	180	180	2م	9+920	97
	180	180	2م	9+940	98
	180	180	2م	9+960	99
	180	180	2م	9+980	100
	180	180	2م	10+000	101
	180	180	2م	10+020	102
	180	180	2م	10+040	103
	180	180	2م	10+060	104
	180	180	2م	10+080	105
	180	180	2م	10+100	106
	180	180	2م	10+120	107
	180	180	2م	10+140	108
	180	180	2م	10+160	109
	180	180	2م	10+180	110
	0	180	2م	مدخل الكفاح	111
		19800	الإجمالي الكلي		
	18500	إجمالي الكمية المنفذة 2م			



مجال التوثيق

البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
مراجعة المرافقة الجديدة  
مهندس المحرك الهندسة

الشركة المنفذة				المالك		المشروع			
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القرافرة /علمان بن عثمان (القطاع الثالث) بطول 2.5 كم			
				المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)					
						مركز القرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة			
10/12/2023	الى تاريخ	من بداية العمل		1	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المساحية لأعمال الاسفلت لطبقة رابطة			
				جاري	نوع المستخلص				
ملاحظات	الكمية	الطول (م)	العرض (م)	نوع الطبقة	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م
					الى	من			
	9000	1000	9	رابطة	9+000	8+000	2023/11/27	185	1
	10620	1180	9	رابطة	10+180	9+000	2023/11/28	186	2



البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
مهندس الشركة المنفذة  
مؤتمن المهندس احمد الوائلى

ممثل اللجنة

الشركة العنقذة			المالك		المشروع				
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة			الهدية العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع إنشاء زواج كفاءة طريق القراقرز إسماعيل بن عثمان (القطاع الثالث) بالمول 2.5 كم				
			المنطقة الثانية عشر (الوادي الجديد)						
Red Sea International G. Contractors شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة 1 شارع الملك عبدالعزيز - الرياض 11564 Phone: +966 11 433 1111 Fax: +966 11 433 1112 Email: info@redsea.com.sa			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى 1 شارع الملك عبدالعزيز - الرياض 11564 Phone: +966 11 433 1111 Fax: +966 11 433 1112 Email: info@redsea.com.sa		مركز القراقرز - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة				
2023 / 12 / 10	ال تاريخ	من بداية العمل	1	مستخلص رقم	بيان ملائمة طلبات تسليم الأعمال المعملية لأعمال الاستمات لطبقه رابطة				
			جاري	نوع المستخلص					
ملاحظات	نسبة الأقساط	الطول (م)	العرض (م)	نوع الطبقة	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م
	4.64%	1000	9	رابطة	9+000	8+000	29/4/2023	185	1
	4.51%	1180	9	رابطة	10+180	9+000	30/4/2023	185	2



معال

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
 امواتةمسا لمتعة الشهرة لهجه ليد

حصر RC



المبصر الأحمر العالمية للمتاولات  
موقع الشارقة الجديد

# اجمالي كميات RC


18500.00	الكمية المنفذة حتى 30/12/2023
0	ما تم صرفه


مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم



*(Handwritten signature)*

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
مؤتمن الفرافرة الجديد

الشركة المنفذة			المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرارة / عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم	
 The Red International & Consultant 100000, Jeddah, Saudi Arabia P.O. Box 29095, Jeddah 21511, Saudi Arabia www.the-red.com.sa			 الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد ) www.gar.gov.sa		 مركز الفرارة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة	
30/12/2023	الى تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	الحصر الهندسي لكميات طبقة الرق ( RC2 )	
			جارى	نوع المستخلص		
ملاحظات	المسطح المنفذ	المساحة	الوحدة	المحطة	م	
	0	0	2م	8+000	1	
	0	180	2م	8+020	2	
	0	180	2م	8+040	3	
	0	180	2م	8+060	4	
	0	180	2م	8+080	5	
	0	180	2م	8+100	6	
	0	180	2م	8+120	7	
	0	180	2م	8+140	8	
	140	180	2م	8+160	9	
	180	180	2م	8+180	10	
	180	180	2م	8+200	11	
	180	180	2م	8+220	12	
	180	180	2م	8+240	13	
	180	180	2م	8+260	14	
	180	180	2م	8+280	15	
	180	180	2م	8+300	16	
	180	180	2م	8+320	17	
	180	180	2م	8+340	18	
	180	180	2م	8+360	19	
	180	180	2م	8+380	20	
	180	180	2م	8+400	21	
	180	180	2م	8+420	22	
	180	180	2م	8+440	23	
	180	180	2م	8+460	24	
	180	180	2م	8+480	25	
	180	180	2م	8+500	26	
	180	180	2م	8+520	27	
	180	180	2م	8+540	28	
	180	180	2م	8+560	29	
	180	180	2م	8+580	30	
	180	180	2م	8+600	31	
	180	180	2م	8+620	32	
	180	180	2م	8+640	33	
	180	180	2م	8+660	34	
	180	180	2م	8+680	35	
	180	180	2م	8+700	36	
	180	180	2م	8+720	37	
	180	180	2م	8+740	38	
	180	180	2م	8+760	39	
	180	180	2م	8+780	40	
	180	180	2م	8+800	41	
	180	180	2م	8+820	42	
	180	180	2م	8+840	43	
	180	180	2م	8+860	44	



30/12/2023	الي تاريخ	بداية العمل	مستخلص رقم		المحصر الهندسي لكميات طبقة المازق ( RC2 )
			1	نوع المستخلص	
			جاري		
	180	180	2م	8+880	45
	180	180	2م	8+900	46
	180	180	2م	8+920	47
	180	180	2م	8+940	48
	180	180	2م	8+960	49
	180	180	2م	8+980	50
	180	180	2م	9+000	51
	180	180	2م	9+020	52
	180	180	2م	9+040	53
	180	180	2م	9+060	54
	180	180	2م	9+080	55
	180	180	2م	9+100	56
	180	180	2م	9+120	57
	180	180	2م	9+140	58
	180	180	2م	9+160	59
	180	180	2م	9+180	60
	180	180	2م	9+200	61
	180	180	2م	9+220	62
	180	180	2م	9+240	63
	180	180	2م	9+260	64
	180	180	2م	9+280	65
	180	180	2م	9+300	66
	180	180	2م	9+320	67
	180	180	2م	9+340	68
	180	180	2م	9+360	69
	180	180	2م	9+380	70
	180	180	2م	9+400	71
	180	180	2م	9+420	72
	180	180	2م	9+440	73
	180	180	2م	9+460	74
	180	180	2م	9+480	75
	180	180	2م	9+500	76
	180	180	2م	9+520	77
	180	180	2م	9+540	78
	180	180	2م	9+560	79
	180	180	2م	9+580	80
	180	180	2م	9+600	81
	180	180	2م	9+620	82
	180	180	2م	9+640	83
	180	180	2م	9+660	84
	180	180	2م	9+680	85
	180	180	2م	9+700	86
	180	180	2م	9+720	87
	180	180	2م	9+740	88
	180	180	2م	9+760	89
	180	180	2م	9+780	90
	180	180	2م	9+800	91
	180	180	2م	9+820	92
	180	180	2م	9+840	93
	180	180	2م	9+860	



مهندس الشركة المحلة  
توقيع المهندس  
93 - 94 - 95  
مركز الدراسات والبحوث الهندسية  
بجامعة القاهرة



30/12/2023	الي تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	الحصر الهندسي لكميات طبقة الترق ( RC2 )
			جاري	نوع المستخلص	
	180	180	2م	9+880	95
	180	180	2م	9+900	96
	180	180	2م	9+920	97
	180	180	2م	9+940	98
	180	180	2م	9+960	99
	180	180	2م	9+980	100
	180	180	2م	10+000	101
	180	180	2م	10+020	102
	180	180	2م	10+040	103
	180	180	2م	10+060	104
	180	180	2م	10+080	105
	180	180	2م	10+100	106
	180	180	2م	10+120	107
	180	180	2م	10+140	108
	180	180	2م	10+160	109
	180	180	2م	10+180	110
	180	180	2م	مدخل الكفاح	111
	18500		الاجمالي		



ممثل الهيئة



الشركة المنفذة	المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة /عثمان بن عفان القطاع الثالث   بطول 2.5 كم
	المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )	
<p>Red Sea International G. Contractors</p> <p>914616, St. Bahi, Giza, Egypt Tel: +0020 11421 144-20 20 76 88 Email: info@red-sea-int.com</p>  <p>البحر الاحمر العالمية للمقاولات التجارة والتجارة التجارة والتجارة التجارة والتجارة التجارة والتجارة</p>	<p>الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى</p> <p>GENERAL AUTHORITY FOR ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (G.A.R.T.)</p> 	مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حيالة كريمة

30/12/2023	الى تاريخ	من بداية العمل		1	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المساحية لأعمال لطبقة اللصق RC			
				جارى	نوع المستخلص	م	رقم الطلب	تاريخ تقديم الطلب	القطاع
ملاحظات	الكمية	الطول (م)	العرض(م)	نوع الطبقة	الى				من
مستخلص 1	9000	1000	9	رش RC	9+000	8+000	2023/11/29	188	1
مستخلص 1	8100	900	9	رش RC	9+900	9+000	2023/11/30	190	2
مستخلص 1	2520	280	9	رش RC	10+180	9+900	2023/12/02	195	3



مختبر الهيئة



الشركة المنفذة	المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )	مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الغرافرة / عثمان بن عفان ( ) القطاع الثالث ( بطول 2.5 كم
<p>Red Sea International G. Contractors</p> <p>Red Sea International G. Contractors 10 - DC25 (Hub) Yasouf Bin Ali Email: info@redsea.com.sa</p>  <p>البحر الاحمر العالمية للمقاولات العالمية - مصر - جدة - شارع المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد ) www.redsea.com.sa</p>	<p>الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى GENERAL AUTHORITY FOR HIGHWAY, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (JABALI)</p> 	مركز الغرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة

10/12/2023	الى تاريخ	من بداية العمل		1	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المعملة لأعمال لطبقة اللصق RC			
				جاري	نوع المستخلص	م	رقم الطلب	تاريخ تقديم الطلب	القطاع
ملاحظات	معدل الرش (جم/م <sup>2</sup> )	الطول (م)	العرض (م)	نوع الطبقة	الى				من
مستخلص 1	402	1000	9	رش RC	9+000	8+000	2023/11/29	188	1
مستخلص 1	405	900	9	رش RC	9+900	9+000	2023/11/30	190	2
مستخلص 1	405	280	9	رش RC	10+180	9+900	2023/12/02	195	3



ممثل الهيئة



# حصر السطحية



البحر الأحمر العالمية للمقالات  
مؤتمن الحرة الجديد


# اجمالي كميات السطحية

18500.00	الكمية المنفذة حتى 30/12/2023
0	ما تم صرفه

مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان -  
الكفاح ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم



*[Handwritten signature]*



الشركة المنفذة		المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )		مشروع لشاء ورفع كفاءة طريق الفرطرة /مندان بن مدان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم	
 <p>Red Sea International S. Co. Sdn. Bhd. 10, Jalan 10, Damak, Kota Tinggi 81900, Johor Bahru, Johor Darul Ta'lim http://www.redseaindonesia.com</p>		 <p>الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد ) 11111, Wadi Al-Jadid, Wadi Al-Jadid 11111, Wadi Al-Jadid, Wadi Al-Jadid</p>		مركز الفرطرة - محافظة الوادى الجديد - مدينة حيرة كريمة	
30/12/2023	الى تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	الحصير الهندسى لكميات طبقة الاسفلت المنطحية
			جارى	نوع المستخلص	
ملاحظات	المسطح المنفذ	المساحة	الوحدة	المحطة	م
	0	0	2م	8+000	1
	0	180	2م	8+020	2
	0	180	2م	8+040	3
	0	180	2م	8+060	4
	0	180	2م	8+080	5
	0	180	2م	8+100	6
	0	180	2م	8+120	7
	0	180	2م	8+140	8
	140	180	2م	8+160	9
	180	180	2م	8+180	10
	180	180	2م	8+200	11
	180	180	2م	8+220	12
	180	180	2م	8+240	13
	180	180	2م	8+260	14
	180	180	2م	8+280	15
	180	180	2م	8+300	16
	180	180	2م	8+320	17
	180	180	2م	8+340	18
	180	180	2م	8+360	19
	180	180	2م	8+380	20
	180	180	2م	8+400	21
	180	180	2م	8+420	22
	180	180	2م	8+440	23
	180	180	2م	8+460	24
	180	180	2م	8+480	25
	180	180	2م	8+500	26
	180	180	2م	8+520	27
	180	180	2م	8+540	28
	180	180	2م	8+560	29
	180	180	2م	8+580	30
	180	180	2م	8+600	31
	180	180	2م	8+620	32
	180	180	2م	8+640	33
	180	180	2م	8+660	34
	180	180	2م	8+680	35
	180	180	2م	8+700	36
	180	180	2م	8+720	37
	180	180	2م	8+740	38
	180	180	2م	8+760	39
	180	180	2م	8+780	40
	180	180	2م	8+800	41
	180	180	2م	8+820	42
	180	180	2م	8+840	43
	180	180	2م	8+860	44



ممثل الهيئة

الشركة المنفذة			المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة			الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )		مشروع إنشاء وادراج كنفية طريق القوافرة /عثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
 Red Sea International Co. Contractors P.O. Box 2360, Jeddah, KSA Tel: +966 11 838 1234 Fax: +966 11 838 1234 Email: info@redseaco.com			 الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة الثانية عشر ( الوادي الجديد )		مركز القوافرة - محافظة الوادي الجديد - مملكة السعودية
30/12/2023	الي تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	البحر الهندسي لكميات طبقة الاسفلت السطحية
			جارى	نوع المستخلص	
	180	180	2م	8+880	45
	180	180	2م	8+900	46
	180	180	2م	8+920	47
	180	180	2م	8+940	48
	180	180	2م	8+960	49
	180	180	2م	8+980	50
	180	180	2م	9+000	51
	180	180	2م	9+020	52
	180	180	2م	9+040	53
	180	180	2م	9+060	54
	180	180	2م	9+080	55
	180	180	2م	9+100	56
	180	180	2م	9+120	57
	180	180	2م	9+140	58
	180	180	2م	9+160	59
	180	180	2م	9+180	60
	180	180	2م	9+200	61
	180	180	2م	9+220	62
	180	180	2م	9+240	63
	180	180	2م	9+260	64
	180	180	2م	9+280	65
	180	180	2م	9+300	66
	180	180	2م	9+320	67
	180	180	2م	9+340	68
	180	180	2م	9+360	69
	180	180	2م	9+380	70
	180	180	2م	9+400	71
	180	180	2م	9+420	72
	180	180	2م	9+440	73
	180	180	2م	9+460	74
	180	180	2م	9+480	75
	180	180	2م	9+500	76
	180	180	2م	9+520	77
	180	180	2م	9+540	78
	180	180	2م	9+560	79
	180	180	2م	9+580	80
	180	180	2م	9+600	81
	180	180	2م	9+620	82
	180	180	2م	9+640	83
	180	180	2م	9+660	84
	180	180	2م	9+680	85
	180	180	2م	9+700	86
	180	180	2م	9+720	87
	180	180	2م	9+740	88
	180	180	2م	9+760	89

مهندس الشركة المنفذة  
م. محمد بن عبد الله  
م. محمد بن عبد الله  
م. محمد بن عبد الله

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة

الشركة المنقذة			المالك		المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع إنشاء وادع كفافه طريق الفرارة / عثمان بن عقيل ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم
 <p>Red Sea International S. Co. Holding 1156266, Saudi Arabia Tel: +966 11 442 0111 www.redsea.com.sa</p>			 <p>الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى القطاع الثالث www.gar.gov.sa</p>		مركز الفرارة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياتة كريمة
30/12/2023	الي تاريخ	بداية العمل	1	مستخلص رقم	الحصر الهندسي لكميات طبقة الاسفلت السطحية
			جاري	نوع المستخلص	
	180	180	2م	9+780	90
	180	180	2م	9+800	91
	180	180	2م	9+820	92
	180	180	2م	9+840	93
	180	180	2م	9+860	94
	180	180	2م	9+880	95
	180	180	2م	9+900	96
	180	180	2م	9+920	97
	180	180	2م	9+940	98
	180	180	2م	9+960	99
	180	180	2م	9+980	100
	180	180	2م	10+000	101
	180	180	2م	10+020	102
	180	180	2م	10+040	103
	180	180	2م	10+060	104
	180	180	2م	10+080	105
	180	180	2م	10+100	106
	180	180	2م	10+120	107
	180	180	2م	10+140	108
	180	180	2م	10+160	109
	180	180	2م	10+180	110
	180	180	2م	مدخل الكفاح	111
	<b>18500</b>			<b>الاجمالي</b>	



مختل الهيئة

البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
مهندس الشركة المنقذة  
مواقع الفرارة الجديدة

الشركة المنفذة		المالك		المشروع						
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع الشاد ورفع كفاءة طريق القرافرة وعثمان بن عفان ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم						
		المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد )								
 <p>Red Sea International S. Contractors 15/Al-Bayda St., Dakhla, QUA, Egypt Tel: +201 201 7400000 Fax: 01176 460 Email: rsi@redsea-international.com</p>		 <p>المنشئ الاكبرى العالمية للمقاولات البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة المنطقة الثانية عشر ( الوادى الجديد ) P.O. Box 10000, Dakhla, QUA, Egypt Tel: +201 201 7400000 Fax: 01176 460 Email: rsi@redsea-international.com</p>		 <p>الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى Red Sea International S. Contractors 15/Al-Bayda St., Dakhla, QUA, Egypt Tel: +201 201 7400000 Fax: 01176 460 Email: rsi@redsea-international.com</p>		مركز القرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريهة				
30/12/2023	الى تاريخ	من بداية العمل		I	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المساحية لأعمال الاسفلت لطبقة سطحية				
				جارى	نوع المستخلص					
ملاحظات	الكمية	الطول (م)	العرض (م)	نوع الطبقة	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م	
					الى	من				
مستخلص 1	9000	1000	9	سطحية	9+000	8+000	2023/11/29	189	1	
مستخلص 1	8100	900	9	سطحية	9+900	9+000	2023/11/30	191	2	
مستخلص 1	2520	280	9	سطحية	10+180	9+900	2023/12/02	196	3	



ممثل الهيئة



الشركة المنفذة				المالك		المشروع			
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة /عبدان بن عقاب ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم			
				المنطقة الثالثة عشر ( الوادي الجديد )					
<b>Red Sea International G. Contractors</b> 979484500, Dakhla, Saudi Arabia TEL: +966 11 7110000 / Fax: +966 11 711 10 10 E-MAIL: info@redseainternational.com				الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى GENERAL AUTHORITY FOR ROAD AND TRANSPORTATION DEVELOPMENT		مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة			
30/12/2023	الى تاريخ	من بداية العمل		1	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المعملية لأعمال الاسفلت لطبقة سطحية			
				جارى	نوع المستخلص				
ملاحظات	نسبة الأسفلت	الطول (م)	العرض (م)	نوع الطبقة	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م
					الى	من			
مستخلص 1	4.92%	1000	9	سطحية	9+000	8+000	2023/11/29	189	1
مستخلص 1	5.06%	900	9	سطحية	9+900	9+000	2023/11/30	191	2
مستخلص 1	5.10%	280	9	سطحية	10+180	9+900	2023/12/02	196	3



ممثل الهيئة

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشراشرة الجديد

مهندس الشركة المنفذة

# طلبات تسليم قطع وإزالة

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضرافة الجديد

مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة  
/عثمان بن عفان - الكفاح ( القطاع  
الثالث ) بطول 2.5 كم

## طلبات تسليم

القطع والإزالة

طبقة أساس

صلاحيه طبقة أساس

طبقة تشريب MC

أسفلت رابطة

الجدول الزمني

كشف تواجد المهندسين  
والمعدات

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الغرافرة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريمة 2.2 كم

طلب استلام أعمال منفذة

رقم الطلب: 14

9 / 11 / 2023

تاريخ تقديم الطلب

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم تربة
- 3- حفر
- 4- طبقة اساس من
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لزيق
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- قطع وإزالة اسفلت قديم

وذلك بالمسافة :

من كم / 8+920 إلى كم / 8+940 بطول 20

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة  
الإسم: محمد آل جهر الغالية للمقاولات  
التوقيع: توقيع الصرافة الجديد



مناسيب ازالة وقطع اسفلت قديم لمشروع طريق الفراخه / عثمان الكفاح

ST	Left	C.L	Right	ds
	5.00	0.000	5	
8+920	103.899	103.824	103.749	104.424
8+930	103.928	103.853	103.778	104.453
8+940	103.955	103.880	103.805	104.480



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريمة شرق مكة

طلب استلام اعمال منظفة

إعداد مكتب

9 / 11 / 2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب ( 894 )

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس سن
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لزي
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

المسئد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة إزالة اسفلت قديم

وذلك بالمسافة :

من كم / 8+070 الى كم / 8+140 بطول 70

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرفح المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

موقع الضرافرة الجديد  
موقع الضرافرة الجديدة



مناسيب ازالة وقطع اسفلت قديم لمشروع طريق الفرافرة /عثمان

ST	Left	C.L	Right	ds
	5.00	0.000	5	
8+070	102.277	102.202	102.127	102.802
8+080	102.245	102.170	102.095	102.770
8+090	102.213	102.138	102.063	102.738
8+100	102.181	102.106	102.031	102.706
8+110	102.148	102.073	101.998	102.673
8+120	102.114	102.039	101.964	102.639
8+130	102.077	102.002	101.927	102.602



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفراقرة / عمان بن عليان - القطاع الثالث - حياة كريمة 2023

طلب استلام اعمال منفذة

رقم الطلب (1434)

تاريخ تقديم الطلب 9 / 11 / 2023

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة اساس سن
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لزق
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- قطع وإزالة اسفلت قديم

وذلك بالمسافة :

من كم / 8+210 إلى كم / 8+230 بطول 20

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس التخطيط للمناوالات  
المهندس الإسم :  
التوقيع :  
مؤتمن مقرر أسرة المتخصصين



مناسيب ازالة وقطع اسفلت قديم لمشروع طريق الفرافرة / عثمان الكفاح

ST	Left	C.L	Right	ds
	5.00	0.000	5	
8+210	101.733	101.658	101.583	102.258
8+220	101.689	101.614	101.539	102.214
8+230	101.644	101.569	101.494	102.169



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريمة في لاكس

طلب استلام اعمال منفذة

11/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (166)

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم أتربة
- 3- حفر
- 4- كاطبة أساس سن
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لثق
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تنسيق

المسئول للمهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- قطع وإزالة اسفلت قديم

وذلك بالمسافة :

من كم / 8+380 إلى كم / 8+420 بطول 40

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

موقع المرافرة الجديد



مناسيب ازالة وقطع اسفلت قديم لمشروع طريق الفرافره / عثمان الكفاح

ST	Left	C.L	Right	ds
	5.00	0.000	5	
8+390	100.933	100.858	100.783	101.458
8+400	100.888	100.813	100.738	101.413
8+410	100.844	100.769	100.694	101.369
8+420	100.799	100.724	100.649	101.324



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القرارة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة عريمة 3 كم

طلب استلام أعمال منفذة

أ. ع. ام. ك. ك.

11/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب 11/11/23

- 1- زالة اسفلت قديم
- 2- ردم التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس سن
- 5- طبقة تكريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لزي
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

المسئد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة ازالة اسفلت قديم

وذلك بالمسافة :

من كم / 9+440 الى كم / 9+650 بطول 210

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرقم المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

التوقيع :

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

المهندس أحمد عبدالعظيم  
 البجور الأحمر العالمية للتقانات  
 موقع القرارة الجديد

# طلبات تسليم أساس

المبشر الأحمر العالمية للمتاومات  
موقع الضرافرة الجديد



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان = القطاع الثالث - حياة كريمة 2 كم

طلب استلام أعمال مقبولة **إعداد الكشاح**

18/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب 1567

- 1- إزالة أسفالت لعمق 20
- 2- ردم التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس من
- 5- طبقة لتثبيت
- 6- طبقة لاسفلت رابطة
- 7- طبقة لزلز
- 8- طبقة أسفالت سطحية
- 9- تخطيط

المسيد المهندس / ممثل المالك

نحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

**وصف العمل :**

- طبقة أساس ثانية

وذلك بالمسافة :

من كم / 8+000 إلى كم / 8+320 بطول 320

**أعمال الفحص البصري**

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

**أعمال مساحية**

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

**أعمال معملية**

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع : 

مهندس الشركة

الإسم : **الإحمر العالمية للمقاولات**  
 التوقيع : **منذوق الضراقرة الجديد**



اختبار كثافة الدمك بالموقع

الموقع : 320 + ...  
 تاريخ :  
 رقم الطلب :

الموقع	
وزن الجهد 40 الرمل قبل الاختبار (جم)	4105
وزن الجهد 40 الرمل بعد الاختبار (جم)	4022
وزن الرمل الذي يمتلأ الحفرة المشروط (جم)	4133
وزن الرمل الذي يمتلأ الحفرة (جم)	1493
وزن الرمل الذي يمتلأ الحفرة (جم)	2210
كثافة الرمال الجاف (جم/سم3)	1.52
حجم الحفرة (سم3)	1783
وزن العينة المستخرجة من الحفرة رطبة (جم)	4190
الكثافة الرطبة (طن/م3)	2.35
رسم الجقطة	
وزن العينة الرطبة + الجقطة (جم)	
وزن العينة الجافة + الجقطة (جم)	
وزن الماء (جم)	
وزن الجقطة (جم)	
وزن العينة الجافة (جم)	
نسبة الرطوبة (%)	6.5
الكثافة الجافة (طن/م3)	2.19
كثافة الدمك بالموقع (طن/م3)	2.23
نسبة الدمك الأصوية (%)	7
نسبة الدمك (%)	98.3

ملاحظات :

مهندس الهيئة :

مهندس معمل الشركة

الاسم

التوقيع

الاسم  
 المهندس الأحمر الغالبية للمقاولات  
 موقع الفرانقة الجديدة



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / عثمان بن عفان - النظام الثالث - حياء كريمة 5 كم

إعداد الكساح طلب القبول مقدمة

18/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (16)

- 1- زيادة مساحات قديم
- 2- زيادة التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس من
- 6- طبقة تشرب
- 5- طبقة اسفلت رابطة
- 7- باقة لاق
- 8- حفره انقلت، طبقة
- 9- تغليظ

السيد المهندس / ممتن العائش

تدية طوية و بعد

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة اساس ثانية

وذلك بمسافة :

من كم / 8+320 الى كم / 8+900 بطول 580

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرقع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع : ٢٠١

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع : م. م. العائش  
موقع الضرافرة الجديد



اختبار كثافة الدمك بالموقع

التاريخ :

الموقع : ٢٠١٩٥٠ ٢٠١٩٥٠

رقم العلب :

نوع العينة :

الموقع				
وزن الجهاز جالرس قبل الاختبار (جم)	١٢٣١	١٢٣١	١٢٣١	١٢٣١
وزن الجهاز جالرس بعد الاختبار (جم)	١٢٧١	١٢٧١	١٢٧١	١٢٧١
وزن الرمل الذي يملأ الحفرة المقروظ (جم)	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
وزن الرمل الذي يملأ المقروظ (جم)	١٢٧٠	١٢٧٠	١٢٧٠	١٢٧٠
وزن الرمل الذي يملأ الحفرة (جم)	١٢٧١	١٢٧١	١٢٧١	١٢٧١
كثافة الرمل القياسي (جم/سم3)	١٦٥	١٦٥	١٦٥	١٦٥
حجم الحفرة (سم3)	١٩٧٩	١٩٧٩	١٩٧٩	١٩٧٩
وزن العينة المستخرجة من الحفرة رطبة (جم)	٤١٥٠	٤١٥٠	٤١٥٠	٤١٥٠
الكثافة الرطبة (طن/م3)	٢٠٩٥	٢٠٩٥	٢٠٩٥	٢٠٩٥
رقم الجفتة				
وزن العينة الرطبة + الجفتة (جم)				
وزن العينة الجافة + الجفتة (جم)				
وزن الماء (جم)				
وزن الجفتة (جم)				
وزن العينة الجافة (جم)				
نسبة الرطوبة (%)	٧,٤	٧	٧,٤	٧,٥٠
الكثافة الجافة (طن/م3)				
	٢١٩٥	٢١٩٧	٢١٩٤	٢١٨٣
أقصى كثافة بالموقع (طن/م3)				
	٢,٤٤	٢,٤٤	٢,٤٤	٢,٤٤
نسبة المياه الأموية (%)				
	٧,٤	٧,٢	٧,٤	٧,٤
نسبة الدمك (%)				
	٩٨,٩	٩٩	٩٨,٧	٩٨,٤

ملاحظات :

مهندس الهيئة :

الاسم

التوقيع

مهندس معمل الشركة





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفراهرة / عثمان بن عفان - الدمام الثالث - حياة كريمة سول 2 كم

طلب إكمال الأعمال

19/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (151)

- 1- إزالة أسفلت قديم
- 2- ردم التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس س
- 5- طبقة تشرية
- 6- طبقة أسفلت رابطة
- 7- طبقة الرق
- 8- طبقة أسفلت ساحبية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

طبقة أساس ثانية

وذلك بالمساحة :

من كم / 8+900 إلى كم / 9+400 بطول 500

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسبت التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

موقع الشرافرة الجديد





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريمة المرحلة الأولى

طلب الإنشائي رقم 169

19/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (169)

- 1- إزاحة أسفلت قديم
- 2- ردم التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس سن
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة أسفلت رابطة
- 7- طبقة لرق
- 8- طبقة أسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة أساس ثانية

وذلك بالمسافة :

من كم / 9+400 إلى كم / 9+800 بطول 400

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مردود	مقبول
		✓

التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مردود	مقبول
		✓

التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مردود	مقبول
		✓

التوقيع :

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد



اختبار كثافة الأملد للمواقع

التاريخ:

الموقع: ١٤٣٠ - ١٤٣١

اسم القطعة:

نوع العينة:

الموقع				
				وزن الجوار بالرمل قبل الاختبار (جم)
				وزن الجوار بالرمل بعد الاختبار (جم)
				وزن الرمل الذي يملأ الحفرة والمختبر (جم)
				وزن الرمل الذي يملأ المختبر (جم)
				وزن الرمل الذي يملأ الحفرة (جم)
				كثافة الرمل القياسي (جم/سم <sup>3</sup> )
				حجم الحفرة (سم <sup>3</sup> )
				وزن العينة المستخرجة من الحفرة رطبة (جم)
				الكثافة الرطبة (طن/م <sup>3</sup> )
				رقم العينة
				وزن العينة الرطبة + الجافة (جم)
				وزن العينة الجافة + الحفنة (جم)
				وزن الماء (جم)
				وزن الحفنة (جم)
				وزن العينة الجافة (جم)
				نسبة الرطوبة (%)
				الكثافة الجافة (طن/م <sup>3</sup> )
				القيمة كثافة الموقع (طن/م <sup>3</sup> )
				نسبة المياه الأصولية (%)
				نسبة التماسك (%)

ملاحظات:

مهندس الهيئة:

الاسم:

التوقيع:





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان - الاجتماع الثالث - حياة كريمة 2023

طلب استلام اتصال عنقود

2023/11/20

تاريخ تقديم التقرير

رقم التقرير: 1066

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- عمق التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة اساس من
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لزج
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / معتز المالك

تحية طيبة وبعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل:

- طبقة اساس ثانية

وذلك بالمساحة:

من كم / 9+800 الى كم / 10+180 بطول 950

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
التوقيع:		

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
التوقيع:		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
التوقيع:		

مهندس الهيئة

الإسم:

التوقيع:









اختبار كثافة الدمك بالسحق

رقم الخ :  
رقم الطلب : 1987

الموقع : غرب قبل المتحيط  
نوع العينة : الأساس ثابته

الموقع		
9600	10000	وزن الجهاز جرمول قبل الاختبار (جم)
4549	4937	وزن الجهاز جرمول بعد الاختبار (جم)
4851	5063	وزن الرمل الذي يملأ الحفرة والمخروط (جم)
1470	1420	وزن الرمل الذي يملأ المخروط (جم)
3381	3593	وزن الرمل الذي يملأ الحفرة (جم)
1,5	1,5	كثافة الرمل القياسي (جم/سم3)
2254	2396	حجم الحفرة (سم3)
5403	5601	وزن العينة المستخرجة من الحفرة رطبة (جم)
2,392	2,338	الكثافة الرطبة (طن/م3)
رقم الجفنة		
وزن العينة الرطبة + الجفنة (جم)		
وزن العينة الجافة + الجفنة (جم)		
وزن الماء (جم)		
وزن الجفنة (جم)		
وزن العينة الجافة (جم)		
8	8	نسبة الرطوبة (%)
2,22	2,206	الكثافة الجافة (طن/م3)
2,24	2,24	أقصى كثافة بالموقع (طن/م3)
7	7	نسبة المياه الأصولية (%)
99,1	98,5	نسبة الدمك (%)

ملاحظات :

مهندس الهيئة :

مهندس محمل الشركة

الأسم /

الاسم : محمد العالقية للمقاولات  
التوقيع : محمد العالقية الجديد

التوقيع /



مشروع تدهان ورفع كفاءة طريق الفراقرة / عثمان بن عفان - الأنطاك الثالث - حضانة كريمة 2.5 كم

طلب استلام قوائم مقايمة

إستاد 2024

14 / 11 / 2023

البريد الإلكتروني

رقم الطلب (15)

1. خطة لرفع كفاءة
2. دراسة
3. خطة
4. خطة استلام
5. خطة تسليم
6. خطة استلام
7. خطة تسليم
8. خطة تسليم

اسم المهندس / ممثل المالك

اسم المهندس / ممثل المالك

من التكرم بعض اللازم نحو استلام

وصف العمل:

خطة استلام أولى

وتلك بالمسافة:

من كم / 8+000 الى كم / 8+430 بطول 430

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع:		

أعمال مساحية

مرفق الفرق المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع:		

أعمال حاملة

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع:		

مهندس الهيئة

الإسم:

التوقيع:

مهندس الشركة

الإسم:

التوقيع:

موقع الفراقرة الجديد  
موقع الشركة العالمية للمقاولات



اختبار كثافة الدمك بالموقع

التاريخ :

رقم القلب :

الموقع : 2+000 - 2+430

نوع البنية : أسفلت كبريتي

الموقع				
				وزن الجهار بالرمل قبل الاختبار (جم)
			9000	
			4805	وزن الجهار بالرمل بعد الاختبار (جم)
			4195	وزن الرمل الذي يملأ الحفرة المقروضة (جم)
			1475	وزن الرمل الذي يملأ المقروضة (جم)
			2722	وزن الرمل الذي يملأ الحفرة (جم)
			1,52	كثافة الرمل القياس (جم/سم3)
			1791	حجم الحفرة (سم3)
			4190	وزن العينة المستخرجة من الحفرة رطبة (جم)
			2,34	الكثافة الرطبة (طن/م3)
رقم الجقنة				
				وزن العينة الرطبة + الجقنة (جم)
				وزن العينة الجافة + الجقنة (جم)
				وزن الماء (جم)
				وزن الجقنة (جم)
				وزن العينة الجافة (جم)
			6,5	نسبة الرطوبة (%)
			2,197	الكثافة الجافة (طن/م3)
			2,23	القياس كثافة بالموقع (طن/م3)
			7	نسبة المياه الأصولية (%)
			98,5	نسبة الدمك (%)

ملاحظات :

مهندس الهيئة :

الاسم /

التوقيع /

مهندس معمل الشرطة





# المكتب الفني

station	الارتفاع	B+430			الارتفاع من محطة طول المقطع	B+000 أسفل أولي	من محطة نسبة انحدار طبقه SLOPE
		L	CL	R			
	المشرب التصميمي	102.75	102.715	102.641	عرض الطرقة	المشرب التصميمي	
8+000	الترق	5.00	0.0	5.00	10.00	103.626	1.5%
	المشرب التصميمي	102.72	102.652	102.577	10.00	102.962	1.5%
8+020	الترق				10.00	102.898	1.5%
	المشرب التصميمي	102.68	102.588	102.513	10.00	102.898	1.5%
8+040	الترق				10.00	102.834	1.5%
	المشرب التصميمي	102.59	102.524	102.449	10.00	102.834	1.5%
8+060	الترق				10.00	102.770	1.5%
	المشرب التصميمي	102.52	102.481	102.385	10.00	102.770	1.5%
8+080	الترق				10.00	102.706	1.5%
	المشرب التصميمي	102.47	102.398	102.321	10.00	102.706	1.5%
8+100	الترق				10.00	102.639	1.5%
	المشرب التصميمي	102.40	102.329	102.254	10.00	102.639	1.5%
8+120	الترق				10.00	102.564	1.5%
	المشرب التصميمي	102.32	102.254	102.179	10.00	102.564	1.5%
8+140	الترق				10.00	102.480	1.5%
	المشرب التصميمي	102.24	102.176	102.095	10.00	102.480	1.5%
8+160	الترق				10.00	102.391	1.5%
	المشرب التصميمي	102.15	102.081	102.005	10.00	102.391	1.5%
8+180	الترق				10.00	102.302	1.5%
	المشرب التصميمي	102.06	101.992	101.917	10.00	102.302	1.5%
8+200	الترق				10.00	102.214	1.5%
	المشرب التصميمي	101.97	101.904	101.829	10.00	102.214	1.5%
8+220	الترق				10.00	102.125	1.5%
	المشرب التصميمي	101.88	101.815	101.740	10.00	102.125	1.5%
8+240	الترق				10.00	102.036	1.5%
	المشرب التصميمي	101.80	101.726	101.651	10.00	102.036	1.5%
8+260	الترق				10.00	101.947	1.5%
	المشرب التصميمي	101.71	101.637	101.562	10.00	101.947	1.5%
8+280	الترق				10.00	101.858	1.5%
	المشرب التصميمي	101.62	101.548	101.473	10.00	101.858	1.5%
8+300	الترق				10.00	101.769	1.5%
	المشرب التصميمي	101.53	101.459	101.384	10.00	101.769	1.5%
8+320	الترق				10.00	101.680	1.5%
	المشرب التصميمي	101.44	101.370	101.295	10.00	101.680	1.5%
8+340	الترق				10.00	101.591	1.5%
	المشرب التصميمي	101.36	101.281	101.206	10.00	101.591	1.5%
8+360	الترق				10.00	101.502	1.5%
	المشرب التصميمي	101.28	101.192	101.117	10.00	101.502	1.5%
8+380	الترق				10.00	101.413	1.5%
	المشرب التصميمي	101.19	101.103	101.028	10.00	101.413	1.5%
8+400	الترق				10.00	101.324	1.5%
	المشرب التصميمي	101.08	101.014	100.939	10.00	101.324	1.5%
8+420	الترق				10.00		
	المشرب التصميمي				10.00		
	الترق				10.00		
	المشرب التصميمي				10.00		
	الترق				10.00		
	المشرب التصميمي				10.00		
	الترق				10.00		
	المشرب التصميمي				10.00		
	الترق				10.00		
	المشرب التصميمي				10.00		
	الترق				10.00		

المهندس الأحمز العالبي للمقاولات  
موقع الصرافرة الجديدة



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريمة كرك

طلب استلام اعمال منفذة

إصدار الكسح

رقم الطلب (10000)

14 / 11 / 2023

تاريخ تقديم الطلب

- 1- ازالة اسفلت قديم
- 2- ردم تربة
- 3- حفر
- 4- طبقة اساس من
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة تزيين
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة اساس اولي

وذلك بالمسافة :

من كم / 8+430 الى كم / 8+910 بطول 480

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
التوقيع :		

اعمال مساحية

مرفق الرقم المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
التوقيع :		

اعمال معبلة

مرفق نتائج المعمل و عينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

البجرا الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرازة الجديد





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريما 52 كم

امتداد الكعج طلب النظرة الثانية

15.11.2022 تاريخ التوقيع

رابع الطب (157)

- 1- إجابة استفسارات عملاء
- 2- دراسة تخطيطية
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس من
- 5- طبقة تاربيط
- 6- طبقة إسفلت رابطة
- 7- طبقة لاق
- 8- طبقة إسفلت نهائية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تعداً لطلبه بعد

مراجعة التصميم بعمل التلازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة أساس لاق

وذلك بامتداد :

من كم / 9+910 إلى كم / 9+500 بطول 410

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

أعمال مساحية

مرفق المرفق المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

أعمال مهملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

مهندس الهيئة

الإسم -

التوقيع :





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفراقرة / عمان بن 4 كم - النظام الثالث - حياة كريمة كرنال

امتداد الكيلج طلب الاقتراح مرفوعة

15.11.2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (15)

- 1- وثيقة المواصفات
- 2- وثيقة الشروط
- 3- خط
- 4- خريطة أساس من
- 5- وثيقة تقويم
- 6- بطاقة امتداد رابطة
- 7- بطاقة لوج
- 8- وثيقة امتداد سائبة
- 9- بطاقة

السيد المهندس / ممثل المالك

تعد عليه بعد

بدرجى للتكرم بعمل اللازم نحو استلام

ورصف العمل

بالتفاهة السيد اونس

بذلك بالمتفاهة

من كم / R+910 الى كم / 9+500 بطول 10

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

أعمال مساحية

مرفق الوفق المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

مهندس الهيئة

الإسم

التوقيع

مهندس الموقع  
المهندس المهندس العالمية للمقاولات  
موقع الفراقرة بالعمان



اختبار كثافة الدمك بالموقع

التاريخ :

الموقع : 94500 → 1910

رقم الطلب :

نوع العينة :

الموقع				
				وزن الجرار + الرمال قبل الاختبار (جم)
			9.10	
			4223	وزن الجرار + الرمال بعد الاختبار (جم)
			4111	وزن الرمال الذى يظل المتروك بالموقع (جم)
			1473	وزن الرمال الذى يبتد المتروك (جم)
			6662	وزن الرمال الذى يظل المتروك (جم)
			1.22	كثافة الرمال القياسى (جم/سم3)
			1745	حجم العينة (سم3)
			4125	وزن العينة المستخرجة من العينة رطبة (جم)
			635	كثافة الرطبة (جم/سم3)
رقم الحقة				
				وزن العينة الرطبة + الحقة (جم)
				وزن العينة الجافة + الحقة (جم)
				وزن الماء (جم)
				وزن الحقة (جم)
				وزن العينة الجافة (جم)
			7	نسبة الرطوبة (%)
			2.20	كثافة الحقة (جم/سم3)
			2.25	كثافة الحقة بالموقع (جم/سم3)
			7	نسبة الرطوبة الاسمية (%)
			98.5	نسبة الدمك (%)

ملاحظات :

مهندس الجودة :

مهندس معمل الطرق

الاسم /

الاسم /

التوقيع /

المبصر المتميز العالمية للمقاولات  
 موقع المشرفة الجليل



## مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القرافرة / عثمان بن عفان - (القطاع الثالث - حياة خريجة كسك)

طلب الإخطار بالموافقة

إرساد الكفاح

16/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (158)

- 1- زانه اسفلت قديم
- 2- زانه التربة
- 3- حجر
- 4- طبقة اساس رين
- 5- طبقة تشريد
- 6- طبقة اسفلت راجلة
- 7- طبقة لوز
- 8- طبقة اسفلت مساحية
- 9- عتبط

السيد مهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل:

- طبقة اساس اولي

وذلك بالمسافة:

من كم / 9+500 الى كم / 10+180 بطول 110

## أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مقبول	التوقيع:
	✓	

## أعمال مساحية

مرفق الوفق المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مقبول	التوقيع:
	✓	

## أعمال معمليّة

مرفق نتائج المحمل وعينات الدمك

ملاحظات	مقبول	التوقيع:
	✓	

مهندس الهيئة

الاسم:

التوقيع:

مهندس الشركة

الاسم:

التوقيع:

 البشير الأحمر الكافية للمتاولات  
 موقع الشرافرة الجديد



اختبار كثافة الدمك بالموقع

التاريخ :  
رقم الطلب :

الموقع : 9+500  
نوع العينة :

الموقع	
وزن الجواز بالرمل قبل الاختبار (جم)	2110 2600
وزن الجواز بالرمل بعد الاختبار (جم)	1751 11151
وزن الرمل الذي يمتد الحفر من المفروض (جم)	1122 1200
وزن الرمل الذي يمتد المفروض (جم)	1473 1473
وزن الرمل الذي يمتد الحفرة (جم)	2116 2771
كثافة الرمل القياسي (جم/سم3)	152 152
حجم الحفرة (سم3)	1787 1825
وزن العينة المستخرجة من الحفرة رطبة (جم)	4181 4060
الكثافة الرطبة (طن/م3)	2,34 2,34
رقم الحلقة	
وزن العينة الرطبة + الحلقة (جم)	
وزن العينة الجافة + الحلقة (جم)	
وزن الماء (جم)	
وزن الحلقة (جم)	
وزن العينة الجافة (جم)	
نسبة الرطوبة (%)	6,8 6,5
الكثافة الجافة (طن/م3)	2,19 2,20
انكسار كثافة بالمواقع (طن/م3)	2,23 2,23
نسبة نسبة الامتصاص (%)	7 7
نسبة الماء (%)	98,1 98,5

ملاحظات :

مهندس هيئة :

مهندس محل الشركة

الاسم

الاسم

التوقيع





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرارة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريما 2.5 كم

طلب استلام أعمال منفذة

أوراد الكناح

12/8/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (148)

- 1- رتبة أسفلت قديم
- 2- ردم لثنية
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس سن
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة أسفلت ربيطة
- 7- طبقة لزيق
- 8- طبقة أسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة أساس أولى (استبدال)

وذلك بالمسافة :

من كم / 8+150 الى كم / 8+200 بطول 50

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرقم المساحي والمناسيب التصحيحية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

موقع الشراشرة الجديد  
البحر الأحمر العالمية للمقاولات





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرانجة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريمة ال 5 كم

طلب استلام اعمال منفذة

بمساحة 80

12/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (99)

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم تربة
- 3- حفر
- 4- كضلة أساس سن
- 5- طبقة لتثبيت
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لاق
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / مهمل العالک

تحية طيبة وبعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة أساس أولي (استبدال)

وذلك بالمساحة :

من كم / 8+270 الى كم / 8+350 بطول 80

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال مساهية

مرفق الرفق المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال معصلية

مرفق نتائج المعصل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الضرافرة الجديد



اختبار كثافة التمسك بالموقع

التاريخ: 12/11/2012

الموقع:

رقم الطلب:

نوع العينة:

الموقع				
				وزن الجهاز + الرمل قبل الاختبار (جم)
			31.2	
			4.14	وزن الجهاز + الرمل بعد الاختبار (جم)
			41.7	وزن الرمل الذي يمتصه التمسك بالموقع (جم)
			14.1	وزن الرمل الذي يمتصه التمسك بالموقع (جم)
			2.1	وزن الرمل الذي يمتصه التمسك بالموقع (جم)
			1.5	كثافة الرمل القياسي (جم/سم <sup>3</sup> )
			17.7	حجم العينة (سم <sup>3</sup> )
			4.14	وزن العينة المستخرجة من الطبقة الرطبة (جم)
			2.3	كثافة الرطبة (طن/م <sup>3</sup> )
رقم العينة				
				وزن العينة الرطبة + الجافة (جم)
				وزن العينة الجافة + الجافة (جم)
				وزن الماء (جم)
				وزن الجافة (جم)
				وزن العينة الجافة (جم)
			6.5	نسبة الرطوبة (%)
			2.2	كثافة الجافة (طن/م <sup>3</sup> )
			2.23	التمسك كثافة بالموقع (طن/م <sup>3</sup> )
			7	نسبة المياه الأصلية (%)
			90.6	نسبة التمسك (%)

ملاحظات:

مهندس الهيئة:

مهندس محل الشركة:

الاسم:

المهندس  
البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع المراجعة الجيد

التوقيع:



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرارة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريمة 2.5 كم

طلب استلام أعمال منفذة

١٠٠٠٠٠٠٠

١٢ / ١ / 2023

تاريخ تقييم الطلب

رقم الطلب (1150)

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة أساس أولي ( استبدال )

وذلك بالمسافة :

من كم / 8+980 الى كم / 9+120 بطول 160

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم لتربة
- 3- حفر
- 4- كاشفة أساس من
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لواق
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

أعمال القحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		س
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرسم المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		س
التوقيع :		

أعمال محلنية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		س
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرارة الجديد



إشطار كثافة الدمك بالموقع

التاريخ: 12/11/2023

رقم الطلب:

الموقع:

نوع العينة:

الموقع				
				وزن الجهاز بالرمل قبل الاختبار (جم)
				وزن الجهاز بالرمل بعد الاختبار (جم)
				وزن الرمل الذي يمتصه الطرقة والمسطرة (جم)
				وزن الرمل الذي يمتصه المسطرة (جم)
				وزن الرمل الذي يمتصه الحفرة (جم)
				كثافة الرمل القياسي (جم/سم <sup>3</sup> )
				حجم الحفرة (سم <sup>3</sup> )
				وزن العينة المستخرجة من الحفرة رطبة (جم)
				كثافة الرطبة (طن/م <sup>3</sup> )
رقم العينة				
				وزن العينة الرطبة + العينة (جم)
				وزن العينة الجافة + العينة (جم)
				وزن الماء (جم)
				وزن العينة (جم)
				وزن العينة الجافة (جم)
				نسبة الرطوبة (%)
				كثافة العينة الجافة (طن/م <sup>3</sup> )
				أقصى كثافة بالموقع (طن/م <sup>3</sup> )
				نسبة العينة الأصولية (%)
				نسبة الدمك (%)

ملاحظات:

مهندس الجيوة:

الاسم:

التوقيع:

مهندس معمل الشركة:

الاسم:

المختبر الأبحاث العالمية للمقاولات  
موقع المرافقة الجديد



مشروع إنشاء ورقم كفاءة طريق الفرازة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريمة كركك

طلب استلام أعمال منفذة (م - ا) الكنتاج

13/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (151)

- 1- إيالة أسفلت قديم
- 2- ردم التربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس من
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة أسفلت رابطة
- 7- شبكة لري
- 8- طبقة أسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة أساس أولي ( استبدال )

وتلك بالمسافة :

من كم / 9+240 إلى كم / 9+390 بطول 150

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرقم المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك


ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
		التوقيع :

مهندس الهيئة

الإسم :  
التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :  
التوقيع :





اختبار كثافة الدم بالموقع

التاريخ: 13/11/2025  
رقم العينة:

الموقع: ...  
نوع العينة: ...

الموقع	
وزن الجهاز بالرمال قبل الاختبار (جم)	71.2
وزن الجهاز بالرمال بعد الاختبار (جم)	47.5
وزن الرمال الذي يمتصه المترجم (مترجم)	41.7
وزن الرمال الذي يمتصه المترجم (جم)	14.5
وزن الرمال الذي يمتصه المترجم (جم)	7.05
كثافة الرمال القياسي (جم/سم <sup>3</sup> )	1.45
حجم المترجم (سم <sup>3</sup> )	17.7
وزن العينة المستخرجة من المترجم رطبة (جم)	47.5
الكثافة الرطبة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.65
رقم العينة	
وزن العينة الرطبة + الجفلة (جم)	
وزن العينة الجافة + الجفلة (جم)	
وزن الماء (جم)	
وزن الجفلة (جم)	
وزن العينة الجافة (جم)	
نسبة الرطوبة (%)	6.7
الكثافة الجافة (جم/سم <sup>3</sup> )	2.22
النسبة المئوية للموقع (جم/سم <sup>3</sup> )	2.23
نسبة العينة الصلبة (%)	7
نسبة الماء (%)	92.94

ملاحظات:

مهندس اللجنة:

مهندس معمل الشرقة

الاسم:

الاسم:

التوقيع:

الباحثون في معمل الشرقة  
موقع الفرقة الجديدة



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق القرافرة / عثمان بن عفان - القطاع الثالث - حياة كريمة ك.ك.م

طلب استلام أعمال منفذة (مصادر وكماح)

13/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (152)

- 1- زيادة أسفلت قديم
- 2- ردم اتربة
- 3- حجر
- 4- طبقة اساس من
- 5- طبقة تشريب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لثق
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة اساس اولي (1/3) استكمال

وذلك بالمسافة :

من كم / 9+800 الى كم / 9+850 بطول 50

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرقم المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

موقع المشرفة الجديد  
 المهندس أحمد الشاذلي للمقاولات



الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثانية عشر بلوادي الجديد  
عملية انشاء ورقع كفاءة طريق الفرارة / عثمان ابن عفان - الكفاح (القطاع الثالث)  
مبادرة حياة كريمة  
اختبار التدرج العام والطبيعي والمفلطح والاستطالة

التحليل المختبري  
تاريخ اجراء الاختبار: ٢٠٢٣/٠٩/١٥  
القطاع المختبر لهيئة:

جدول التصنيف  
تدرج (أ)  
عبءية اللبونة

اسم الشركة:	البحر الاحمر العالمية
نوع العينة:	صلاحية طبقة اساس اولي
مكان اخذ العينة:	١,٥٥٠

رقم او سعة المتخل:	٢
المحموز على كل متخل:	١٠٠
المحموز المتجمع:	١٠٠
% للمحموز:	١٠٠
% للتلار:	١٠٠

رقم	وزن العينة			رقم ٤	رقم ٥	رقم ٦	رقم ٧	رقم ٨
	٢/١	٤/٣	٨/٣					
٢٥٠٠٠	١٤٠٠	١٢٤٠	١٠٨٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠
٧٠٠٠	٤٩٨٧	٣٥٢٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠	٢٢٣٠
١٠٠٩	٤٣,٤	٣١,٠	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٠,٣	٢٠,٣
٣٩,١٣	٢٩,٦٣	١٦,٩٦	٧٩,٧٤	٨٩,١٣	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠

٢- نسب المواد بالعينة


٢٠%	٣ سن
٢٠%	٢ سن
٢٠%	١ سن
٤٠%	رمل تكسير

بي-تدرج المواد الناعمة:

رقم او سعة المتخل:	١٠	٤٠	٩٠
المحموز المتجمع:	١٦٠,٠٠	٢٩٦,٠٠	٣٨٨,٠٠
% للمحموز:	٣٠,٣٥	٥٠,٠٠	٧٤,٣٣
% للتلار:	٦٩,٣٥	٥٠,٠٠	٢٥,٦٧

ج- التدرج العام:

رقم او سعة المتخل (بوصة)	٢	١,٥	١	٣/٤	١/٢	٣/٨	١	١	١
رقم او سعة المتخل (مم)	٥٠,٠	٣٧,٥	٢٥,٠	١٩,٠	١٢,٥	٩,٥	٦,٥	٤,٧٥	٣,٠
% للمتلار:	١٠٠,٠٠	٨٩,١٣	٧٩,٧٤	٦٨,٩٦	-	٥٦,٦٣	٣٩,١٣	٢٧,١٤	١٩,٥٧
تدرج (أ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تدرج (ب)									
تدرج (ج)									

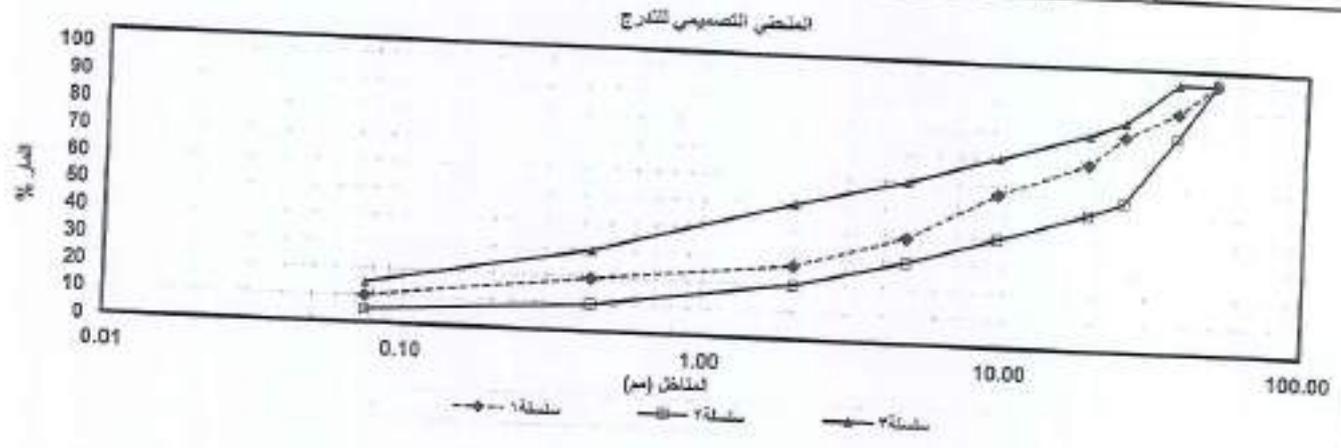

ثانياً: اختبار نسبة الطبيعي والمفلطح والاستطالة

المواصفات	النتيجة	طريقة الحساب	البيان
لا تزيد عن ١٠%	١,٩	$100 \times (1/2)$	١- وزن العينة الكلي (جم)
لا تزيد عن ١٠%	١,٧	$100 \times (1/4)$	٢- وزن المواد الطبيعية بالعينة (جم)
لا تزيد عن ١٠%	١,٤	$100 \times (1/7)$	٣- نسبة المواد الطبيعية بالعينة (%)
			٤- وزن المواد المفلطحة بالعينة (جم)
			٥- نسبة المواد المفلطحة بالعينة (%)
			٦- وزن المواد المستطالة بالعينة (جم)
			٧- نسبة المواد المستطالة بالعينة (%)

مهندس الهيئة:  
[Signature]

مهندس المختبر:  
عوضي صلاح الفرارة الجليلية  
[Signature]





اسم الشركة :	البحر الأحمر العالمية
نوع العينة :	صلاحية طبقة أساس أولي
مكان أخذ العينة :	٣٠٤٠٠

تاريخ اجراء الاختبار :	٢٠٢٣/١٢/١٥
القطاع الممثل للعينة :	

نتائج الاختبار :-


الانتفاش	
رقم القالب	التاريخ
١	
٠.٥٠	الارتفاع الابتدائي (سم)
٠.٨٠	الارتفاع النهائي (سم)
٠.٨٠	الفرق (سم)
١١٦.٧٠	ارتفاع العينة (سم)
٩٨.٦٩%	نسبة الانتفاش (%)

نسبة الرطوبة للقالب بعد الدمك	
رقم القالب	h
١	
٤٤.٦٦	وزن القالب (جم)
٢٢٠	وزن القالب + العينة الرطبة (جم)
٢٠٨	وزن القالب + العينة الجافة (جم)
١٢.٠	وزن الماء (جم)
١٦٣.٦	وزن العينة الرطبة (جم)
٧.٣٢	نسبة الرطوبة (%)
٧.٣٢	نسبة العينة الاصلوية (%)

نسبة الدمك للقالب (%)	
رقم القالب	١
حجم القالب (سم <sup>3</sup> )	٢١٦٢
وزن القالب (جم)	٥١٣٢
وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	١٠١٠٠
وزن العينة رطبة (جم)	٤٩٦٧
الكثافة الرطبة (جم / سم <sup>3</sup> )	٢.٣٤١
الكثافة الجافة (جم / سم <sup>3</sup> )	٢.١٨١
كثافة بروناتور (جم / سم <sup>3</sup> )	٢.٢١٠
نسبة الدمك (%)	٩٨.٧

قراءات التصلب :

الإختراق (سم)	٠.٦٤	١.٢٧	١.٩١	٢.٥٤	٤.٤٥	٥.٠٨	٧.٦٢
قراءة الحمل من جهاز	٠.١٥	٠.٤٠	٠.٦٤	٠.٨٨	١.٠٦	١.٢٣	١.٣٦
الحمل المصحح (كيلو نيوتن)	٢.٠٥	٥.٤٧	٨.٧٥	١٢.٠٣	١٤.٤٩	١٦.٨٢	١٨.٥٩

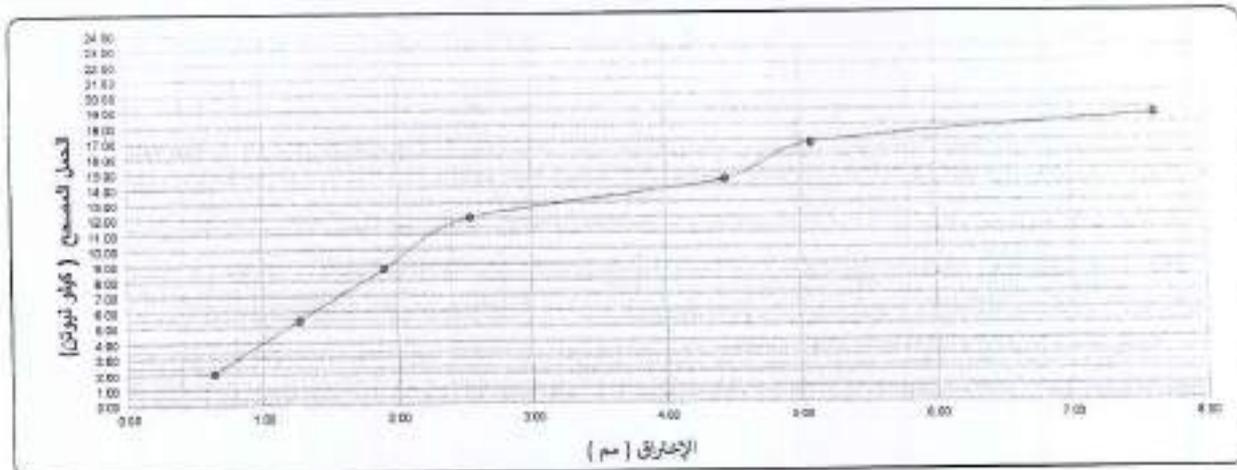

الخصائص :-

الإختراق (سم)	الحمل (كجم/سم <sup>2</sup> )	الحمل القياسي (كجم/سم <sup>2</sup> )	CBR (%)	دمك القالب (%)	دمك الطبقة المطلوب (%)	CBR
٢.٥٤	١٣٦٠	١٣٦٠	٩٠.٢٤%	٩٨.٧	٩٨	٩٨.٦١%
٥.٠٨	١٧١٥.٣٩	٢٠٤٠	٨٤.٠٩%	٩٨.٧	٩٨	٨٣.٥٠%

مهندس الهيئة:  
[Signature]

مهندس محل الشركة:  
[Signature]  
موقع الشرافرة الجديدة  
للمتاولات

إختبار بروكتور القياسي / المعدل

البحر الأحمر العالمية	اسم الشركة:	٢٠٢٣/١٢/١٥	تاريخ اجراء الإختبار:
صلاحية طبقة أساس أولي	نوع العينة:		القطاع الممثل للعينة:
٨٥٥٠٠	مكان أخذ العينة:		


نتائج الإختبار - الحسابات :-

٢.٢١	القصي كثافة جافة (جم / سم <sup>3</sup> )	٥٨٥٠	وزن القالب (جم)
٦.٩	نسبة المياه الأصلوية (%)	٢١٠٤	حجم القالب (سم <sup>3</sup> )

رقم الإختبار	١	٢	٣	٤
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	١٠٤٠٠	١٠٦١٠	١٠٨٢١	١٠٧٦٠
وزن العينة رطبة (جم)	٤٥٥٠	٤٧٦٠	٤٩٧١	٤٩١٠
الكثافة الرطبة (جم / سم <sup>3</sup> )	٢.١٦٣	٢.٢٦٢	٢.٢٦٣	٢.٢٣٤

رقم الجفنة	a	h	k	l	d	e	u	x
وزن الجفنة فارغة (جم)	٤٤.١٦	٤٣.٦٦	٤٢.٥٩	٤١.٩٩	٤٣.١	٤٥.١٢	٤٦	٤٤.١٨
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	١٩٠٠٠	١٩٦٠٠	٢١٥٠٠	٢١٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢١٦٠٠	٢٠٨٠٠	٢١٢٠٠
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	١٨٧٠٠	١٩٢٠٠	٢٠٧٠٠	٢٠٣٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٥٠٠	١٩٤٠٠	١٩٨٠٠
وزن المياه (جم)	٣٠٠	٤٠٠	٨٠٠	٧٠٠	١٢٠٠	١١٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠
وزن العينة جافة (جم)	١٤٢.٨	١٤٨.٣	١٦٤.٤	١٦١.٠	١٦٤.٩	١٥٩.٩	١٤٨.٠	١٥٣.٨
نسبة الرطوبة (%)	٢.١	٢.٧	٤.٩	٤.٣	٧.٢	٦.٩	٩.٥	٩.١
متوسط نسبة الرطوبة (%)	٢.٤	٤.٦	٧.١	٩.٣				
الكثافة الجافة (جم / سم <sup>3</sup> )	٢.١١٢	٢.١٦٣	٢.٢٠٦	٢.١٣٥				

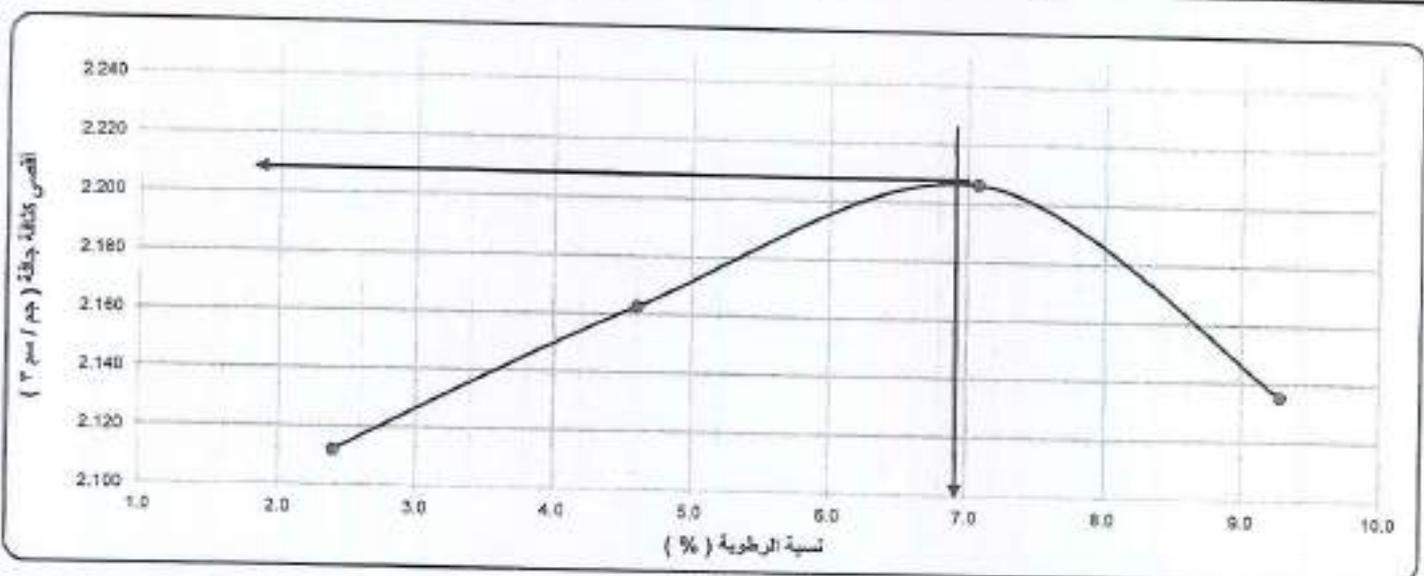

مهندس الهيئة:

مهندس معمل الشركة:

حسي صلاح

الباحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفرانقة الجديدة



اختبار الكمرج العلام والطبيعي والمقسط والاستطالة

أولاً: التحليل المنطلي للركام الناعم والخشن

تاريخ إجراء الاختبار:	١٠/١٢/٢٠١٨
القطاع الممثل للجنة:	

جدول التصنيف  
 كمرج (١)

اسم الشركة:	البحر الأحمر العلمية
نوع العينة:	صلاحية طبقة أساس ثانية
مكان أخذ العينة:	R+100

عمية للتونة

١- اختبار الكمرج

رقم أو سعة المنخل	وزن العينة						
	٢	١.٥	١	٠.٧٥	٠.٥	٠.٢٥	٠.١٥
المحجوز على كل منخل	٠.٠	١١٤٤.٠	١٦٥٦.٠	٩٥٥.٠	-	١٢٠٠.٠	١٩٤٤.٠
المحجوز المتجمع	٠.٠	١١٤٤.٠	٢٨٠٠.٠	٣٧٥٥.٠	٤٩٥٥.٠	٦٨٩٩.٠	٢٢٤٤.٠
% للمحجوز	٠.٠	١١.٣	٢٧.٦	٣٧.٠	٤٨.٨	٦٨.٠	٢٢.٩٩
% للصار	١٠٠.٠٠	٨٨.٧٢	٧٢.٤٠	٦٢.٩٨	٥١.١٥	٣١.٩٩	

اختبار المواد الخفيفة:

٢- نسب المواد بالعينة

٢٠%	٣ سن
٢٠%	٢ سن
٢٠%	١ سن
٤٠%	زعل تكسير


وزن العينة (جم)

٥٣٨.٠	رقم أو سعة المنخل	٢.٠	٤.٠	١.٠
	المحجوز المتجمع	٣١٥.٠٠	٢٣٢.٠٠	١٢٠.٠٠
	% للمحجوز	٦٧.٨٤	٤٣.٣١	٢٢.٣٠
	% للصار	٣٢.١٦	٥٦.٦٩	٧٧.٧٠

ج- الكمرج العام:

رقم أو سعة المنخل (بوسه)	٢	١.٥	١	٠.٧٥	٠.٥	٠.٢٥	٠.١٥	٠.٠٧٥
رقم أو سعة المنخل (مم)	٥٠.٠	٣٧.٥	٢٥.٠	١٩.٠	١٢.٥	٩.٥	٤.٧٥	٠.٧٥
% للصار	١٠٠.٠٠	٨٨.٧٢	٧٢.٤٠	٦٢.٩٨	٥١.١٥	٣١.٩٩	١٨.١٤	١٠.٢٩
كمرج (١)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
كمرج (ب)								
كمرج (ج)								

المنطلي التصميمي للكمرج

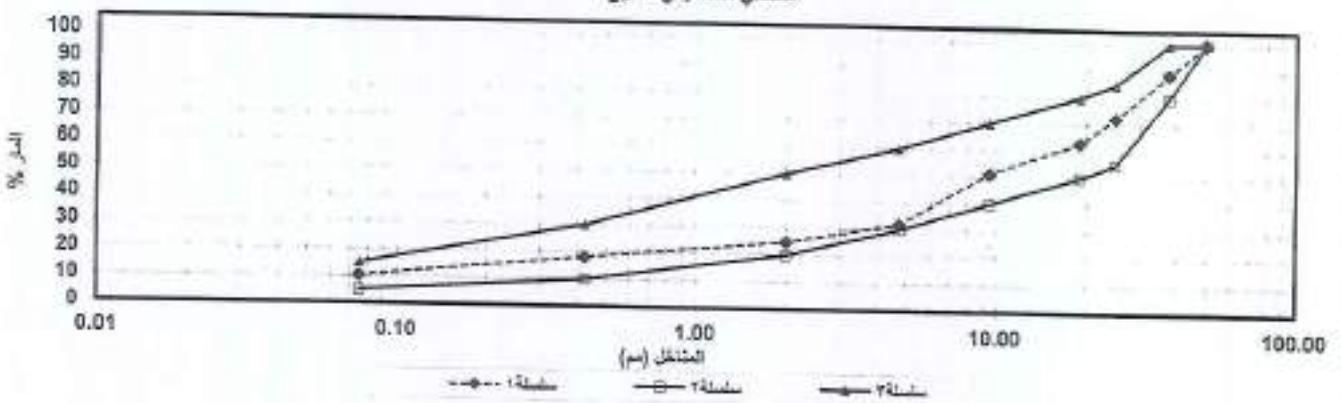

ثانياً: اختبار نسبة الطبيعي والمقسط والاستطالة

المواصفات	النتيجة	طريقة الحساب	البيانات
١		١٨٠٠	وزن العينة الظني (جم)
٢		٣٢	وزن المواد الطبيعية بالعينة (جم)
٣	١.٨	$100 \times (1/2)$	نسبة المواد الطبيعية بالعينة (%)
٤		٢٩.٠٠	وزن المواد المقطحة بالعينة (جم)
٥	١.٦	$100 \times (1/4)$	نسبة المواد المقطحة بالعينة (%)
٦		٢٤	وزن المواد المستطبة بالعينة (جم)
٧	١.٣	$100 \times (1/10)$	نسبة المواد المستطبة بالعينة (%)

مواصفات الهيئة:

مواصفات المنطلي التصميمي للمواد الخشنة  
 المواصفات القياسية المصرية  
 المواصفات القياسية المصرية  
 المواصفات القياسية المصرية





## إختبار بروكتور القياسي / المعدل


اليحراج الأحمر العالمية	اسم الشركة :	٢٠٢٢/١١/ ٨	تاريخ اجراء الإختبار :
صلاحية طبقة أساس ثانية	نوع العينة :		القطاع الممثل للعينة :
٢٠٨٠٠	مكان أخذ العينة :		

## نتائج الإختبار - الحسابات :

٢.٢٢٥	أقصى كثافة جافة (جم / سم <sup>٣</sup> )	٥٨٥٠	وزن القالب (جم)
٦.٨٠	نسبة المياه الأصولية (%)	٢١٠.٤	حجم القالب (سم <sup>٣</sup> )

رقم الإختبار	١	٢	٣	٤
وزن القالب + العينة رطبة (جم)	١٠٢٨٤	١٠٤٦٦	١٠٨٥٠	١٠٦٩٥
وزن العينة رطبة (جم)	٤٤٣٤	٤٦١٦	٥٠٠٠	٤٨٤٥
الكثافة الرطبة (جم / سم <sup>٣</sup> )	٢.١٠٧	٢.١٩٤	٢.٢٧٦	٢.٣٠٢

رقم الجفنة	m	w	d	s	m	n	l	z
وزن الجفنة فارغة (جم)	٤٣.٥٦	٤٤	٤٣.٥٧	٤٦	٤٣.٥٤	٤٤.٤٤	٤٣.٦٢	٤٤
وزن الجفنة + العينة رطبة (جم)	٢١٦.٠	٢٠٥.٠	٢١٨.٠	٢٠٣.٠	٢٠٢.٠	٢١٧.٠	٢٢٢.٠	٢٢٩.٠
وزن الجفنة + العينة جافة (جم)	٢١٢.٠	٢٠١.٠	٢١٠.٠	١٩٧.٠	١٩١.٠	٢٠٧.٠	٢٠٨.٠	٢١٤.٠
وزن المياه (جم)	٤.٠	٤.٠	٨.٠	٦.٠	١١.٠	١٠.٠	١٤.٠	١٥.٠
وزن العينة جافة (جم)	١٦٨.٤	١٥٧.٠	١٦٦.٤	١٥١.٠	١٤٧.٥	١٦٢.٦	١٦٤.٤	١٧٠.٠
نسبة الرطوبة (%)	٢.٤	٢.٥	٤.٨	٤.٠	٧.٥	٦.٢	٨.٥	٨.٨
متوسط نسبة الرطوبة (%)	٢.٥	٤.٤	٦.٨	٨.٧	٢.٥	٢.١١٩	٢.٢٢٥	٢.١١٩
الكثافة الجافة (جم / سم <sup>٣</sup> )	٢.٠٥٧	٢.١٠٢	٢.٢٢٥	٢.٠٥٧	٢.١١٩	٢.١١٩	٢.١١٩	٢.١١٩

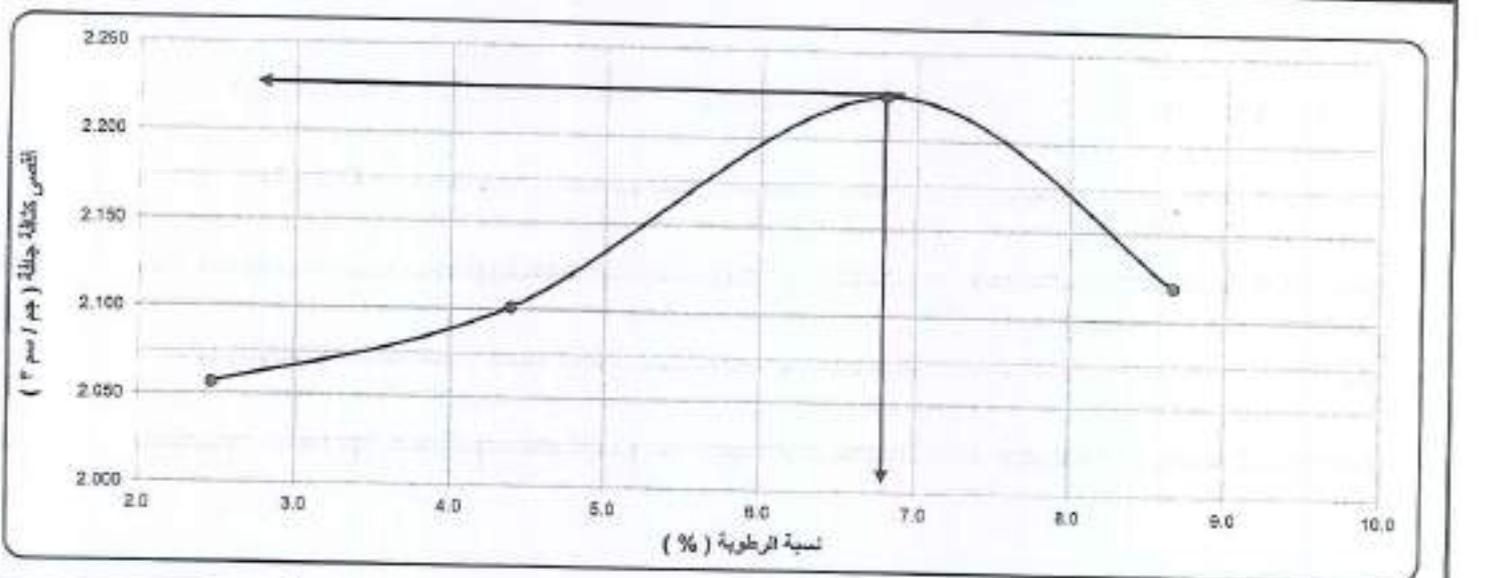

مهندس الهيئة :

مهندس معمل الشركة :

حسن صلاح الاحمد العالمية للمقاولات  
موقع الفرافرة الجديد



الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد  
مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان ابن عفان - الكلاخ (المرحلة الثالثة)  
مبادرة حياة كريمة  
اختبار تحديد نسبة تحمل تابلورنيا (CBR)

اسم الشركة :	البحر الأحمر العالمية
نوع العينة :	جلاحيية طبقة اساس لانية
مكان أخذ العينة :	٩٨.٠٠

تاريخ اجراء الاختبار :	٢٠٢٢/١١/١٢
القطاع الممثل للعينة :	

نتائج الاختبار :-


الإنتفاش	
رقم القالب	التاريخ
٦	
٠.٠٠	الارتفاع الابتدائي ( سم )
٠.٦٩	الارتفاع النهائي ( سم )
٠.٦٩	انحراف ( سم )
١١٦.٧٠	ارتفاع العينة ( سم )
٠.٥٩%	نسبة الإنتفاش ( % )

نسبة الرطوبة للقالب بعد الدمك	
رقم العينة	الوزن
٢٩.١٣	وزن العينة ( جم )
٩٢.٠	وزن العينة الرطبة (جم)
٢٠.٨	وزن العينة الجافة ( جم )
١٢.٠	وزن الماء ( جم )
١٦٨.٩	وزن العينة الجافة ( جم )
٧.١١	نسبة الرطوبة ( % )
٧.١١	نسبة العينة الإسمية ( % )

نسبة الدمك للقالب ( % )	
رقم القالب	الوزن
٦	
٢١٢٢	وزن القالب ( سم )
٥٦.٠	وزن القالب ( جم )
١٠١.٠	وزن القالب + وزن العينة رطبة ( جم )
٥٠.٠	وزن العينة رطبة ( جم )
٢.٣٥٦	الكتلة الرطبة ( جم / سم )
٢.٢٠٠	الكتلة الجافة ( جم / سم )
٢.٢٢٥	كثافة بروفيلور ( جم / سم )
٩٨.٩	نسبة الدمك ( % )

قراءات التحميل :

الإشراق ( سم )	٠.٦٤	١.٢٧	١.٩١	٢.٥٤	٤.٤٥	٥.٠٨	٧.٦٢
قراءة الحمل من العداد	٠.١٥	٠.٣٩	٠.٦٠	٠.٨٤	٠.٩٩	١.١٥	١.٢٨
الحمل المصحح (كيلو نيوتن)	٢.٠٤	٥.٣٣	٨.٦٠	١١.٤٩	١٣.٥٤	١٥.٧٢	١٧.٥٠

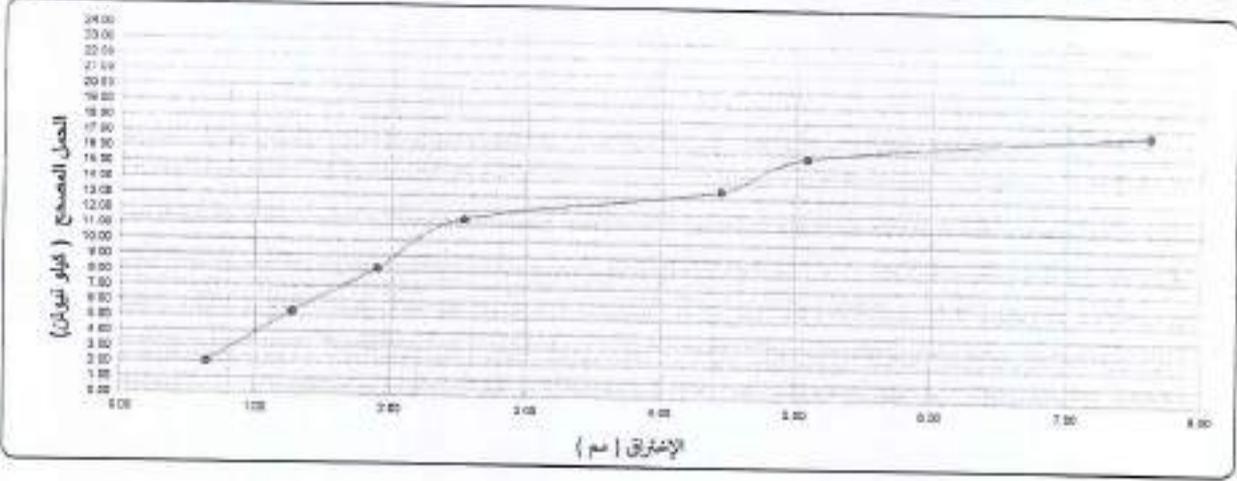

البيانات :-

الإشراق ( سم )	الحمل (كجم/سم)	الحمل القياسي (كجم/سم)	CBR ( % )	دمك القالب ( % )	دمك الطبقة المطلوب ( % )	CBR عند نسبة ٩٨ %
٢.٥٤	١١٧١.٤٨	١٣٦٠	٨٦.١٤%	٩٨.٩	٩٨	٨٥.٣٨%
٥.٠٨	١٦٠٣.٨٢	٢٠٤٠	٧٨.٦٢%			٧٧.٩٢%

مهندس الهيئة :  
[Signature]

مهندس معمل الشركة:  
حسني صلاح  
البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
مواقع الصرافرة الجديدة

# طلبات تسليم MCO

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الشراشرة الجديدة



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( لقطاع الثالث ) بطول 2.5 كم - حياة كريمة

طلب استلام وثائق

25.11.2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب ( 169 )

- 1- إزالة أسفلت قديم
- 2- ردم اثربة
- 3- حفر
- 4- طبقة أساس من
- 5- طبقة تسيب
- 6- طبقة أسفلت رابطة
- 7- طبقة لاق
- 8- طبقة أسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بحد ..

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة رشن MCO

وذلك بالمسافة :

من كم / 9+000 إلى كم / 10+180 بطول 1.180

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
التوقيع :		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :  
التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :  
التوقيع :

موقع الفرافرة الجديد  
البحر الأحمر العالمية للمقاولات



مشروع رفع كفاءة طريق الفرافة / عثمان بن عفان ( اقطاع الثالث ) بطول 2.5 كم

إختبار معدل رش ( RC2 - MC1 )

رقم الطلب	التاريخ	اسم المشروع	موقع العينة	نوع الخلطة	رقم الطلب
				MCO	
			10 + 18 - 94000	موقع العينة	
أولاً / معلومات الرش					
نوع الرش	ثقل الرش				
درجة حرارة الرش	معدل الرش				
ارتفاع الرش	سرعة الانتشار				

ثانياً / إختبار معدل الرش

رقم الإختبار	موقع العينة	1	2	3	الوحدة
		L/S	C.L	R/S	
1	موقع العينة				
2	وزن البليتة قبل الإختبار	3050	3300	3500	gms
3	وزن البليتة بعد الإختبار	3351,8	3601	3801,8	gms
4	وزن الرش	301,8	301	301,8	gms
5	مساحة البليتة	125	125	125	sq.cm.
6	معدل الرش 3/4	1207	1204	1207	gms/sq.cm.
7	نسبة معدل الرش				kg/sq.m
8	متوسط معدل الرش	1208			kg/sq.m

مهندس الهيئة :

*(Handwritten signature)*

المواصفة البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
مواقع الشرافة الجديدة  
القائم بالإختبار



مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان (قطاع الثالث) بطول 2.5 كم - حياة كريمة

طلب استلام: 15/11/2023

23/11/2023 تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب ( 168 )

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم اتربة
- 3- حفر
- 4- طبقة اساس من
- 5- طبقة تخرمب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة الرق
- 8- الطبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المكتب

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة رشن MCO

وذلك بالمسافة :

من كم / 8+000 إلى كم / 9+000 بطول 1000

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
التوقيع :		

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
التوقيع :		

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		←
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :



مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان بن 2.5 كم (القطاع الثالث)

إختبار معدل رش ( RC2 - MCO )

2215/223

التاريخ

رقم الطلب

اسم الشارع

MCO

نوع الخلطة

9+000

-

8+000

بداية ونهاية الموقع

موقع العينة

أولا / معلومات الرش

كثافة الرش

نوع الرش

معدل الرش

درجة حرارة الرش

سرعة الانتير

ارتفاع الرش

ثانيا / إختبار معدل الرش

الوحدة

3

2

1

رقم الإختبار

R/S

C.L.

L/S

موقع العينة

1

gms

3600

3400

3200

وزن البلطة قبل الإختبار

2

gms

39018

3700,5

3500,8

وزن البلطة بعد الإختبار

3

gms

301,8

300,5

300,8

وزن الرش

4

sq.cm.

1,25

1,25

1,25

مساحة البلطة

5

gms/sq.cm.

1207

1202

1203

معدل الرش 3/4

6

kg/sq.m

نسبة معدل الرش

7

kg/sq.m

1204

متوسط معدل الرش

8

مهندس الهيئة :

المواصفة

المركز القومي  
للبحوث والدراسات  
الطرق والجسور والأنفاق  
بمحافظة القاهرة  
القاهرة - مصر

القائم بالإختبار :

# طلبات تسليم رابطة

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
موقع الفراشة الجديد



**مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان ( انقطاع الثالث ) بطول 2.5 كم - حياة كريمة**

طلب استلام : أعمال حفر

27 - 11 - 2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب ( 186 )

- 1- إزالة أسفلت قديم
- 2- ردم تربة
- 3- حفر
- 4- هادئة اساس من
- 5- طبقة لتثبيت
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لزي
- 8- طبقة اسفلت سطحية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بعد ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

طبقة اسفلت رابطة .

وذلك بالمسافة :

من كم / 9+000 إلى كم / 10+180 بطول 1180

**أعمال الفحص البصري**

ملاحظات	مرفوض	مقبول
التوقيع :		

**أعمال مساحية**

مرفق الرقع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
التوقيع :		

**أعمال معملية**

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
التوقيع :		

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الإسم :

التوقيع :

البحر الأحمر العالمية للمقاولات  
 موقع الفرافرة الجديد



اختبار الإستخلاص


رابعة 23	نوع العينة: الطريق - الإنشاء	10+180	9+000	لترينج إجراء الاختبار:
خلاصة البصر الأحمر	المساحة:	المختبر الأحمر العالمية للمقاولات		المقطع الممثل للعينة:
				اسم الشركة:
				رقم البند / عرض البند:

نتائج الاختبار - الحسابات :-

2028.5	وزن العينة بعد الاختبار ( جم )
4.51%	نسبة الألياف

2120.0	وزن العينة قبل الاختبار ( جم )
91.5	وزن البوتوم

معدن المواصفات العامة رابعة 23		نسبة الألياف التصميمية		المتاح (النسبة %) (S.F.)	المتاح (%)	المحتجز (%)	المحتجز (جم)	سعة المتخلل	
الحد الأدنى (%)	الحد الأقصى (%)	حدود المتاح لتكسيش (%)	حدود المتاح (%)					(مم)	( بوصة )
100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	25.0	"2
100	75	95.0	96.0	91.9	90.0	9.76	291.0	39.0	"3/4
70	45	66.3	56.0	61.9	62.5	37.47	750.0	9.5	"3/8
50	30	50.0	43.1	47.0	48.6	50.38	1022.0	4.75	رقم 4
35	20	24.6	20.0	21.6	31.7	78.28	1568.0	2.36	رقم 8
30	5	15.5	9.5	13.5	12.0	87.75	1780.0	0.600	رقم 30
17	3	12.0	6.5	9.5	10.2	89.82	1822.0	0.500	رقم 50
8	2	7.8	4.3	6.3	6.8	93.17	1890.0	0.150	رقم 100
4	0	4.0	2.2	3.7	3.8	96.18	1951.0	0.075	رقم 200

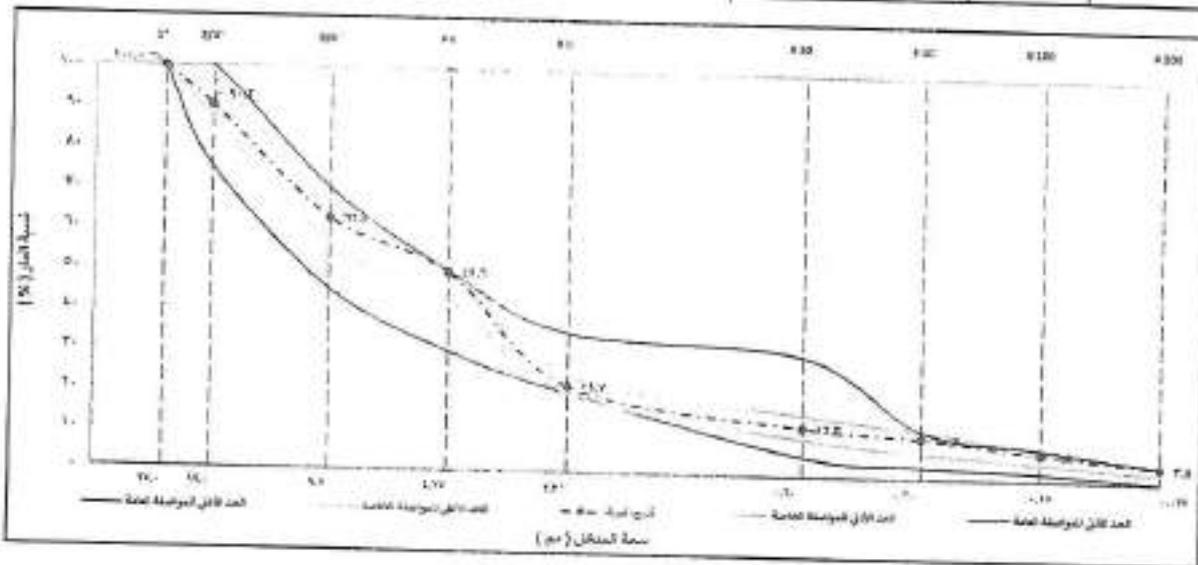

مهندس الهيئة

1/1  
 توقيع

1/1  
 التوقيع بالبحر الأحمر العالمية للمقاولات  
 موديع الشرافرة الجديد





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان / انطاع الثالث بطول 2.5 كم - حياة كريمة

طلبه المفاضل رقم 10000

28/11/2023

تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب ( 185 )

- 1- إزالة اسفلت قديم
- 2- ردم التربة
- 3- ختم
- 4- طبقة اساس من
- 5- طبقة الطوب
- 6- طبقة اسفلت رابطة
- 7- طبقة لزي
- 8- طبقة اسفلت سطوية
- 9- تخطيط

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة اسفلت رابطة

ونك بالمسافة :

من كم / 8+000 الي كم / 9+000 بطول 1000

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

التوقيع :

مهندس الهيئة

الإسم :

التوقيع :

مهندس الشركة  
الإسم : المهندس العالمية للمتاولات  
التوقيع :  
مشروع الفرافرة الجديد



اختيار الإسفلت

تاريخ اجراء الاختبار: 28/11/2021  
القطاع المسجل للهيئة: 9+000 8+000  
اسم الشركة: البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
رقم البند / عرض البند:


نوع العينة: رابطة 03  
التجهيز - الاتجاه: خلاطة البحر الاحمر  
الخلاطة:

1789.0	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
4.53%	نسبة الاسفلت

1870.0	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
81.0	وزن البوتومين

نتائج الاختبار - الحسابات:

حدود التوافق العامة رابطة 03		حدود التوافق التصميمية		الخصائص الخصائص (%) AASHTO	ناتج اختبار (%)	المحتوى الجاف (%)	المحتوى الجاف (جم)	سعة المتخلل	
الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)							(مم)	(بوصة)
100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	25.0	*1
100	75	95.9	86.8	92.9	93.8	6.43	115.0	19.0	*3/4
70	45	66.3	36.2	61.3	63.4	36.61	635.0	9.5	*3/8
50	30	50.0	25.7	47.2	46.8	53.10	950.0	4.75	رقم 4
35	20	24.6	20.1	11.6	13.0	77.03	1278.0	2.36	رقم 8
30	5	15.5	9.5	12.9	13.1	86.08	1540.0	0.600	رقم 30
12	3	12.0	5.5	10.5	10.1	89.55	1602.0	0.300	رقم 50
8	2	7.8	4.3	8.3	5.3	94.47	1690.0	0.150	رقم 100
4	0	4.0	2.2	3.9	3.2	96.81	1712.0	0.075	رقم 200

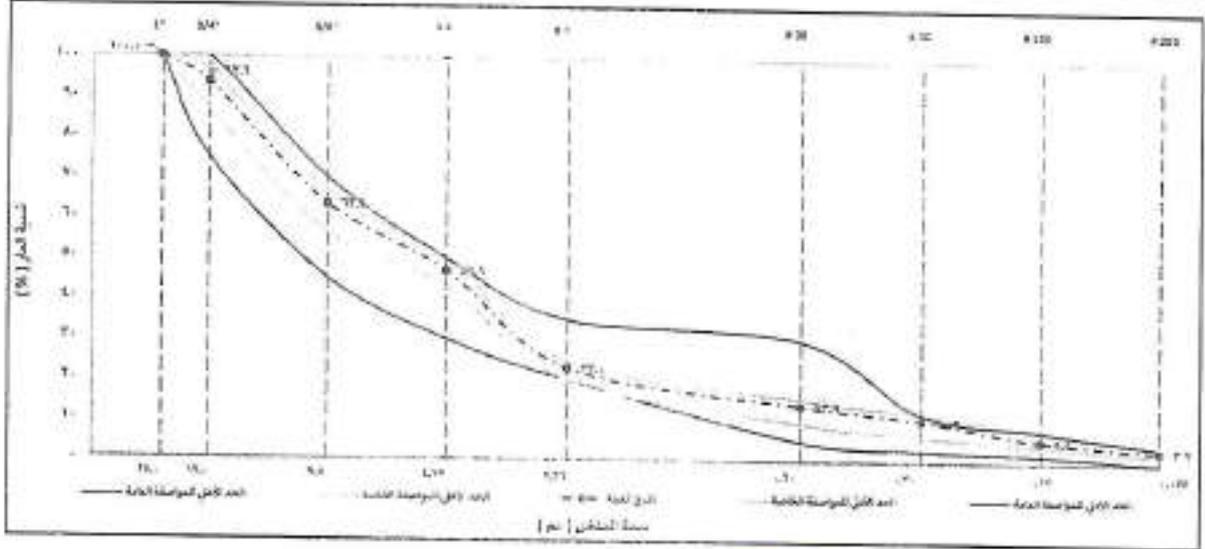

مهندس  
التوقيع

التام بالاختبار  
البيانات الاحصائية للمقاولات  
مؤتمنة  
التوقيع







الشركة المنفذة		المالك		المشروع			
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة		الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / حضان بن عدنان / القطاع الثالث / بطول 2.5 كم			
<p>Red Sea International G. Contractors P. Medya St., Dakh. City, Egypt Tel. +90511 7460111 / 7460112 / 7460113 Email: rsi@redsea.com.eg</p>  <p>البحر الاحمر العالمية للمقاولات التجارة - المقاولات العالمية مقر الشركة: القاهرة - مصر www.redsea.com.eg</p>		<p>الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT CONTROL</p> 		مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - مبادرة حياة كريمة			
10 / 12 / 2023	الى تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	1	مستخلص جاري رقم	كتشف تواجد السادة مهندسى فريق العمل من قبل الشركة المنفذة للاعمال	
ملاحظات	ايام الغياب	الاسم	العدد الموجود بالموقع	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقا للعقد	التخصص	م
	0	مجدى حسن الغندور	1	10	1	مدير تنفيذ طرق	1
	0	عبد المنعم عصام عبد المنعم	1	5	1	حاسب كميات	2
	0	حسنى صلاح حافظ	2	5	2	مراقب تنفيذ/ فنى مواد	3
	0	عاطف محمد الشبوي					
	0	ايمن عبد الهادى سليمان	2	5	2	فنى سلامة مرورية	4
	0	جمال سليمان					
	0	نبيل عبد السميع محمد	2	7	2	مساح	5
	0	محمد سالم علوانى					

مهندس الهيئة

البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
مهندس الشركة مهندس الفرافرة الجديد



الشركة المنفذة				المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة				الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرطرة / عتمان بن عفان (قطاع الثالث) بطول 2.5 كم	
Red Sea International G. Contractors (Malindi, Dubai, Ras Al Khaima) Tel: +965 2777400 / Fax: +965 2777414 Email: info@redsea.com.om		 البحر الاحمر العالمية للمقاولات الشركة العامة للطرق والكباري والنقل البري عمان 30300 Tel: +965 2777400 / Fax: +965 2777414 Email: info@redsea.com.om		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT TOWNSHIP		 مركز الشرافرة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حياة كريمة	
10 / 12 / 2023	الى تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	1	مستخلص جاري رقم	كشف تواجد السادة مهندسي فريق العمل من قبل الشركة المنفذة للاعمال	
ملاحظات	ايام الغياب	الاسم	العدد الموجود بالموقع	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقا للعقد	التخصص	م
	0	مجدى حسن الغندور	1	10	1	مدير تنفيذ طرق	1
	0	عبدالمنعم عصام عبدالمنعم	1	5	1	حاسب كميات	2
	0	حسنى صلاح حافظ	2	5	2	مرافق تنفيذ/ فني مواد	3
	0	عاطف محمد النبوي					
	0	ايمن عبد الهادي سليمان	2	5	2	فني سلامة مرورية	4
	0	جمال سليمان					
	0	نبيل عبد السميع محمد	2	7	2	مساح	5
	0	محمد سالم علواني					

مهندس الهيئة

ام

البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
 مهندسة الهيئة الجديدة  
 مهندس الشركة المنفذة

ام

الشركة المنفذة				المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات				الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع البناء ورفع كفاءة طريق القدرا / اقصان من عمان   المبلغ الثلاث   بدون 2.5 كم	
						مركز القرطبة - محافظة الوادي الجديد - مبادرة حواء كريمة	
19/12/2023	في تاريخ	بتاريخ العمل	من تاريخ	1	مستخلص جاري رقم	كشوف توحيد المقادير المتواجدة بالموقع	
ملاحظات	المعد التفعيل	العدد طبقا للعقد	نوع المادة	نوع البند	م		
	1	1	مخففة خلط اسفلت مركزية	مجمع العلاقات	1		
	1	1	زافع التربة ( لودر )		2		
	1	1	معمل اسفلت ومواد		3		
	160	لا تقل عن 100 طن	خزانات لتخزين بيتومين		4		
	40	30طن	خزان M.C		5		
	40	80طن	خزان R.C		6		
	1	1	مغسلة مواد		7		
	2	2	مبرد مياه خلط	8			
	3	3	ماكينة المزه خروج لا تقل عن 50 كد وات	اعمال لحوارات وتأمين مستخدس الطريق	9		
	1	1	ولش 15ك		10		
	2	2	كلارك		11		
	1	1	لودر		12		
	بملاحة لا تقل عن 300طن		خزانات تخزين اسفلت (في حالة وجود اعمال خرسانية بالمشروع)	اعمال الاتربة	13		
	1	1	زافع التربة   لودر		14		
	1	1	موزعات مياه		15		
	1	1	جرير		16		
	1	1	هراس تربة		17		
	1	1	بلودوز على جاتير		18		
	4	4	عربة قلاب		19		
	1	1	لودر		20		
	4	4	عربة قلاب		21		
	1	1	تلكه مياه		22		
	1	1	جرير مزود بحساس لوزر جديد او بملاحة جيدة لا يزيد عمره عن 5 سنوات هراس اساس كاولش وزنه في حدود 24طن جديد او بملاحة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	اعمال الاساس	23		
	2	2	جرار زراعي مزود بمكنسة				
	2	2	حماط حواء				
	2	2	عربة فرش اسفلت سائل (التاير)				
	2	2	عربة فرش المخلوط الاسفلت ( قنشر )		24		
	1	1	هراس جديد خشيف وزنه لا يقل عن 7 طن	25			
	1	1	هراس جديد ثقيل لا يقل وزنه عن 12 طن	26			
	1	1	هراس كاولش ثقيل وزنه في حدود 24 طن	27			
	1	1	منشار قطع اسفلت	28			
	1	1	عربة مكثسة مكنة المكنية لتنظيف السطح قبل الرصيف	29			

مهندس الهيئة

المهندس المهندس المهندس  
عبدالله بن محمد بن عبدالمجيد



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد .....

الموضوع : بخصوص اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - عثمان بن عفان / الكفاح ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم ضمن مبادرة " حياة كريمة " مركز الفرافرة - الوادي الجديد

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات .

نحيط علم سيادتكم انه لا توجد في اشتراطات التعاقد الخاصة بالعملية تواجد عمالة محملة علي العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام...

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

مهندس /  
( علاء عبدالعال حسين )



Handwritten signature in blue ink.

تحرير في : 2023/ 12 / 10



محضر استلام موقع  
عملية: اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة/عثمان بن عفان بطول 2.5 كم القطاع الثالث مركز الفرافرة محافظة الوادي  
الجديد ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)  
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات  
عقد رقم ( 2024/2023/676 )

إليه في يوم 9 / 11 / 2023

قامت اللجنة المكونة من :-

- 1- السيد المهندس / محمد شعبان
  - 2- السيد المهندس / أحمد حمدي
  - 3- السيد المهندس / علاء سعيد عبد السلام
- مدير المشروع ( الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري )  
مهندس العملية ( الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري )  
مدير المشروع (شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات)

تم المرور على مسار العملية عاليه و تبين أن الطريق خالي من الحوائق الظاهرية و لاتوجد أي موانع من استلام موقع العملية و البدء في التنفيذ.

و يعتبر تاريخ 9 / 11 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع و بدء الأعمال بالعمليه.

و هذا محضر منا بذلك ...

التوقيع

الاسم

- 1- السيد المهندس /
- 2- السيد المهندس /
- 3- السيد المهندس /

يحتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثامنة عشرة بالوادي الجديد

علاء عبد العال حسين





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : بخصوص اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - عثمان بن عفان / الكفاح ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم ضمن مبادرة " حياة كريمة " مركز الفرافرة - الوادي الجديد

مقولة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

نحيط علم سيادتكم انه تم توفير الاستراحة الخاصة بجهاز الاشراف بالعملية اعلاه حسب شروط التعاقد .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

مهندس /  
( علاء عبدالعال حسين )



Handwritten signature in blue ink.

تحرير في : 2023/12 / 10



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : بخصوص اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - عثمان بن عفان / الكفاح ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم ضمن مبادرة "حياة كريمة" مركز الفرافرة - الوادي الجديد

مقابلة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

نحيط علم سيادتكم انه لا يوجد باشتراطات العملية اعلاه تواجد مكتب استشاري خارجي للاشراف على الاعمال حسب شروط التعاقد .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

مهندس /  
(علاء عبدالعال حسين)



Handwritten signature in blue ink.

تحرير في : 2023/12/10

## محضر معاينة

انه في يوم الخميس الموافق 9 / 11 / 2023 بوجود كلا من الاتى أسمائهم :

1-المهندس / محمد شعبان مدير المشروع ( الهيئة العامة للطرق والكبارى )

2-المهندس / أحمد حمذى مهندس العملية ( الهيئة العامة للطرق والكبارى )

3-المهندس / علاء سعيد ممثل شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تم قياس مسافة النقل على الطبيعة عن مشروع مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة /عثمان بن عفان بطول 2.5 كم ( القطاع الثالث ) -حياه كريمة - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - الخاص بشركة البحر الأحمر من الكم 8 الى الكم 2.10 وقد وجدت المسافة من كساره الشركة التي يتم توريد طبقة منها طبقة الاساس الى متوسط القطاع المذكور هي 56 كم .

وبناء على تلك المسافة يتم المحاسبة على مسافة النقل 56 كم لكامل القطاع .

. وبناء على ذلك تم الاتفاق .

3- م. م. علاء سعيد

2- م. م. محمد شعبان

1- م. م. أحمد حمذى

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبدالعال حسين)



## محضر معاينة

انه في يوم الخميس الموافق 9 / 11 / 2023 بوجود كلا من الاتى أسمائهم :

1-المهندس / محمد شعبان مدير المشروع ( الهيئة العامة للطرق والكبارى )

2-المهندس / أحمد حمدي مهندس العمليّة ( الهيئة العامة للطرق والكبارى )

3-المهندس / علاء سعيد ممثل شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تم قياس مسافة النقل على الطبيعة عن مشروع مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة /عثمان بن عفان بطول 2.5 كم ( القطاع الثالث ) -حياه كريمة - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد - الخاص بشركة البحر الأحمر من الكم 8 الى الكم 2.10 وقد وجدت المسافة من كساره الشركة التي يتم توريد طبقة منها طبقة الاساس الى متوسط القطاع المذكور هي 56 كم .

وبناء على تلك المسافة يتم المحاسبة على مسافة النقل 56 كم لكامل القطاع .

. وبناء على ذلك تم الاتفاق .

3-  م. المهندس

2- 

1- 

رئيس الادارة المركزية

مهندس / 

(علاء عبدالعال حسين)





السادة / الشركة المصرية للتعبدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

تحية طيبة وبعد ....

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم الكميات المحجزة الموردة بالمقر المكعب للعملية عالية تنفيذ / شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات وذلك من تاريخ  
9/11/2023 وحتى تاريخ 30/12/2023 وبياناتها كالتالي :-

1 إجمالي الأتربة: 5000 م<sup>3</sup>

السن لزوم طبقة الأساس : 3م<sup>3</sup>10489

السن لزوم الطبقة الرابطة الاسفلتية 6سم : 3م<sup>3</sup>1269.21

السن لزوم الطبقة السطحية الاسفلتية 5سم : 3م<sup>3</sup> 760.81

2 إجمالي السن : 3م<sup>3</sup>12519.02

الرمل لزوم الطبقة الرابطة الاسفلتية 6سم : 3م<sup>3</sup>335.08

الرمل لزوم الطبقة السطحية الاسفلتية 5سم : 3م<sup>3</sup> 489.09

3 إجمالي الرمل : 3م<sup>3</sup>824.17

برجاء التكرم من سيادتكم نحو الإفادة بقيام الشركة بسداد الإتاوة المطلوبة للكميات بحالية حتى يتسنى للهيئة  
العامة للطرق والكباري إستكمال إجراءات صرف المستخلص الختامي .

وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار ""

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

علاء عبدالعال حسين

التوقيع /

تحريري في :

30/12/2023

تقرير رقم ( 77 ) بتاريخ 2023 / 12 / 11  
مشروع : رفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان / الكفاح  
( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم حياة كريمة  
تنفيذ : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات



المسيد المهندس / رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

تحية طيبة ..... وبعد

نشرف بان نرفق التقرير المعمل رقم (77) لمشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان / الكفاح  
( للقطاع الثالث ) بطول 2.5 كم حياة كريمة لعدد ( 2 ) عبدة صلاحية اساس من كم 9+000 وكم 10+000 .

بيانات القيمة كما يلي :

المبلغ	البيانات
6470	مقابل خدمة + اعداد كتابة تقرير
905.8	قيمة مضافة (14%)
7375.8	الاجمالي

لذا يرجى من سيادتكم التنبية بتحصيلها من شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام؟؟؟



مهندس المعمل

*[Handwritten signature]*

اخصائي المعمل

*[Handwritten signature]*

## معمل المنطقة

### معمل المواد

تقرير رقم: ( 77 ) بتاريخ 11 / 12 / 2023

مشروع : مشروع رفع كفاءة طريق الرفافة / عثمان بن عفان / الكفاح ( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم

تنفيذ : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

### تقرير اختبارات معملية

#### بيانات ادارية

القائم بإحضار العينات : م / أحمد حمدي أحمد

العينات مسئولة من أحضرها:

الجهة المشرفة : الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الثانية عشر

#### بيانات العينات

1- عينة طبقة أساس (تكمير كمسارات)

#### النتائج:

#### 1- التدرج الخشن

ملاحظات	مواصفات الاساس	كم العينة		سعة او رقم المهزة
		كم 10+000	كم 9+000	
	100	%100	%100	"2
	100 - 70	% 89	% 85	"1.5
	85 - 55	% 72	% 77	"1
	80 - 50	% 71	% 67	"4/3
	70 - 40	% 55	% 53	"8/3
	60 - 30	% 44	% 44	رقم 4

#### 2- تحديد نسبة تدرج الناعم

رقم 10	% 29	% 27	50 - 20
رقم 40	% 15	% 18	30 - 10
رقم 200	% 5	% 5	15 - 5

#### 3 - التآكل بجهاز لوس انجلوس

ملاحظات	المواصفات الخاصة بالاساس	كم العينة		سعة او رقم المهزة
		كم 10+000	كم 9+000	
	زيادة عن 40 %	36 %	% 38	نسبة فقد بعد 500 لفة ب . غ %

4- الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت

ملاحظات	مواصفات الخاصة بالأساس	كم العينة	
		10+000 كم	9+000 كم
	لا يزيد عن 10%	% 0	% 0
	لا يزيد عن 5%	% 0	% 0
	لا يزيد عن 10%	% 0	% 0
	لا يزيد عن 10%	% 0	% 0

5- السيولة واللدونة

ملاحظات	مواصفات الخاصة بالأساس	كم العينة	
		10+000 كم	9+000 كم
	لا يزيد عن 30%	عديمه	عديمه
	لا يزيد عن 8%	عديمه	عديمه

6- الدمك المعدل

ملاحظات	كم العينة	
	10+000 كم	9+000 كم
	2.35	2.36
	% 7.55	% 7.50

7- نسبة تحمل كاليفورنيا

ملاحظات	المواصفات الخاصة بالمشروع	كم العينة	
		10+000 كم	9+000 كم
	لا يقل عن 80%	% 81	% 81
	لا يزيد عن 3%	% 0	% 0

يعتمد!

رئيس الإدارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)



مهندس المعمل

[Signature]

اخصائي المعمل

[Signature]

تقرير رقم : ( 78 ) بتاريخ 11 / 12 / 2023  
مشروع : رفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان / الكفاح  
( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم حياة كريمة  
تنفيذ : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

المسيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

تحية طيبة .....ويعد

نتشرف بأن نرفق التقرير المعصلي رقم ( 78 ) لمشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان بن عفان / الكفاح  
( القطاع الثالث ) بطول 2.5 كم لعدد ( 3 ) عينة استخلاص اسفلت رابطة .

بيانات القيمة كما يلي :

المبلغ	البيانات
2200	مقابل خدمة + كتابة تقرير
308	قيمة مضافة (14%)
2508	الاجمالي

لذا يرجى من سيادتكم التنبية بتحصيلها من شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام!!!!

مهندس المعمل

اخصائي المعمل



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

تقرير رقم : 78

تاريخ : 11/12/2023

مشروع : رفع كفاءة طريق القرافرة / حضان بن عطان / الكفاح

القطاع الثالث ( جيايا كريمة ) بطول 2.5 كم

تنفيذ : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

إشراف : المنطقة الثانية عشر بلوادي الجديد



## معمل المنطقة

### العينات مسئولية من احضرها

نعم باحضار العينات : م / أحمد حمدي أحمد

نوع العينة : طبقة رابطة

تجارب التي اجريت : الاستخلاص و إيجاد نسبة الاسفلت

حدود المواصفات		حدود التصميم		نوع العينة	نوع الاسفلت	نوع الرابطة	نوع الحصى	نوع الرمل
U.L	L.L	U.L	L.L					
100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
100.0%	75.0%	95.9%	85.9%	94.2%	94.5%	93.9%	93.9%	3"
70.0%	45.0%	86.3%	56.3%	82.7%	82.4%	64.8%	64.8%	3/4"
50.0%	30.0%	60.0%	43.1%	49.8%	44.9%	48.5%	48.5%	3/8"
35.0%	20.0%	25.6%	20.0%	22.4%	20.4%	27.1%	27.1%	#4
20.0%	5.0%	15.5%	9.5%	10.0%	7.5%	15.3%	15.3%	#8
12.0%	3.0%	12.0%	6.0%	4.8%	3.9%	4.2%	4.2%	#20
8.0%	2.0%	7.8%	4.8%	3.3%	2.1%	2.8%	2.8%	#30
4.0%	0.0%	4.0%	2.2%	0.8%	1.1%	1.0%	1.0%	#100
4.75%	4.25%	4.75%	4.25%	4.6%	4.7%	4.6%	4.6%	A200



مهندس المعمل

أخصائي المعمل

تقرير رقم ( 80 ) بتاريخ 31 / 12 / 2023  
رفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان ابن عفان / الكفاح  
( القطاع الثالث ) حياة كريمة  
تنفيذ : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

تحية طيبة ..... وبعد

نتشرف بأن نرفق التقرير المعصلي رقم (80) بخصوص عملية رفع كفاءة طريق الفرافرة / عثمان ابن عفان / الكفاح ( القطاع الثالث ) حياة كريمة لعدد ( 2 ) عينة أسفلت سطحية .  
بيانات القيمة كما يلي :

المبلغ	البيانات
1550	قيمة تجارب المعمل + كتابة تقرير
217	قيمة مضافة (14%)
1767	الاجمالي

لذا يرجى من سيادتكم التنبيه بتحصيلها من شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام!!!!

مهندس المعمل

لخصني المعمل



إدارة المشاريع والنقل البري

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

تقرير رقم : 80  
 تاريخ : 31/12/2023  
 مشروع : رفع كفاءة طريق القرافرة / عثمان بن عفان / الفلاح (القطاع الثالث)  
 بطول 2.5 كم  
 نفقة : شركة البحر الأحمر التعليمية للمقاولات  
 المراف : المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

شركة العامة  
 للطرق والجسور والنقل البري  
 GENERAL AUTHORITY  
 FOR ROADS AND BRIDGES  
 AND RAILWAYS TRANSPORT  
 وزارة النقل  
 المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

### معمل المزج

لتم باحضار العينات : احمد حمدي

نوع العينة : طبقة سطحية

تجارب التي اجريت : الاستخلاص و ايجاد نسبة الاسفلت

حدود المرصفت		حدود القصيمي							
U.L	L.L	U.L	L.L					كم 8+500	كم 9+600
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%					100.00%	100.00%
100.00%	80.00%	100.00%	83.60%					93.36%	93.36%
80.00%	80.00%	71.00%	61.00%					66.14%	62.11%
65.00%	48.00%	56.90%	48.90%					66.65%	62.73%
60.00%	36.00%	49.30%	43.30%					39.66%	34.77%
30.00%	19.00%	26.60%	22.60%					18.67%	12.89%
23.00%	13.00%	19.10%	13.10%					9.16%	8.20%
15.00%	7.00%	11.90%	8.90%					4.43%	5.08%
8.00%	3.00%	7.10%	4.10%					2.53%	2.73%
5.26%	4.75%	5.26%	4.75%					5.08%	5.08%



مهندس المعمل  
 اخصائي المعمل
