


فصل كميات الاعمال العادية والاطلال المخطوط بالاسمنت
الى ص بالردم حول البربخ خلاصة لـ CV+0.21



الكميات

259.85

الكميات
271.3

641.9

بدراسات

1630.65

استاري الطين

عملية الشركة

مختار



محضر متابعة



التاريخ: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١

اسم المشروع: مشروع قطار السريع (العين السخنة - الطمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشاري الاتصال المساحية لبيئة الطرق والكباري)

برصد احداثيات المحجر الخاص بشركة / بمساحة
بحضور كل من :-

- ١- م / احمد سامي انور
- ٢- م / محمد حسن
- ٣- م / مصطفى حمورسي
- ٤- م /

وكانت احداثياته :-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
١	7٠3115.84٥	77٩٥٥7.832	11 Km

ملاحظات :-

مهندس البيئة
ع

استشاري المشروع
ع

استشاري المساحة

M. M. M.
14
14

مهندس الشركة المنفذة

ع
ع





محضر معاينة عينات ردم



التاريخ : 2022 / 10 / 31

اسم المشروع : مشروع القطار السريع [العين السخنة - الزمينا]

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشاري الاحمال المساحية لهيئة الطرق والكباري برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / الشاوي للمقاولات العمومية

بمضور كلاً من :-

1- م. 1 / م. 2 / م. 3 / م. 4
م. 1 / م. 2 / م. 3 / م. 4
م. 1 / م. 2 / م. 3 / م. 4
م. 1 / م. 2 / م. 3 / م. 4

و كانت إحداثياته كالتالي :-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	مسافة المحجر من قطاع الردم
1	706609,265	778940,2	19
	706919,295	777878,029	
	707176,977	777730,502	

تم زيادة مساحة النقل وذلك لخلق طريقه المحاجر من قبل
شركة الرواد لمؤعمال كوبري طريقه المحاجر 29+50 وذلك
في تاريخ 2022/10/17
ملاحظات 1 -
يوجد حرقه مساحه 2 كم

مهندس الهيئة
رصد عينات
استشاري الهيئة

استشاري المشروع

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة





السادة شركة الثناوي

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بأن كمية الردم الخاصة

ببربخ 425+28 هي 4628.13 م³

وبربخ 920+28 هي 4752 م³

يتم خصمها من كمية الردم الفعلية للقطاع

ولسيادتكم جزيل الشكر.....

مدير المشروع من قبل مكتب الرائد للاستشارات

م/خالد عوض

٢٠٢٢/٩/١٩



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ: ٢٠٢٣-٨-١٥

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

بأعتماد الكميات الملفدة الخاصة بشركة :. الشناوى للمقاولات العمومية

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	27+500	28+500	اعمال حفر شامل اعمال حفر البرايخ	182858.1	كمية اجمالية بدون تصنيف الاجهادات
2			اعمال ردم	267246.27	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
3			اعمال ردم احلال البراخ باستخدام سن ١+سن ٢+رمل للبراخ ارقام ٢٧+٥٣٨ & ٢٨+٤٢٥	2440.02	
4			اعمال ردم احلال البراخ باستخدام سن ١+سن ٢+رمل + اسمنت للبراخ رقم ٢٧+٥٣٨	641.9	

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية العمل حتى تاريخه

مهندس الهيئة
٢/٢٠٢٣/٢٠٢٣

استشارى الهيئة
الهيئة

استشارى المساحة
عاصم محمد
مهندس الشركة المنفذة
محمد
SHENAWY
CONSTRUCTION
011-129115/15/17

مهندسون انشائيون 45 المنقذون

بيان الأعمال من بداية العمل حتى تاريخه عقد رقم ٧٠٠٥٩٧-٢٠٢١-٧٠٠٥٩٧

[illegible]

مهندس التهيئة
H. Boucetta

المستشار في الهيئة
J. J. J.

المختصين في الطب في المستشفى

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة - العلمين - مطروح)

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية

الموقف التنفيذي الأسبوعي

مستخلص جاري ٩ عقد ٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
18/06/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
250,000.00	كمية الردم المنفذ
92.10%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /


الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
شركة الشناوي
18/06/2023
موقف تنفيذي اسبوعي
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
055/111/111
01-111111/11/11

من الكم ٢٧٠٠٠ حتى الكم ٢٨٠٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
25/06/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنفذ	252,000.00
نسبة تنفيذ الردم	92.84%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية



من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشاوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
17/07/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
257,000.00	كمية الردم المنفذ
94.68%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد ماهر
التوقيع /
الشاوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
008/988/111/11
8/00-129178/11/11

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
24/07/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنفذ	259,000.00
نسبة تنفيذ الردم	95.42%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
الشارع ١٤٦٥
ب.ص. ٥٥٩/١٤٤/١١٦٠
مكتب تنفيذي ٥٥٩/١٤٤/١٥/١٣

EL SHENNAWI
CONSTRUCTION

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
31/07/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنقذ	261,000.00
نسبة تنفيذ الردم	96.16%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنقذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع /
أحمد حسن

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات المعمورة و المنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
م.د. ١٤٦٥
ب.د. ٢٥٩/٦٤٤/١١/٦
م.د. ٥٧٠٠١٤٩٦٦٥/١٤/١٢

EL SHENAWY
CONSTRUCTION



القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
الجهة الاستشارية : مكتب د/حسن مهدي



من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
06/08/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
263,000.00	كمية الردم المنفذ
96.89%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد تيمس
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
٥٥٩/١١١/١١٦
٤٧٠٠ ١٢٩١٦٥/١٥/١٣

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
13/08/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنفذ	265,000.00
نسبة تنفيذ الردم	97.63%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / محمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
505/111/111/111
3/00/111/111/111



الفطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
 الجهة الاستشارية : مكتب د/حسن مهدي



من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
20/08/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

27

271,434.00	إجمالي كمية الردم
270,000.00	كمية الردم المنفذ
99.47%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

27

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /

الشناوي للمقاولات العامة والمنشآت السياحية
والمنشآت السياحية

جنت : ١٢٦٥
بج : ٥٥٩/١٤٤/١١٦
تلف فاكس : ٥٥٩١٦٥/٢٥/١٣

EL SHENNAVY
CONSTRUCTION



القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
الجهة الاستشارية : مكتب د/حسن مهدي



من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
27/08/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
271,000.00	كمية الردم المنفذ
99.84%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد شوقي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
EL SHENAWY
CONSTRUCTION
٥٥٨/١١١/١١١
٥٥٨/١١١/١١١

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
05/09/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنفذ	271,434.00
نسبة تنفيذ الردم	100.00%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع / 

الاسم / احمد سامي
التوقيع / 
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
009/122/117
18-129150/20/12

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة - العلمين - مطروح)

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية

الموقف التنفيذي الشهري

مستخلص جاري ٩ عقد ٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشواهد للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
الشواهد للمقاولات العمومية
والمنشآت السياحية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
201-11111111/11/11

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
31/07/2023	موقف تنفيذي الشهري

271,434.00	إجمالي كمية الردم
261,000.00	كمية الردم المنفذ
96.16%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الشناوي / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
٢٥٩/١١١/١١١
٤/٠٠-١١٩١١٥/١٢/١٣

من الكم ٢٧٠٥٠٠ حتى الكم ٢٨٠٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
05/09/2023	موقف تنفيذي الشهري

271,434.00	إجمالي كمية الردم
271,434.00	كمية الردم المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
المستشاري للشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
في المنشآت السياحية
من ب ١٢١٥
مكي ٨٢٩/١٤٤/١١٩
مكتب مصري ٥٢٠-١٢٩١٦٦/١٤/١٣



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة - العلمين - مطروح)

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية

الموقف التنفيذي النصف شهري

مستخلص جاري ٩ عقد ٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
25/06/2023	موقف تنفيذي نصف شهري

271,434.00	إجمالي كمية الردم
252,000.00	كمية الردم المنفذ
92.84%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية



من الكم ٢٧+٥٠٠ حتى الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي نصف شهري
17/07/2023

271,434.00	إجمالي كمية الردم
257,000.00	كمية الردم المنفذ
94.68%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
٢٠٢٣ / ١٢ / ١٦
٢٠٢٣ / ١٢ / ١٦

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي نصف شهري
31/07/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنفذ	261,000.00
نسبة تنفيذ الردم	96.16%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية

الاستشاري للمنشآت الحكومية
و المنشآت السياحية
مكتب / ١١٦٥
ميدان / ٥٥٩/٦٤٤/١١٦٦
مكتب فريسن / ٥/٠٠١٤٩٦٥/٢٥/١٣
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
13/08/2023	موقف تنفيذي نصف شهري

271,434.00	إجمالي كمية الردم
265,000.00	كمية الردم المنفذ
97.63%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع / 

الاسم / احمد سامي
التوقيع / 
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية

التقارير للمقاولات العمومية
و المنشآت السياحية
من ت: ١١٦٥
م: ٥٥٩/٦١٤/١١٦٥
مكتب خريفي
٤٧٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٢
EL SHENHAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
05/09/2023	موقف تنفيذي نصف شهري

271,434.00	إجمالي كمية الردم
271,434.00	كمية الردم المتفد
100.00%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المتفد
100.00%	نسبة تنفيذ القطع






استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية

الشناوي للمقاولات العمومية
والمنشآت السياحية
EL SHENAWY
CONSTRUCTION
١١٦٨٠
بعضي : ٠٨٩ / ١١١ / ١١١
بوك هيلس : ٠٨٩ / ١١١ / ١١١



برای $CV + 0.2A$

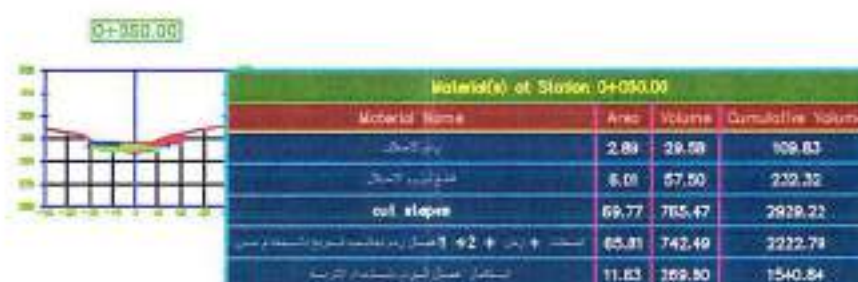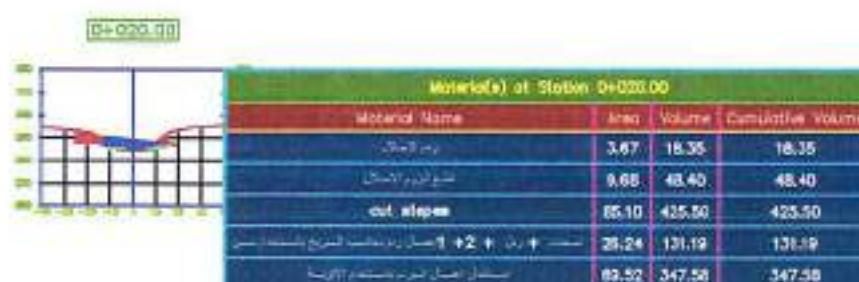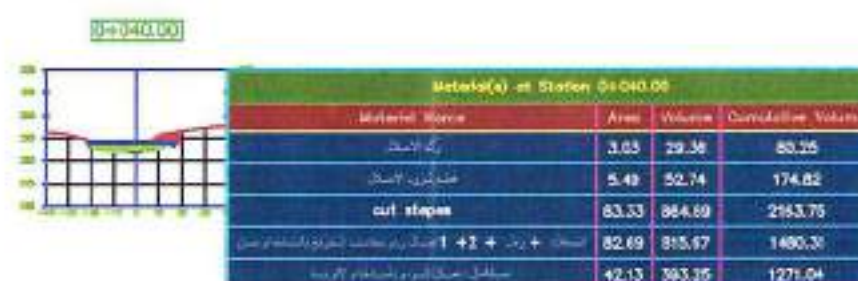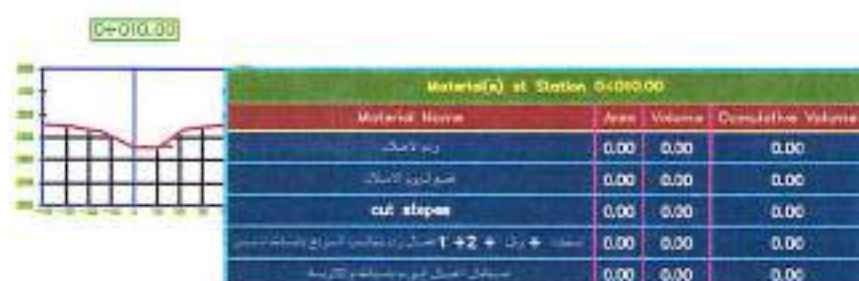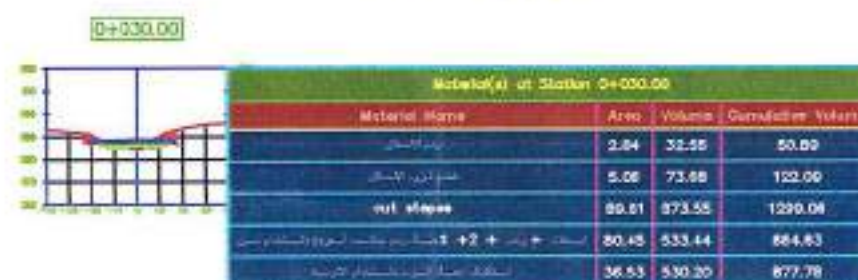

انکسپیکشن

SHENNAVY
INSTRUCTION

055/11111111

055/11111111

055/11111111


مجلس الوزراء
الهيئة العامة للاستثمار
القاهرة - مصر

بريد ٤٥٠٠٠٠

0+000.49

Material(s) at Station 0+000.49			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	2.11	0.00	0.00
فتح لوزم الامتال	9.87	0.00	0.00
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	5.48	0.00	0.00

0+100.00

Material(s) at Station 0+100.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	1.84	53.34	283.81
فتح لوزم الامتال	20.83	466.94	1428.15
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	7.33	154.78	511.71

0+200.00

Material(s) at Station 0+200.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	3.85	83.13	535.86
فتح لوزم الامتال	2.92	38.50	2187.98
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	0.71	8.63	777.12

0+025.00

Material(s) at Station 0+025.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	3.18	64.83	64.83
فتح لوزم الامتال	16.84	327.36	327.36
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	5.77	137.82	137.82

0+125.00

Material(s) at Station 0+125.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	1.77	45.10	328.91
فتح لوزم الامتال	15.08	448.89	1877.04
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	4.94	153.35	665.06

0+225.00

Material(s) at Station 0+225.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	3.66	93.85	829.71
فتح لوزم الامتال	2.03	61.91	2249.89
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	0.45	14.52	791.54

0+050.00

Material(s) at Station 0+050.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	3.82	87.55	152.37
فتح لوزم الامتال	8.67	318.57	646.23
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	3.35	114.03	251.85

0+150.00

Material(s) at Station 0+150.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	2.67	53.46	384.37
فتح لوزم الامتال	3.44	231.48	2108.53
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	1.86	82.47	747.53

0+243.88

Material(s) at Station 0+243.88			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	2.21	55.40	885.11
فتح لوزم الامتال	0.06	19.72	2269.61
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	0.00	4.29	795.03

0+075.00

Material(s) at Station 0+075.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	2.43	78.09	230.46
فتح لوزم الامتال	16.53	314.97	961.21
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	5.05	105.05	356.93


0+175.00

Material(s) at Station 0+175.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
رم لوزم الامتال	2.80	68.36	452.73
فتح لوزم الامتال	0.00	42.95	2151.48
امتال امسال لوزم على الارض الطبيعية بجانب السورج	0.00	20.76	768.29



الرجوع

٢٨٩٥٠




مشاريع القنصل السويدي
من ت. ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
٢٩٧ ٣٢٢ ٥١١ م. ق. ٢٥٢ - ١٩٠


التمشيد

برج ١٠٠ + ٢٩


0+000.20

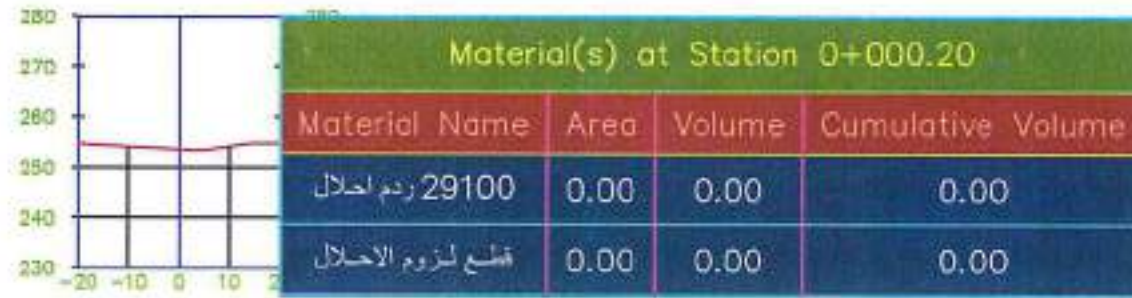

0+075.00

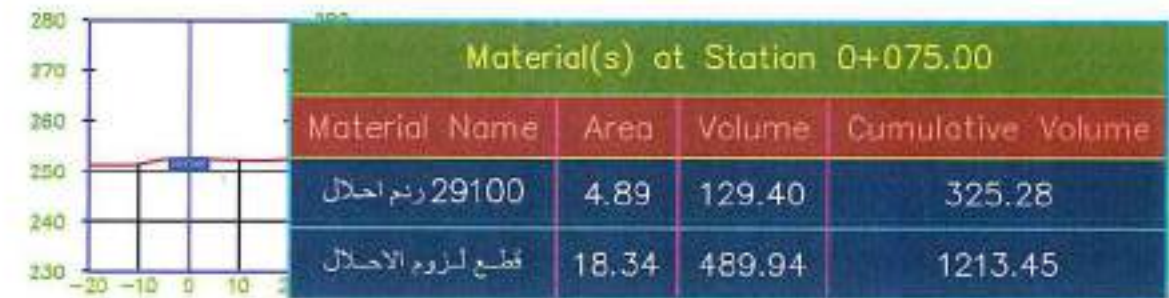


0+025.00

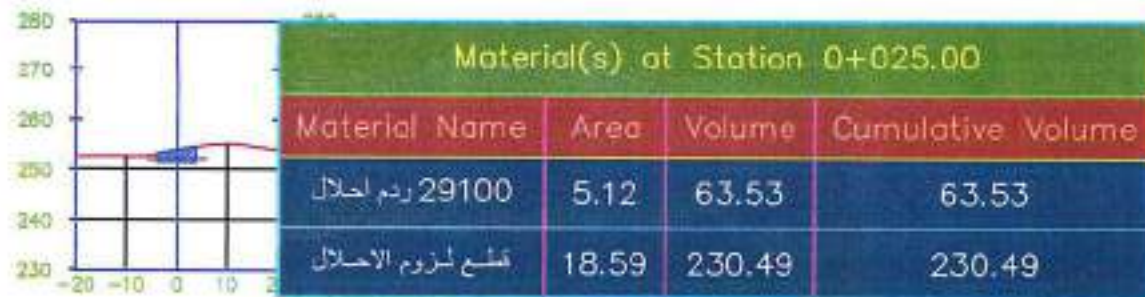


0+100.00



0+050.00

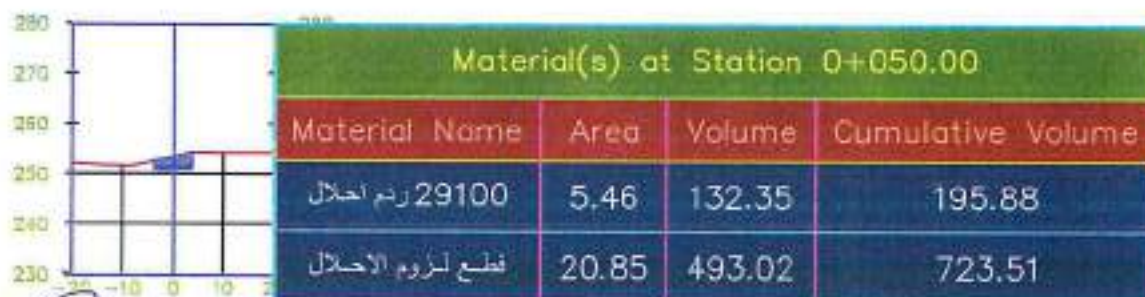

0+125.00

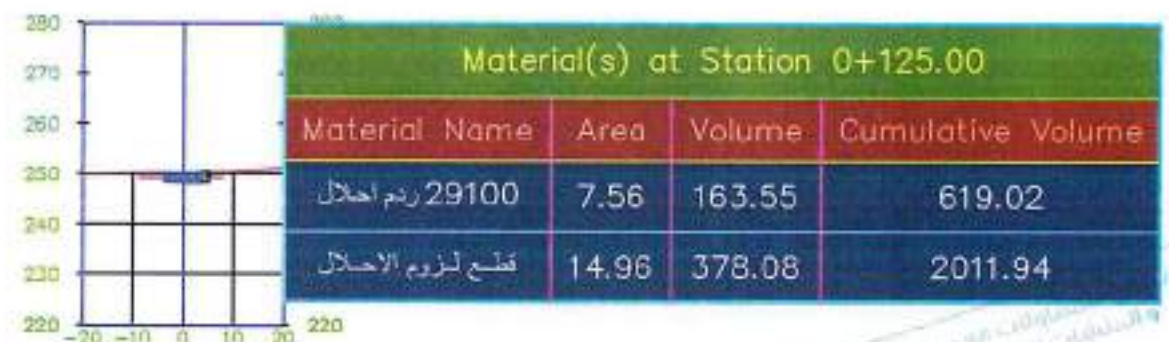


المنشأ

مشاريع الهندسة المعمارية
م. ت. ٨٩٦٩١
م. ف. ٢٩٧ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦
١٩٠ ٢٥٦


م. ت. ٨٩٦٩١
م. ف. ٢٩٧ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦
١٩٠ ٢٥٦

27+500.00

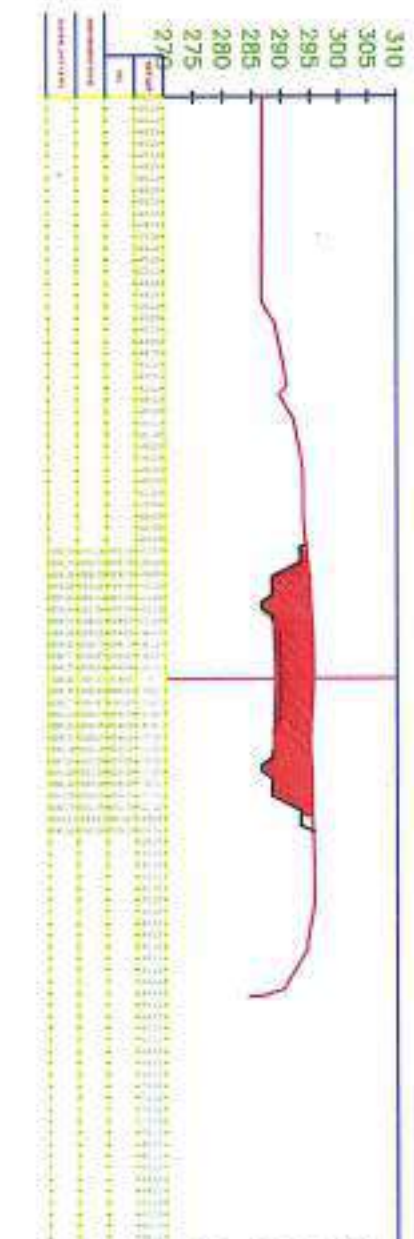


Waterway at Station 27+500.00				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	274.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	

27+525.00

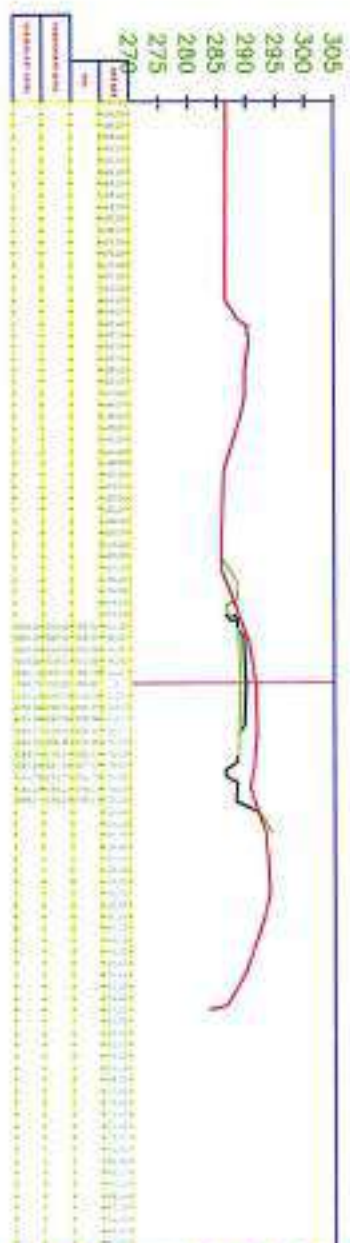


Waterway at Station 27+525.00				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	24.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	

27+550.00

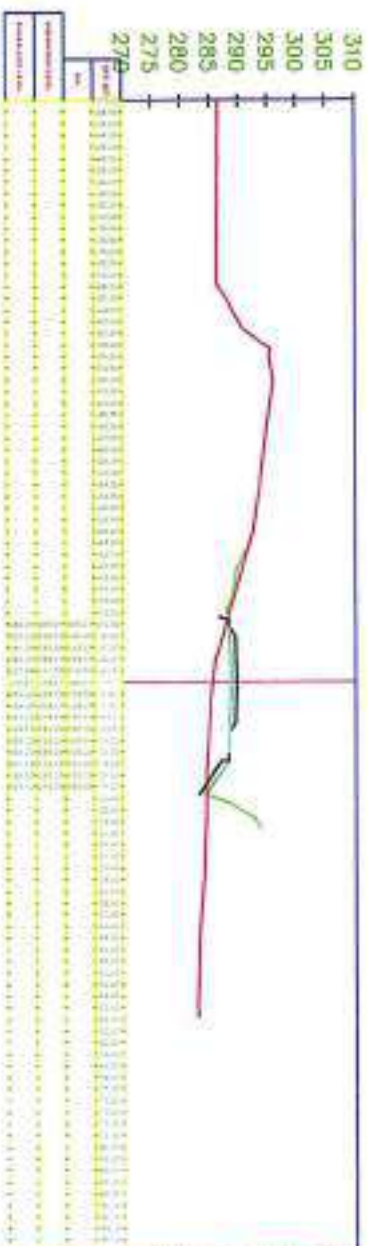


Waterway at Station 27+550.00				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	24.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	

27+575.00

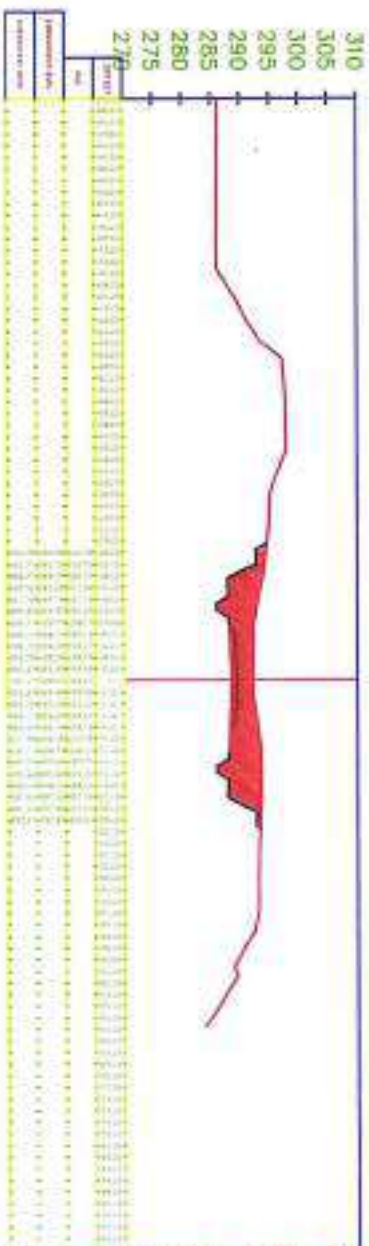

Waterway at Station 27+575.00				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	24.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	

27+600.00

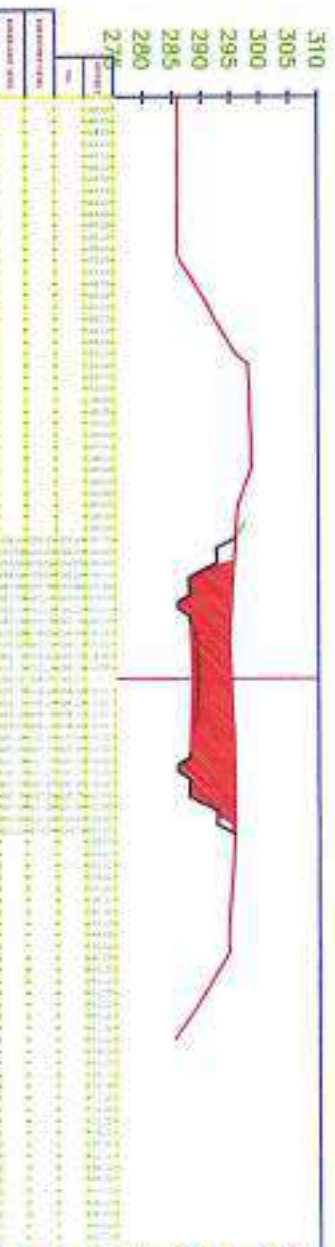


Waterway at Station 27+600.00				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	24.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	
Slope Protection				
Waterway Name	Area	Volume	Conclusive Volume	
Waterway Name	0.00	0.00	0.00	


27+600.00

27+600.00


27+625.00

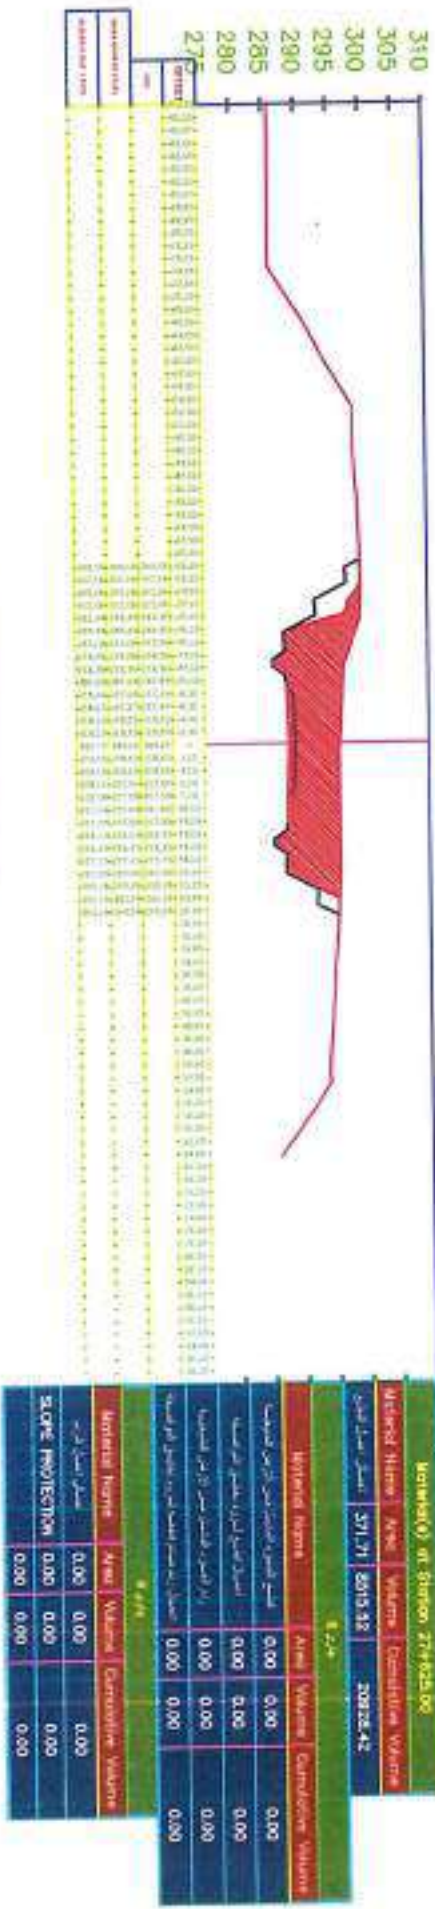


27+650.00

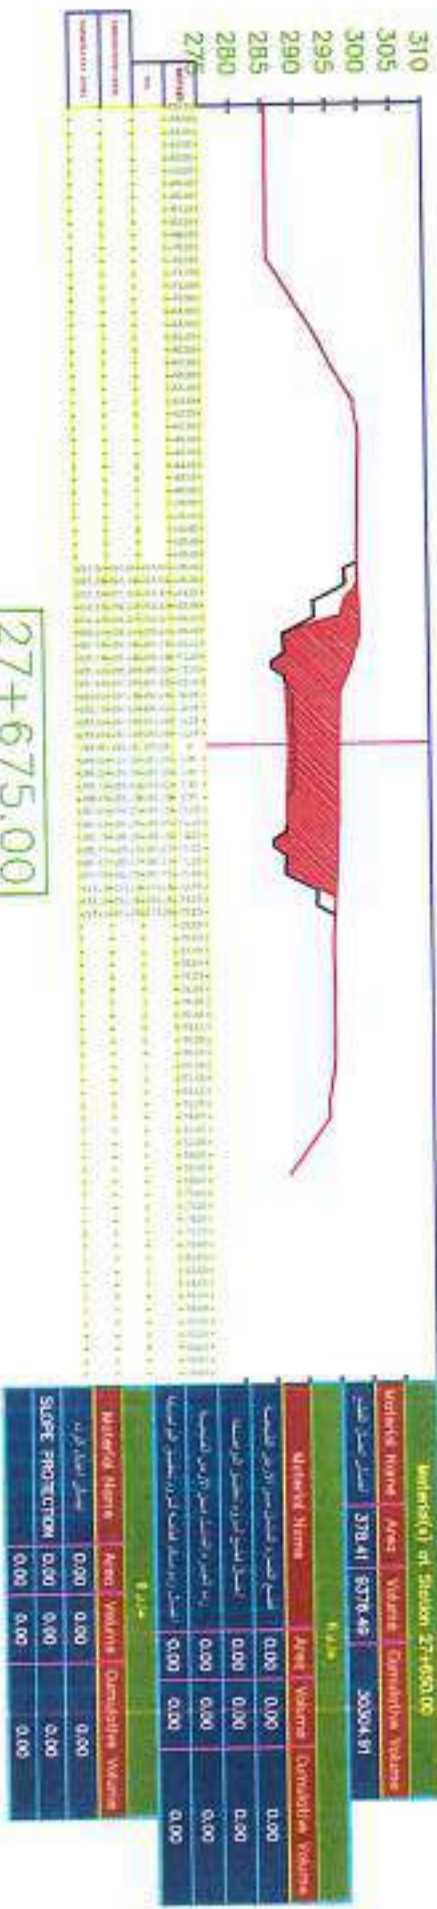


27+675.00

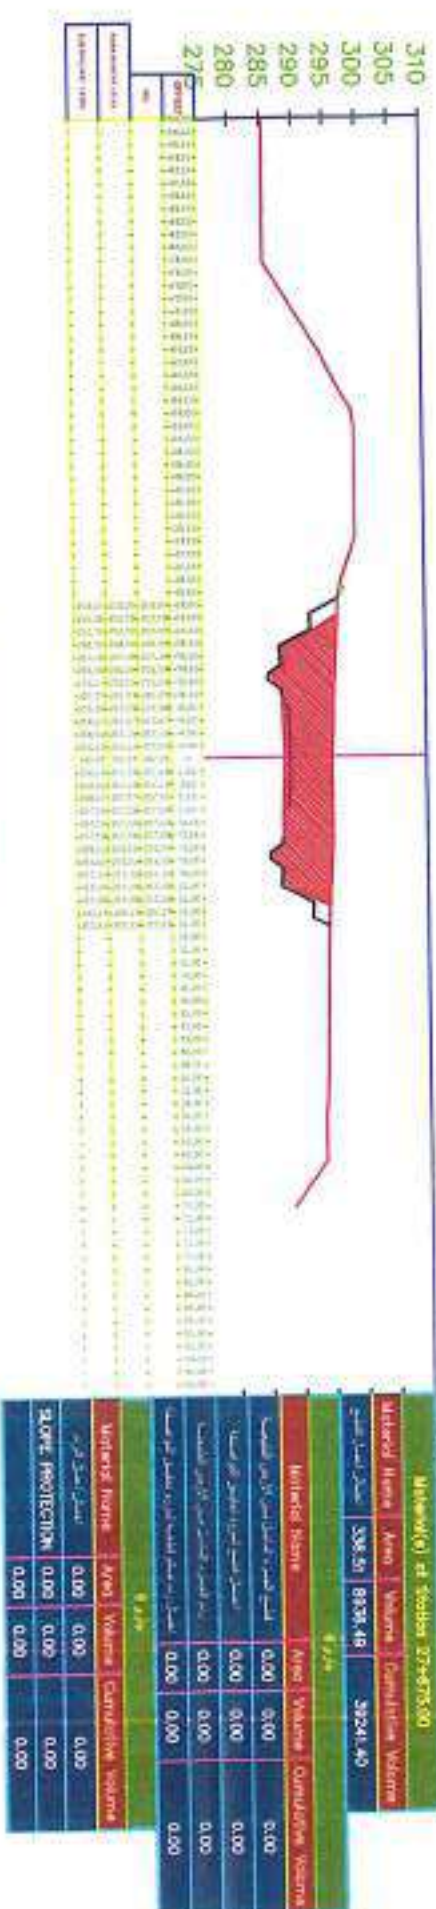

27+700.00

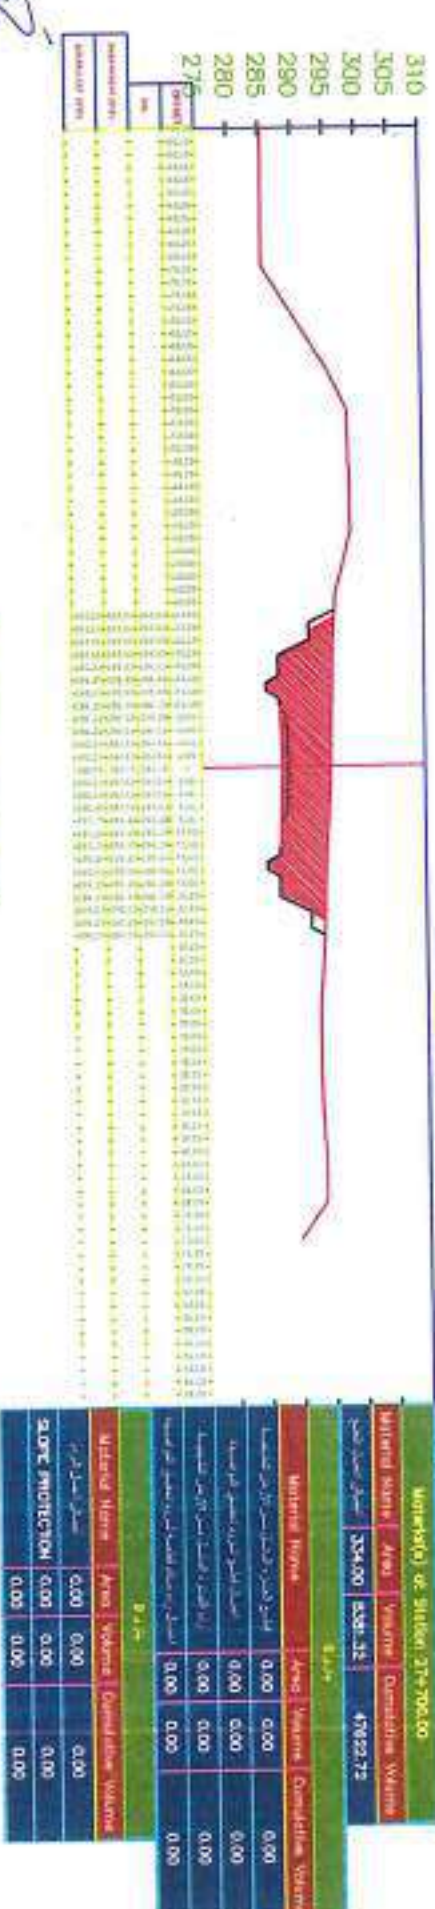

27+725.00

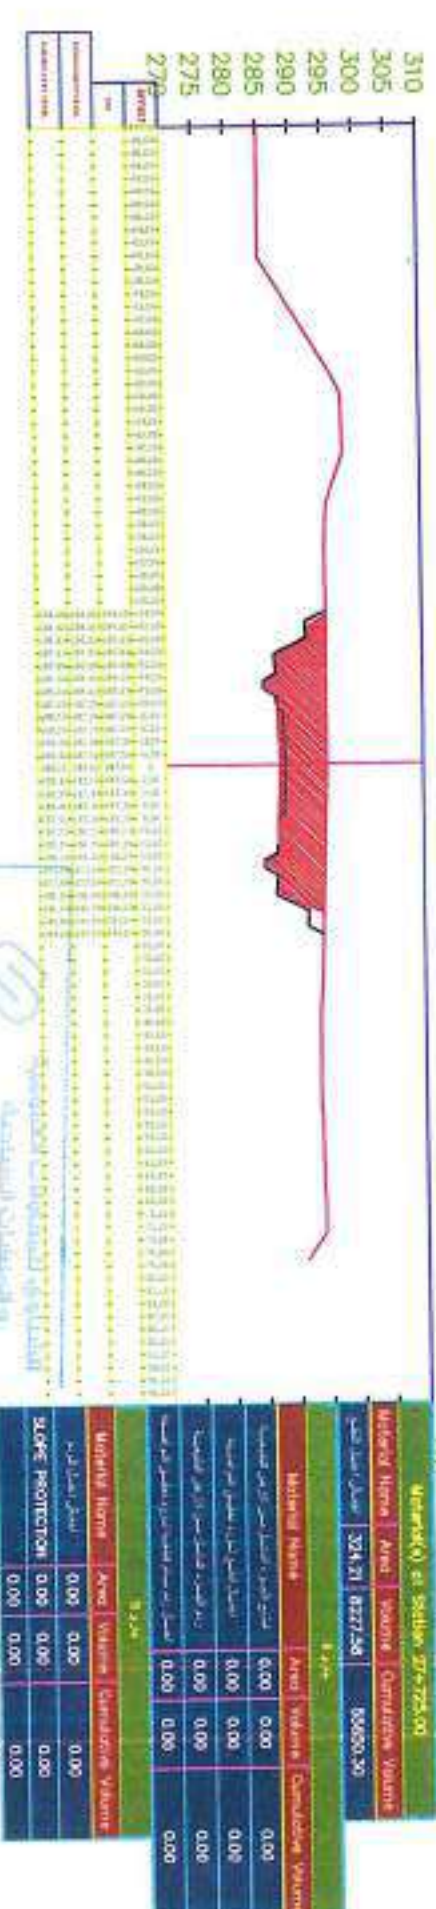


Handwritten notes and signatures in the top left corner.

EL SHENNAVI
CONSTRUCTION
28/11/11
27+725.00


Handwritten signature in the bottom right corner.

10


27+875.00

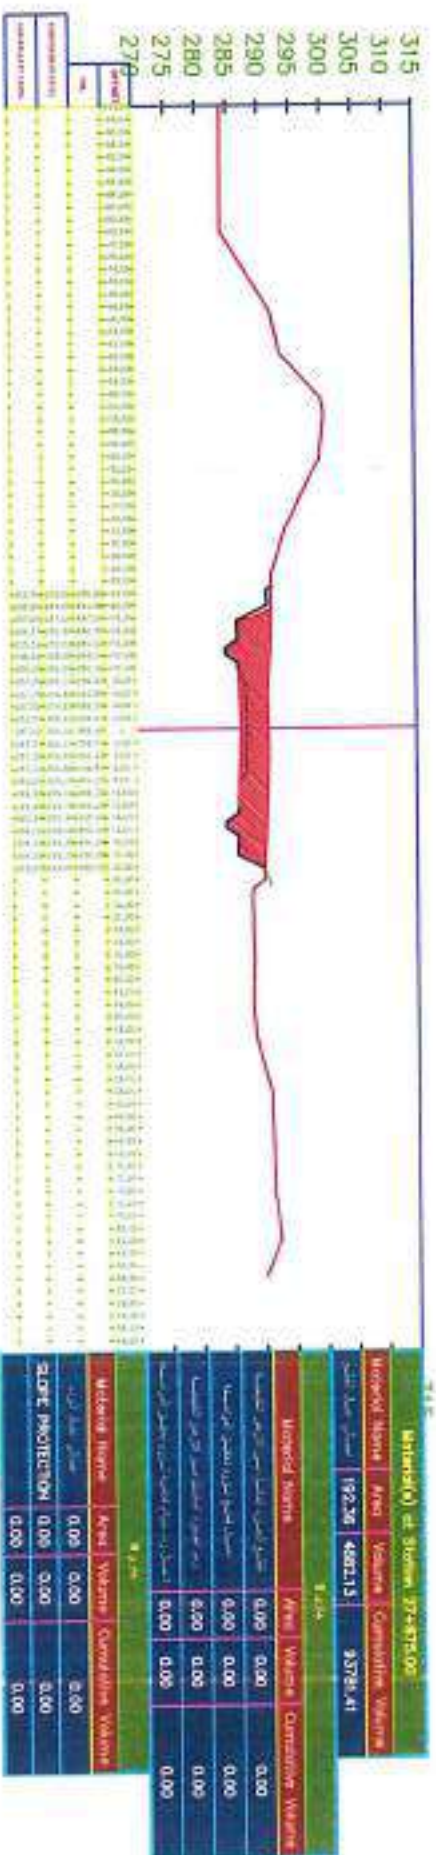


27+900.00

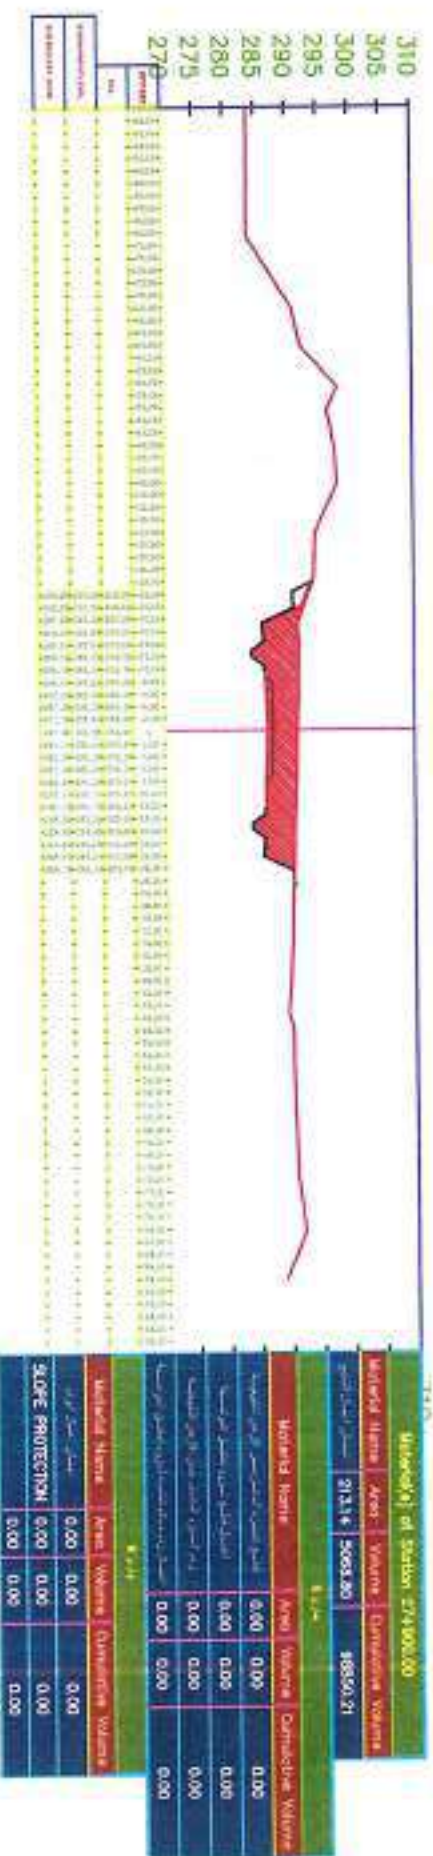


27+925.00

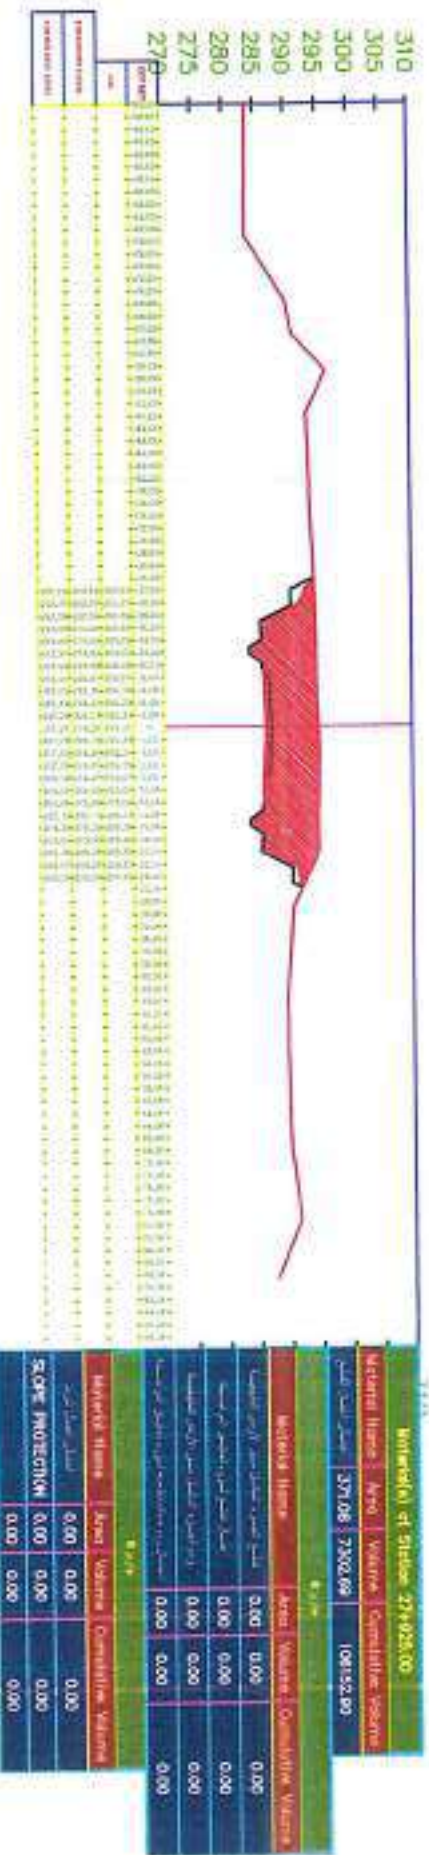

27+950.00

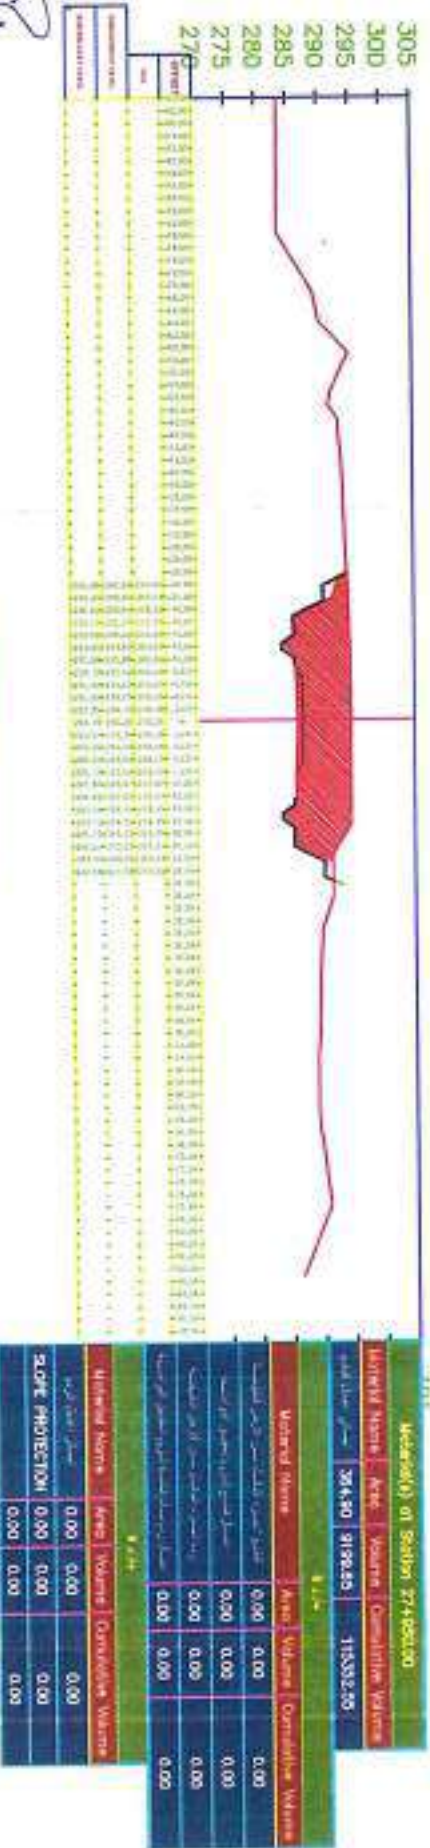


27+975.00

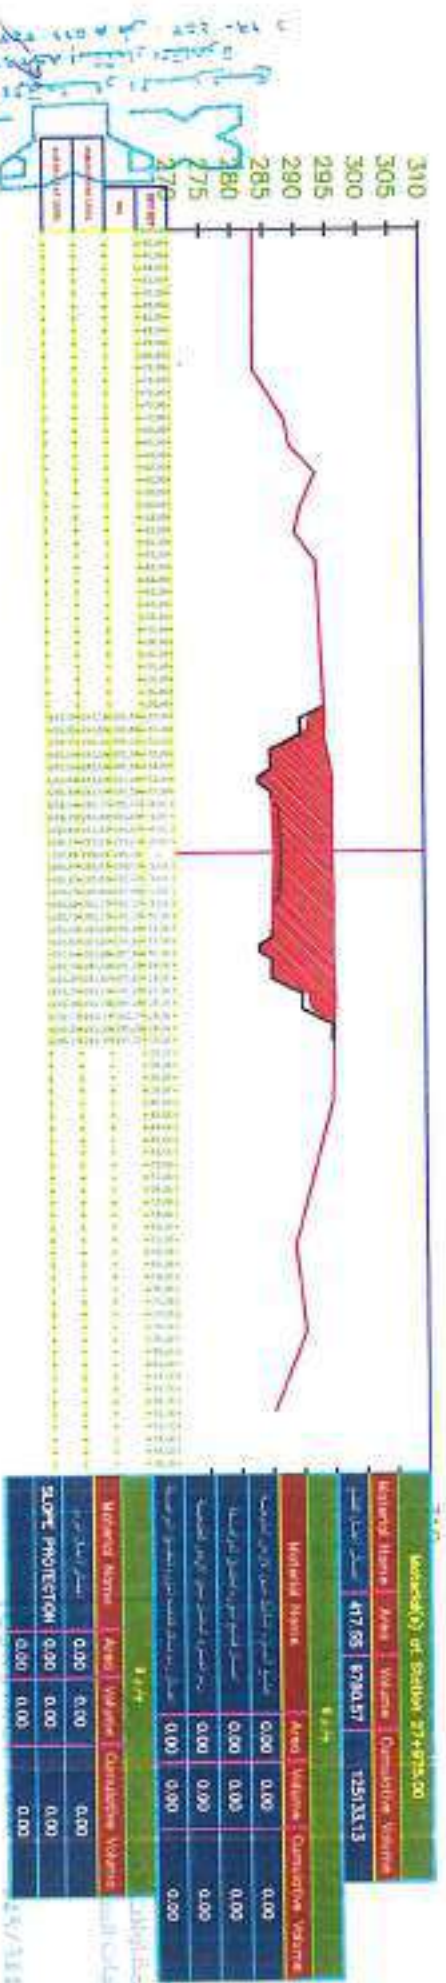


Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

28+125.00

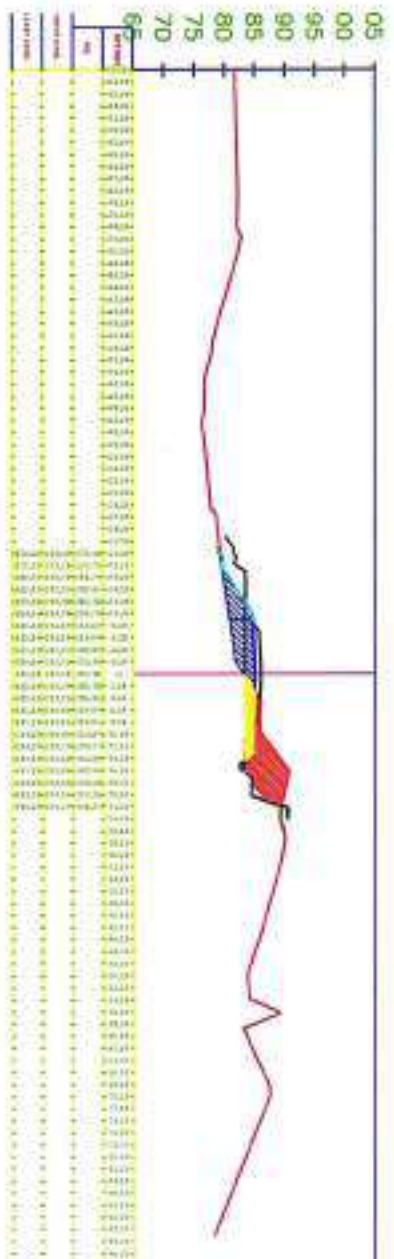


Material(s) at Station 294+28.00				
Material Name / Area	Volume	Compaction	Volume	
Subgrade	56.38	2524.28	18221.08	
8.25"				
Material Name	Area	Volume	Compaction	Volume
Subgrade	0.00	0.00	0.00	0.00
Subgrade	10.38	594.98	1038.35	
Subgrade	0.00	0.00	0.00	0.00
Subgrade	10.38	594.98	1038.35	
8.25"				
Material Name	Area	Volume	Compaction	Volume
Subgrade	53.28	301.88	572.25	
SLOPE PROTECTION	1.68	24.92	28.58	
SLOPE PROTECTION	0.00	0.00	0.00	0.00

28+150.00

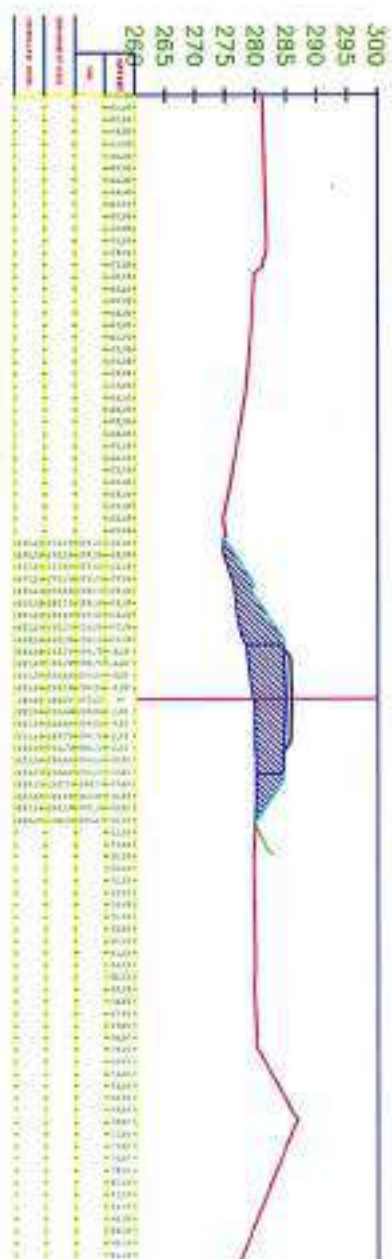


Material Name				
Area	Volume	Compaction	Volume	
Subgrade	0.00	720.50	1865.15	
8.25"				
Material Name	Area	Volume	Compaction	Volume
Subgrade	0.00	0.00	0.00	
Subgrade	0.00	328.48	1865.70	
Subgrade	0.00	0.00	0.00	
Subgrade	0.00	328.48	1865.70	
8.25"				
Material Name	Area	Volume	Compaction	Volume
Subgrade	109.53	3160.15	4133.10	
SLOPE PROTECTION	3.63	48.82	57.70	
SLOPE PROTECTION	0.00	0.00	0.00	

28+175.00

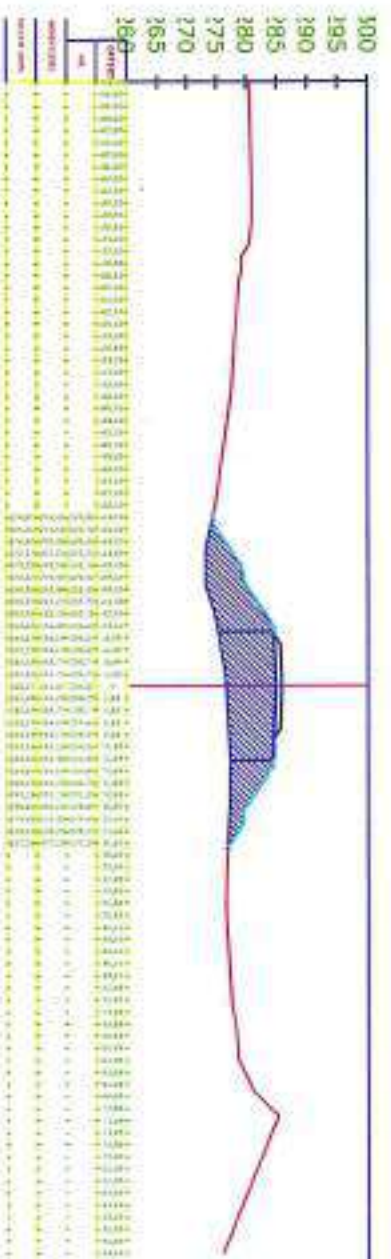


8.25"				
Material Name				
Area	Volume	Compaction	Volume	
Subgrade	0.00	0.00	14865.70	
8.25"				
Material Name				
Area	Volume	Compaction	Volume	
Subgrade	0.00	0.00	0.00	
Subgrade	0.00	0.00	14865.70	
Subgrade	0.00	0.00	0.00	
Subgrade	0.00	0.00	14865.70	
8.25"				
Material Name				
Area	Volume	Compaction	Volume	
Subgrade	331.36	6638.14	10709.24	
SLOPE PROTECTION	8.50	115.21	134.01	
SLOPE PROTECTION	0.00	0.00	0.00	

28+200.00

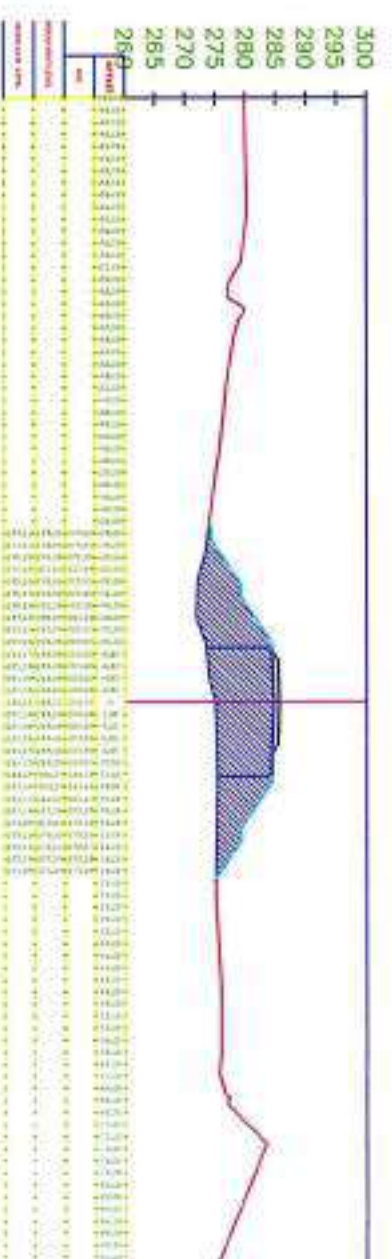

Material Name				
Area	Volume	Compaction	Volume	
Subgrade	0.00	0.00	14893.58	
Material Name				
Area	Volume	Compaction	Volume	
Subgrade	0.00	0.00	0.00	
Subgrade	0.00	0.00	1845.30	
Subgrade	0.00	0.00	0.00	
Subgrade	0.00	0.00	1845.30	
Material Name				
Area	Volume	Compaction	Volume	
Subgrade	414.57	9318.58	20588.03	
SLOPE PROTECTION	5.52	135.41	338.43	
SLOPE PROTECTION	0.00	0.00	0.00	

28+225.00

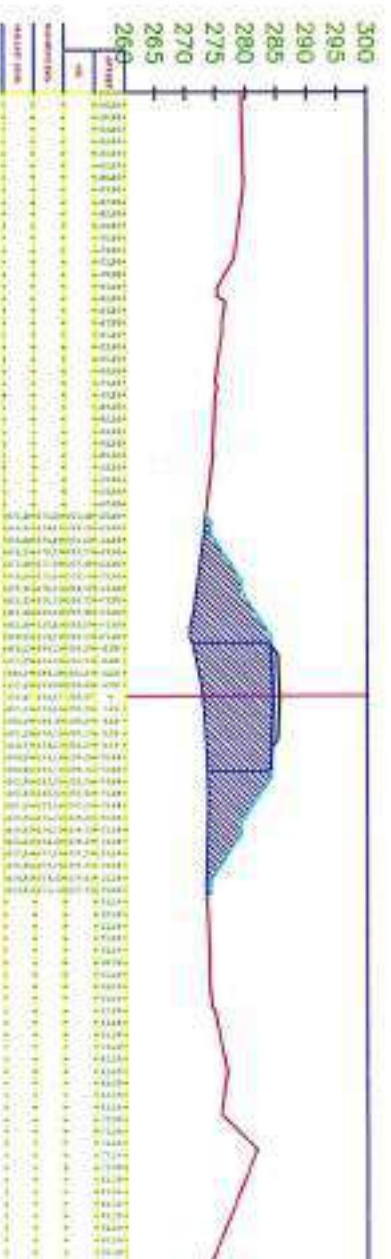


Sheet#01 of Sheet# 28-226-00				
Material Name	Area	Volume	Compaction	Volume
Subgrade	0.00	0.00	10000.00	
8.25"				
Material Name	Area	Volume	Compaction	Volume
Subgrade	404.47	11500.50	31447.34	
SLOPE PROTECTION	6.50	147.49	167.19	
SLOPE PROTECTION	0.00	0.00	0.00	0.00




الهيئة العامة
للخدمات البلدية
والبنية التحتية
بالمملكة العربية
السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Public Works
and Urban Planning

EL SHENAWAY
CONSTRUCTION
009/1117111
011/1111111/1111111
011/1111111/1111111


28+375.00

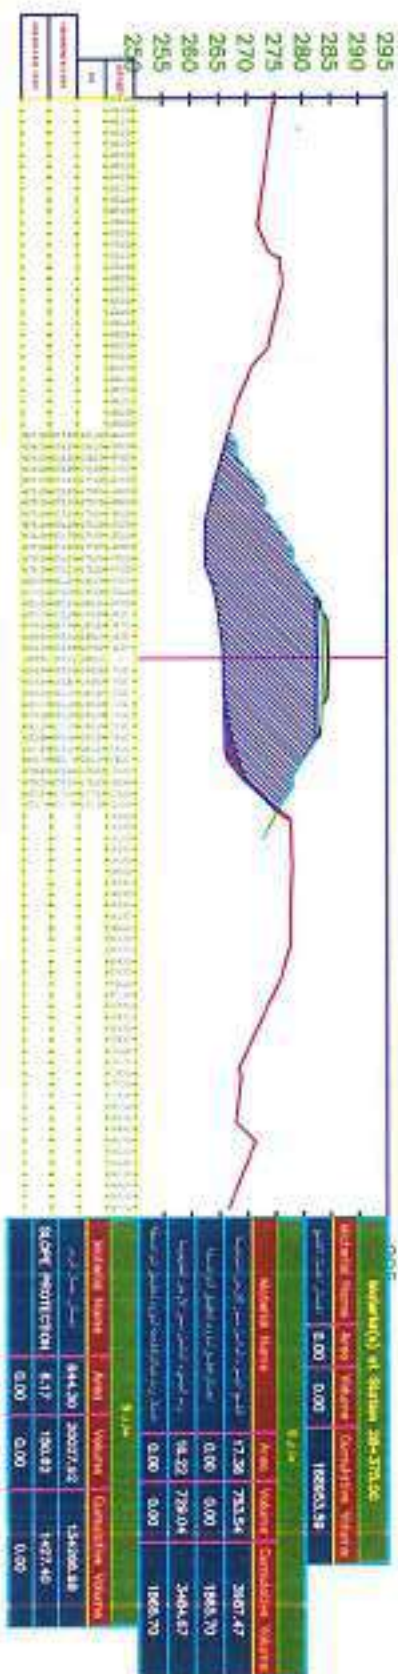


28+400.00

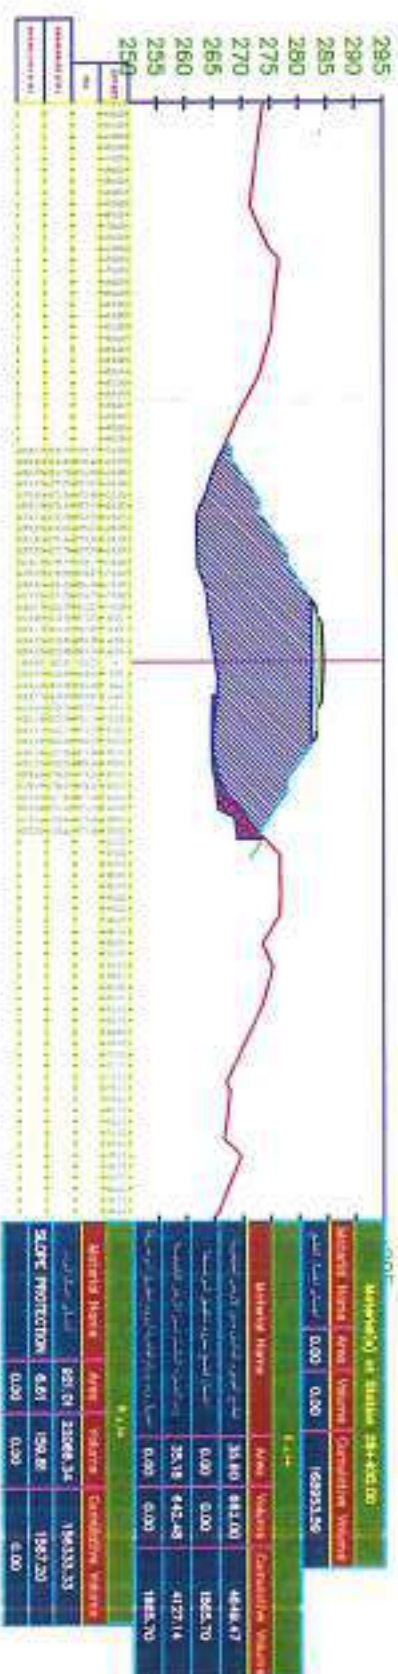

28+425.00

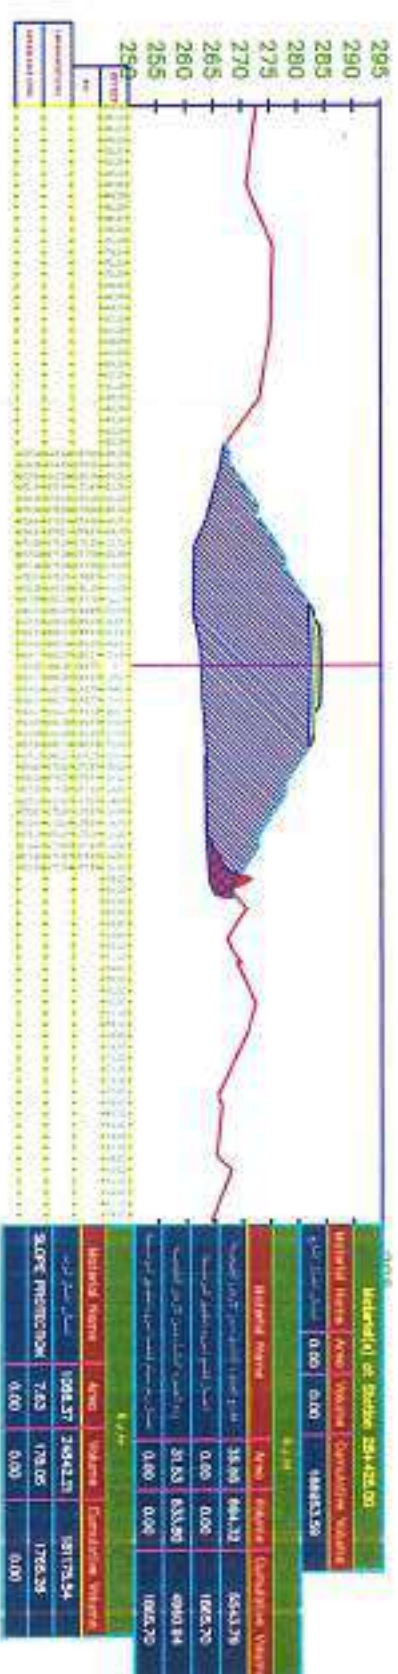


28+450.00

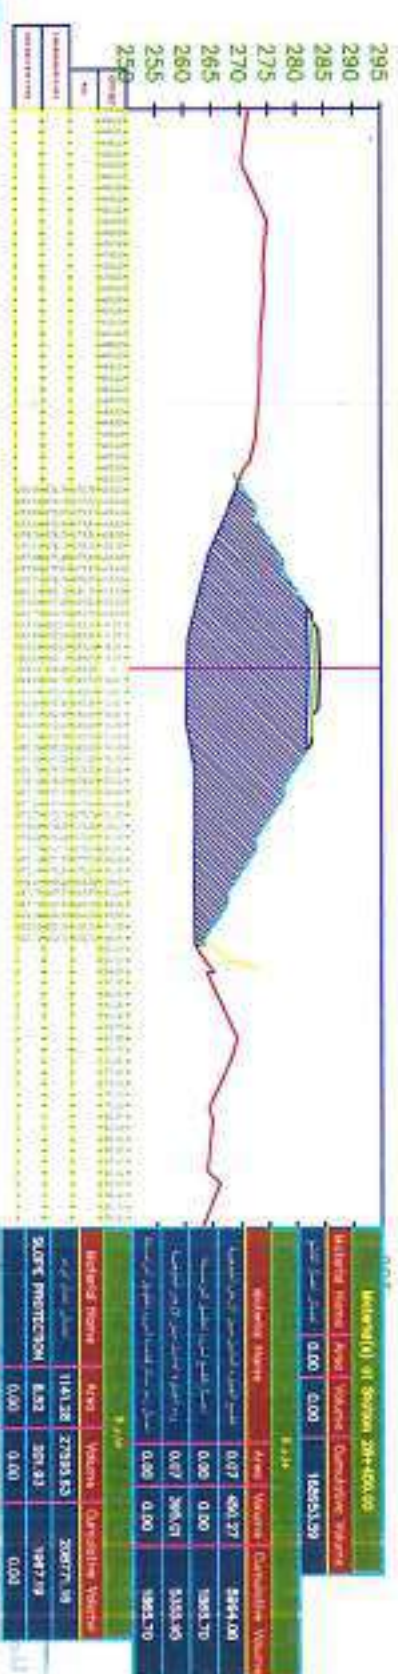


1. 10. 200 AM 11.11.2000

EJ SHEPARDSON
CONSTRUCTION
205/146-1111 ext 303
270-889-1111 / 270-817-0000


28+475.00

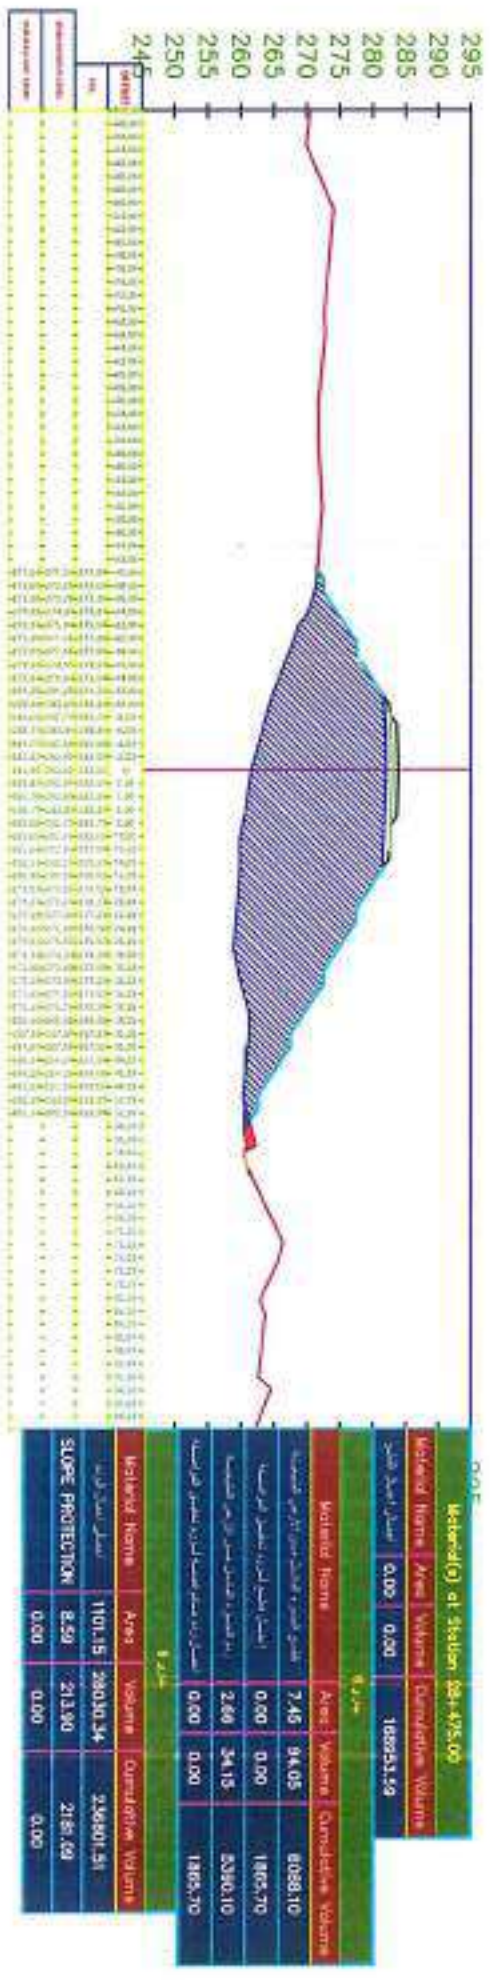

28+500.00

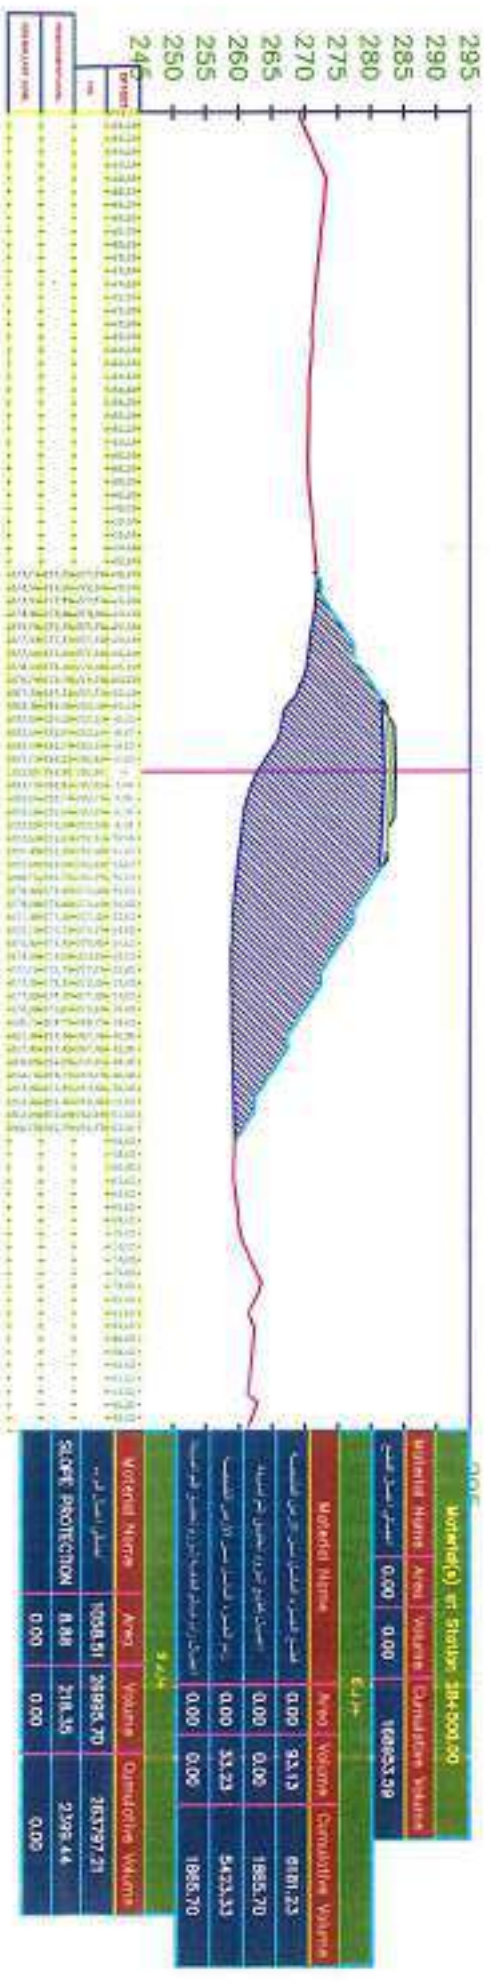


 EL SHENNAWY
 CONSTRUCTION
 004/1117/17-004
 07-114138/10/17 00400404
