

المنطقة السادسة - بني سويف

اصال رفع كفاءة طريق نعيم / دمر مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ١,٢ كم ضمن المرحلة الأولى من
المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٣) ختامي

من ٢٠٢٤/٠٥/٢١ الي ٢٠٢٤/٠٨/١٩

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اصال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات سك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	م ٣	٥,٩٨٥.٠٠	١,٠١١.٠٠	٦,٩٩٦.٠٠			
2	توريد وتركيب مواسير الحدار من البلاستيك المقارم لاشعة الشمس قطر ٦ بخفض تشغيل ٦ جو	م . ط	٢٤٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٠.٠٠			
3	اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عد التربة الصخرية	م ٣	٣,٩٩٠.٠٠	١,٠٠٥.٠٠	٤,٩٩٥.٠٠			
4	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع مسافة النقل ٢ كم	م ٣	١,٣٥٦.٠٠	١,٦٤١.٠٠	٢,٩٩٧.٠٠			
5	اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة نقع تكسر الكسرات مسافة النقل ١٠٠ كم	م ٣	٢,٩٦٤.٠٠	١,٣٣٩.٥٠	٤,٣٠٣.٥٠			
6	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	م ٢	٥,٤٦٠.٠٠	٣,٠٣٨.٠٠	٨,٤٩٨.٠٠			
7	اصال إنشاء طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية بسك ٦ سم بعد الدمك ومواصلات الجهة المشغلة للطرق والكباري	م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
8		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			

مهندس المشروع

الاعمار للمقاولات العامة
والتوريدات واستغلال محاجر
من ٢٠٢٤/٠٥/٢١ الي ٢٠٢٤/٠٨/١٩

مهندس الشركة

أشرف

Page 1



بخصوص :- عملية رفع كفاءة طريق (نعيم - ديمو - مركز ناصر محافظة بنى سويف
بطول 1.2 كم ضمن مبادرة الرئاسية حياة كريمة)

تنفيذ : شركة الأعمار للمقاولات والتوريدات واستغلال المحاجر

عقد رقم : - العقد رقم (1440) لسنة 2023 / 2024

محضر استلام موقع

انه فى يوم الاثنين 22 / 4 / 2024 تم الاجتماع والمرور على الطبيعة كل من جهاز
الاشراف من قبل المنطقة السادسة بنى سويف والجهاز التنفيذى من قبل الشركة .
وبعد المرور على الطبيعة بالعملية عاليه بكامل الطول وتبين انه لا توجد عوائق ظاهرية تمنع البدء فى تنفيذ
الاعمال المدرجة بالعقد وعليه يعتبر يوم 22 / 4 / 2024 وهو تاريخ استلام الموقع وبدء التنفيذ .

جهاز اشراف الهيئة :

مدير عام المشروعات

مدير ادارة المشروعات

السيد المهندس / مصطفى شعبان
السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ

جهاز الشركة المنفذة :

مدير تنفيذ المشروع عن الشركة

السيد المهندس / سليمان محمد الزملوط

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزية
مهندس طارق يوسف الخزار
٢٥/٨/٢٠٢٤

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٢٤٠)
عقد رقم

المشروع :- انشاء طريق دمو /نعيم
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- الاعمار

السيد مدير عام شركة

الاعمار

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربه المأخوذه من العمله عاليه
وقد احضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/١/٢٨

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٢٤٠)

عقد رقم

بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤

المشروع :- رصف طريق دمو /نعيم ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

شركة :- اعمار للمقاولات والتوريدات

نوع العينة :- عدد ١ عينة اترية رملية حصوية

نوع الاختبار : أقصى كثافة جافة /نسبة المياه الملائمة/الكثافة الجافة بالموقع/نسبة الرطوبة/نسبة الدمك
أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة

تنبه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ٦٢٣ ك.٧٠٠	المواصفات
سعة المنخل		
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٠٢٨	
نسبة المياه الملائمة %	%٦.٧٥	
الكثافة الجافة بالموطن/م ^٣ قع	١.٩٤٥	
نسبة الرطوبة %	%٣.٩٥	
نسبة الدمك %	%٩٦	لا يقل عن ٩٥ %

ملاحظات: العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للدمك

التكاليف : قيمة الاعمال : ٢٥٠.٠٥٥.٠٠٠

ض.م ١٤ % ١١٢.٠٠



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٢٣٣)
عقد رقم

المشروع :- انشاء طريق دمو /نعيم
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- الاعمار

السيد مدير عام شركة

الاعمار


تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربه الماخوذه من العمله عاليه
وقد احضرت العينة بمعرفة /منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٨/١/٢٠٢٣

مرفقات
عدد
(١)

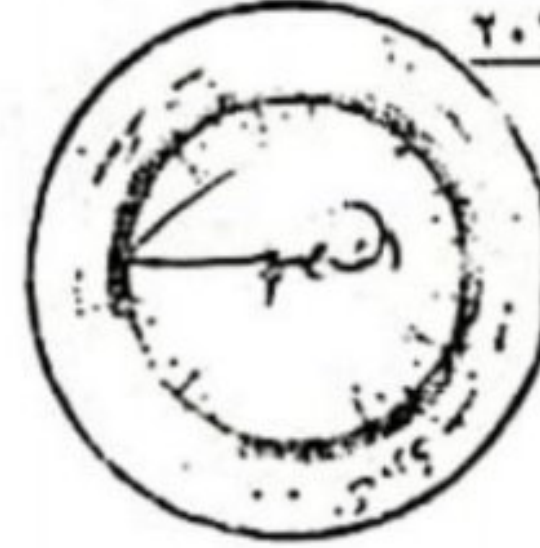

رئيس الاداره المركزيه
مهندس/

طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٢٣٢)
عقد رقم
بتاريخ ٢٠٢٤/١/٨

المشروع :- رصف طريق دمو / نعيم ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
شركة :- اعمار للمقاولات والتوريدات
نوع العينة :- عدد ١ عينة اترية رملية حصويه
نوع الاختبار :- التدرج اللدونه / اقصى كثافه جافة / نسبة المياه الملائمه / نسبة تحمل كاليفورنيا / الانتفاخ
أحضرت العينة بمعرفة / مغل المنطقة
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ٦٠٥	المواصفات
سعة المنخل		
"٢	٩٤	١٠٠
"١ ٢/١	٧٢	١٠٠-٧٠
"١	٤٥	٨٥-٥٥
"٤/٣	٣٥	٨٠-٥٠
"٨/٣	٣٤	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٢	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٩	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٢	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٨.٦٤	١٥-٥
حد السيولة	---	لا تزيد عن ٣٠%
حد اللدونه	عديمه	
مجال اللدونه	---	لا تزيد عن ٨%
تصنيف التربه	L11	
اقصى كثافه جافة طن/م ^٣	٢.٠٢٨	
نسبة المياه الملائمه %	%٦.٧٥	
نسبة تحمل كاليفورنيا %	%٢٧	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ	صفر	

ملاحظات: العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعية والصلاحيه
التكاليف: بقيمة الاعمال: ٢٥٠ + ١٩٧٠.٠٠٠

ض.م. ١٤ %



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٢٤٨)
عقد رقم

المشروع :- انشاء طريق دمو /نعيم
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- الاعمار

السيد مدير عام شركة

الاعمار

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربه المأخوذه من العمليه عاليه
وقد أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٢/١١

مرفقات
عدد
(١)



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٢٣٢)

عقد رقم

بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١١

المشروع :- رصف طريق دمو /نعيم . ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
شركة :- اعمار للمقاولات والتوريدات

نوع العينة :- عدد ١ عينة س ٦ تكسير كسارات عباره عن احجار سليسيه جبريه
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/اقصى كثافه جافة /نسبة المياه الملائمه/الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبه/نسبة الدمك
أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ٦٣٧ ك. ٨٠٠ طبقة ثانيه	المواصفات تدرج (ب)
"٢"	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١"	٩٩	١٠٠-٧٠
"١"	٧٥	٨٥-٥٥
"٤/٣"	٥٠	٨٠-٥٠
"٨/٣"	٤٠	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٠	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٥	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٥	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٧.٩٨	١٥-٥
حد السيولة	---	لا تزيد عن ٣٠%
حد اللدونه	عديمه	
مجال اللدونه	---	لا تزيد عن ٨%
اقصى كثافه جافة طن/م ^٣	٢.١٧٥	
نسبة المياه الملائمه%	٧.٢١%	
الكثافه الجافه بالموقع طن/م ^٣	٢.١٨	
نسبة الرطوبه%	٣.٨٢	
نسبة الدمك%	١٠٠%	لا يقل عن ٩٥%

ملاحظات: العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للنوعيه وللصلاحيه
التكاليف : قيمة الاعمال :- ٢٥٠ + ١٨٤٥

ض.م ١٤ % ٢٩٣.٣



٢٣٨٨.٣٠

شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بأن شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية تنفيذ أعمال عملية رفع كفاءة طريق (نعيم - ديمو - مركز ناصر - محافظة بنى سويف) بطول 1.2 كم وأن الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت أنها مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس

١١٣

شهادة

اسم العملية : عملية تنفيذ عملية رفع كفاءة طريق (نعيم - ديمو - مركز ناصر - محافظة بني سويف) بطول 1.2 كم .

الشركة المنفذة : شركة الأعمار للمقاولات العامة واستغلال المحاجر .

كشف بأسماء السادة مهندسين ومديري المشروع من قبل الشركة للمشروع عالية

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	أ / أشرف محمد سليم	مدير المشروع	جيد
2	م / أيمن محمد سليم	مهندس الموقع	جيد
3	م / نورهان جمال محمود	مهندس مساحة	جيد

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بني سويف

مهندس ١



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بأن الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد أعمال رفع كفاءة طريق (نعيم - ديمو - مركز ناصر - محافظة بنى سويف) بطول 1.2 كم والتي قامت بتنفيذها شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس


س.ت. ٢٠٩٢١ ب.ض. ١٢٢-٩٦٤-٢٩٠

احمد عراقى حسين

شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بخصوص أعمال رفع كفاءة طريق (نعيم - ديمو - مركز ناصر - محافظة بنى سويف) بطول 1.2 كم بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالأمر المباشر) والتي قامت بتنفيذها شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر بالآتي :
1. تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة كافة المواد لبنود الاعمال بالعملية طبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
 2. تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ 2024 \ 8 \ 21
 3. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات أخرى مستحقة
 4. قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة من بذلك .

مدير المشروع



مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس



تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية طبقا للختامي

اسم العملية : عملية تنفيذ عملية رفع كفاءة طريق (نعيم - ديمو - مركز ناصر - محافظة بنى سويف)

بطول 1.2 كم بمحافظة بنى سويف

الشركة المنفذة : الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر .

قيمة العملية طبقا للعقد : 5116753 جنيه

مدة العملية طبقا للعقد : 4 شهور

تاريخ استلام الموقع : 2024 \ 4 \ 22


تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد : 2024 \ 8 \ 21

قيمة العملية طبقا لآخر مقياسة معتمدة : 5116753 جنيه

قيمة العملية طبقا للختامي : 3746294 جنيه

النسبة الفعلية لما تم انجازه : 100%

مدير المشروع




مهندس المشروع

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس ١





كشف خاص باعمال المقاول

عملية رفع كفاءة طريق (نعيم - ديمو - مركز ناصر - محافظة بنى سويف) بطول 1.2 كم

عقد رقم (1440 \ 2023 \ 2024)

الشركة المنفذة : الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر .

قيمة العملية طبقا للعقد : 5116753 جنيه

قيمة العملية طبقا للختامي : 3746294 جنيه

تاريخ بداية الأعمال طبقا للعقد : 2024 \ 4 \ 22

تاريخ النھو الفعلي : 2024 \ 8 \ 21

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس

احمد عراقي حسين




شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بخصوص عملية رفع كفاءة طريق (نعيم - ديمو - مركز ناصر - محافظة بنى سويف) بطول 1.2 كم بمحافظة بنى سويف والتي قامت بتنفيذها شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر أنه تم خصم قيمة التجارب المعملية وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس ١

حصر كميات الردم طريق نعيم / دمو شركة الاعمار للمقاولات العامة بطول 1+200 م

الكمية	ملسوب الاحلال	ملسوب الأرض الطبيعية	s.t
114	40.59	39.83	0+000
114	40.67	39.91	00+020
114	40.76	40	00+040
117	40.90	40.12	00+060
117	40.90	40.12	00+080
117	40.90	40.12	00+100
114	40.86	40.10	00+120
114	40.76	40	00+140
114	40.73	39.97	00+160
114	40.72	39.95	00+180
114	40.69	39.93	00+200
114	40.67	39.91	00+220
114	40.64	39.88	00+240
114	40.62	39.86	00+260
114	40.60	39.84	00+280
117	40.60	39.82	00+300
117	40.57	39.79	00+320
117	40.57	39.79	00+340
117	40.57	39.79	00+360
115.5	40.55	39.78	00+380
115.5	40.55	39.78	00+400
114	40.54	39.78	00+420
114	40.53	39.77	00+440
114	40.53	39.77	00+460
114	40.54	39.78	00+480
114	40.54	39.78	00+500
114	40.55	39.79	00+520
114	40.56	39.80	00+540
114	40.57	39.81	00+560
114	40.58	39.82	00+580
114	40.59	39.83	00+600
114	40.60	39.84	00+620
114	40.61	39.85	00+640
115.5	40.61	39.84	00+660
115.5	40.61	39.84	00+680
115.5	40.61	39.84	00+700
115.5	40.61	39.84	00+720
115.5	40.60	39.83	00+740
115.5	40.60	39.83	00+760
115.5	40.60	39.83	00+780

حصر كميات الردم طريق نعيم / دمو شركة الاعمار للمقاولات العامة بطول 1+200 م
والقوريدات واستغلال مجاير
س.ت. ٢٠٩٢١ ب.ض. ١٢٢١-٩٦٤-٢٩٠

115.5	40.59	39.82	00+800
115.5	40.59	39.82	00+820
115.5	40.59	39.82	00+840
115.5	40.59	39.82	00+860
114	40.57	39.81	00+880
114	40.57	39.81	00+900
114	40.56	39.80	00+920
114	40.56	39.80	00+940
114	40.56	39.80	00+960
114	40.69	39.93	00+980
114	40.82	40.06	1+000
114	40.96	40.20	1+020
115.5	41.10	40.33	1+040
115.5	41.10	40.33	1+060
114	41.22	40.46	1+080
114	41.36	40.60	1+100
114	41.49	40.73	1+120
114	41.62	40.86	1+140
114	41.75	40.99	1+160
114	41.88	41.12	1+180
114	42.01	41.25	1+200
114	42.11	41.35	
6996	الكمية الاجمالية (6996) م3		

مهندس الهيئة /

[Signature]

مهندس الشركة /



حصر كميات المن طريق نعيم / دمو شركة الاعمار للمقاولات العامة بطول 1+200 م

الكمية	منسوب المن	منسوب الاحلال	s.t
70.5	41.06	40.59	0+000
70.5	41.14	40.67	00+020
70.5	41.23	40.76	00+040
67.5	41.33	40.88	00+060
67.5	41.33	40.88	00+080
67.5	41.33	40.88	00+100
67.5	41.31	40.86	00+120
70.5	41.23	40.76	00+140
70.5	41.20	40.73	00+160
70.5	41.19	40.72	00+180
70.5	41.16	40.69	00+200
69	41.13	40.67	00+220
69	41.10	40.64	00+240
69	41.08	40.62	00+260
69	41.04	40.60	00+280
69	41.04	40.58	00+300
69	41.01	40.55	00+320
69	41.01	40.55	00+340
69	41.01	40.55	00+360
70.5	41.02	40.54	00+380
70.5	41.01	40.54	00+400
70.5	41.01	40.54	00+420
70.5	41.01	40.53	00+440
70.5	41.00	40.53	00+460
70.5	41.01	40.54	00+480
70.5	41.01	40.54	00+500
70.5	41.01	40.55	00+520
70.5	41.03	40.56	00+540
70.5	41.04	40.57	00+560
70.5	41.05	40.58	00+580
70.5	41.06	40.59	00+600
70.5	41.07	40.60	00+620
70.5	41.07	40.61	00+640
70.5	41.07	40.60	00+660
70.5	41.07	40.60	00+680
70.5	41.07	40.60	00+700
70.5	41.07	40.60	00+720
72	41.07	40.59	00+740
72	41.07	40.59	00+760
72	41.07	40.59	00+780

الاعمار للمقاولات العامة
التوريدات والمستلزمات
من: ٢٩٠-٩٦٤-١٢٢١

			00+800
72	41.06	40.59	00+820
72	41.06	40.59	00+840
72	41.06	40.59	00+860
70.5	41.04	40.57	00+880
70.5	41.04	40.57	00+900
72	41.04	40.56	00+920
72	41.04	40.56	00+940
72	41.04	40.56	00+960
72	41.17	40.69	00+980
72	41.30	40.82	1+000
72	41.44	40.96	1+020
72	41.57	41.10	1+040
72	41.57	41.10	1+060
72	41.70	41.22	1+080
72	41.84	41.36	1+100
72	41.97	41.49	1+120
70.5	42.09	41.62	1+140
70.5	42.22	41.75	1+160
70.5	42.35	41.88	1+180
70.5	42.49	42.01	1+200
70.5	42.58	42.11	
4303.5	الكمية الاجمالية (4303.5) م3		

مهندس الهيئة /

[Signature]

مهندس الشركة /

الأعمار للمقاولات العامة
والقوى والاعمال
س.ت. ٢٠٩٢١ ب.ض. ١٢٢-٩٦٤-٢٩٠

١١٣

حصر كميات إزالة المخلفات طريق نعيم / دمو شركة الاعمار للمقاولات العامة بطول 1+200 م

الكمية	منسوب الأرض قبل القطع	منسوب الأرض بعد القطع	s.t
51	40.74	40.40	0+000
45	41.12	40.82	00+020
48	41.06	40.74	00+040
42	40.98	40.70	00+060
45	40.95	40.65	00+080
48	40.46	40.14	00+100
37.5	40.71	40.46	00+120
40.5	40.99	40.72	00+140
36	40.99	40.75	00+160
40.5	41.06	40.79	00+180
51	41.20	40.86	00+200
48	41.77	41.45	00+220
34.5	41.63	41.40	00+240
40.5	42.00	41.73	00+260
45	41.90	41.60	00+280
46.5	41.06	40.75	00+300
52.5	42.10	41.75	00+320
55.5	42.30	41.93	00+340
45	43.20	42.90	00+360
54	42.10	41.74	00+380
45	42.00	41.70	00+400
52.5	41.10	40.75	00+420
60	41.92	41.52	00+440
46.5	42.75	42.44	00+460
60	41.30	40.90	00+480
51	41.13	40.79	00+500
49.5	41.70	41.37	00+520
52.5	41.05	40.70	00+540
45	42.43	42.13	00+560
48	41.63	41.31	00+580
55.5	41.90	41.53	00+600
45	41.64	41.34	00+620
52.5	41.75	41.40	00+640
48	41.45	41.13	00+660
60	41.70	41.30	00+680
54	41.76	41.40	00+700
46.5	41.34	41.03	00+720
45	41.80	41.50	00+740
61.5	41.74	41.33	00+760
54	42.15	41.79	00+780


د



		40.73	00+800
55.5	41.10	41.65	00+820
49.5	41.98	40.94	00+840
58.5	41.33	40.73	00+860
52.5	41.08	41.69	00+880
46.5	42.00	41.09	00+900
60	41.49	40.80	00+920
52.5	41.15	40.73	00+940
64.5	41.20	41.00	00+960
58.5	41.39	40.88	00+980
49.5	41.21	40.79	1+000
55.5	41.16	40.61	1+020
52.5	41.96	40.62	1+040
54	41.98	40.71	1+060
45	41.01	40.60	1+080
60	41.00	40.66	1+100
51	41.00	40.70	1+120
45	41.00	40.70	1+140
36	40.94	40.80	1+160
30	41.00	41.33	1+180
37.5	41.58	41.98	1+200
45	42.28		
2997	الكمية الاجمالية (2997) م3		

مهندس الهيئة /

د

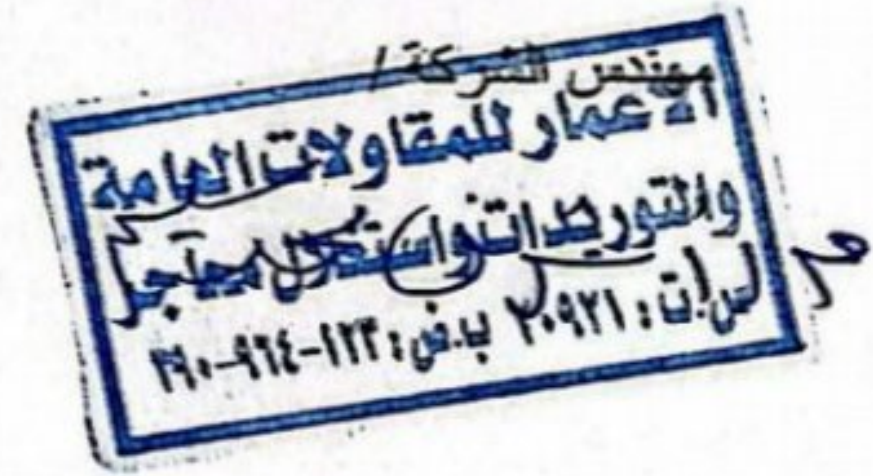

حصر كمية (M.C.O) طريق نعيم / دمو شركة الاعمار للمقاولات العامة بطول 200 + 1 م 2


الكمية	عرض القطاع	s.t
140	7	0+000
140	7	00+020
140	7	00+040
140	7	00+060
140	7	00+080
140	7	00+100
140	7	00+120
140	7	00+140
140	7	00+160
140	7	00+180
140	7	00+200
140	7	00+220
140	7	00+240
140	7	00+260
140	7	00+280
140	7	00+300
140	7	00+320
140	7	00+340
140	7	00+360
140	7	00+380
140	7	00+400
140	7	00+420
140	7	00+440
140	7	00+460
140	7	00+480
140	7	00+500
140	7	00+520
140	7	00+540
140	7	00+560
140	7	00+580
135	6.75	00+600
135	6.75	00+620
135	6.75	00+640
136	6.8	00+660
136	6.8	00+680
136	6.8	00+700
140	7	00+720

شركة الاعمار للمقاولات العامة
والتيوريدات واستغلال مستاجرها
س.ت: ٢٠٩٢١ ب.ض: ١٢٢-٩٦٤-٢٩٠

حصر كمية (M.C.O) طريق نعيم / دمو شركة الاعمار للمقاولات العامة بطول 200 + 1 م 2

140	7	00+740
140	7	00+760
140	7	00+780
140	7	00+800
140	7	00+820
140	7	00+840
140	7	00+860
140	7	00+880
140	7	00+900
140	7	00+920
140	7	00+940
140	7	00+960
135	6.75	00+980
135	6.75	1+000
135	6.75	1+020
140	7	1+040
140	7	1+060
140	7	1+080
140	7	1+100
140	7	1+120
140	7	1+140
140	7	1+160
140	7	1+180
140	7	1+200
8498	الكمية الاجمالية (8498) م 2	

مهندس الهيئة /



مهندس الشركة /



ع ١١

حصر كميات القطع طريق نعيم / دمو شركة الاعمار للمقاولات العامة بطول 1+200 م

الكمية	منسوب الأرض قبل القطع	منسوب الأرض بعد القطع	s.t
82.5	40.38	39.83	0+000
82.5	40.46	39.91	00+020
82.5	40.55	40	00+040
82.5	40.67	40.12	00+060
82.5	40.67	40.12	00+080
82.5	40.67	40.12	00+100
82.5	40.65	40.10	00+120
82.5	40.55	40	00+140
82.5	40.52	39.97	00+160
82.5	40.50	39.95	00+180
82.5	40.48	39.93	00+200
82.5	40.46	39.91	00+220
82.5	40.43	39.88	00+240
82.5	40.41	39.86	00+260
82.5	40.39	39.84	00+280
82.5	40.37	39.82	00+300
82.5	40.34	39.79	00+320
82.5	40.34	39.79	00+340
82.5	40.34	39.79	00+360
82.5	40.33	39.78	00+380
82.5	40.33	39.78	00+400
82.5	40.33	39.78	00+420
82.5	40.32	39.77	00+440
82.5	40.32	39.77	00+460
82.5	40.33	39.78	00+480
82.5	40.33	39.78	00+500
82.5	40.34	39.79	00+520
82.5	40.35	39.80	00+540
82.5	40.36	39.81	00+560
82.5	40.37	39.82	00+580
82.5	40.38	39.83	00+600
82.5	40.39	39.84	00+620
82.5	40.40	39.85	00+640
82.5	40.39	39.84	00+660
82.5	40.39	39.84	00+680
82.5	40.39	39.84	00+700
82.5	40.39	39.84	00+720
82.5	40.38	39.83	00+740
82.5	40.38	39.83	00+760
82.5	40.38	39.83	00+780

شركة المقاولات العامة
والتوريدات واستغلال مجاور
س.ت: ٢٠٩٢١ ب.ض: ١٢٢-٩٦٤-٢٩٠

			00+800
82.5	40.37	39.82	00+820
82.5	40.37	39.82	00+840
82.5	40.37	39.82	00+860
75	40.31	39.81	00+880
75	40.31	39.81	00+900
82.5	40.35	39.80	00+920
82.5	40.35	39.80	00+940
82.5	40.35	39.80	00+960
82.5	40.48	39.93	00+980
82.5	40.61	40.06	1+000
82.5	40.75	40.20	1+020
75	41.83	40.33	1+040
75	41.83	40.33	1+060
82.5	41.01	40.46	1+080
82.5	41.14	40.60	1+100
82.5	41.28	40.73	1+120
82.5	41.41	40.86	1+140
82.5	41.54	40.99	1+160
75	41.62	41.12	1+180
82.5	42.80	41.25	1+200
82.5	42.90	41.35	
4995	الكمية الاجمالية (4995) م3		

مهندس الهيئة /

ت

مهندس الشركة /



حصر كمية مواسير طريق نعيم / دمو شركة الاعمار للمقاولات العامة بطول 1+200 م.ط

الكمية	عرض القطاع	S.T
		0+000
		00+020
		00+040
		00+060
12.00	6.0	00+080
		00+100
		00+120
12.00	6.0	00+140
		00+160
		00+180
12.00	6.0	00+200
		00+220
12.00	6.0	00+240
		00+260
12.00	6.0	00+280
		00+300
		00+320
		00+340
12.00	6.0	00+360
		00+380
12.00	6.0	00+400
		00+420
		00+440
12.00	6.0	00+460
		00+480
		00+500
12.00	6.0	00+520
		00+540
12.00	6.0	00+560
		00+580
		00+600
12.00	6.0	00+620
		00+640
		00+660
		00+680
		00+700
		00+720
12.00	6.0	00+740
		00+760
		00+780
12.00	6.0	00+800

ف

شركة الاعمار للمقاولات العامة
والقوريدات واستغلال محاجر
س.ت: ٢٠٩٢١ ب.ض: ١٢٢-٩٦٤-٢٩٠

		00+820
		00+840
12.00	6.0	00+860
		00+880
12.00	6.0	00+900
		00+920
12.00	6.0	00+940
		00+960
		00+980
12.00	6.0	1+020
		1+040
		1+060
		1+080
12.00	6.0	1+100
		1+120
12.00	6.0	1+140
		1+160
12.00	6.0	1+180
		1+200
240	الكمية الاجمالية (240) مط	

ج

الاعمار للمقاومات العامة
مواصفات ونسبة الانسداد
من ٢٠٩٢١ ب.ض. ١٢٢-٩٦٤-٢٩٠
