



الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالأحالة الي مشروع تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطعه مع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر تنفيذ ( شركة ال فوزي عبده علي للمقاولات العموميه ) .

عقد رقم 1201 / 2022/2021 بتاريخ 2022/06/12

نتشرف بأن نرفق لسيادتك عدد (3) اصل من مستخلص جارى (16) من بداية العمل وحتى تاريخ 2024/11/28 وكذا استمارة 50 ع.ح بمبلغ 3706686.80 فقط وقدره ثلاثة مليون وسبعمائه وستة الف وستمائه وستة وثمانون جنية وثمانون قرشا لا غير ..

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مرفقات:

عدد (3) مستخلص 16 جارى

عدد (3) حصر اعمال

عدد (4) بيان اعمال

عدد 1 استمارة 50 ع.ح

رئيس الاداره المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /

مشيرة السيد عبد الله







الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد الاستاذ / رئيس الادارة المركزية للشؤون الماليه و الاداريه

تحية طيبه وبعد ,,

بالاحاله الي مشروع اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطعه مع طريق الواحات بطول 8 كم بالامر المباشر

تنفيذ شركه (ال فوزي عبد علي للمقاولات العموميه ) عقد رقم ( 1201 / 2021 / 2022 ) بتاريخ ( 06/12 / 2022 )

وبالاشاره الي تواجد العماله طبقا للمشروع عاليه ..

نحيط سيادتكم علما بعدم تواجد العماله بالمشروع بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتي تاريخه برجاء التكرم بالاحاطه و التنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير ,,

تحريرا في 2024/11/28

يعتمد ,,

رئيس الادارة المركزيه

الطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبد الله



لرعي



الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية و الاداريه

تحية طيبة وبعد ,،،

بالاحاله الي مشروع اعمال الاسفلت و النيوجيرسي والدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطعه مع طريق الواحات بطول 8 كم بالامر المباشر .

تنفيذ شركه ( ال فوزي عبد علي للمقاولات العموميه ) رقم ( 1201 / 2021 / 2022 ) بتاريخ ( 12 / 06 / 2022 )

وبالاشاره الي المحملات الخاصه طبقا للمشروع عاليه

نحيط سيادتكم بأن جميع المحملات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق منذ بدايه المشروع وحتى تاريخه وغير متواجد اي محملات بالاداره المركزيه للطريق الدائري ومحاوره .

برجاء التكرم بالاحاطه و التنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير ,،،

تحريرا في 2024/11/28

يعتمد ,،،

رئيس الادارة المركزيه

الدائري ومحاوره



محمد



الشركة

شركة ال فوزي عبده للمقاولات العموميه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مستخلص جاري (16)

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري  
حول القاهرة الكبرى

في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم  
بالأمر المباشر

مقاولة / شركه ال فوزي عبده للمقاولات العموميه

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12/ 6 / 2022

شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2024-11-28

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفئة بالمفاوضة<br>وقائمه 15/7/2022 | كمية البند بالمقاييسه | الوحدة         | مقدار العمل السابق لإجراهه | مقدار العمل عن<br>هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي<br>تمت حتى الان | جاري أم<br>نهائي | قيمة الأعمال التي تمت خلال<br>هذه المدة فقط | قيمة الأعمال التي تمت إلى الان | الباقى بعد الإستقطاعات | ملاحظات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-5       | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كالفولانزا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% فلا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردھا على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشھا بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم -<br>إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان-<br>السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة قبل (2022-07-15)                                                                            | 375.00                              | 35005.00              | م <sup>3</sup> | 35003.87                   | 0.00                        | 35003.87                                | جاري             | 0.00                                        | 13126451.25                    | 13126451.25            | 1- يرأى تطبيق نصوص العقد<br>2- المهندسون والفنيون متواجدون<br>3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده<br>4- يرأى خصم قيمة تجارب المعمل<br>5- البرنامج الزمني متواجد<br>6- معمل الموقع متواجد<br>7- المحملات تراجع بمعلوميه قطاع التنفيذ و المناطق بدءا من تاريخ استلام الموقع<br>8 - كرفانات جهاز الاشراف متواجده بالموقع |
| 1-5       | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج اوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كالفولانزا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% فلا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردھا على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لايزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشھا بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم -<br>إحتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كلم بزيادة أو نقصان و ذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1 جنيه لكل 1 كم ز ياده عن مسافه نقل 100 كم -<br>السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر في الفترة بعد (2022-07-15) | 396.00                              | 39520.00              | م <sup>3</sup> | 37631.00                   | 0.00                        | 37631.00                                | جاري             | 0.00                                        | 14901876.00                    | 14901876.00            | 9- يرأى عمليه ٥٠٪ من عمليه<br>البند (١-١) ب السمن<br>مرور تجانس المحمل                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1-8       | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>في الفترة قبل (2022-04-21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145.00                              | 95542.00              | م <sup>2</sup> | 95542.00                   | 0.00                        | 95542.00                                | جاري             | 0.00                                        | 13853590.00                    | 13853590.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1-8 ب     | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153.00                              | 81688.00              | م <sup>2</sup> | 81688.00                   | 0.00                        | 81688.00                                | جاري             | 0.00                                        | 12498264.00                    | 12498264.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| /         | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .<br>في الفترة بعد (2022-07-15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158.00                              | 325956.00             | م <sup>2</sup> | 178925.00                  | 6752.00                     | 185677.00                               | جاري             | 1066816.00                                  | 29336966.00                    | 29336966.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3-8       | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في الفترة بعد 15/7/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140.00                              | 615000.00             | م <sup>2</sup> | 480797.00                  | 16449.00                    | 497246.00                               | جاري             | 2302860.00                                  | 69614440.00                    | 69614440.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-7       | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.5 كجم / 2م <sup>2</sup> ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.20                                | 615000.00             | م <sup>2</sup> | 477618.00                  | 16449.00                    | 494067.00                               | جاري             | 151330.80                                   | 4545416.40                     | 4545416.40             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بصحة ذلك

( شركة المقاولات العموميه )

مهندس المشروع

احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد

مدير عام الشؤون المالية و الاداريه

أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م / ممدوح سليمان

مدير المشروع

م / محمود علي عبدالفتاح





الشركة

شركة ال فوزي عبده للمقاولات العموميه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

مستخلص جاري ( 16 )

عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجرسى و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري  
حول القاهرة الكبرى

في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم  
بالأمر المباشر

مقاولة / شركه ال فوزي عبده للمقاولات العموميه

عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 12 / 6 / 2022

شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 2024-11-28

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفئة بالمفاوضة<br>وقائمه 15/7/2022 | كمية البند بالمقايسة | الوحدة         | مقدار العمل السابق لإجراه | مقدار العمل عن<br>هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي<br>تمت حتى الان | جاري أم<br>نهائي | قيمة الأعمال التي تمت خلال<br>هذه المدة فقط | قيمة الاعمال التي تمت إلى الان | الباقى بعد الإستقطاعات | ملاحظات . |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 1-7       | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م <sup>2</sup><br>ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات<br>التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى<br>وتعليمات المهندس المشرف .<br>في الفترة قبل (2022-04-21)                                                                                                                                                                                                                                    | 25.00                               | 95542.00             | م <sup>2</sup> | 95542.00                  | 0.00                        | 95542.00                                | جاري             | 0.00                                        | 2388550.00                     | 2388550.00             |           |
| 1-7 ب     | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م <sup>2</sup><br>ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات<br>التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى<br>وتعليمات المهندس المشرف .<br>في الفترة من (2022-04-21) إلى (2022-07-15)                                                                                                                                                                                                                    | 27.50                               | 81688.00             | م <sup>2</sup> | 81688.00                  | 0.00                        | 81688.00                                | جاري             | 0.00                                        | 2246420.00                     | 2246420.00             |           |
| 1-7 ج     | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م <sup>2</sup><br>ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات<br>التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى<br>وتعليمات المهندس المشرف .<br>في الفترة بعد (2022-07-15)                                                                                                                                                                                                                                    | 27.50                               | 325956.00            | م <sup>2</sup> | 182104.00                 | 6752.00                     | 188856.00                               | جاري             | 185680.00                                   | 5193540.00                     | 5193540.00             |           |
| 2-9       | بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى ) وجه واحد بارتفاع 90سم<br>طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م <sup>3</sup> وبإجهاد لا يقل<br>عن 250 كجم/سم <sup>2</sup> والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد<br>لا يقل عن 200 كجم/سم <sup>2</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة<br>والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات<br>المهندس المشرف<br>في الفترة قبل (2022-07-15)         | 485.00                              | 13262.00             | م.ط            | 13262.00                  | 0.00                        | 13262.00                                | جاري             | 0.00                                        | 6432070.00                     | 6432070.00             |           |
| 12-9      | بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجرسى ) وجه واحد بارتفاع 90سم<br>طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/سم <sup>3</sup> وبإجهاد لا يقل<br>عن 250 كجم/سم <sup>2</sup> والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز بإجهاد<br>لا يقل عن 200 كجم/سم <sup>2</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 7 Ø 12 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة<br>والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات<br>المهندس المشرف<br>في الفترة بعد (2022-07-15)        | 500.00                              | 14979.978            | م.ط            | 4101.00                   | 0.00                        | 4101.00                                 | جاري             | 0.00                                        | 2050500.00                     | 2050500.00             |           |
| 1-9       | بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفاير جلاس (نيوجرسى ) وجهين بارتفاع 90سم اعلي<br>الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/سم <sup>3</sup> وبإجهاد<br>لا يقل عن 250 كجم/سم <sup>2</sup> والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 12 سم وعرض 80 سم أسفل الحاجز<br>بإجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم <sup>2</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار 10 Ø 16 م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول<br>الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى<br>وتعليمات المهندس المشرف . في الفترة بعد 15/7/2022 | 685.00                              | 8000.00              | م.ط            | 5041.00                   | 0.00                        | 5041.00                                 | جاري             | 0.00                                        | 3453085.00                     | 3453085.00             |           |

أقر بصحة ذلك

( شركة المقاولات العموميه )

مهندس المشروع

احمد عبد العزيز

مدير المشروع

اسلام صابر السيد

ممثل المالك "الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م/ محمود علي عبدالفتاح

مدير مشروعات القطاع الجنوبي

م/ ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه

أ/ أحمد عبد الجواد





الشركة  
شركة ال فوزي عبده للمقاولات العموميه



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

مستخلص جاري (16)  
عن عمليه / تنفيذ اعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري  
حول القاهرة الكبرى  
في المسافه من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم  
بالأمر المباشر  
مقاولة / شركة ال فوزي عبده للمقاولات العموميه  
عقد رقم 1201/2021/2022 بتاريخ 6 / 12 / 2022  
شامل المده من بدايه التعاقد وحتى تاريخ 28-11-2024

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفئة بالمفاوضة<br>وقالنه 15/7/2022 | كمية البند بالمقايسة | الوحدة         | مقدار العمل السابق لإجراؤه | مقدار العمل عن<br>هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي<br>تمت حتى الان | جاري أم<br>نهائي | قيمة الأعمال التي تمت خلال<br>هذه المدة فقط | قيمة الاعمال التي تمت إلى الان | الباقى بعد الإستقطاعات | ملاحظات .    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| 3-4       | بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانته عاديه لحمايه مواسير اليرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت 250 كجم<br>3م/ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي الاقلل اجهاد الكسر للعينات عن 200 كجم/3م مع اجراء الاختبارات اللازمه ويتم<br>التنفيذ طبقا لاصول الصنائه و الرسومات التفصيليه المعتمده و البند بجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق و<br>الكباري وتعليمات المهندس المشرف. | 1450.00                             | 8499.92              | 3م             | 1777.00                    | 0.00                        | 1777.00                                 | جاري             | 0.00                                        | 2576650.00                     | 2576650.00             |              |
| 1         | بالمقطوعه<br>عمل خزان صرف صحن طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول<br>والبند يشمل :<br>1- حفر<br>2- خرسانة عاديه<br>3- خرسانة مسلحة<br>4- عزل وتر ستوب<br>5- عزل من ألواح البولييم<br>6- مبني كسوة للمادة العازلة<br>7- محارة للحوائط الداخلية<br>و ذلك طبقا للرسم مات الموضحة                                                                                                                       | 400000.00                           | 1.00                 | مقطوعه         | 1.00                       | 0.00                        | 1.00                                    | جاري             | 0.00                                        | 400000.00                      | 400000.00              |              |
| 2         | بالمقطوعه تحويل مسار غرفة تجميع الصرف الطبيعي والصرف الصناعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50000.00                            | 1.00                 | مقطوعه         | 1.00                       | 0.00                        | 1.00                                    | جاري             | 0.00                                        | 50000.00                       | 50000.00               |              |
| 3         | بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير 6 بوصة ضغط 10 بار مع كافة ما يلزم من الحفر في الأسفلت وإعادة الوضع الى ما كان عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350.00                              | 100.00               | م.ط            | 100.00                     | 0.00                        | 100.00                                  | جاري             | 0.00                                        | 35000.00                       | 35000.00               |              |
| 4         | بالعدد عمل غرفة تفتيش من الخرسانة المسلحة طبقا لمواصفات الشركة الوطنية للبترول والبند يشمل الغطاء المعتمد 12 و 25 طن                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10000.00                            | 8.00                 | مقطوعه         | 8.00                       | 0.00                        | 8.00                                    | جاري             | 0.00                                        | 80000.00                       | 80000.00               |              |
| 5         | بالمقطوعه نقل أعمدة إنارة مع تغير الخطوط وربطها بشبكة المحطة مع المحافظة عليها والكشافات الخاصة بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6200.00                             | 8.00                 | مقطوعه         | 8.00                       | 0.00                        | 8.00                                    | جاري             | 0.00                                        | 49600.00                       | 49600.00               |              |
| 6         | بالمقطوعه نقل الID الخاص بالمحطة مع تغير التالف من الغرارة أو ألواح الكلابنج أثناء نقل وتنفيذ القاعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65000.00                            | 1.00                 | مقطوعه         | 1.00                       | 0.00                        | 1.00                                    | جاري             | 0.00                                        | 65000.00                       | 65000.00               |              |
|           | طبقا للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الكارئات على البند رقم 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.00                               |                      | م <sup>3</sup> | 64212.87                   | 0.00                        | 64212.87                                | جاري             | 0.00                                        | 1605321.75                     | 1605321.75             |              |
|           | طبقا للقائمة الموحدة يوليو 2022 وتحميل الموازين على البند رقم 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.00                                |                      | م <sup>2</sup> | 338610.00                  | 0.00                        | 338610.00                               | جاري             | 0.00                                        | 1015830.00                     | 1015830.00             |              |
|           | إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                      |                |                            |                             |                                         |                  |                                             |                                |                        | 185518570.40 |
|           | المصروف عن المستخلص السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                      |                |                            |                             |                                         |                  |                                             |                                |                        | 181811883.60 |
|           | قيمه المستخلص المستحقه عن هذه المده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                      |                |                            |                             |                                         |                  |                                             |                                |                        | 3706686.80   |

تحرر في 28 / 11 / 2024

أقر بصحة ذلك  
( شركة المقاولات العموميه )

مهندس المشروع  
احمد عبد العزيز

مدير المشروع  
اسلام صابر السيد

يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية



مدير عام الشؤون الماليه و الاداريه  
أ / أحمد عبد الجواد

مدير مشروعات القطاع الجنوبي  
م / ممدوح سليمان

مدير المشروع  
م / محمود علي عبدالفتاح



## بيان أعمال الموقع

[illegible]

كميات جاري 15 عن هذه المدة

| البلد                      | طبقة اسفلت رابطة | اسفلت سطحية | RC    | طبقة MCO | قدمه الميول | طبقة اساس | نيوجيرسي واجه واحد | نيوجيرسي وجهين |
|----------------------------|------------------|-------------|-------|----------|-------------|-----------|--------------------|----------------|
| الاجمالسي جانب ايمن وايسر: | 6752             | 16449       | 16449 | 6752     | 0           | 0         | 0                  | 0              |

## جمالي الكميات حتي تاريخه

|                              |                     |            |        |             |             |           |                       |                |
|------------------------------|---------------------|------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------|
| البلد                        | طبقة اسفلت<br>رابطه | اسفلت سطحه | RC     | طبقة<br>MCO | قدمه الميول | طبقة اساس | نيوجيرسي واجه<br>واحد | نيوجيرسي وجهين |
| الاجمالي جانب ايمن<br>وايسر: | 362907              | 497247     | 494068 | 366086      | 1777.55     | 72634.9   | 17363                 | 5041           |

مدير الموقع للمالك :

مدير مشروع الشركة المنفذه :

م/ المكتب الفني :

شركة المااولات العمومية  
قوى عبده على وشركاه  
مشروع توسعات الدائري

طالب فحص

موقع العمل : الدريه  
توقيع : أحمد عبدالعزیز  
تاريخ صدوره : 2024/11/9  
تاريخ إستلامه : 2024/11/9  
جاءا 16

| الكمية | العدد | الإرتفاع | العرض | الطول | الموقع     |           | الإتجاه | وصف البند                                |
|--------|-------|----------|-------|-------|------------|-----------|---------|------------------------------------------|
|        |       |          |       |       | الى المحطة | من المحطة |         |                                          |
| 14457  | m2    |          |       |       | 6+800      | 5+550     | 15R     | 2-7<br>لبنان لاسفلت<br>من السطوح<br>(RC) |
| 664    | m2    |          |       |       |            |           | أول     |                                          |
| 1328   | m2    |          |       |       | 6+950      | 6+810     | 15R     |                                          |

☐ غير مطابق

☐ مطابق مع ملاحظات

☐ مطابق

بمسمى المصنف

المجموع = 16449 m2

التوقيع :

☐ غير مطابق

☐ مطابق مع ملاحظات

☐ مطابق

بمسمى

التوقيع :

☐ غير مطابق

☐ مطابق مع ملاحظات

☐ مطابق

بمسمى

التوقيع :

☐ غير موافق


☒ موافق


بمسمى

التوقيع :

# Cut/Fill Summary


| Name               | Cut Factor | Fill Factor | 2D Area      | Cut         | Fill        | Net               |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| qu 6000 lsr sathya | 1.000      | 1.000       | 14457.08sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |
| Totals             |            |             | 14457.08sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |

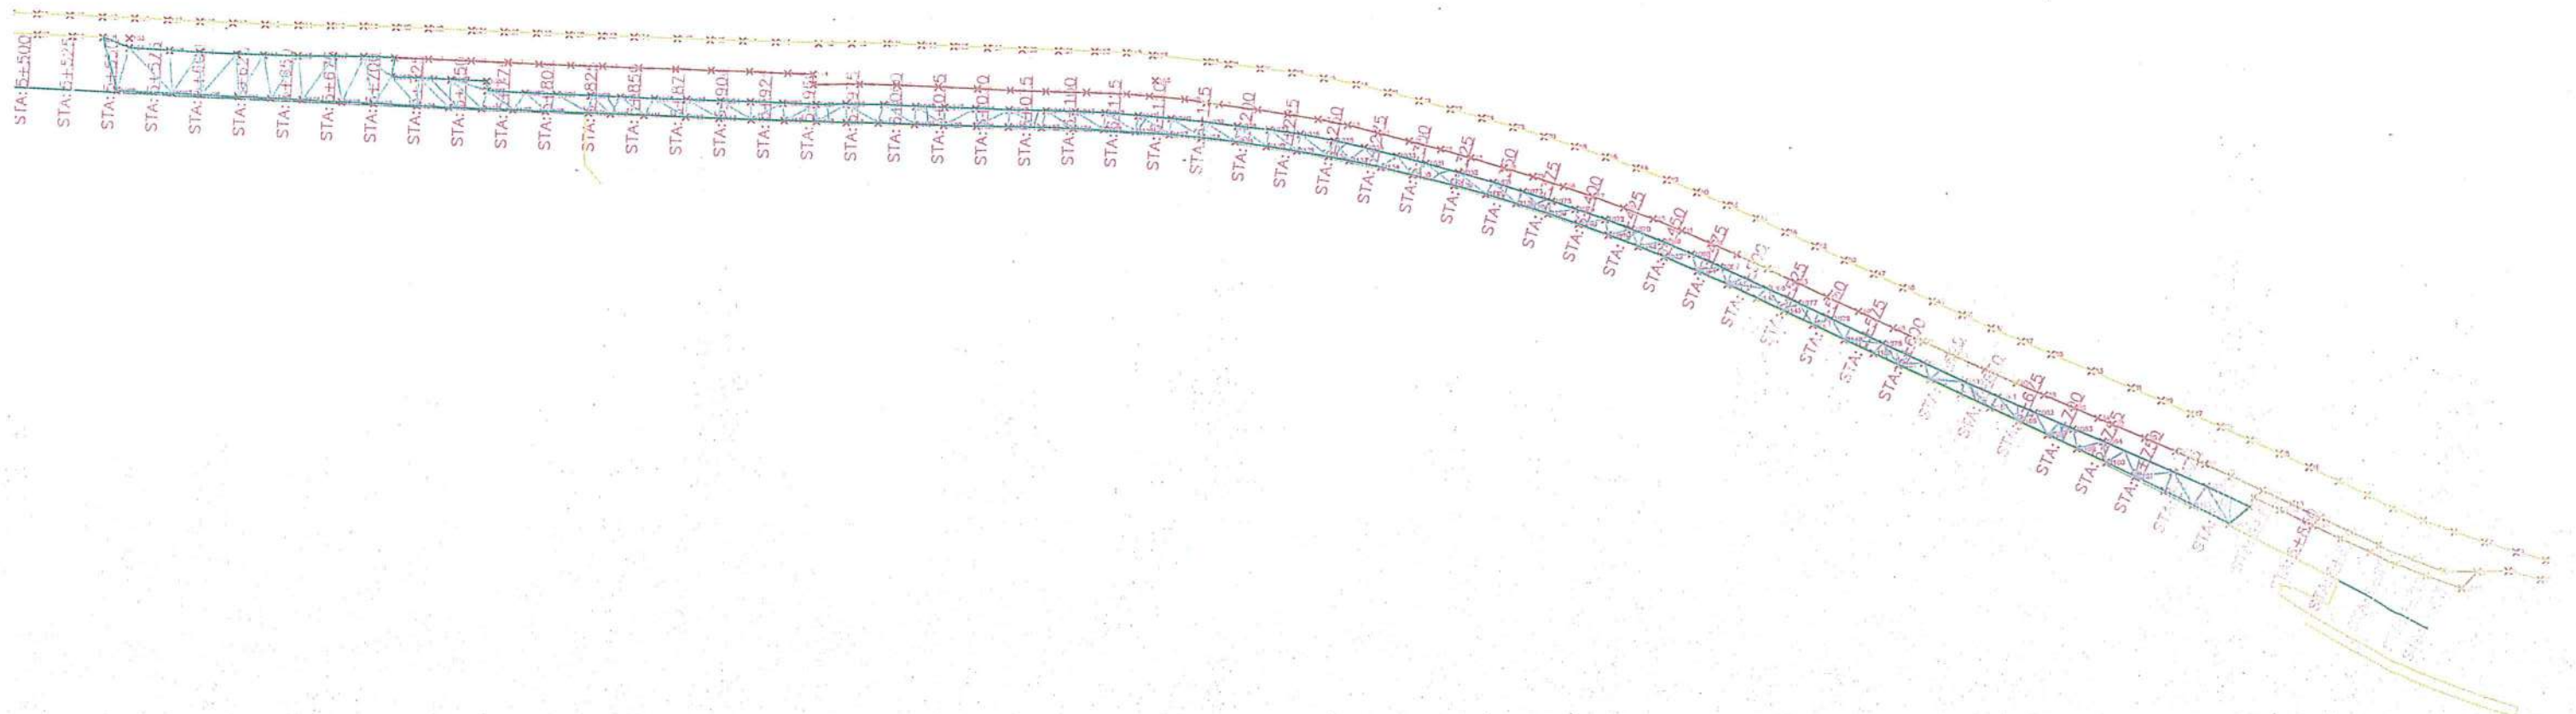

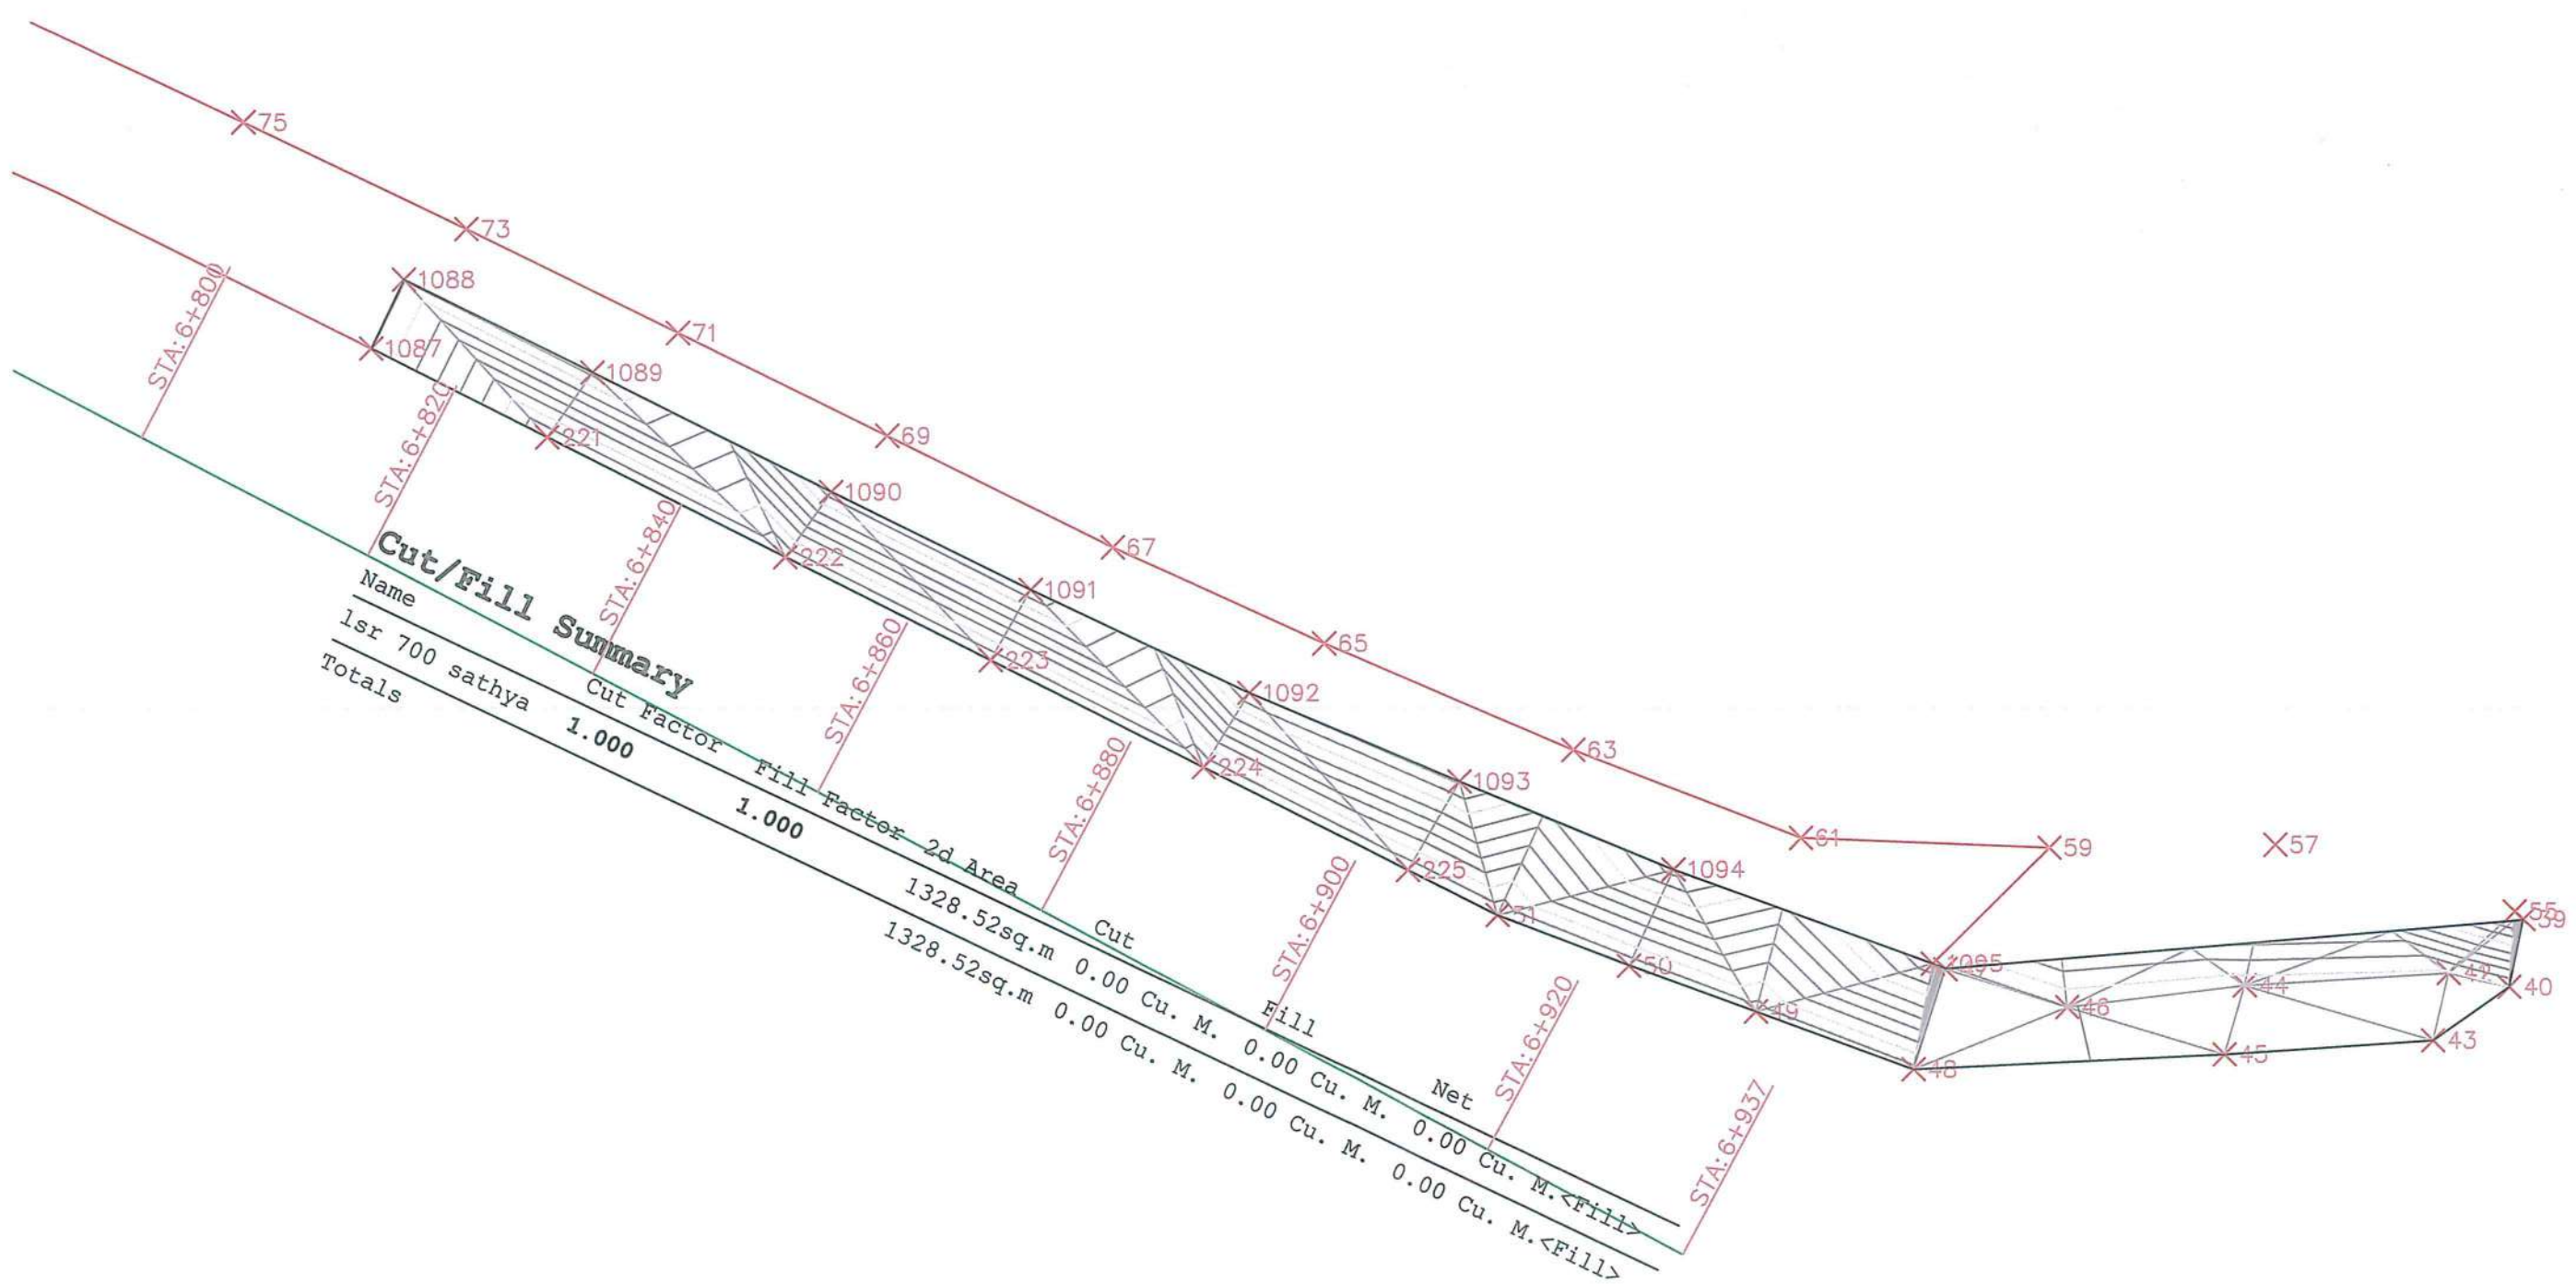

**Cut/Fill Summary**

| Name           | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area     | Cut         | Fill        | Net               |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| lsr 700 sathya | 1.000      | 1.000       | 1328.52sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |
| Totals         |            |             | 1328.52sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |

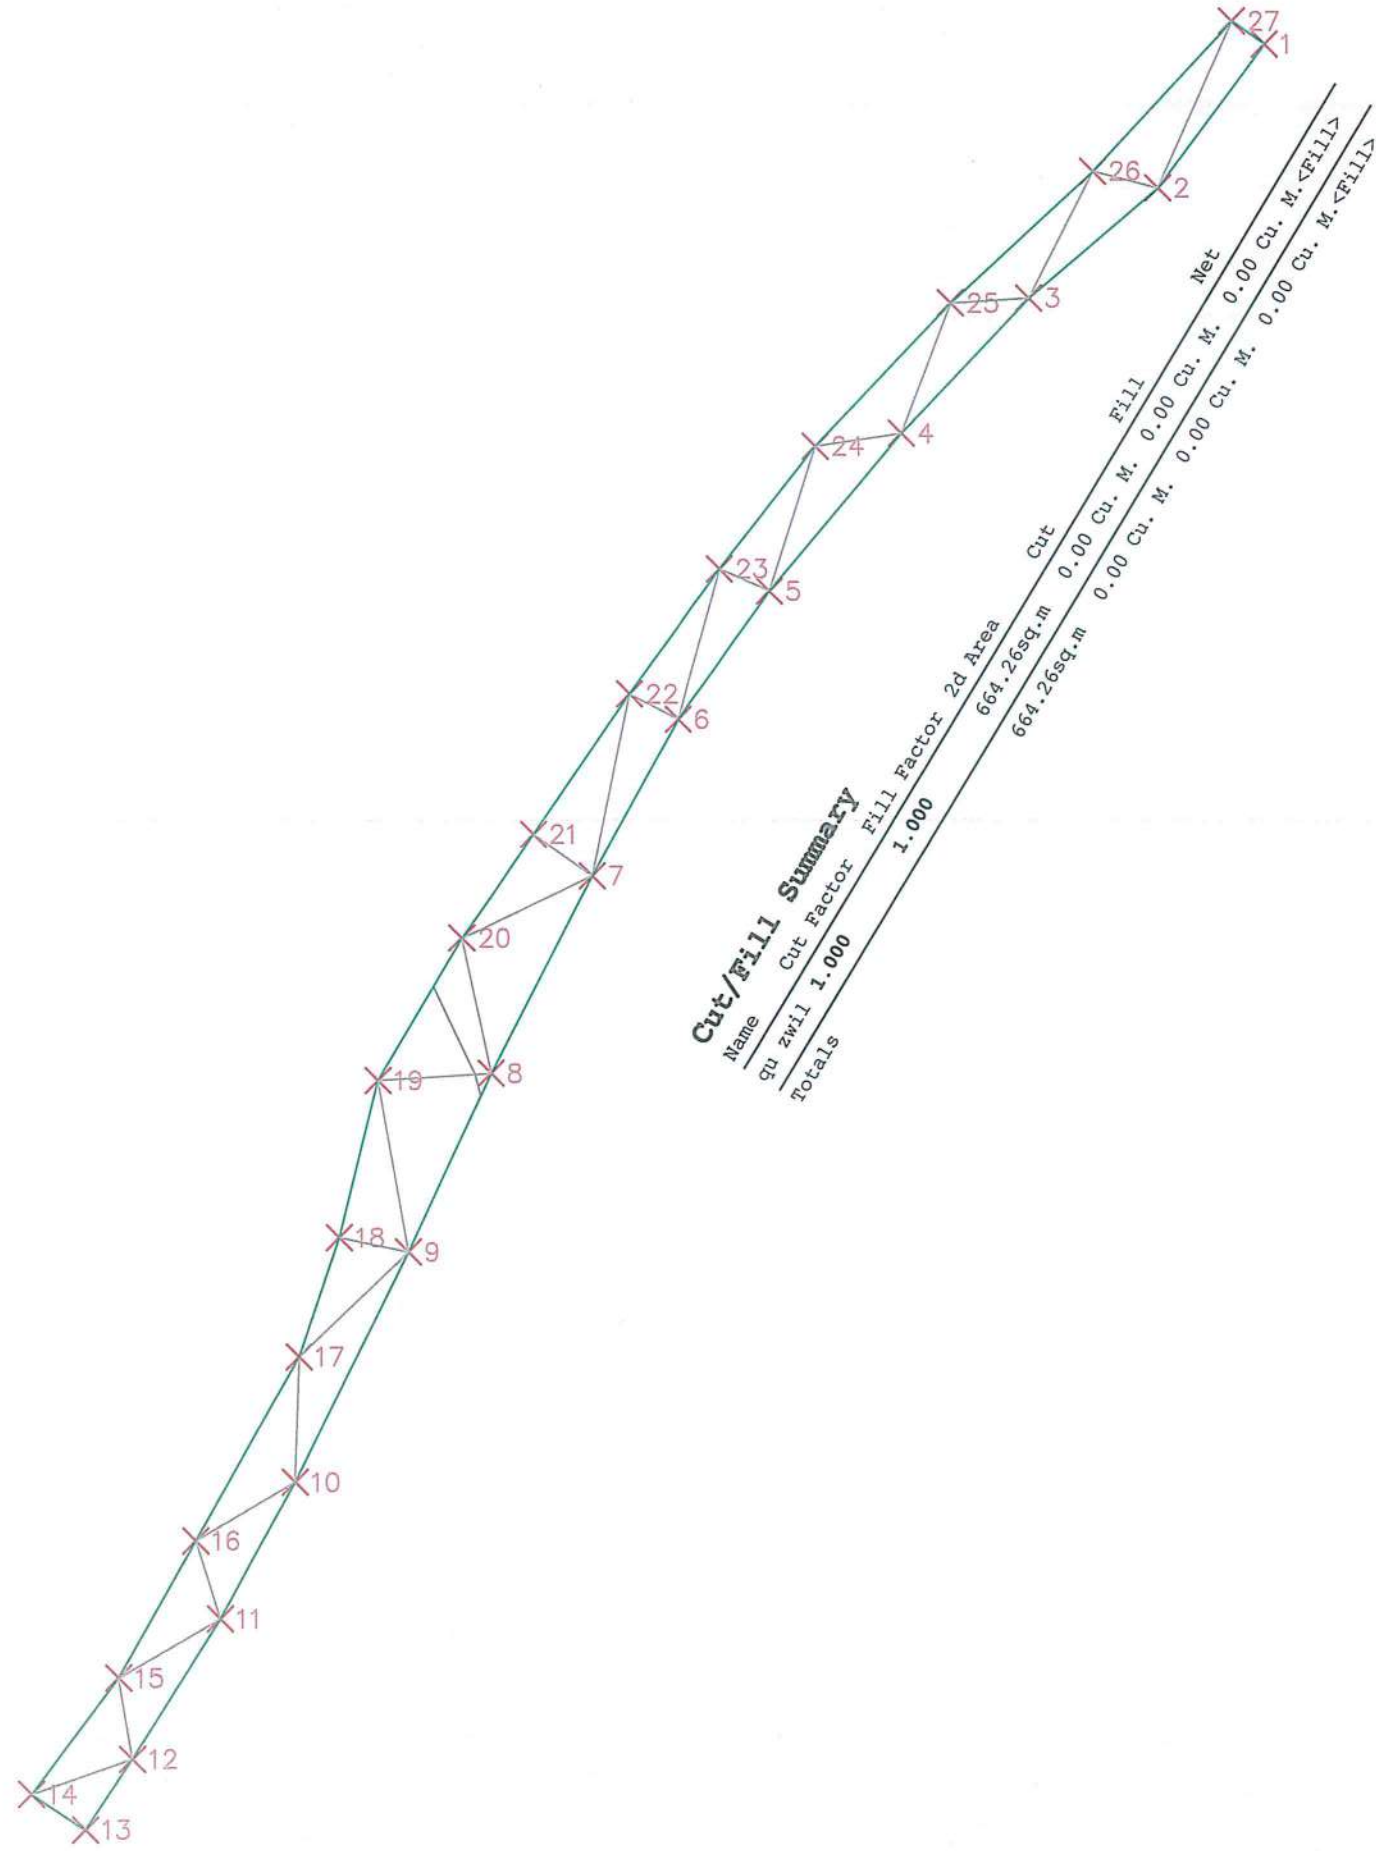

طلب فحص

مقدم الطلب: أحمد عبد العزيز توقيع: أحمد عبد العزيز  
موقع العمل: البرية  
تاريخ صدوره: 2024/11/9 تاريخ استلامه: 2024/11/9  
بارى 16

| الكمية | العدد | الإرتفاع | العرض | الطول | الموقع     |           | الإتجاه | وصف البند  |
|--------|-------|----------|-------|-------|------------|-----------|---------|------------|
|        |       |          |       |       | الى المحطة | من المحطة |         |            |
| 14457  | m2    |          |       |       | 6+800      | 5+950     | SR      | ساحة اسفلت |
| 664    | m2    |          |       |       |            |           | اول     | طريق       |
| 1328   | m2    |          |       |       | 6+950      | 6+800     | SR      |            |

☐ غير مطابق

☐ مطابق مع ملاحظات

☐ مطابق

موافق

16449 m2

التوقيع

☐ غير مطابق

☐ مطابق مع ملاحظات

☐ مطابق

موافق

التوقيع

☐ غير مطابق

☐ مطابق مع ملاحظات

☐ مطابق

موافق

التوقيع

☐ غير موافق


☒ موافق


موافق


التوقيع

# Cut/Fill Summary

| Name               | Cut Factor | Fill Factor | 2D Area      | Cut         | Fill        | Net               |
|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| qu 6000 lsr sathya | 1.000      | 1.000       | 14457.08sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |
| Totals             |            |             | 14457.08sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |

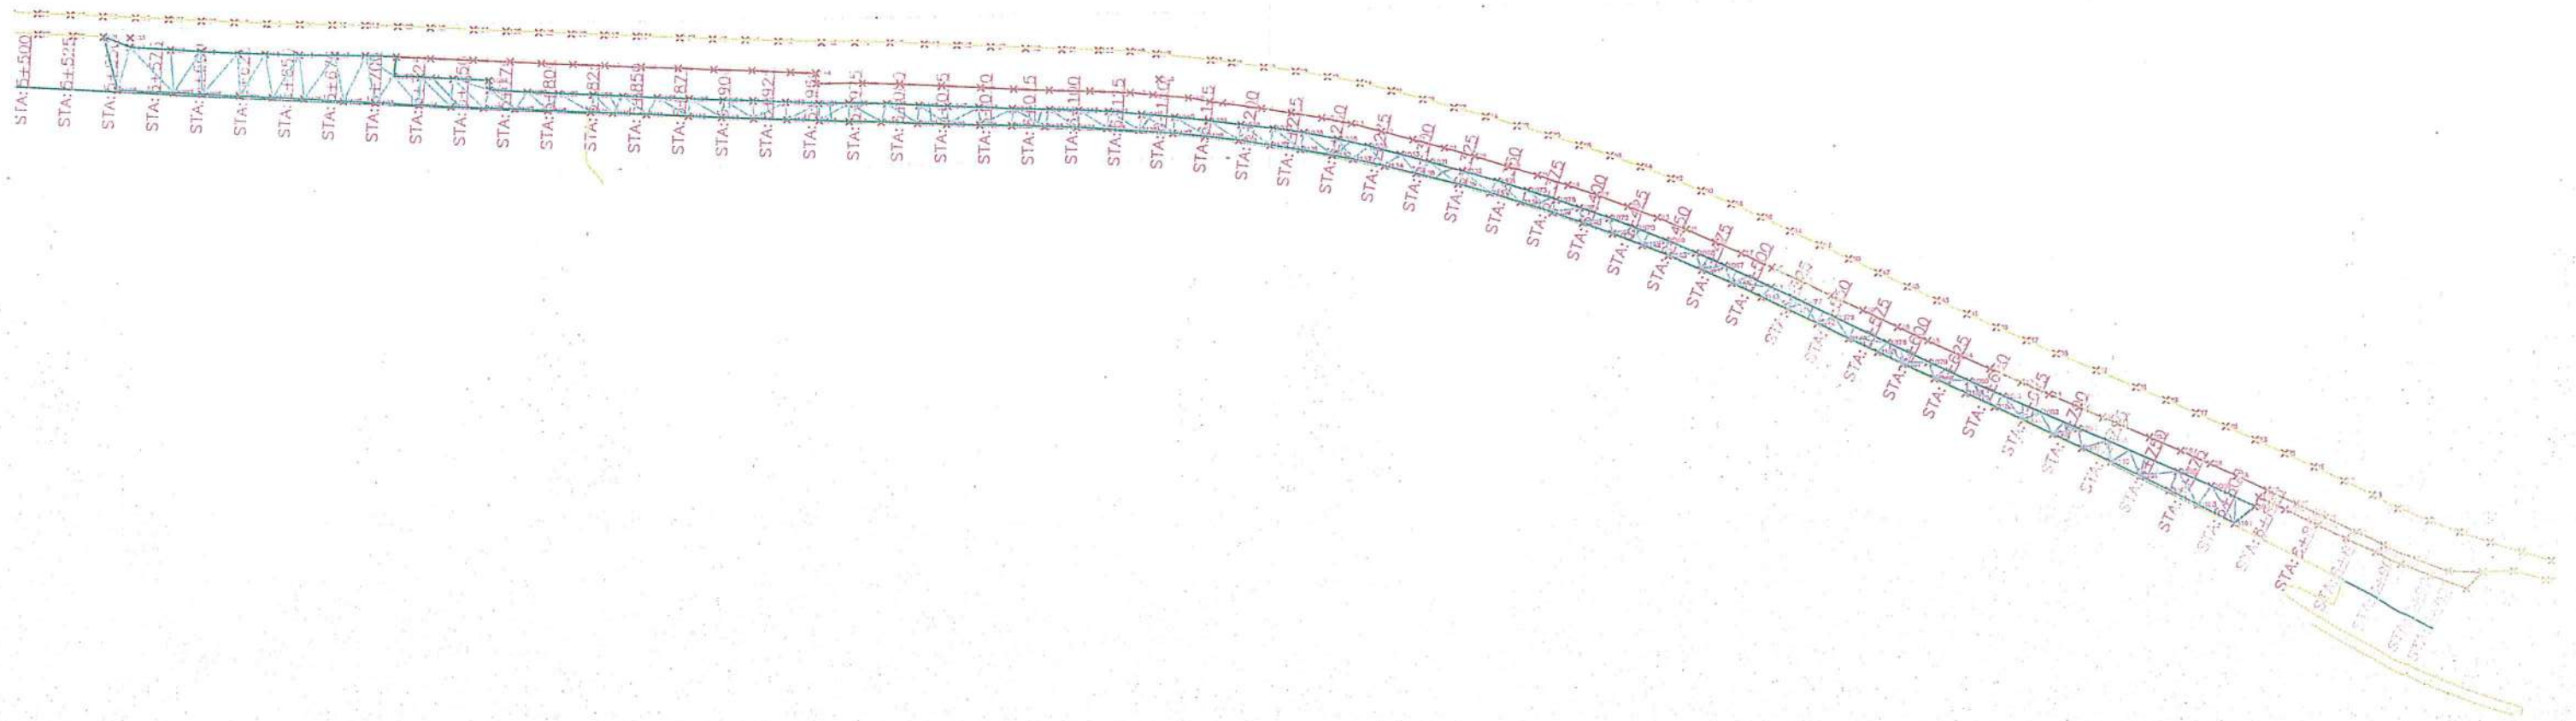

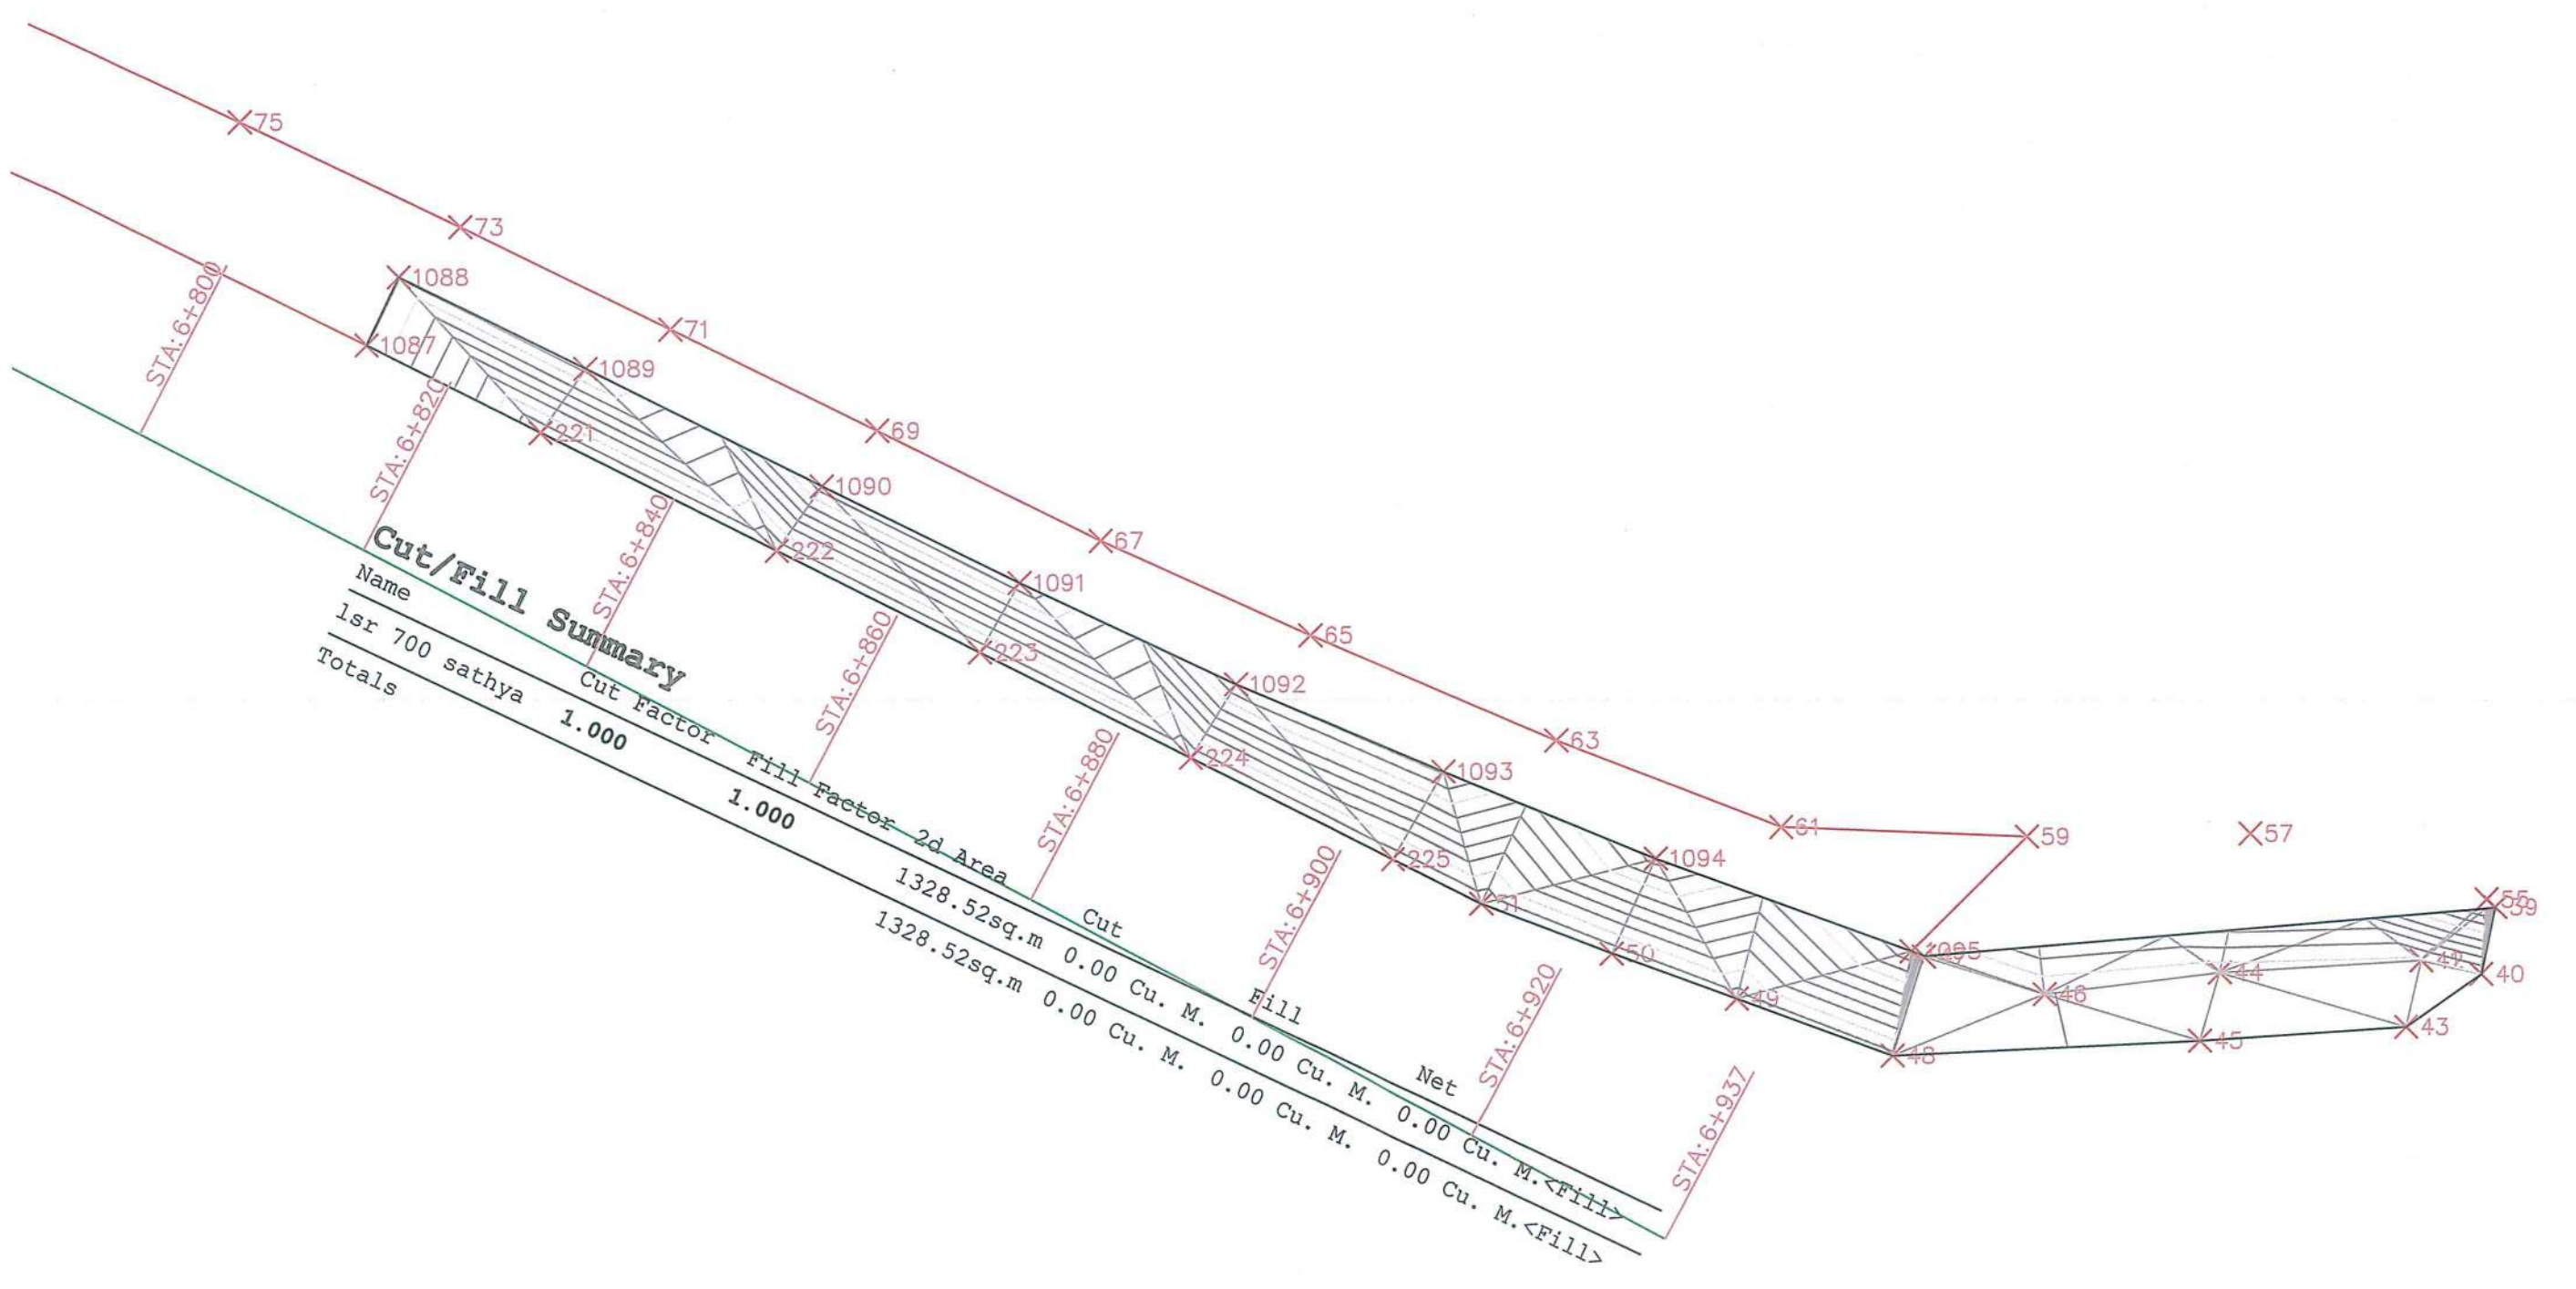

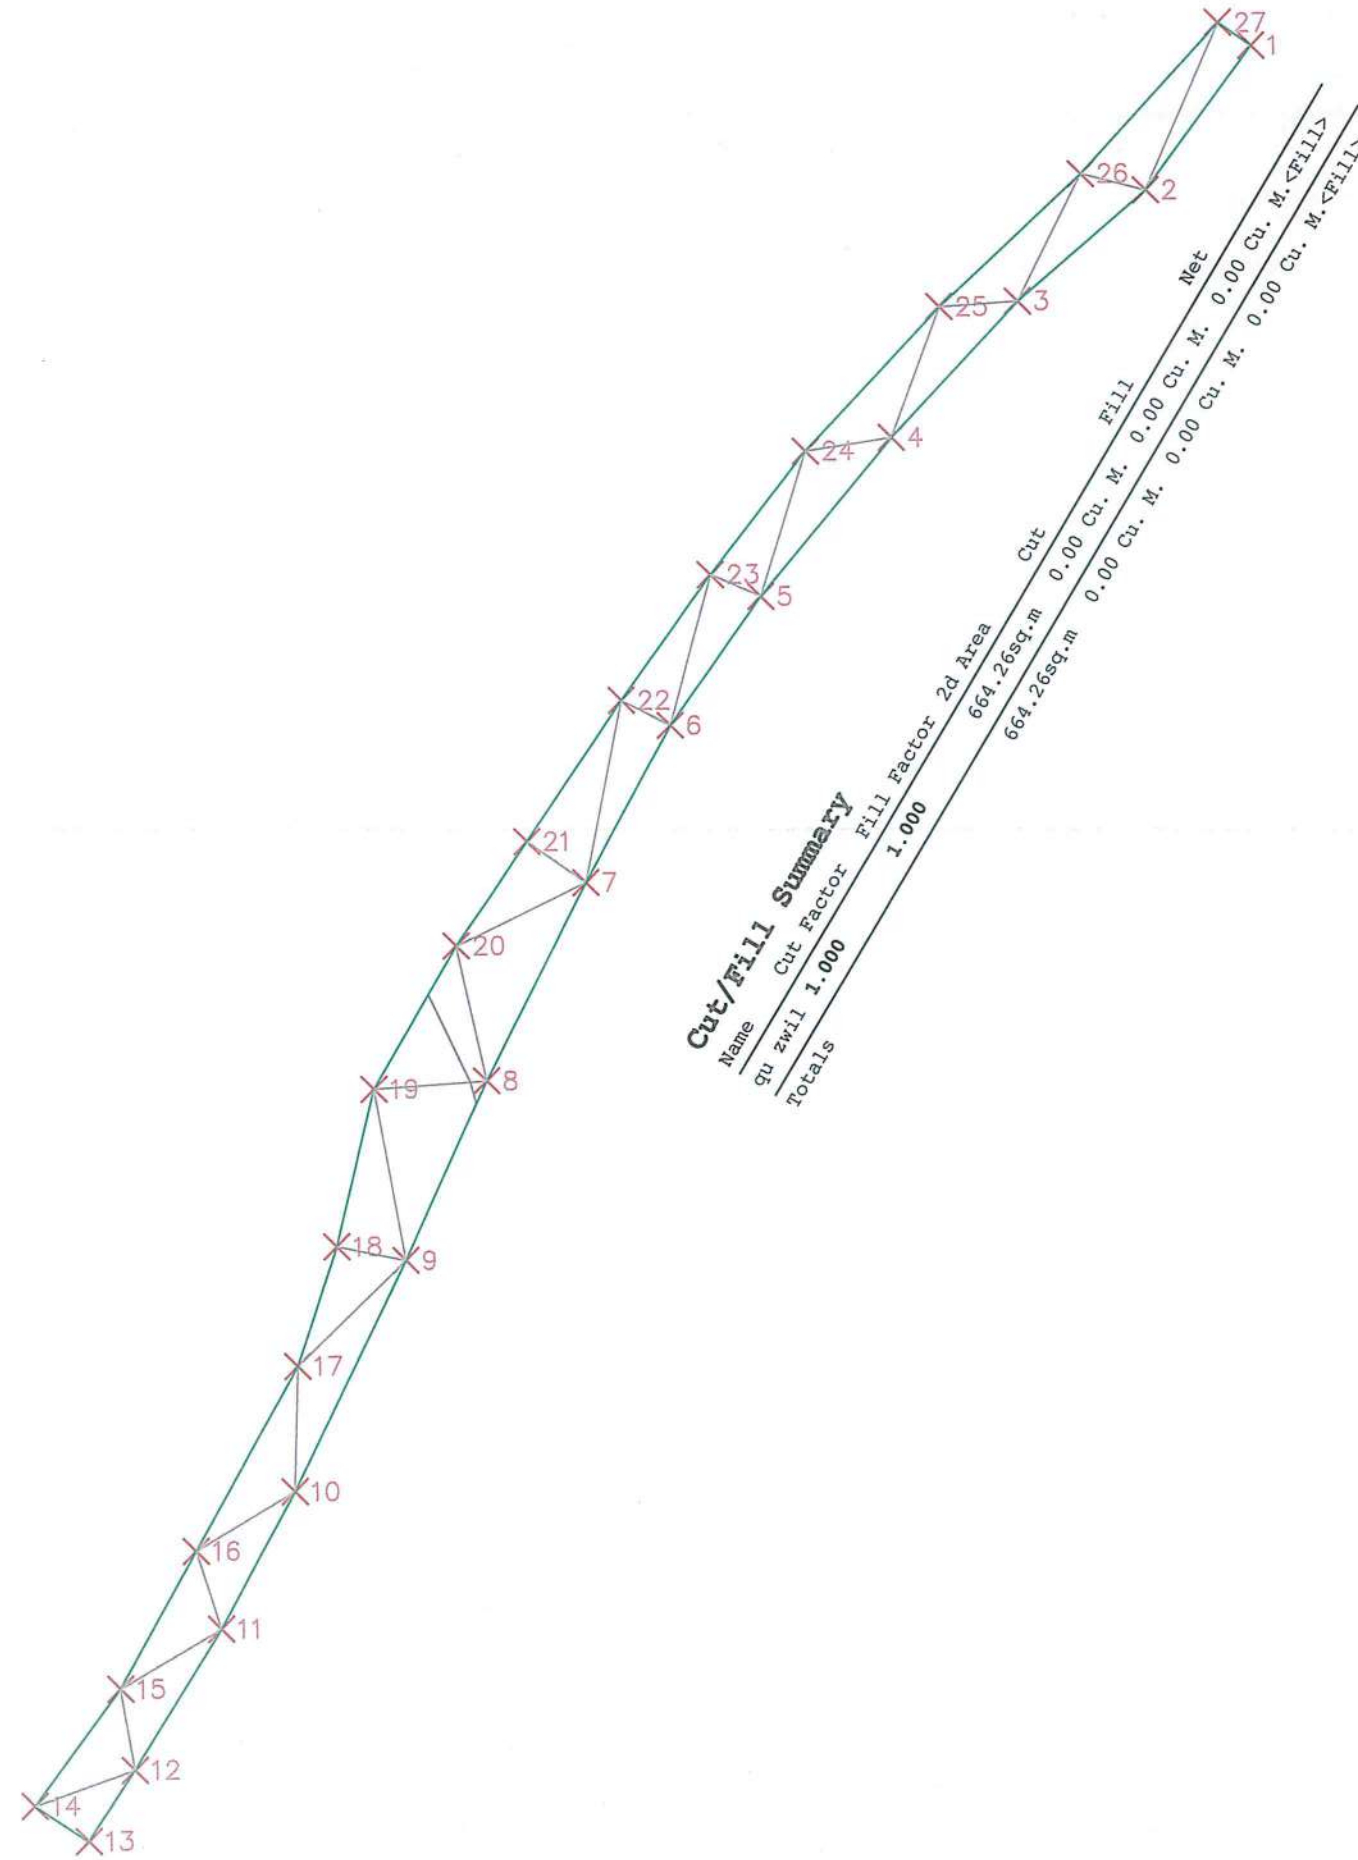

طلب فحص

إسم مقدم الطلب : المهندس فوزى توقيع : فوزى موقع العمل : الدائري  
رقم الطلب : 16 تاريخ صدوره : 2024/11/28 تاريخ إستلامه : 2024/11/28

| رقم البند | وصف البند   | الاتجاه | الموقع    |            | الطول | العرض | الإرتفاع | العدد | الكمية |
|-----------|-------------|---------|-----------|------------|-------|-------|----------|-------|--------|
|           |             |         | من المحطة | الى المحطة |       |       |          |       |        |
| 21-7      | MC<br>تسوية | التحويل |           |            |       |       |          | ٣٢    | ١301   |
|           |             | التحويل |           |            |       |       |          | ٣٢    | 5092   |
|           |             | 192     | 7+050     | 6+950      |       |       |          | ٣٢    | 369    |

المهندس المدني : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

إمضاء : 675242

التوقيع :

مهندس المواد : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق


التوقيع :

مهندس المساحة : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

التوقيع :


مدير المشروع : ☒ موافق ☐ غير موافق

التوقيع :

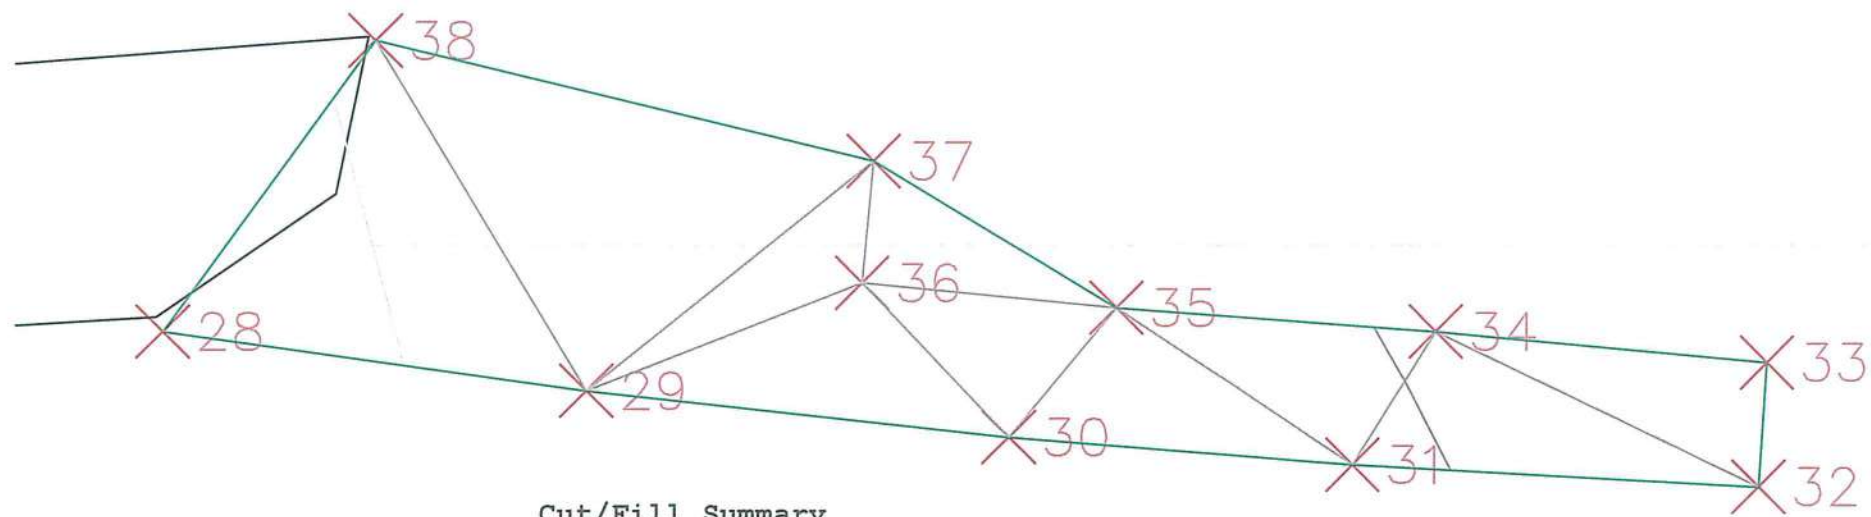


# **Cut/Fill Summary**

| Name     | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area    | Cut         | Fill        | Net               |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| rabta qu | 1.000      | 1.000       | 359.31sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |
| Totals   |            |             | 359.31sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |

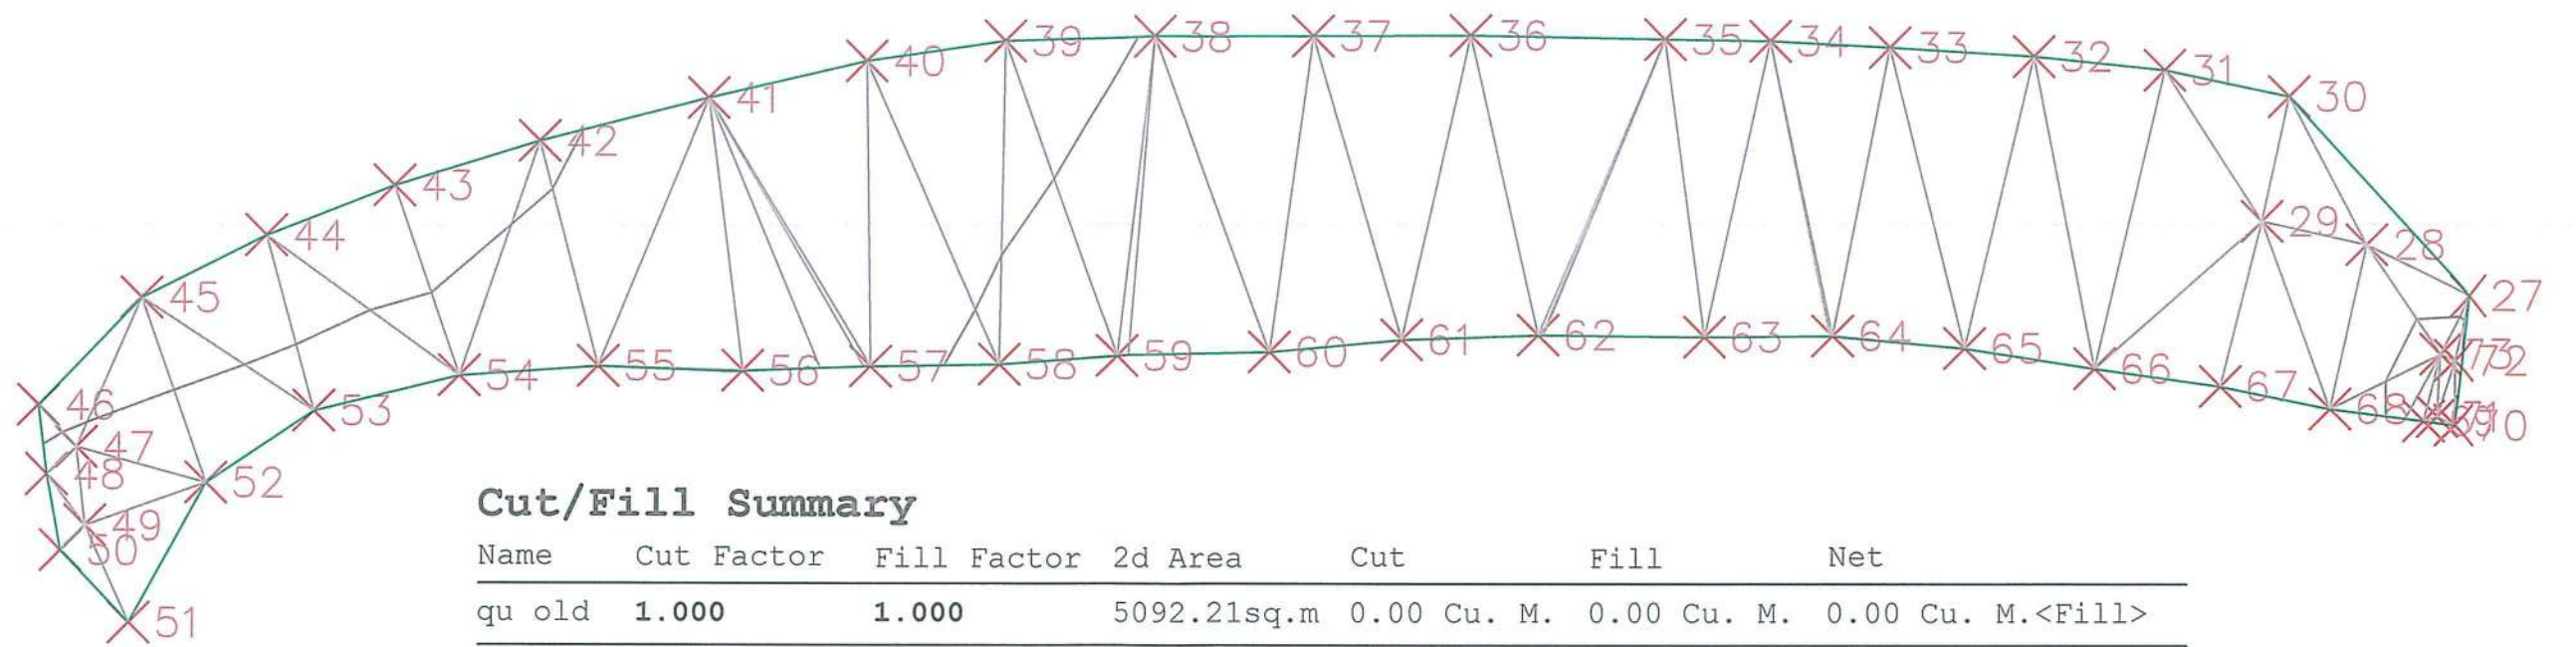

### Cut/Fill Summary

| Name   | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area     | Cut  |        | Fill |        | Net  |              |
|--------|------------|-------------|-------------|------|--------|------|--------|------|--------------|
| qu old | 1.000      | 1.000       | 5092.21sq.m | 0.00 | Cu. M. | 0.00 | Cu. M. | 0.00 | Cu. M.<Fill> |
| Totals |            |             | 5092.21sq.m | 0.00 | Cu. M. | 0.00 | Cu. M. | 0.00 | Cu. M.<Fill> |

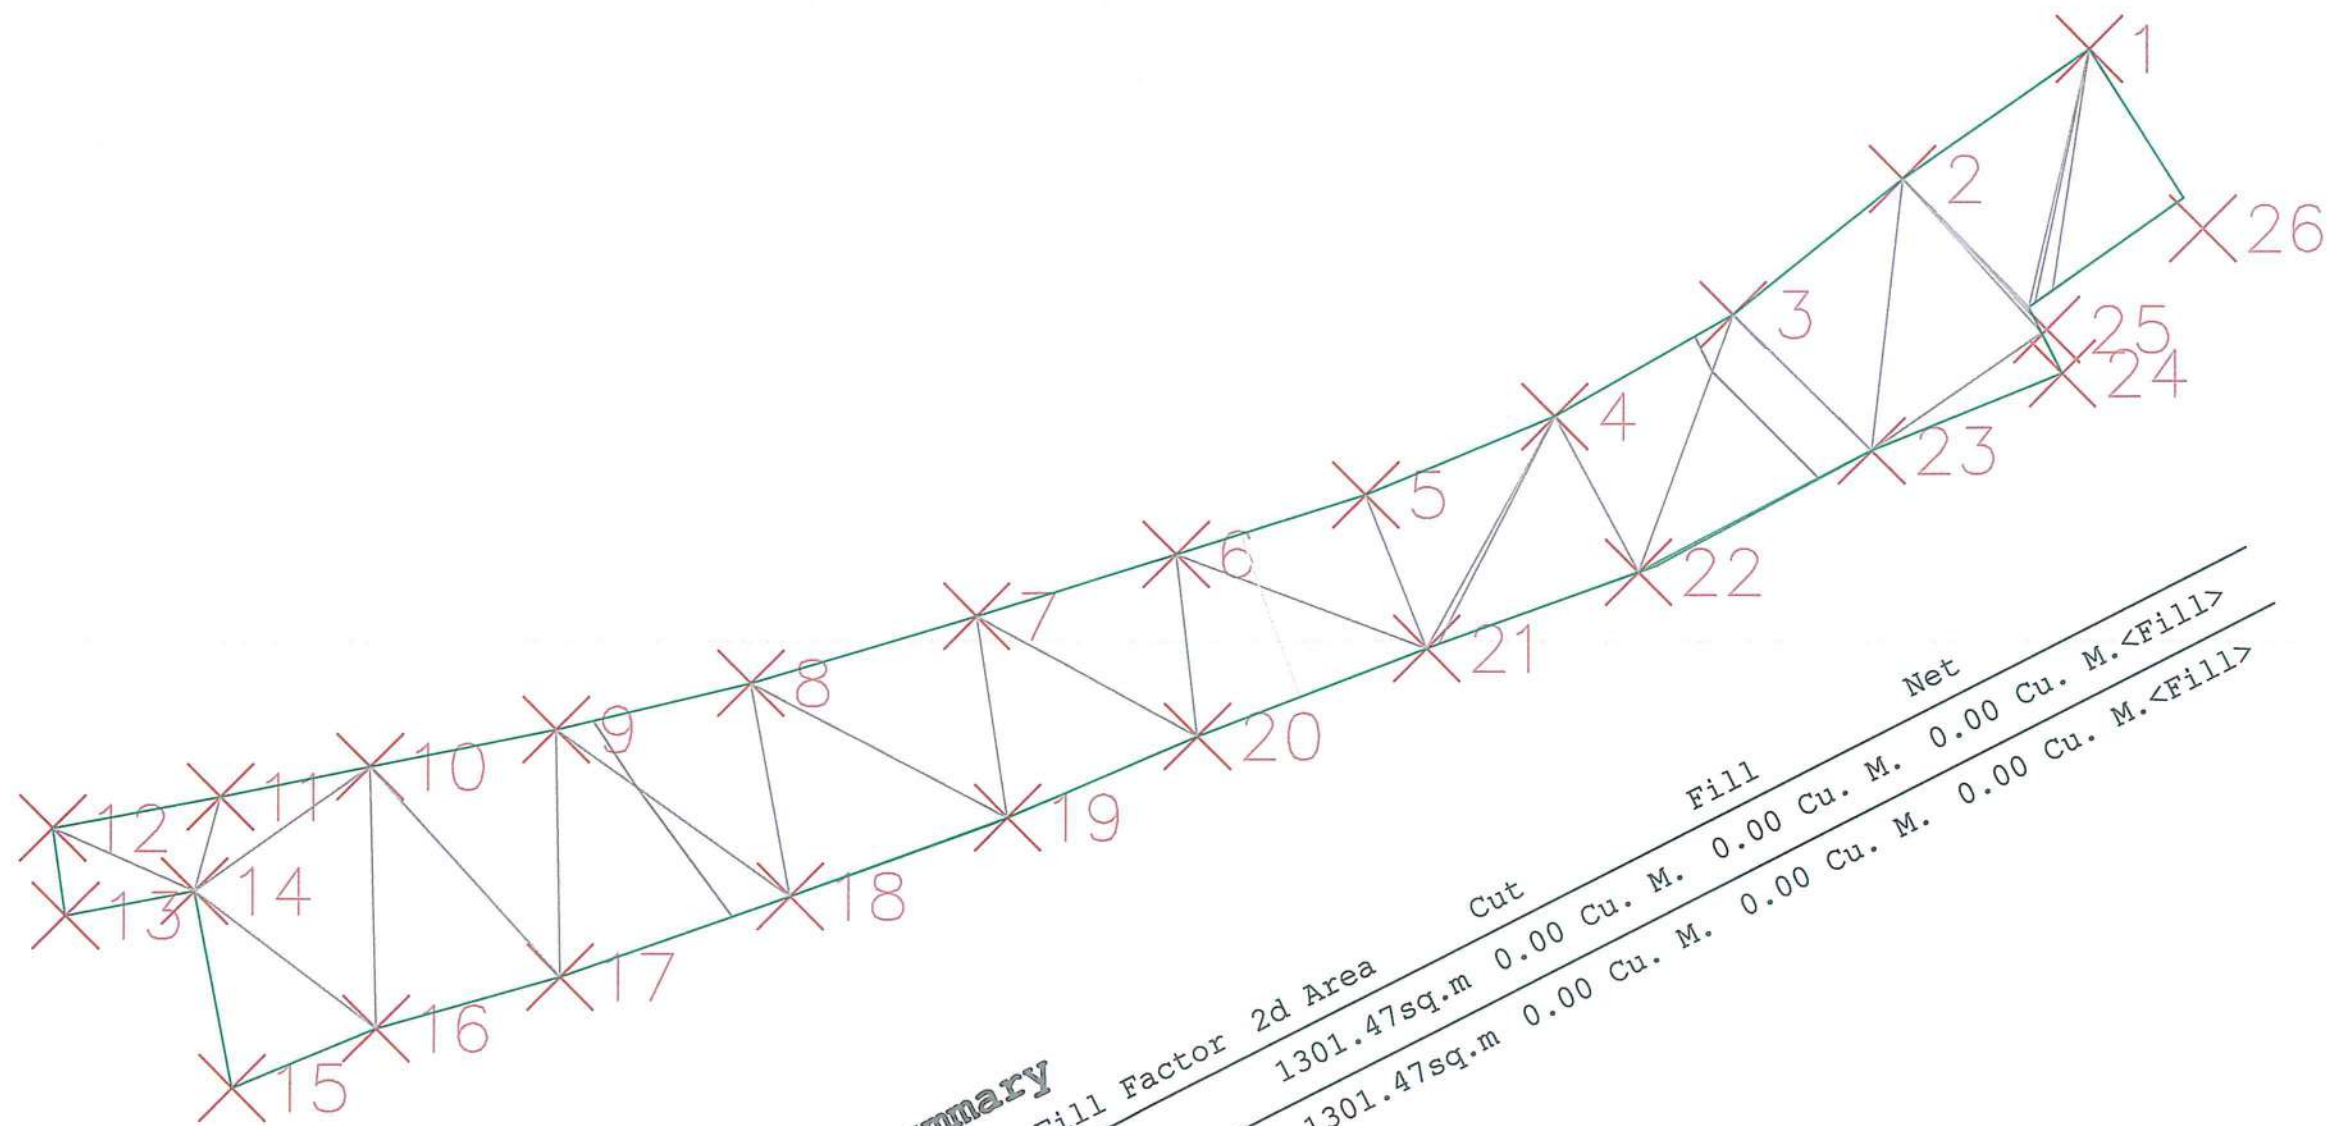

### Cut/Fill Summary

| Name    | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area     | Cut         | Fill        | Net               |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| qu alex | 1.000      | 1.000       | 1301.47sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |
| Totals  |            |             | 1301.47sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |



الإستشاري / مكتب الرائد  
للإستشارات الهندسية



المالك / الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
تنفيذ أعمال الاسفلت و النيوجيرسي و الدمانات ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري  
حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي  
تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم بالأمر المباشر.

تنفيذ شركة فوزى عبده للمقاولات العمومية



المقاول : شركة المقاولات  
العمومية فوزى عبده

### طلب فحص

إسم مقدم الطلب : المهندس فوزى توقيع : فوزى موقع العمل : الدائري  
رقم الطلب : جاري ١٥ تاريخ صدوره : 2024/11/28 تاريخ إستلامه : 2024/11/28

| رقم البند | وصف البند   | الإتجاه | الموقع    |            | الطول | العرض | الإرتفاع | العدد | الكمية |
|-----------|-------------|---------|-----------|------------|-------|-------|----------|-------|--------|
|           |             |         | من المحطة | الى المحطة |       |       |          |       |        |
| ٤١-٤      | صيانة رابطة | التوصيل |           |            |       |       |          | ٣٢    | ١٣٥١   |
|           |             | التوصيل |           |            |       |       |          | ٣٢    | ٦٥٩٢   |
|           |             | ٤٨١     | ٦+٩٥٥     | ٧+٥٥       |       |       |          | ٣٢    | ٣٥٩    |

المهندس المدني : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

المهندس فوزى

التوقيع :

مهندس المواد : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق


التوقيع :

مهندس المساحة : ☐ مطابق ☐ مطابق مع ملاحظات ☐ غير مطابق

التوقيع :


مدير المشروع : ☒ موافق ☐ غير موافق

التوقيع :

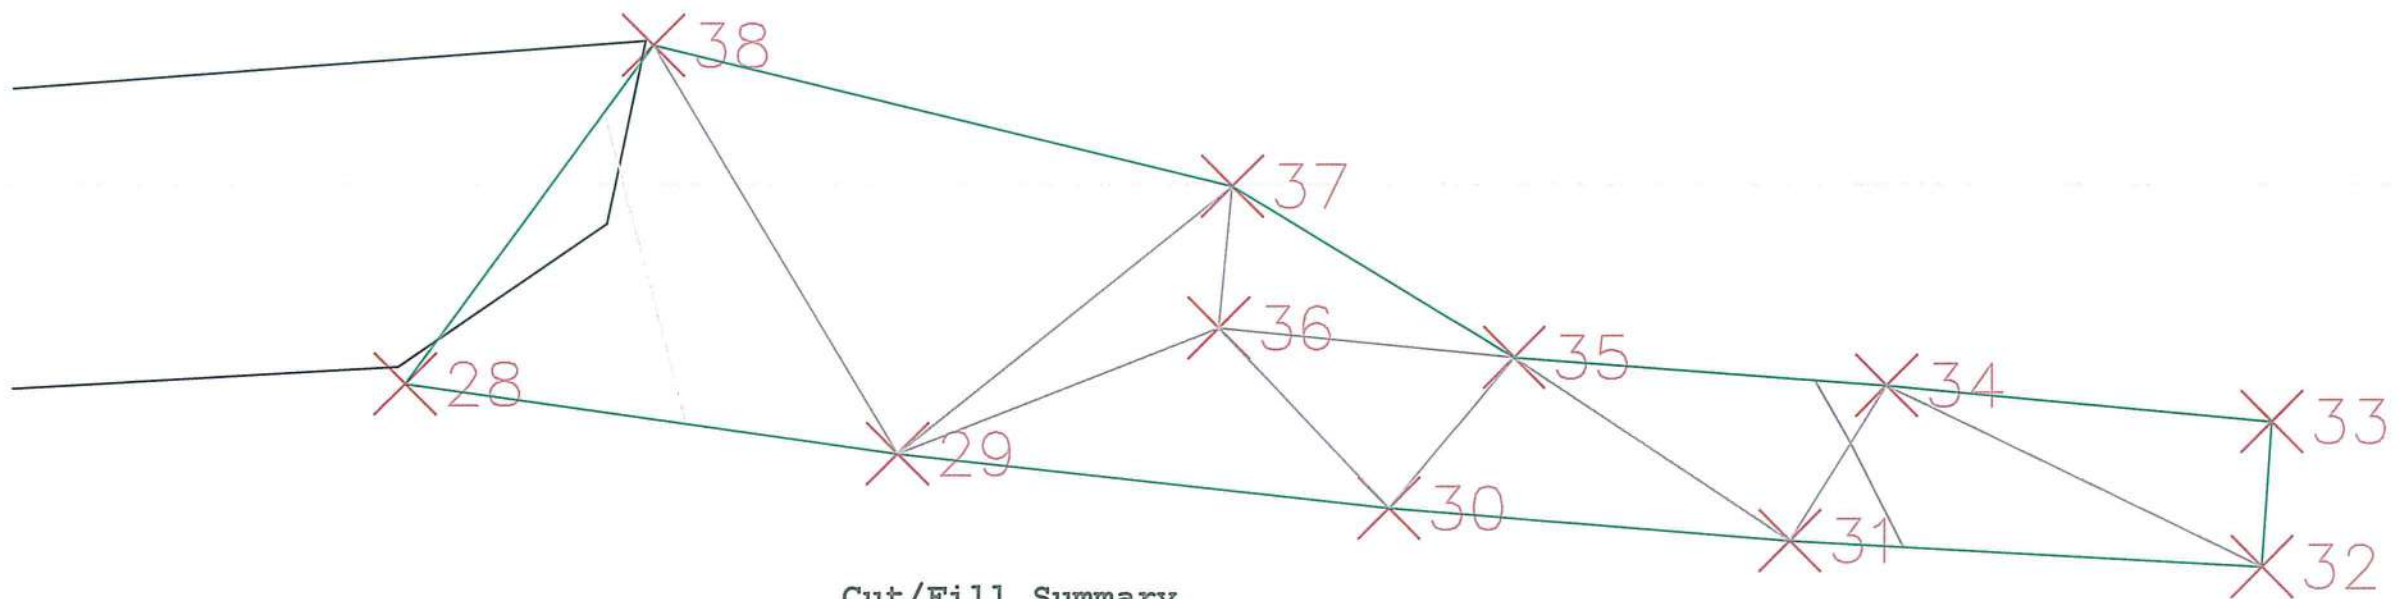


#### Cut/Fill Summary

| Name     | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area    | Cut         | Fill        | Net               |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| rabta qu | 1.000      | 1.000       | 359.31sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |
| Totals   |            |             | 359.31sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |

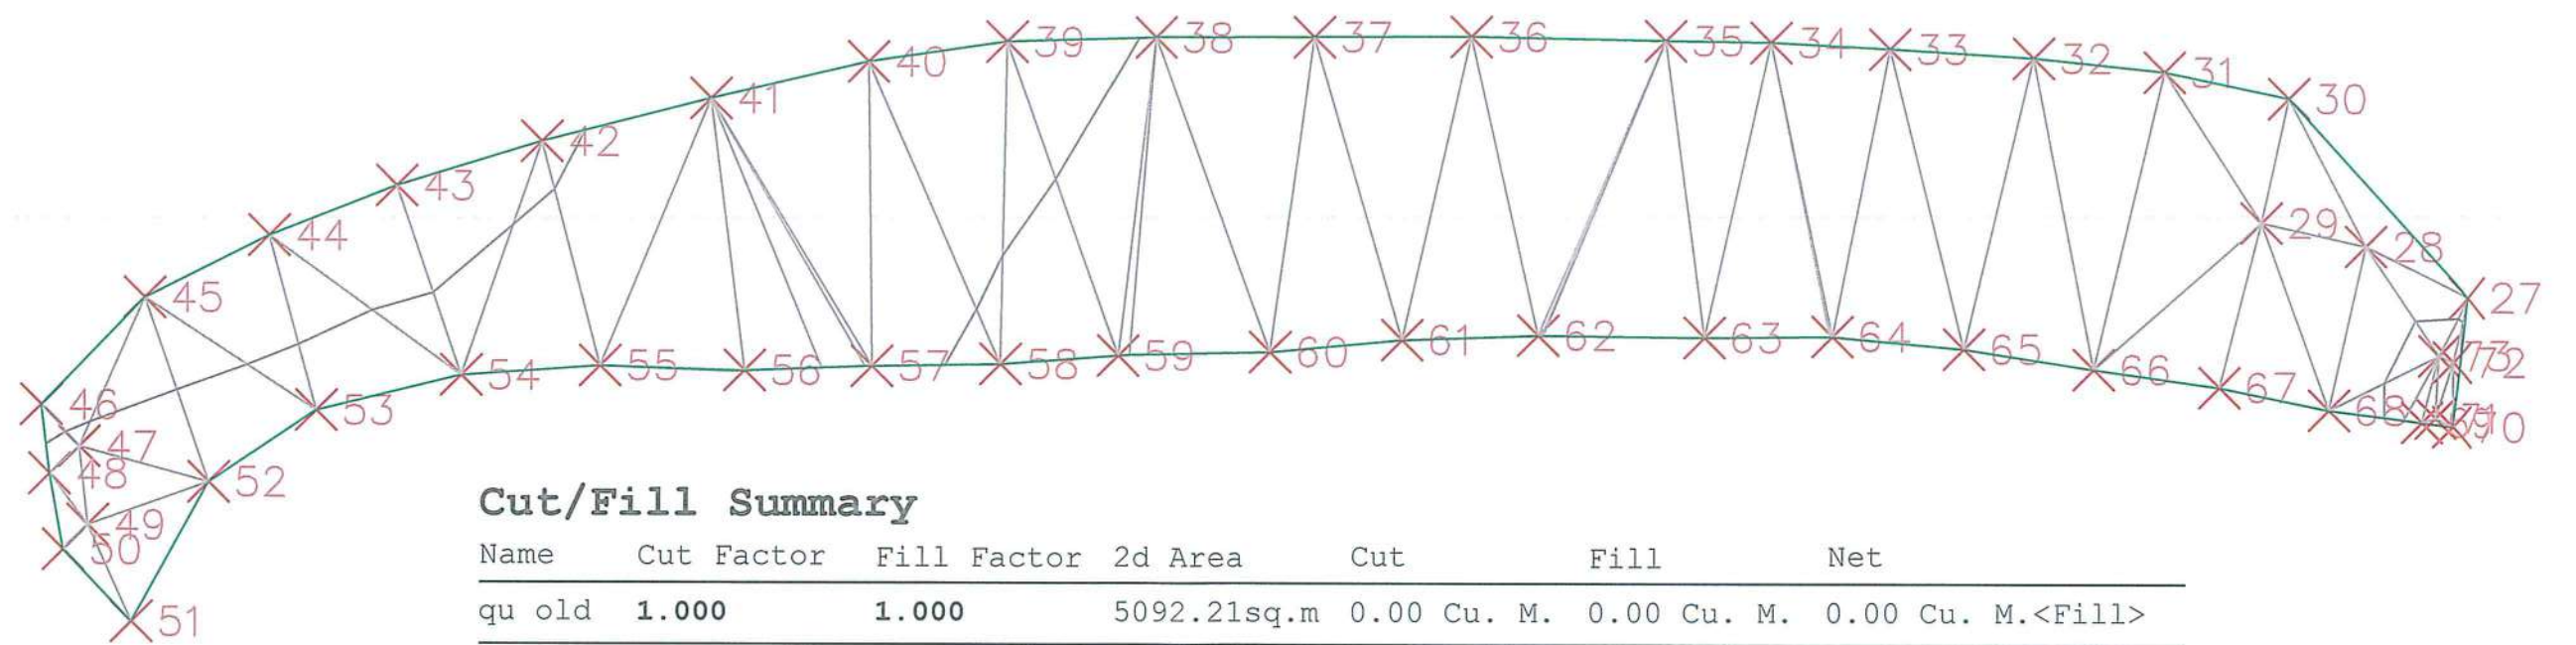

### Cut/Fill Summary

| Name   | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area     | Cut         | Fill        | Net               |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| qu old | 1.000      | 1.000       | 5092.21sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |
| Totals |            |             | 5092.21sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |

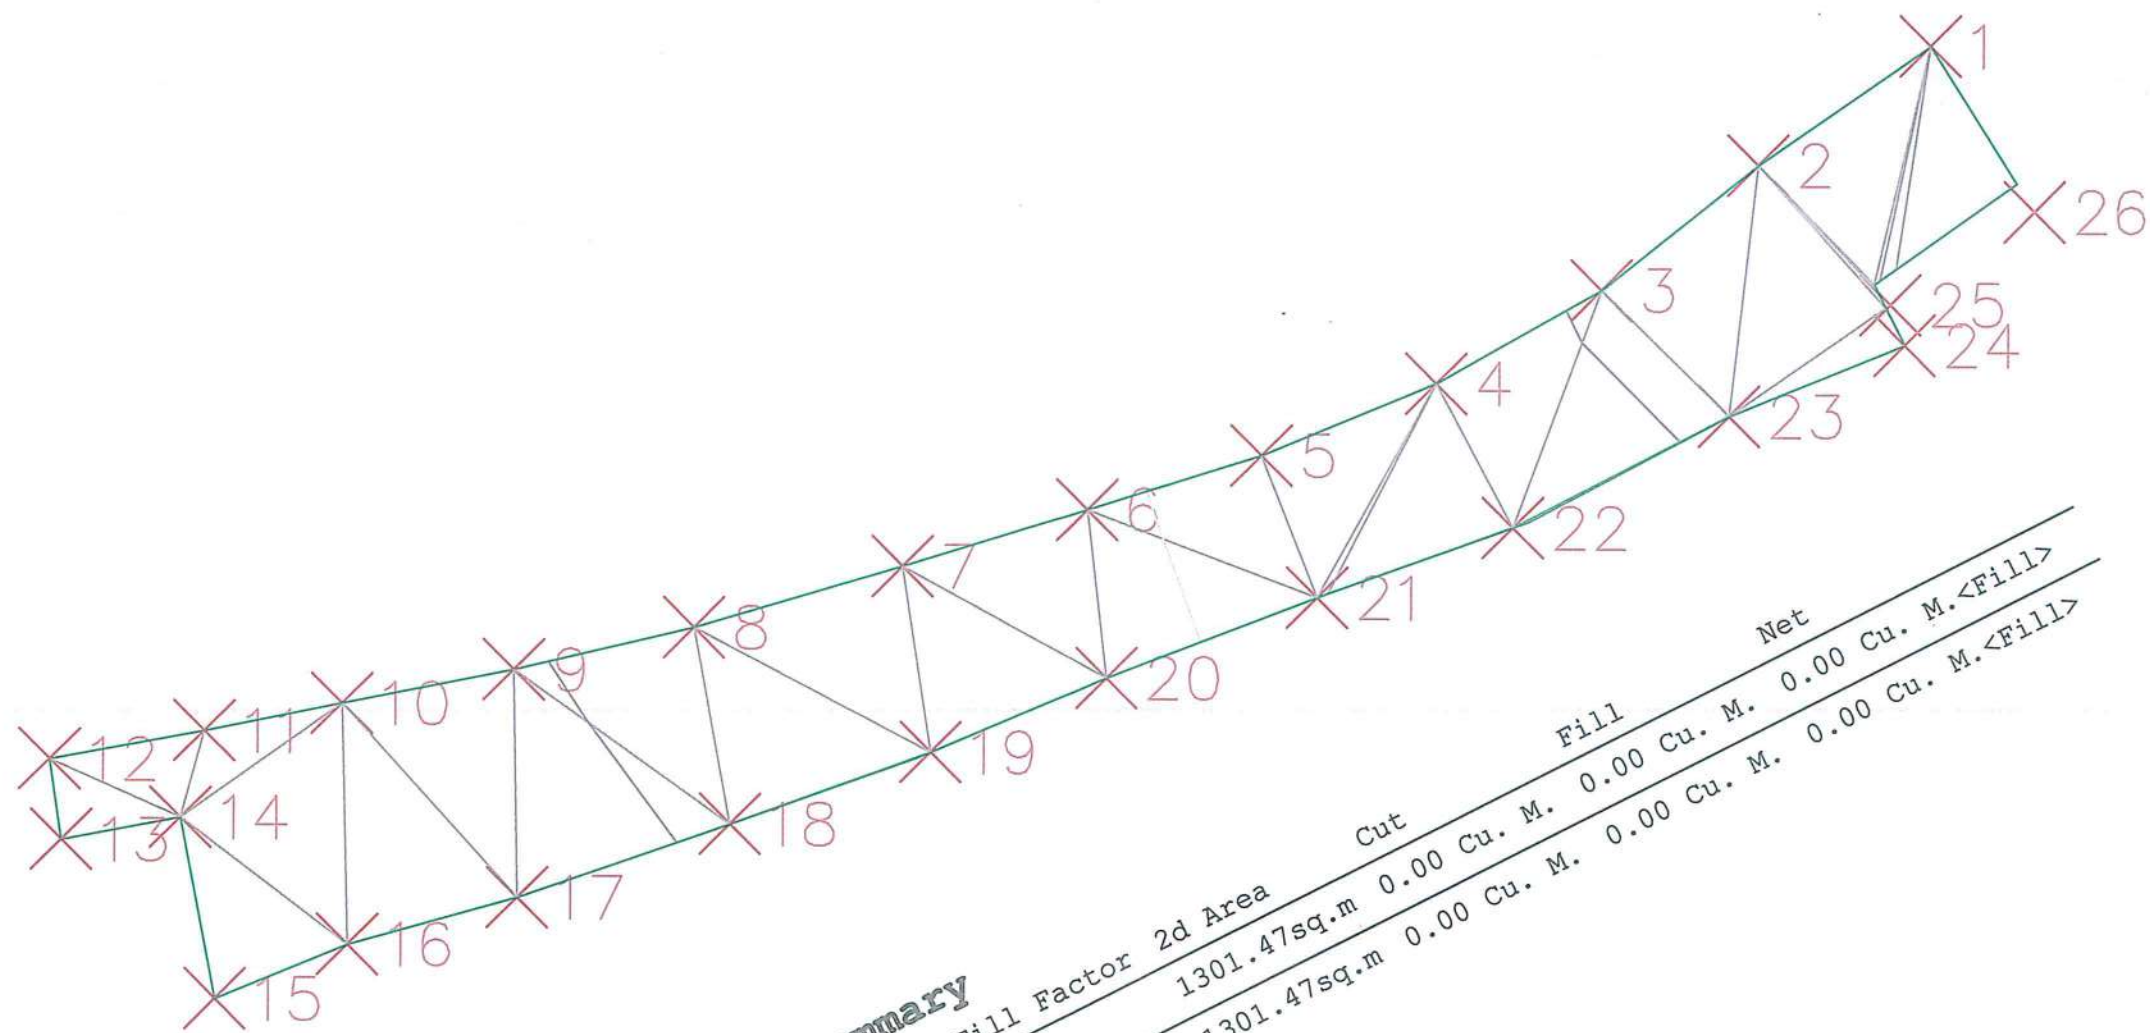

### Cut/Fill Summary

| Name    | Cut Factor | Fill Factor | 2d Area     | Cut         | Fill        | Net               |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| qu alex | 1.000      |             | 1301.47sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |
| Totals  |            | 1.000       | 1301.47sq.m | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M. | 0.00 Cu. M.<Fill> |



٣١٠٨  
مذكره



## مذكرة للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

### أولاً : الموضوع :

- إيماءاً أعمال الاسفلت والدهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٨ كم وبخصوص الخطاب الوارد إلينا من شركة ال فوزي عبده للمقاولات العمومية (الشركة المنفذة) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٠ بشأن طلبهم مد مدة المشروع (٦) أشهر اضافيه لينتهي المشروع في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ .

### ثانياً : الإجراءات :

- نتشرف بالعرض على سيادتكم :-  
أنه قد صدر عقد بأمر إسناد مباشر لشركة ال فوزي عبده برقم ( ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٠١ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢ ومدة تنفيذ ٦ أشهر تبدأ من ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٢٨ بقيمة (٢٤٦٠٤٣٠٠٠) (مئتان وستة واربعون مليون وثلاثة واربعون الف جنيه فقط لا غير ..) وذلك لتنفيذ أعمال الاسفلت والدهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٨ كم  
تم مد مدة العملية بعدد ٣ اشهر لينتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ (مرفق)  
تم مد مدة العملية بعدد ٣ اشهر لينتهي في ٢٠٢٣/٠٦/٢٨ (مرفق)  
تم مد مدة العملية بعدد ٣ اشهر لينتهي في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ (مرفق)  
تم مد مدة العملية بعدد ٦ اشهر لينتهي في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ (مرفق)  
تم مد مدة العملية بعدد ٦ اشهر لينتهي في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ (مرفق)  
وايماءاً الي طلب الشركة بمد مدة المشروع من تاريخ اخر موافقه في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ وحتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

### وذلك للأسباب الآتية :-

- ١ - بالإشارة الي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٢-٢-٢٣ بمنح الشركات مدة ستة أشهر نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية
- ٢ - عدم استقرار اسعار الصرف للعملات الاجنبية مما تسبب في عدم توافر الخامات الاساسيه للتنفيذ
- ٣ - وبشأن أعمال الاسفلت والدهانات و النيوجيرسي ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٨ كم وما تتضمنه من معوقات للتنفيذ مازالت متواجده حتي الان وتتمثل في الآتي :-  
- توقف الأعمال من المحطة ٥+١٠٠ إلى المحطة ٥+٩٠٠ في الاتجاه الأيسر بسبب تأخر شركة الكهرباء عن نقل الكابلات من دائري ١ إلى دائري ٢  
- تم إسناد أعمال اللويات والرامبات الخاصة بنفق حازم حسن بنطاق المشروع بكميات تقدر بحوالي ١٧٥٠٠٠ متر مكعب ردم ترابي و ١٤٨٠٠٠ متر مكعب قطع و ٦٠٠٠ متر مكعب سن و ١٠٠٠٠ متر مربع بلاطات حماية الميول ولم يتم البدء بأعمال النفق حتى تاريخه لحين انتهاء التحويلة المرورية بكوبري أسكندرية (د٩) مما يتطلب مد مدة المشروع ما لا يقل عن ٤ أشهر.  
- توقف الأعمال في الجانب الأيمن من المحطة ٦+٩٠٠ إلى المحطة ٧+٢٠٠ بسبب أعمال توسعة كوبري (د٩) والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة الغرابلي.

لحري

تابع مذكرة العرض  
بشأن مددة أعمال الاسفلت و الدهانات و النيوجيرسي  
ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافة من  
تقاطعه مع طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي  
وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٨ كم



ثالثاً : المطالب :

التكرم بما تروته سيادتكم مناسباً لهذه (إضافة ٦ اشهر) فقط ليصبح نهو المشروع في  
٢٠٢٥/٠٣/٣١

والأمر مفوض لسيادتكم ،،،

(التوقيع)

مهندس /  
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

محمد باه

أ.م

رابعاً : رأى السيد الأستاذ/ مدير عام العقود والفتاوى واللوائح :

① نرى جواز الموافقة على ما استقر اليه التوقيع (الأستاذ/ تامر بدرت محمود  
بجاءه الفند - المختص في هذا الشأن - وفقاً  
لمدراثة - المستندة الى مواظب شرطه لفتاوى - مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

(التوقيع)  
مهندسه/ منار عبد الهادي  
مدير الادارة المركزية لبحوث الطرق

سادساً : رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

(التوقيع)  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

سابعاً : رأى السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الادارة :

(التوقيع)  
لواء مهندس/ طارق محمد عبد الجواد  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

الأمر مفوض

سادساً : قرار السيد / رئيس مجلس الادارة :

(التوقيع)

لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أو الله على الرأى القانوى

⑤ المقررة من باب الفهرار ببلدية أم - ٢٠٢٤ ٢٠٢٤ ٢٠٢٤  
في سراج - العشي ، وما استندت ذلك من منى البلي  
- على لائحة المقررة - مع من تصيل مقابل تأخير من - ٢٠٢٤  
- مواظب ملأه ذلك ، ٢٠٢٤
