



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الي اعمال انشاء سور الكتبيه (٧٠١) حرب المعترض مشروع تطوير وتوسعه الطرق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بالأمر المباشر

عقد رقم ١٣٤٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٢٤

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (٣) اصل من مستخلص جاري ٢ من ٢٠-٠٤-٢٠٢٤ وحتى تاريخ ٢٦-٠٢-٢٠٢٥ وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣٣٩٥٢٧٠٠٩ جنيهه (فقط وقدره ثلاثه مليون وثلاثمائة وخمسه وتسعون الف ومائتان وسبعون جنيهه و تسعه قروش لا غير ...)

يرجي التفضل بالاحاطه والتوجيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مرفقات:


عدد (٣) مستخلص جاري ٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) حصر اعمال

عدد (٣) حصر اعمال

عدد (٣) بين اعمال مجمع



يعتمد ..

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
مشيرة السيد عبد الله

مصلحة المحاسبة العامة للرقابة والكبار
 رقم
 المبلغ المستحق إلى
 { الطلبات عليه ، أو :
 بموجب :
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو :
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالتحريان الآتي :

رقم	التاريخ	حصة	فرش
٣٢٩٥٤٧٠٩٠٩			

رقم
 المحتم ذو التاريخ



٣٢٩٥٤٧٠٩٠٩

تفيد في السجل برقم

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع المحصر		نوع المحصر		فرش	
	بسمات	موضوع	نوع	مبلغ	حصة	فرش
		موضوع تطوير مشروع (المرتبج الإداري)				
		من المانية من تقاعدها مع مركز الخدمة				
		الراشدة (المعزاة) ومركزها مع مركز				
		العاملة أعالي الاقتصاد والخدمة				
		بسمات الاستقطاعات				
		عادي	إضافي	دفعة توفيق		
		فرش حصة	فرش حصة	فرش حصة		
		رسم الخدمة				
		مركز الخدمة المطلوب صرفها				

المحتم ذو التاريخ



رؤس

لجنة المحاسبة

علامة

- في سنة ٢٠٠٩
- إقرار كاتب محل المحوزات والتنازلات
 - إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المحصر وأن البد المحصر يسمح ولم يكن الصرف : الإمتاء
 - حاري : الإمتاء
 - أو : بأن المبلغ مضاف بحساب : الإمتاء
- شبه العام لتدوين المبالغ الأموية ١٤٣٠ هـ من ١٤٣٠ هـ

المحتم ذو التاريخ (جيم) قيد في سجل رقم ٥٥ ج هـ برقم
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 ٢٠ سنة
 يفتد حسب
 إذن صرف




مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٠٩ يبلغ

- (٢)
- رقم السند (وهو رقم القيد في الدختر رقم ٢٢٤ ج هـ) : إمتاء الكاتب المنوط
 - قيد في دفتر الحسابات المختصة : إمتاءات موظفي الشغل
 - محب (٣) : رقم : إمتاء الكاتب المنوط
 - قيد في سجل : تحت رقم : إمتاء الكاتب المنوط
 - أدرج في كشف : رقم : إمتاء الكاتب المنوط
 - استل : إمتاء : طالب أم كاتب المحصر




الأسئلة

$$78 + \dots \times \left[1 - \dots - 3290 \times 1.19 \right] = 1.1 \text{ المسألة}$$

$$111117, 11 =$$

$$17917, 10 = \left[\dots \times 3290 \times 1.19 \right] = 1.1 \text{ المسألة}$$

$$17917, 10 = \left[\dots \times 3290 \times 1.19 \right] = 1.1 \text{ المسألة}$$

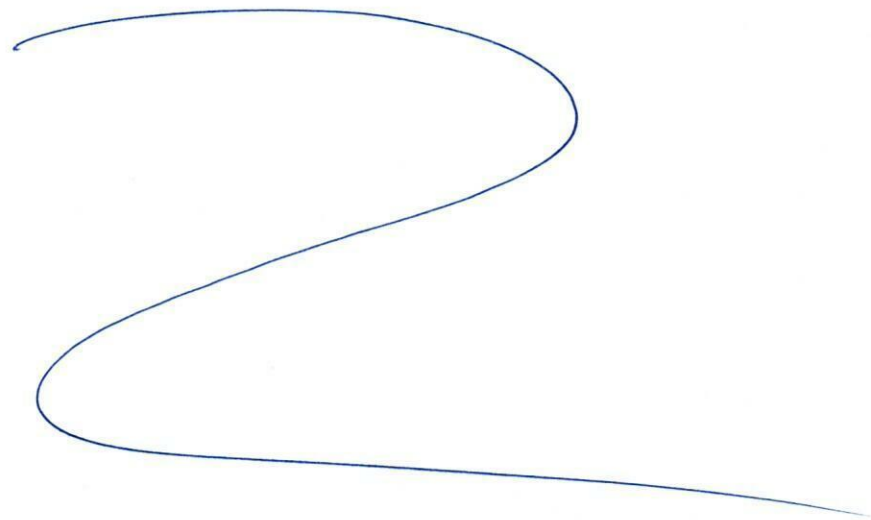

السيد الاستاذ / رئيس الادارة المركزيه للشؤون الماليه و الاداريه

تحية طيبة ... وبعد ,,,

بالإحالة الي اعمال انشاء سور الكتيبه (٧٠١) حرب المعترض مشروع تطوير وتوسعه الطرق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بالأمر المباشر

عقد رقم ١٣٤٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٢٤

وبالاشارة الي تواجد العماله طبقا للمشروع عاليه ..

نحيط سي : تكم علما بعدم تواجد العماله بالمشروع بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتي تاريخه
برجاء التكرم بالاحاطه و التنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير ,,

تحريرا في ٢٦/٠٢/٢٠٢٥

يعتمد ,,,

الادارة المركزيه
مهندس
مشيرة السيد عبد الله
٩٦٣٥



السيد الاستاذ / رئيس الادارة المركزيه للشؤون الماليه و الاداريه

تحية طيبه وبعد ,,,

بالإحالة الي اعمال انشاء سور الكتبيه (٧٠١) حرب المعترض مشروع تطوير وتوسعه الطرق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بالأمر المباشر

عقد رقم ١٣٤٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٢٤

وبالاشارة الي المحملات الخاصه طبقا للمشروع عاليه

نحيط سيادتكم بأن جميع المحملات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق منذ بدايه المشروع وحتى تاريخه وغير متواجد اي محملات بالاداره المركزيه للطريق الدائري ومحاوره .

برجاء التكرم بالاحاطه و التنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير ,,

بحريرا في ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

يعتمد ,,,

رئيس الادارة المركزيه

الطريق الدائري ومحاوره

مستشيرة السيد عبد الله



٩٦٣٥

رقم البند	البند	الكمية المنفذة	الوحدة
1-6	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متر ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهرة بسمك ٠,٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وعمل البوارج والأوتار اللازمة وتركيب شبك مد في أماكن اتصال المباني بالفاصل الانشائية (عامود - كمره - الاكتاف) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	7905.96	م ^٢

الكمية بامتار المربع	العرض	الطول	العدد
٣٣٤١,٥٢	٢٠,٤	٣,٩٠٠	٤٢
٦٠٨,٤	٤	٣,٩٠٠	٣٩
٢١١٣,٤٤	٢٠,٤	٣,٧٠٠	٢٨
٥٨٨,٣	٣,٧٥	٣,٧٠٠	٥٣
٩٨١,٢٤	٢٠,٤	٣,٧٠٠	١٣
٢٧٣,٠٦	٠,١٨	٣,٧٠٠	٤١٠
٧٩٠,٥٩٦	الإجمالي		

سفوت

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية المنفذة
3-4	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م ^٣	56.30

كميرات (عدد ٢٥ فاصل)					
إجمالي الحجم للنموذج (م ^٣)	الحجم للباكية (م ^٣)	السبك	العرض	الطول	العدد
٢٣,١	٠,٤١٢٥	٠,٢٥	٠,٤	٤,١٢٥	٥٦
٢٣,٢	٠,٤	٠,٢٥	٠,٤	٤,٠٠٠	٨٣
٥٦,٣				إجمالي أعمال الكميرات (م ^٣)	



شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره


بيان اعمال سور الكتيبة فوج (٧٠١) حرب اليكترونيه

البنود	الكمية المنفذه	الوحده	ملاحظات
حفر	1500.00	م ^٣	
ردم	1083.00	م ^٣	
قواعد عادية	226.70	م ^٣	
قواعد مسلحة وسملات	427.00	م ^٣	
أعمدة	154.20	م ^٣	
توريد وتركيب حديد تسليح	68.32	طن	
مباني طوب اسمنتي	41.46	م ^٣	
مباني طوب طقلي	1036.43	م ^٣	
كمرات	106.00	م ^٣	
بياض التخشين	7900.00		
عزل	3120.61	م ^٢	

مدير المشروع للمالك :

20

مدير مشروع الشركة المنفذه :



المكتب الفني للشركة المنفذه :

JP



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بخصوص: عن اعمال انشاء سور الكتيبه (٧٠١) حرب الكترونيه المعترض مشروع تطوير وتوسعه الطرق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات بالأمر المباشر عقد رقم ١٣٤٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٢٤
نحيط سيادتكم علما بالآتي :-

كرفان جهاز الاشراف متواجد بموقع العمل .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير ..

تحريرا في ٢٠٢٥/٠٤/١٥

٤/١٥
C.C

يعتمد ...

رئيس الادارة المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد محمد الله

مهندسة/

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل المحافظات قسم المصروفات العامة
رقم المصروف / ١٤٨٨٨
تاريخ / ١٦ / ٤ / ٢٠٢٥
التوقيع /

الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
