

بخصوص :- المستخلص رقم (٣) جارى عن
عملية: أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التراب
الصخرية التى تشكل مصادد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول
(١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (٣) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ٥٠ ع . ح بقيمة
المستخلص وبيان كالاتى :-

جملة الأعمال	٨١٨٢٧٥٠,٠٠	
سابق صرفة	٧٢٦٩٠٥٠,٠٠	
	٩١٣٧٠٠,٠٠	
الاستقطاعات		
قرش	جنية	
٠٠	٤٥٦٨٥	٥٪ لحسن سير العمل
٦٠	٢٢٣٢٧	عادى و اضافى
٤٠	—	توقيع وموارد
٦٥	٤١١١	نسبة ٥٠,٤٥ ٪ قيمة العمالة غير المنتظمة
٦٥	٤١١١	نسبة ٥٠,٤٥ ٪ قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد
٧٦٢٣٦,٣٠	٧٦٢٣٦,٣٠	جملة الاستقطاعات
٨٣٧٤٦٣,٧٠	صافى المبلغ	

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

(علاء عبدالعال حسين)

مهندس

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

- (١١) استمارة ٥٠ ع . ح
(٤) مستخلص
(١) كسر الاصل
(١) تقرير شهري واسيوس
(١) بياحه محلات

Y 22

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(10) ارجح فی ستم

[Return to top of page](#)

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

2014年12月

ادبيات موظفي الشطب

امضاء الكاتب الموقوف

امضاء الكاتب الموثق

إمضاء: الكاتب المخطوط.

2. Find the value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

111

القضايا

Question (7)

(٤) قیام فی مسجد

(۵) اورج فی کشف

البرنامج الزمني المقترح لنهو الاعمال في فترة من شهر 2024-8-1 حتي 2024-12-1

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكتلان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التراب الصخرية التي تشكل مصائد ومال على طريق ديروط / الغرافة بطول (150) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد)



البيد	الوحدة	أجمالي الكمية	Aug-2024				Sep-2024				Oct-2024				Nov-2024			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
إزالة كتلان الرملة الموجودة أعلى الطريق	3م	180000																
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر	3م	10																
بأتمر الكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد	3م	30																
توريد وفرض تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكتلان الرملية بسمن لا يقل 25 سم	2م	50000																

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



٢٠٢٤/٨/٢٣



بيان المعدات

التاريخ : 2024-9-10

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصادم رمال على طريق ديروط / الفرافرة بطول (150) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد)

اسم المشروع :

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة اتحاد بن اتش أسيوط للمقاولات العامة المتكاملة

رقم (2025/2024/112)

لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
2	لودر
6	عربية قلاب
1	تانك مياه
2	سيارات خدمة
2	هراس





عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب
الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم
نطاق (محافظة الوادي الجديد) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١٢).

مستخلص رقم ٣ جارى

البند	بيان الأعمال	كمية الحصر
١	بالمتر المكعب أعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلي من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفه باستخدام المكانس الميكانيكية والفنة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٨,١٧٩٦٦٠ م٣
٤	بالمتر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة بمنهجية تثبيت الغرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية باستخدام المعدات اللازمة مع الرش بالمياه وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	٤٥٥٠٠,٠٠ م٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة






بيان كميات بند رقم (1) أزالة الكتان الرملية المستخلص رقم (3) لشركة اتحادي أتش أسيوط

مهندس الشركة

التوقيع /

مهندس الهيئة

التوقيع /



أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التراب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الغرافرة / ديروط بطول (150) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد)

بيان كميات بند رقم (4) توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بن أنش أسبوت

ملاحظات	الكمية بالمتر المسطح	القطاع		البند	م
		الى	من		
الجانب الايسر	7500	54+200.00	54+050.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	1
الجانب الايمن	9000	60+030.00	59+850.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	2
الجانب الايسر	5000	59+950.00	59+850.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	3
الجانب الايسر	6000	31+300.00	31+000.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	4
الجانب الايسر	2500	25+312.50	25+062.50	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	5
الجانب الايسر	2500	57+850.00	57+600.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	6
الجانب الايسر	4000	62+000.00	61+600.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	7
الجانب الايسر	1000	27+100.00	27+000.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	8
الجانب الايسر	1000	18+155.00	18+055.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	9
الجانب الايسر	3500	135+450.00	135+100.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	10
الجانب الايسر	1500	135+950.00	135+800.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	11
الجانب الايسر	2000	136+600.00	136+400.00	توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية	12
	45500			الاجمــــــــــــــــالى	

مهندس الهيئة العامة للطرق والمواصلات
التوقيع /

مهندس الشركة
التوقيع /



أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 18+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
18+055.00	1.850	0.000	0.000
18+075.00	9.560	114.100	114.100
18+100.00	18.570	351.530	465.630
18+125.00	18.440	462.600	928.220
18+150.00	7.490	324.140	1252.370
18+155.00	4.130	29.060	1281.420

مهندس الهيئة



٣٧٦١٣

مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادي الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 25+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بي أتش أسيوط

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
25+062.50	0.090	0.000	0.000
25+075.00	1.140	7.680	7.680
25+100.00	14.120	190.760	198.440
25+125.00	25.830	499.400	697.840
25+150.00	36.920	784.420	1482.260
25+175.00	48.370	1066.140	2548.400
25+200.00	41.970	1129.240	3677.640
25+225.00	17.630	745.050	4422.690
25+250.00	2.760	254.960	4677.650
25+275.00	0.030	34.880	4712.530
25+300.00	0.030	0.700	4713.230
25+312.50	0.740	4.840	4718.070



مهندس الهيئة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التراب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادي الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 27+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بن اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
27+000.00	10.590	0.000	0.000
27+025.00	19.040	370.470	370.470
27+050.00	25.410	555.730	926.200
27+075.00	20.140	569.380	1495.590
27+100.00	12.780	411.470	1907.050

مهندس الهيئة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 30+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
30+000.00	11.700	0.000	0.000
30+025.00	23.430	439.040	439.040
30+050.00	24.360	597.360	1036.400
30+060.00	18.930	216.450	1252.850

مهندس الهيئة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 31+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى إتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
31+000.00	32.310	0.000	0.000
31+025.00	17.520	622.880	622.880
31+050.00	22.510	500.410	1123.290
31+075.00	38.360	760.910	1884.210
31+100.00	60.660	1237.740	3121.950
31+125.00	51.320	1399.760	4521.710
31+150.00	15.820	839.250	5360.960
31+175.00	13.080	361.280	5722.230
31+200.00	48.280	767.030	6489.260
31+225.00	133.620	2273.760	8763.020
31+250.00	138.970	3407.420	12170.440
31+275.00	119.690	3233.240	15403.680
31+300.00	112.850	2906.650	18310.330



مهندس الهيئة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 35+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
35+010.00	11.970	0.000	0.000
35+025.00	12.440	183.090	183.090
35+050.00	4.580	212.710	395.810
35+075.00	3.290	98.370	494.170
35+100.00	3.250	81.690	575.860
35+110.00	5.220	42.300	618.160

مهندس الهيئة

٣٧٦٦٣



مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 54+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
54+050.00	316.810	0.000	0.000
54+075.00	222.730	6744.300	6744.300
54+100.00	152.880	4695.110	11439.420
54+125.00	92.220	3063.630	14503.050
54+150.00	89.460	2270.930	16773.980
54+175.00	97.230	2333.670	19107.650
54+200.00	166.940	3302.190	22409.850

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 57+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
57+000.00	14.600	0.000	0.000
57+025.00	25.920	494.160	494.160
57+050.00	10.300	452.840	946.990
57+075.00	9.670	247.070	1194.060

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 58+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
57+600.00	0.000	0.000	0.000
57+625.00	0.000	0.000	0.000
57+650.00	0.000	0.000	0.000
57+675.00	18.850	235.650	235.650
57+700.00	32.330	639.780	875.430
57+725.00	30.250	762.730	1638.160
57+750.00	12.520	534.620	2172.780
57+775.00	0.030	161.260	2334.040
57+800.00	9.490	118.990	2453.030
57+825.00	9.930	242.790	2695.820
57+850.00	0.000	121.630	2817.450

مهندس الهيئة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادي الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 60+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بي أتش أسيوط

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
59+850.00	748.840	0.000	0.000
59+875.00	752.270	18983.470	18983.470
59+900.00	758.570	18885.460	37868.930
59+925.00	739.990	18864.760	56733.690
59+950.00	657.520	17468.980	74202.670
59+975.00	354.400	12387.090	86589.760
60+000.00	363.910	8978.840	95568.610
60+025.00	371.360	8468.540	104037.150
60+030.00	374.290	1864.130	105901.280

مهندس الهيئة

مهندس الشركة






أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادي الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 62+000 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بن اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
61+600.00	18.190	0.000	0.000
61+625.00	38.850	713.050	713.050
61+650.00	43.410	1028.210	1741.250
61+675.00	28.670	901.010	2642.260
61+700.00	3.960	407.880	3050.140
61+725.00	12.830	209.810	3259.950
61+750.00	19.480	403.820	3663.770
61+775.00	8.880	354.510	4018.270
61+800.00	0.030	111.430	4129.700
61+825.00	0.050	0.950	4130.660
61+850.00	0.070	1.450	4132.110
61+875.00	0.010	1.010	4133.120
61+900.00	0.030	0.490	4133.610
61+925.00	0.060	1.150	4134.760
61+950.00	0.040	1.230	4135.990
61+975.00	0.110	1.820	4137.810
62+000.00	0.030	1.700	4139.510



مهندس الهيئة

مهندس الشركة



أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 135+100 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
135+100.00	7.210	0.000	0.000
135+125.00	18.890	326.250	326.250
135+150.00	21.290	502.240	828.490
135+175.00	10.940	402.900	1231.390
135+200.00	0.510	143.210	1374.600
135+225.00	3.590	51.280	1425.880
135+250.00	7.000	132.350	1558.230
135+275.00	17.710	308.820	1867.050
135+300.00	33.950	645.680	2512.730
135+325.00	10.910	560.750	3073.480
135+350.00	17.750	358.310	3431.790
135+375.00	15.120	410.930	3842.720
135+400.00	2.690	222.580	4065.290
135+425.00	0.210	36.210	4101.500
135+450.00	3.920	51.610	4153.120



مهندس الهيئة

مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 135+600 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
135+600.00	11.230	0.000	0.000
135+625.00	24.470	446.160	446.160
135+650.00	26.850	641.400	1087.560
135+675.00	14.900	521.800	1609.360
135+700.00	2.130	212.830	1822.190

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 135+800 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بنى اتش أسبوط

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
135+800.00	12.830	0.000	0.000
135+825.00	27.390	502.690	502.690
135+850.00	30.180	719.610	1222.300
135+875.00	17.440	595.200	1817.500
135+900.00	2.850	253.600	2071.100
135+925.00	8.010	135.760	2206.870
135+950.00	12.390	254.970	2461.830

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 136+400 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بن إتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
136+400.00	9.520	0.000	0.000
136+425.00	24.040	419.530	419.530
136+450.00	27.620	645.670	1065.210
136+475.00	16.070	546.120	1611.330
136+500.00	2.000	225.910	1837.240
136+525.00	5.660	95.740	1932.980
136+550.00	10.600	203.220	2136.200
136+575.00	5.040	195.440	2331.640
136+600.00	8.400	168.020	2499.670

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادي الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 136+700 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بن اتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
136+700.00	3.800	0.000	0.000
136+725.00	16.150	249.380	249.380
136+750.00	19.410	444.510	693.890

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادي الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 136+900 المستخلص رقم (3) لشركة اتحاد بن إتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
136+900.00	5.250	0.000	0.000
136+925.00	16.470	271.490	271.490
136+950.00	18.690	439.490	710.980
136+975.00	8.560	340.570	1051.560
137+000.00	0.030	107.290	1158.850

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول 150 كم نطاق محافظة الوادى الجديد

كميات إزالة الكثبان الرملية تبة كم 137+200 المستخلص رقم (3) لشركة أتحاد بي إتش أسبوت

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
137+200.00	9.570	0.000	0.000
137+225.00	22.440	400.160	400.160
137+250.00	25.210	595.640	995.800
137+275.00	14.180	492.370	1488.170
137+300.00	2.170	204.320	1692.490
137+325.00	5.700	98.330	1790.820
137+350.00	9.670	192.160	1982.980
137+375.00	4.500	177.220	2160.190
137+400.00	8.330	160.410	2320.600

مهندس الهيئة



٢٠٢٠/١٢/٢٣

مهندس الشركة





مشروع:- اعمال إزالة الكتيان الرملية وتثبيتها وعمل توسة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد
رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد

تنفيذ : شركة اتحاد بي اتش أسيوط للمقاولات العمومية
التقرير الأسبوعي



الجهة المشرفة	الهيئة العامة للطرق والكبارى
الشركة المنفذة	اتحاد بي اتش اسيوط للمقاولات
الكمية المتوقعة ازالته	٣١٨٠٠٠٠
ماتم تنفيذه	٣١٧٩٦٦,١٨
تاريخ بدء العمل	٢٠٢٤/٧/٣١
نسبة التنفيذ	٩٩,٨%
مكونات المشروع	

* اعمال إزالة الكثبان الرملية أعلى الطريق والتي تعيق حركة المرور

* توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لا يقل ٢٥ سم

الاعمال

اتجاه الفراقة		الوحدة	البند	م
نسبة التنفيذ %	الكمية الاجمالية			

١٠٠% ١٨٠٠٠٠ ٣م اعمال ازالة الرمال السافية ١

١٠٠% ٤٥٨٣٠ ٢م توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكتبان الرملية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة ٢



١

البرنامج الزمني المقترح لنهـو الاعمال في فترة من شهر 1-8-2024 حتي 1-12-2024




عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكتلان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التياب الصخرية التي تشكل مصادد رمال على طريق ديروط / الفراوة بطول (150) كم نطاق (محافظة الوادى الجديد)

البيـد	الوحدة	أجمال الكمية	Aug-2024				Sep-2024				Oct-2024				Nov-2024			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
إزالة لكتلان الرملية الموجودة على الطريق	3م	180000																
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر	3م	10																
بالتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد	3م	30																
توريد وفرض تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكتلان الرملية بسمك لا يقل 25 سم	2م	50000																

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





بيان المعدات

التاريخ : 2024-9-10

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصادد رمال على طريق ديروط / الفراطرة بطول (150) كم نطاق (محافظة الوادى الجديد)

اسم المشروع :

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة اتحاد بن اتش أسيوط للمقاولات العامة المتكاملة

رقم (2025/2024/112)

لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
2	لودر
6	عربية قلاب
1	تانك مياه
2	سيارات خدمة
2	هراس

مهندس الهيئة

مهندس الشركة










مشروع:- اعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد
رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد

تنفيذ : شركة اتحاد بي اتش أسبيوط للمقاولات العمومية
التقرير الشهري

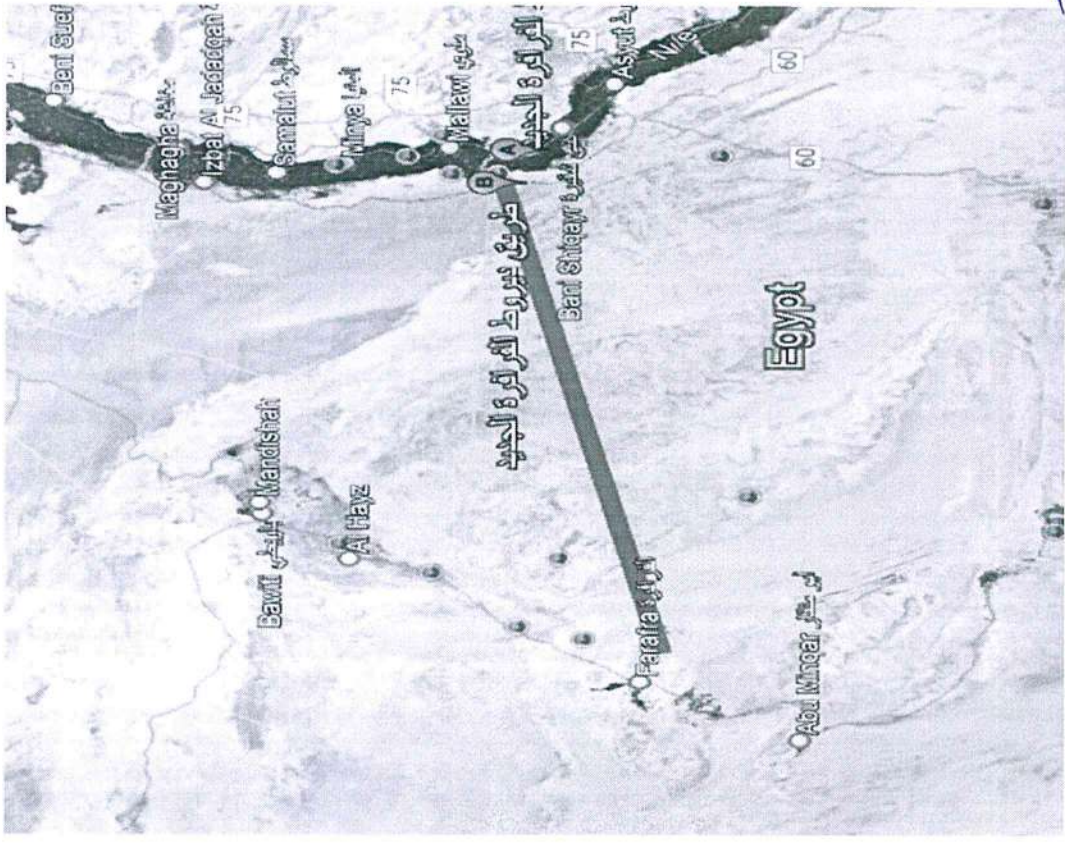

الجهة المشرفة	الهيئة العامة للطرق والكبارى
الشركة المنفذة	اتحاد بي انش اسبوت للمقاولات
الكمية المتوقعة ازالته	٣١٨٠٠٠٠
ماتم تنفيذه	٣١٧٩٦٦٠,١٨
تاريخ بدء العمل	٢٠٢٤/٧/٣١
نسبة التنفيذ	%٩٩,٨
مكونات المشروع	


*- اعمال إزالة الكثبان الرملية أعلى الطريق والتي تعيق حركة المرور
*- توريد وفرش تربة لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لا يقل ٢٥ سم

الاعمال

اتجاه القرافرة		الوحدة	البند	م
نسبة التنفيذ %	الكمية الاجمالية			

١٠٠% ١٨٠٠٠٠ ٣م اعمال إزالة الرمال السائفة ١

١٠٠% ٤٥٨٣٠ ٢م توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لا يقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة ٢



١

البرنامج الزمني المقترح لنهـو الاعمال في فترة من شهر 1-8-2024 حتي 1-12-2024




عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكتلان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التراب الصخرية التي تشكل مصادد رمال على طريق ديروط / القرارة بطول (150) كم نطاق (محافظة الوادى الجديد)

البنـد	الوحدة	إجمالي الكمية	Nov-2024				Oct-2024				Sep-2024				Aug-2024			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
إزالة لكتلان الرملية الموجودة اعلى الطريق	3م	180000																
أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر	3م	10																
بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد	3م	30																
توريد وفوش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكتلان الرملية بسمك لا يقل 25 سم	2م	50000																

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





بيان المعدات

التاريخ : 2024-9-10

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصادد رمال على طريق ديروط / الفرازة بطول (150) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد)

اسم المشروع :

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة اتحاد بن اتش أسيوط للمقاولات العامة المتكاملة

رقم (2025/2024/112)

لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :



العدد	المعدة
2	لودر
6	عربية قلاب
1	تألك مياه
2	سيارات خدمة
2	هراس

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



صور المشروع

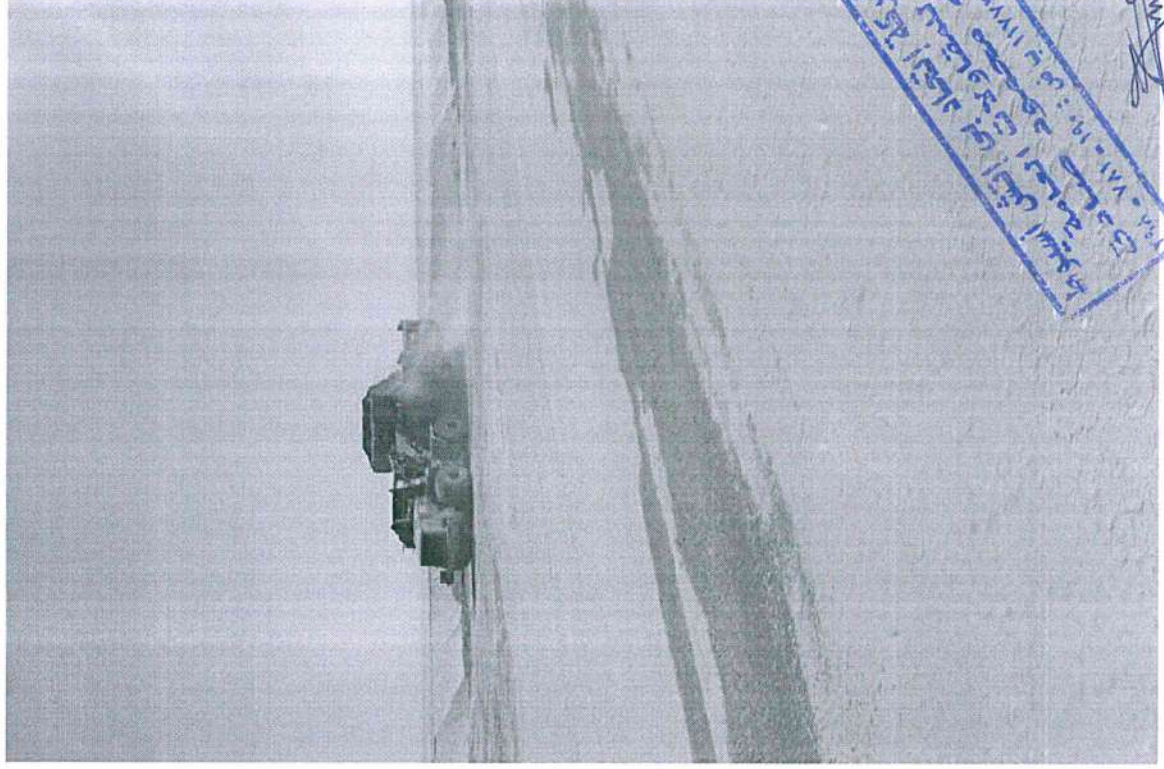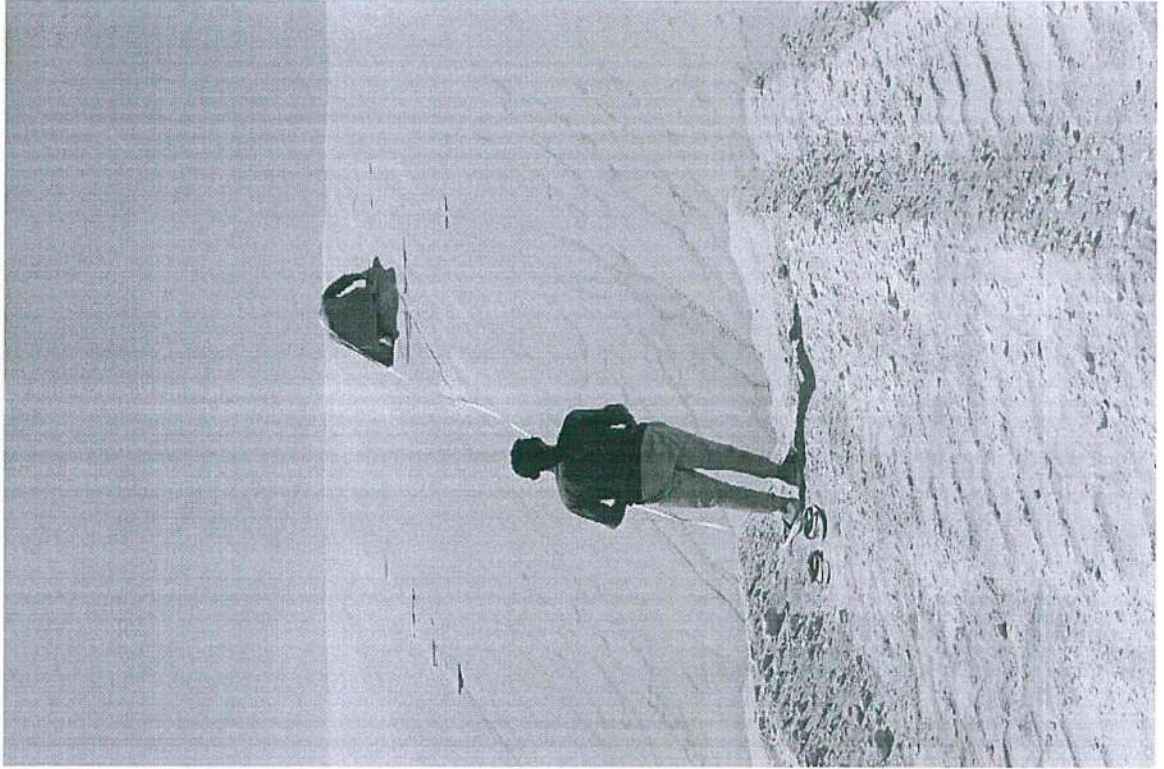

Handwritten signature or initials.



مشروع:- اعمال إزالة الكتبان الرملية وتنشيتها على طريق الفراقرة / ديروط بطول ١٥٠ نطاق محافظة الوادي الجديد

صور المشروع

