



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى
(القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة والتوريدات



مقايضة ختامية لعقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣

رقم البند	البند	الوحدة	الكميات العقد طبقا لأخر مفاوضة			كميات المقايضة الختامية طبقا لأخر مفاوضة		
			الكمية	الفئة	الإجمالي	الكمية	الفئة	الإجمالي
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم	م٢	٢٣٠٠٠	٦٠,٠٠	١٣٨٠٠٠٠,٠٠٠	٢٢٩٥٣,٢٩٥	٦٠,٠٠	١٣٧٧١٩٧,٧٠٠
٦	توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية	طن	٧١٥	١٣٠٠,٠٠	٩٢٩٥٠٠,٠٠٠	٧٢٠,٦١٩	١٣٠٠,٠٠	٩٣٦٨٠٤,٧٠٠
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م٢	م٢	٢٣٠٠٠	٢٥,٠٠	٥٧٥٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧٤٠,٦٦٠	٢٥,٠٠	٥٦٨٥١٦,٥٠٠
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٣ ب)	م٢	٢٣٠٠٠	١٠٩,٠٠	٢٥٠٧٠٠٠,٠٠٠	٢٢٧٤٠,٦٦٠	١٠٩,٠٠	٢٤٧٨٧٣١,٩٤٠
الإجمالي			٥٣٩١٥٠٠,٠٠٠			٥٣٦١٢٥٠,٨٤٠		

مدير عام الصيانة
م / محمود عبد الغنى
التوقيع

مهندس المشروع بالهيئة
م / عطا زايد عطا
التوقيع

مهندس الشركة
م / محمود أحمد سيد
التوقيع

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (اسيوط - المنيا)
مهندس / اسلام محمد فوزى



التوقيع



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



بيان الأعمال الواردة بالمستخلص رقم (٥) ختامى

بند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية الأعمال السابقة	كمية الأعمال التي تمت خلال فترة المستخلص	إجمالي كمية الأعمال حتى تاريخ المستخلص	الموقع (كم)		ملاحظات
						من	الى	
5	توريد وفرش طبقة أساس وإعادة التدوير باستخدام ماكينة FDR	م ^٢	٢٢٠٠٠,٠٠٠	٩٥٣,٢٩٥	٢٢٩٥٣,٢٩٥	٠٠+٠٧٠	٠٢+٠٨٠	
6	بالطن توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم	طن	٧٠٠,٠٠٠	٢٠,٦١٩	٧٢٠,٦١٩	٠٠+٠٧٠	٠٢+٠٨٠	
7	أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م ^٢ ...	م ^٢	٢٢٠٠٠,٠٠٠	٧٤٠,٦٦٠	٢٢٧٤٠,٦٦٠	٠٠+٠٦٠	٠٢+٠٨٠	
8	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم	م ^٢	٢٠٣٥٠,٠٠٠	٢٣٩٠,٦٦٠	٢٢٧٤٠,٦٦٠	٠٠+٠٦٠	٠٢+٠٨٠	

مهندس المشروع بالهيئة

م / عطا زايد عطا

التوقيع /

مهندس الشركة

م / محمود أحمد سيد

التوقيع /



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة وانشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



بيان بكميات بند رقم (٥) الواردة بالمستخلص رقم (٥) ختامى

مسمى بند رقم (٥)

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم في الطريق القائم بإستخدام ماكينة FDR

22,953.295

بيان الكمية المنفذة

مهندس الهيئة

م / عطا زايد عطا

التوقيع /

مهندس الاستشارى

م / أحمد محمد عبد المنعم

التوقيع /

مهندس الشركة

م / محمود أحمد سيد

التوقيع /



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند: بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مئبث وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة FDR

رقم البند : ه
أعمال FDR

المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
00+070	12.690	0.000	0.000
00+080	12.869	127.795	127.795
00+100	12.260	251.290	379.085
00+120	11.786	240.460	619.545
00+140	11.785	235.710	855.255
00+160	12.592	243.770	1,099.025
00+180	12.249	248.410	1,347.435
00+200	12.026	242.750	1,590.185
00+220	11.980	240.060	1,830.245
00+240	11.985	239.650	2,069.895
00+260	11.827	238.120	2,308.015
00+280	11.731	235.580	2,543.595
00+300	10.802	225.330	2,768.925
00+320	10.667	214.690	2,983.615
00+340	10.340	210.070	3,193.685
00+360	10.348	206.880	3,400.565
00+380	10.564	209.120	3,609.685
00+400	10.500	210.640	3,820.325
00+420	10.744	212.440	4,032.765
00+440	10.954	216.980	4,249.745
00+460	11.005	219.590	4,469.335
00+480	11.153	221.580	4,690.915
00+500	11.461	226.140	4,917.055
00+520	11.523	229.840	5,146.895
00+540	11.565	230.880	5,377.775
00+560	11.534	230.990	5,608.765
00+580	11.401	229.350	5,838.115
00+600	11.408	228.090	6,066.205
00+620	11.553	229.610	6,295.815
00+640	11.452	230.050	6,525.865
00+660	11.381	228.330	6,754.195
00+680	11.640	230.210	6,984.405
00+700	11.439	230.790	7,215.195
00+720	11.661	231.000	7,446.195
00+740	11.410	230.710	7,676.905
00+760	11.271	226.810	7,903.715
00+780	11.152	224.230	8,127.945
00+800	11.073	222.250	8,350.195
00+820	11.114	221.870	8,572.065

مهندس الاستشاري

الرجح

مهندس الشركة

الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند: بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس ميثب وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة FDR

رقم البند : ٥
أعمال FDR

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
8,793.575	221.510	11.037	00+840
9,012.025	218.450	10.808	00+860
9,227.205	215.180	10.710	00+880
9,441.345	214.140	10.704	00+900
9,655.835	214.490	10.745	00+920
9,869.585	213.750	10.630	00+940
10,082.405	212.820	10.652	00+960
10,294.575	212.170	10.565	00+980
10,505.625	211.050	10.540	01+000
10,726.975	221.350	11.595	01+020
10,963.635	236.660	12.071	01+040
11,208.625	244.990	12.428	01+060
11,456.005	247.380	12.310	01+080
11,700.555	244.550	12.145	01+100
11,941.515	240.960	11.951	01+120
12,176.335	234.820	11.531	01+140
12,402.885	226.550	11.124	01+160
12,624.695	221.810	11.057	01+180
12,849.915	225.220	11.465	01+200
13,078.455	228.540	11.389	01+220
13,308.345	229.890	11.600	01+240
13,536.765	228.420	11.242	01+260
13,761.235	224.470	11.205	01+280
13,985.795	224.560	11.251	01+300
14,211.715	225.920	11.341	01+320
14,438.565	226.850	11.344	01+340
14,666.795	228.230	11.479	01+360
14,894.825	228.030	11.324	01+380
15,121.925	227.100	11.386	01+400
15,348.875	226.950	11.309	01+420
15,574.935	226.060	11.297	01+440
15,801.695	226.760	11.379	01+460
16,032.335	230.640	11.685	01+480
16,263.845	231.510	11.466	01+500
16,492.845	229.000	11.434	01+520
16,720.855	228.010	11.367	01+540
16,947.385	226.530	11.286	01+560
17,175.985	228.600	11.574	01+580
17,410.365	234.380	11.864	01+600
17,646.725	236.360	11.772	01+620

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة وانشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند: بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠ سم في الطريق القائم باستخدام ماكينة FDR

رقم البند : ٥
أعمال FDR

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
17,880.335	233.610	11.589	01+640
18,111.565	231.230	11.534	01+660
18,342.155	230.590	11.525	01+680
18,571.535	229.380	11.413	01+700
18,801.835	230.300	11.617	01+720
19,034.895	233.060	11.689	01+740
19,267.155	232.260	11.537	01+760
19,499.235	232.080	11.671	01+780
19,731.605	232.370	11.566	01+800
19,962.975	231.370	11.571	01+820
20,195.905	232.930	11.722	01+840
20,427.545	231.640	11.442	01+860
20,657.775	230.230	11.581	01+880
20,889.235	231.460	11.565	01+900
21,121.055	231.820	11.617	01+920
21,352.295	231.240	11.507	01+940
21,583.145	230.850	11.578	01+960
21,815.005	231.860	11.608	01+980
22,046.855	231.850	11.577	02+000
22,276.515	229.660	11.389	02+020
22,504.145	227.630	11.374	02+040
22,729.585	225.440	11.170	02+060
22,953.295	223.710	11.201	02+080

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



بيان بكميات بند رقم (٦) الواردة بالمستخلص رقم (٥) ختامى

مسمى بند رقم (٦)
بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخلطة التصميمية المعتمدة

720.619

بيان الكمية المنفذة

مهندس الهيئة

م / عطا زايد عطا

التوقيع /

مهندس الاستشارى

م / أحمد محمد عبد المنعم

التوقيع /

مهندس الشركة

م / محمود أحمد سيد

التوقيع /



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند: بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة

رقم البند : ٦
أعمال الاسمنت

المحطة	العرض	المساحة	كمية الاسمنت (بالطن)	كمية الاسمنت التراكمية (بالطن)
00+070	12.690	0.000	0.000	0.000
00+080	12.869	127.795	4.012	4.012
00+100	12.260	251.290	7.889	11.901
00+120	11.786	240.460	7.549	19.451
00+140	11.785	235.710	7.400	26.851
00+160	12.592	243.770	7.653	34.504
00+180	12.249	248.410	7.799	42.303
00+200	12.026	242.750	7.621	49.924
00+220	11.980	240.060	7.537	57.461
00+240	11.985	239.650	7.524	64.984
00+260	11.827	238.120	7.476	72.460
00+280	11.731	235.580	7.396	79.856
00+300	10.802	225.330	7.074	86.930
00+320	10.667	214.690	6.740	93.671
00+340	10.340	210.070	6.595	100.266
00+360	10.348	206.880	6.495	106.761
00+380	10.564	209.120	6.565	113.326
00+400	10.500	210.640	6.613	119.939
00+420	10.744	212.440	6.670	126.609
00+440	10.954	216.980	6.812	133.421
00+460	11.005	219.590	6.894	140.315
00+480	11.153	221.580	6.957	147.271
00+500	11.461	226.140	7.100	154.371
00+520	11.523	229.840	7.216	161.587
00+540	11.565	230.880	7.248	168.835
00+560	11.534	230.990	7.252	176.087
00+580	11.401	229.350	7.200	183.288
00+600	11.408	228.090	7.161	190.449
00+620	11.553	229.610	7.209	197.657
00+640	11.452	230.050	7.222	204.880
00+660	11.381	228.330	7.168	212.048
00+680	11.640	230.210	7.227	219.275
00+700	11.439	230.790	7.246	226.521
00+720	11.661	231.000	7.252	233.773
00+740	11.410	230.710	7.243	241.016
00+760	11.271	226.810	7.121	248.137
00+780	11.152	224.230	7.040	255.177
00+800	11.073	222.250	6.978	262.154
00+820	11.114	221.870	6.966	269.120
00+840	11.037	221.510	6.954	276.074
00+860	10.808	218.450	6.858	282.933
00+880	10.710	215.180	6.756	289.688

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند: بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة

رقم البند : ٦
أعمال الاسمنت

كمية الاسمنت التراكمية (بالطن)	كمية الاسمنت (بالطن)	المساحة	العرض	المحطة
296.411	6.723	214.140	10.704	00+900
303.145	6.734	214.490	10.745	00+920
309.856	6.711	213.750	10.630	00+940
316.537	6.681	212.820	10.652	00+960
323.198	6.661	212.170	10.565	00+980
329.824	6.626	211.050	10.540	01+000
336.773	6.949	221.350	11.595	01+020
344.203	7.430	236.660	12.071	01+040
351.895	7.691	244.990	12.428	01+060
359.661	7.766	247.380	12.310	01+080
367.339	7.678	244.550	12.145	01+100
374.904	7.565	240.960	11.951	01+120
382.276	7.372	234.820	11.531	01+140
389.389	7.113	226.550	11.124	01+160
396.352	6.964	221.810	11.057	01+180
403.423	7.071	225.220	11.465	01+200
410.598	7.175	228.540	11.389	01+220
417.815	7.217	229.890	11.600	01+240
424.987	7.171	228.420	11.242	01+260
432.034	7.047	224.470	11.205	01+280
439.084	7.050	224.560	11.251	01+300
446.177	7.093	225.920	11.341	01+320
453.299	7.122	226.850	11.344	01+340
460.464	7.165	228.230	11.479	01+360
467.623	7.159	228.030	11.324	01+380
474.753	7.130	227.100	11.386	01+400
481.878	7.125	226.950	11.309	01+420
488.975	7.097	226.060	11.297	01+440
496.094	7.119	226.760	11.379	01+460
503.335	7.241	230.640	11.685	01+480
510.603	7.268	231.510	11.466	01+500
517.793	7.189	229.000	11.434	01+520
524.951	7.158	228.010	11.367	01+540
532.063	7.112	226.530	11.286	01+560
539.240	7.177	228.600	11.574	01+580
546.598	7.358	234.380	11.864	01+600
554.019	7.421	236.360	11.772	01+620
561.353	7.334	233.610	11.589	01+640
568.613	7.259	231.230	11.534	01+660
575.852	7.239	230.590	11.525	01+680
583.053	7.201	229.380	11.413	01+700
590.284	7.230	230.300	11.617	01+720

مهندس الشركة

مهندس الاستشارى



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند: بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة

رقم البند : ٦
أعمال الاسمنت

كمية الاسمنت التراكمية (بالطن)	كمية الاسمنت (بالطن)	المساحة	العرض	المحطة
597.601	7.317	233.060	11.689	01+740
604.892	7.292	232.260	11.537	01+760
612.178	7.286	232.080	11.671	01+780
619.474	7.295	232.370	11.566	01+800
626.738	7.264	231.370	11.571	01+820
634.050	7.313	232.930	11.722	01+840
641.323	7.272	231.640	11.442	01+860
648.551	7.228	230.230	11.581	01+880
655.818	7.267	231.460	11.565	01+900
663.096	7.278	231.820	11.617	01+920
670.355	7.260	231.240	11.507	01+940
677.603	7.248	230.850	11.578	01+960
684.882	7.279	231.860	11.608	01+980
692.161	7.279	231.850	11.577	02+000
699.371	7.210	229.660	11.389	02+020
706.518	7.146	227.630	11.374	02+040
713.595	7.078	225.440	11.170	02+060
720.619	7.023	223.710	11.201	02+080

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



بيان بكميات بند رقم (٧) الواردة بالمستخلص رقم (٥) ختامى

مسمى بند رقم (٧)
بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م٢ ...

22,740.660

بيان الكمية المنفذة

مهندس الهيئة

م / عطا زايد عطا

التوقيع /

مهندس الاستشارى

م / أحمد محمد عبد المنعم

التوقيع /

مهندس الشركة

م / محمود أحمد سيد

التوقيع /



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م^٢ ...

رقم البند : ٧
أعمال M.C

المحطة	العرض	المساحة	المساحة التراكمية
00+060	12.264	0.000	0.000
00+070	12.164	122.140	122.140
00+080	12.202	121.830	243.970
00+090	12.196	121.990	365.960
00+100	11.949	120.725	486.685
00+110	11.781	118.650	605.335
00+120	11.600	116.905	722.240
00+130	11.580	115.900	838.140
00+140	11.584	115.820	953.960
00+150	11.753	116.685	1070.645
00+160	12.065	119.090	1189.735
00+170	12.051	120.580	1310.315
00+180	11.791	119.210	1429.525
00+190	11.684	117.375	1546.900
00+200	11.628	116.560	1663.460
00+210	11.506	115.670	1779.130
00+220	11.331	114.185	1893.315
00+230	11.141	112.360	2005.675
00+240	11.192	111.665	2117.340
00+250	11.214	112.030	2229.370
00+260	11.230	112.220	2341.590
00+270	11.216	112.230	2453.820
00+280	11.089	111.525	2565.345
00+290	11.251	111.700	2677.045
00+300	10.782	110.165	2787.210
00+310	10.718	107.500	2894.710
00+320	10.645	106.815	3001.525
00+330	10.590	106.175	3107.700
00+340	10.416	105.030	3212.730
00+350	10.317	103.665	3316.395
00+360	10.401	103.590	3419.985
00+370	10.448	104.245	3524.230
00+380	10.543	104.955	3629.185
00+390	10.524	105.335	3734.520
00+400	10.609	105.665	3840.185
00+410	10.669	106.390	3946.575
00+420	10.794	107.315	4053.890
00+430	10.962	108.780	4162.670
00+440	10.976	109.690	4272.360

مهندس الاستشارى

أحمد محمد

مهندس الشركة

أحمد محمد



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م ٢ ...

رقم البند : ٧
أعمال M.C

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
4382.560	110.200	11.064	00+450
4493.290	110.730	11.082	00+460
4604.330	111.040	11.126	00+470
4716.190	111.860	11.246	00+480
4829.235	113.045	11.363	00+490
4943.020	113.785	11.394	00+500
5056.860	113.840	11.374	00+510
5171.270	114.410	11.508	00+520
5286.645	115.375	11.567	00+530
5401.940	115.295	11.492	00+540
5516.680	114.740	11.456	00+550
5631.275	114.595	11.463	00+560
5745.470	114.195	11.376	00+570
5859.260	113.790	11.382	00+580
5973.190	113.930	11.404	00+590
6087.650	114.460	11.488	00+600
6202.660	115.010	11.514	00+610
6317.460	114.800	11.446	00+620
6431.390	113.930	11.340	00+630
6545.980	114.590	11.578	00+640
6661.180	115.200	11.462	00+650
6775.790	114.610	11.460	00+660
6891.075	115.285	11.597	00+670
7006.370	115.295	11.462	00+680
7120.125	113.755	11.289	00+690
7232.870	112.745	11.260	00+700
7345.450	112.580	11.256	00+710
7457.940	112.490	11.242	00+720
7570.875	112.935	11.345	00+730
7684.275	113.400	11.335	00+740
7797.205	112.930	11.251	00+750
7909.175	111.970	11.143	00+760
8020.375	111.200	11.097	00+770
8131.170	110.795	11.062	00+780
8241.290	110.120	10.962	00+790
8349.705	108.415	10.721	00+800
8457.715	108.010	10.881	00+810
8567.025	109.310	10.981	00+820
8676.565	109.540	10.927	00+830
8785.455	108.890	10.851	00+840

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م ٢ ...

رقم البند : ٧
أعمال M.C

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
8893.370	107.915	10.732	00+850
9000.305	106.935	10.655	00+860
9106.860	106.555	10.656	00+870
9213.955	107.095	10.763	00+880
9321.700	107.745	10.786	00+890
9429.755	108.055	10.825	00+900
9537.850	108.095	10.794	00+910
9646.395	108.545	10.915	00+920
9757.175	110.780	11.241	00+930
9870.670	113.495	11.458	00+940
9986.980	116.310	11.804	00+950
10105.630	118.650	11.926	00+960
10225.435	119.805	12.035	00+970
10346.940	121.505	12.266	00+980
10467.085	120.145	11.763	00+990
10585.940	118.855	12.008	01+000
10704.120	118.180	11.628	01+010
10819.785	115.665	11.505	01+020
10936.910	117.125	11.920	01+030
11056.775	119.865	12.053	01+040
11177.370	120.595	12.066	01+050
11298.220	120.850	12.104	01+060
11419.860	121.640	12.224	01+070
11541.865	122.005	12.177	01+080
11661.805	119.940	11.811	01+090
11780.515	118.710	11.931	01+100
11900.260	119.745	12.018	01+110
12019.655	119.395	11.861	01+120
12138.085	118.430	11.825	01+130
12256.425	118.340	11.843	01+140
12372.510	116.085	11.374	01+150
12486.260	113.750	11.376	01+160
12599.795	113.535	11.331	01+170
12713.640	113.845	11.438	01+180
12827.575	113.935	11.349	01+190
12939.525	111.950	11.041	01+200
13051.710	112.185	11.396	01+210
13165.530	113.820	11.368	01+220
13279.260	113.730	11.378	01+230
13393.140	113.880	11.398	01+240

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م^٢ ...

رقم البند : ٧
أعمال M.C

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
13506.900	113.760	11.354	01+250
13620.095	113.195	11.285	01+260
13732.915	112.820	11.279	01+270
13846.005	113.090	11.339	01+280
13959.705	113.700	11.401	01+290
14073.865	114.160	11.431	01+300
14187.790	113.925	11.354	01+310
14301.015	113.225	11.291	01+320
14414.250	113.235	11.356	01+330
14527.860	113.610	11.366	01+340
14641.990	114.130	11.460	01+350
14756.570	114.580	11.456	01+360
14871.290	114.720	11.488	01+370
14986.300	115.010	11.514	01+380
15101.490	115.190	11.524	01+390
15216.630	115.140	11.504	01+400
15331.470	114.840	11.464	01+410
15445.955	114.485	11.433	01+420
15560.375	114.420	11.451	01+430
15674.615	114.240	11.397	01+440
15788.995	114.380	11.479	01+450
15903.935	114.940	11.509	01+460
16019.415	115.480	11.587	01+470
16135.205	115.790	11.571	01+480
16251.225	116.020	11.633	01+490
16368.195	116.970	11.761	01+500
16485.860	117.665	11.772	01+510
16602.215	116.355	11.499	01+520
16716.045	113.830	11.267	01+530
16827.330	111.285	10.990	01+540
16936.405	109.075	10.825	01+550
17044.465	108.060	10.787	01+560
17152.735	108.270	10.867	01+570
17262.155	109.420	11.017	01+580
17373.480	111.325	11.248	01+590
17486.415	112.935	11.339	01+600
17600.130	113.715	11.404	01+610
17714.710	114.580	11.512	01+620
17829.690	114.980	11.484	01+630
17943.340	113.650	11.246	01+640

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعي الغربي (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م^٢ ...

رقم البند : ٧
أعمال M.C

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
18054.990	111.650	11.084	01+650
18165.285	110.295	10.975	01+660
18274.590	109.305	10.886	01+670
18383.195	108.605	10.835	01+680
18491.870	108.675	10.900	01+690
18600.840	108.970	10.894	01+700
18709.710	108.870	10.880	01+710
18819.030	109.320	10.984	01+720
18928.370	109.340	10.884	01+730
19038.165	109.795	11.075	01+740
19148.145	109.980	10.921	01+750
19257.085	108.940	10.867	01+760
19365.550	108.465	10.826	01+770
19474.030	108.480	10.870	01+780
19582.340	108.310	10.792	01+790
19690.160	107.820	10.772	01+800
19798.525	108.365	10.901	01+810
19907.875	109.350	10.969	01+820
20017.055	109.180	10.867	01+830
20125.705	108.650	10.863	01+840
20233.910	108.205	10.778	01+850
20341.445	107.535	10.729	01+860
20448.685	107.240	10.719	01+870
20556.155	107.470	10.775	01+880
20664.260	108.105	10.846	01+890
20773.030	108.770	10.908	01+900
20882.585	109.555	11.003	01+910
20993.080	110.495	11.096	01+920
21103.455	110.375	10.979	01+930
21213.655	110.200	11.061	01+940
21324.395	110.740	11.087	01+950
21435.750	111.355	11.184	01+960
21547.190	111.440	11.104	01+970
21657.660	110.470	10.990	01+980
21767.400	109.740	10.958	01+990
21877.020	109.620	10.966	02+000
21986.290	109.270	10.888	02+010
22095.560	109.270	10.966	02+020
22205.260	109.700	10.974	02+030
22314.415	109.155	10.857	02+040

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة




مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم / م^٢ ...

رقم البند : ٧
أعمال M.C

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
22422.135	107.720	10.687	02+050
22528.860	106.725	10.658	02+060
22634.810	105.950	10.532	02+070
22740.660	105.850	10.638	02+080

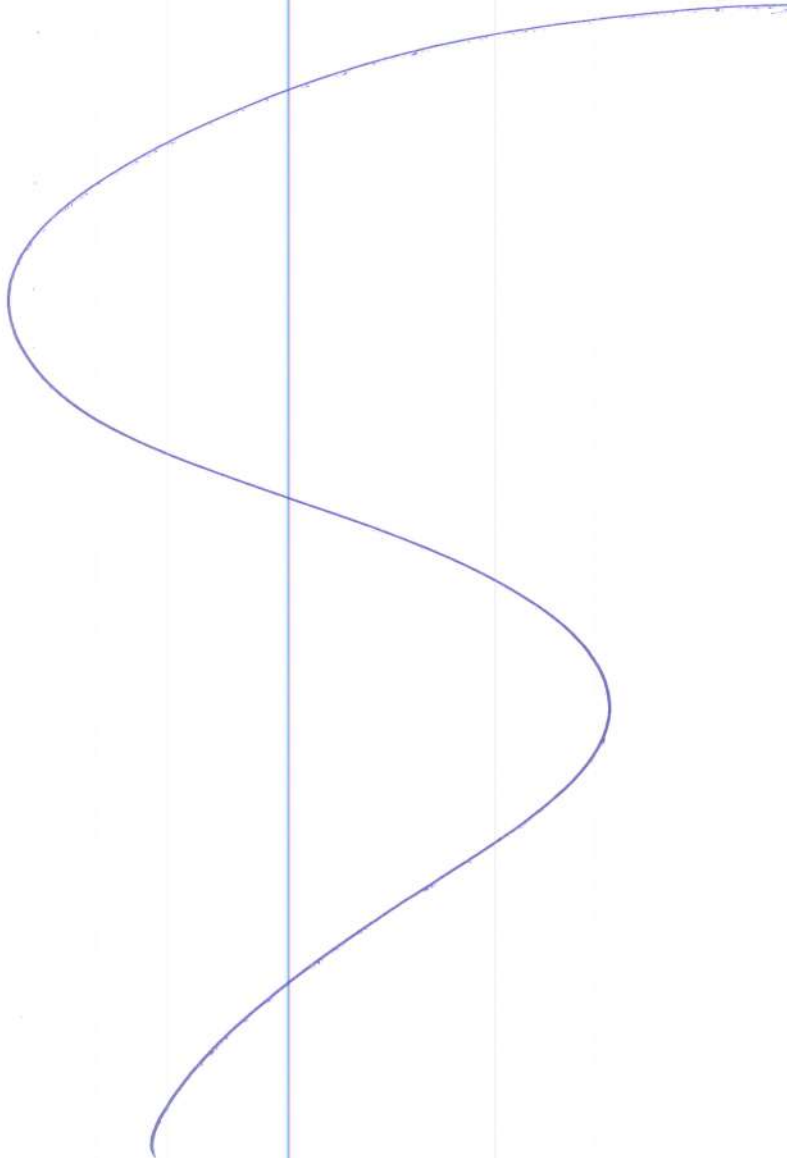

مهندس الاستشاري

أ. محمد

مهندس الشركة

أ. محمد



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



بيان بكميات بند رقم (٨) الواردة بالمستخلص رقم (٥) ختامى

مسمى بند رقم (٨)
بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

22,740.66

بيان الكمية المنفذة

مهندس الهيئة

م / عطا زايد عطا

التوقيع /

مهندس الاستشارى

م / أحمد محمد عبد المنعم

التوقيع /

مهندس الشركة

م / محمود أحمد سيد

التوقيع /



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : ٨
أعمال طبقة اسفلت سطحية

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
0.000	0.000	12.264	00+060
122.140	122.140	12.164	00+070
243.970	121.830	12.202	00+080
365.960	121.990	12.196	00+090
486.685	120.725	11.949	00+100
605.335	118.650	11.781	00+110
722.240	116.905	11.600	00+120
838.140	115.900	11.580	00+130
953.960	115.820	11.584	00+140
1070.645	116.685	11.753	00+150
1189.735	119.090	12.065	00+160
1310.315	120.580	12.051	00+170
1429.525	119.210	11.791	00+180
1546.900	117.375	11.684	00+190
1663.460	116.560	11.628	00+200
1779.130	115.670	11.506	00+210
1893.315	114.185	11.331	00+220
2005.675	112.360	11.141	00+230
2117.340	111.665	11.192	00+240
2229.370	112.030	11.214	00+250
2341.590	112.220	11.230	00+260
2453.820	112.230	11.216	00+270
2565.345	111.525	11.089	00+280
2677.045	111.700	11.251	00+290
2787.210	110.165	10.782	00+300
2894.710	107.500	10.718	00+310
3001.525	106.815	10.645	00+320
3107.700	106.175	10.590	00+330
3212.730	105.030	10.416	00+340
3316.395	103.665	10.317	00+350
3419.985	103.590	10.401	00+360
3524.230	104.245	10.448	00+370
3629.185	104.955	10.543	00+380
3734.520	105.335	10.524	00+390
3840.185	105.665	10.609	00+400
3946.575	106.390	10.669	00+410
4053.890	107.315	10.794	00+420
4162.670	108.780	10.962	00+430
4272.360	109.690	10.976	00+440

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : ٨
أعمال طبقة اسفلت سطحية

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
4382.560	110.200	11.064	00+450
4493.290	110.730	11.082	00+460
4604.330	111.040	11.126	00+470
4716.190	111.860	11.246	00+480
4829.235	113.045	11.363	00+490
4943.020	113.785	11.394	00+500
5056.860	113.840	11.374	00+510
5171.270	114.410	11.508	00+520
5286.645	115.375	11.567	00+530
5401.940	115.295	11.492	00+540
5516.680	114.740	11.456	00+550
5631.275	114.595	11.463	00+560
5745.470	114.195	11.376	00+570
5859.260	113.790	11.382	00+580
5973.190	113.930	11.404	00+590
6087.650	114.460	11.488	00+600
6202.660	115.010	11.514	00+610
6317.460	114.800	11.446	00+620
6431.390	113.930	11.340	00+630
6545.980	114.590	11.578	00+640
6661.180	115.200	11.462	00+650
6775.790	114.610	11.460	00+660
6891.075	115.285	11.597	00+670
7006.370	115.295	11.462	00+680
7120.125	113.755	11.289	00+690
7232.870	112.745	11.260	00+700
7345.450	112.580	11.256	00+710
7457.940	112.490	11.242	00+720
7570.875	112.935	11.345	00+730
7684.275	113.400	11.335	00+740
7797.205	112.930	11.251	00+750
7909.175	111.970	11.143	00+760
8020.375	111.200	11.097	00+770
8131.170	110.795	11.062	00+780
8241.290	110.120	10.962	00+790
8349.705	108.415	10.721	00+800
8457.715	108.010	10.881	00+810
8567.025	109.310	10.981	00+820
8676.565	109.540	10.927	00+830
8785.455	108.890	10.851	00+840

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : ٨
أعمال طبقة اسفلت سطحية

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
8893.370	107.915	10.732	00+850
9000.305	106.935	10.655	00+860
9106.860	106.555	10.656	00+870
9213.955	107.095	10.763	00+880
9321.700	107.745	10.786	00+890
9429.755	108.055	10.825	00+900
9537.850	108.095	10.794	00+910
9646.395	108.545	10.915	00+920
9757.175	110.780	11.241	00+930
9870.670	113.495	11.458	00+940
9986.980	116.310	11.804	00+950
10105.630	118.650	11.926	00+960
10225.435	119.805	12.035	00+970
10346.940	121.505	12.266	00+980
10467.085	120.145	11.763	00+990
10585.940	118.855	12.008	01+000
10704.120	118.180	11.628	01+010
10819.785	115.665	11.505	01+020
10936.910	117.125	11.920	01+030
11056.775	119.865	12.053	01+040
11177.370	120.595	12.066	01+050
11298.220	120.850	12.104	01+060
11419.860	121.640	12.224	01+070
11541.865	122.005	12.177	01+080
11661.805	119.940	11.811	01+090
11780.515	118.710	11.931	01+100
11900.260	119.745	12.018	01+110
12019.655	119.395	11.861	01+120
12138.085	118.430	11.825	01+130
12256.425	118.340	11.843	01+140
12372.510	116.085	11.374	01+150
12486.260	113.750	11.376	01+160
12599.795	113.535	11.331	01+170
12713.640	113.845	11.438	01+180
12827.575	113.935	11.349	01+190
12939.525	111.950	11.041	01+200
13051.710	112.185	11.396	01+210
13165.530	113.820	11.368	01+220
13279.260	113.730	11.378	01+230
13393.140	113.880	11.398	01+240

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة لبيانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : ٨
أعمال طبقة اسفلت سطحية

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
13506.900	113.760	11.354	01+250
13620.095	113.195	11.285	01+260
13732.915	112.820	11.279	01+270
13846.005	113.090	11.339	01+280
13959.705	113.700	11.401	01+290
14073.865	114.160	11.431	01+300
14187.790	113.925	11.354	01+310
14301.015	113.225	11.291	01+320
14414.250	113.235	11.356	01+330
14527.860	113.610	11.366	01+340
14641.990	114.130	11.460	01+350
14756.570	114.580	11.456	01+360
14871.290	114.720	11.488	01+370
14986.300	115.010	11.514	01+380
15101.490	115.190	11.524	01+390
15216.630	115.140	11.504	01+400
15331.470	114.840	11.464	01+410
15445.955	114.485	11.433	01+420
15560.375	114.420	11.451	01+430
15674.615	114.240	11.397	01+440
15788.995	114.380	11.479	01+450
15903.935	114.940	11.509	01+460
16019.415	115.480	11.587	01+470
16135.205	115.790	11.571	01+480
16251.225	116.020	11.633	01+490
16368.195	116.970	11.761	01+500
16485.860	117.665	11.772	01+510
16602.215	116.355	11.499	01+520
16716.045	113.830	11.267	01+530
16827.330	111.285	10.990	01+540
16936.405	109.075	10.825	01+550
17044.465	108.060	10.787	01+560
17152.735	108.270	10.867	01+570
17262.155	109.420	11.017	01+580
17373.480	111.325	11.248	01+590
17486.415	112.935	11.339	01+600
17600.130	113.715	11.404	01+610
17714.710	114.580	11.512	01+620
17829.690	114.980	11.484	01+630
17943.340	113.650	11.246	01+640

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



مشروع تنفيذ أعمال طريق أبوقرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسبك ٥ سم

رقم البند : ٨
أعمال طبقة اسفلت سطحية

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
18054.990	111.650	11.084	01+650
18165.285	110.295	10.975	01+660
18274.590	109.305	10.886	01+670
18383.195	108.605	10.835	01+680
18491.870	108.675	10.900	01+690
18600.840	108.970	10.894	01+700
18709.710	108.870	10.880	01+710
18819.030	109.320	10.984	01+720
18928.370	109.340	10.884	01+730
19038.165	109.795	11.075	01+740
19148.145	109.980	10.921	01+750
19257.085	108.940	10.867	01+760
19365.550	108.465	10.826	01+770
19474.030	108.480	10.870	01+780
19582.340	108.310	10.792	01+790
19690.160	107.820	10.772	01+800
19798.525	108.365	10.901	01+810
19907.875	109.350	10.969	01+820
20017.055	109.180	10.867	01+830
20125.705	108.650	10.863	01+840
20233.910	108.205	10.778	01+850
20341.445	107.535	10.729	01+860
20448.685	107.240	10.719	01+870
20556.155	107.470	10.775	01+880
20664.260	108.105	10.846	01+890
20773.030	108.770	10.908	01+900
20882.585	109.555	11.003	01+910
20993.080	110.495	11.096	01+920
21103.455	110.375	10.979	01+930
21213.655	110.200	11.061	01+940
21324.395	110.740	11.087	01+950
21435.750	111.355	11.184	01+960
21547.190	111.440	11.104	01+970
21657.660	110.470	10.990	01+980
21767.400	109.740	10.958	01+990
21877.020	109.620	10.966	02+000
21986.290	109.270	10.888	02+010
22095.560	109.270	10.966	02+020
22205.260	109.700	10.974	02+030
22314.415	109.155	10.857	02+040

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة




مشروع تنفيذ أعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الأول)
بطول ٢ كم مركز أبو قرقاص محافظة المنيا
ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة ليبيا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣



مسمى البند : بالتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم

رقم البند : ٨
أعمال طبقة أسفلت سطحية

المساحة التراكمية	المساحة	العرض	المحطة
22422.135	107.720	10.687	02+050
22528.860	106.725	10.658	02+060
22634.810	105.950	10.532	02+070
22740.660	105.850	10.638	02+080

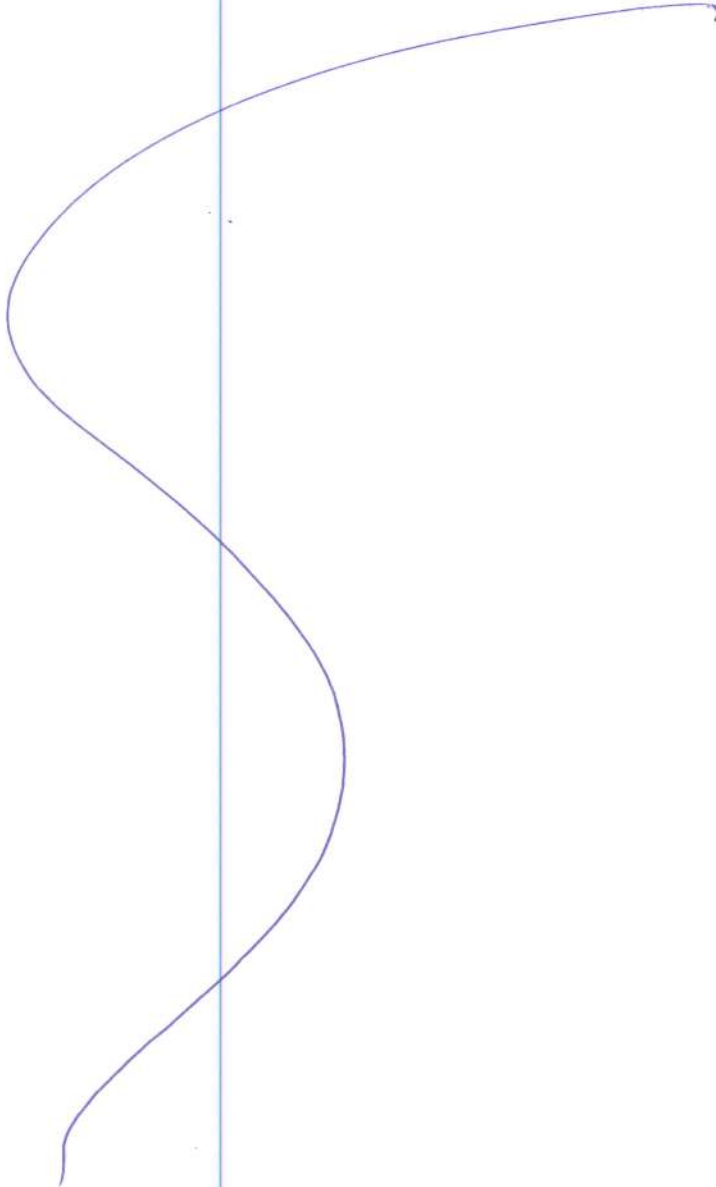

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة بأسىوط و المنيا

ملف : / /

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

مشروع شبكة الطرق القومية



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد،،،،،

بخصوص: - اعمال طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الاول) بطول ٢ كم مركز ابوقرقاص
محافظة المنيا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة .

عقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣

تنفيذ :- شركة لبيانا للمقاولات والتوريدات .

يرجى التكرم بالاحاطة أن العملية غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير في ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسىوط و المنيا)

مهندس /

م / اسلام محمد فوزي





تقرير كفاءة مهندسين الشركة

بخصوص : اعمال طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الاول) بطول ٢ كم مركز ابوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : شركة لبيان للمقاولات والتوريدات .

عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣

تشهد المنطقة السابعة بأسسيوط بأن السادة المهندسين الاتي أسمائهم بعد ماعملوا في تنفيذ العملية عالية .

م	الأسم	الوظيفة	الكفاءة	السير والسلوك
١	م / محمود أحمد سيد	مدير مشروع	جيد جداً	جيد جداً
٢	م / محمد ربيع محمود	مهندس مكتب فني	جيد جداً	جيد جداً
٣	م / أحمد علي ابوالنور	مهندس تنفيذ طرق	جيد جداً	جيد جداً
٤	م / عمرو محمددين	مهندس مواد	جيد جداً	جيد جداً

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسسيوط و المنيا)

مهندس /

م / اسلام محمد فوزي





شهادة معامل

نتشرف بالاحاطة بأن : شركة لبياننا للمقاولات والتوريدات
والمسند لها اعمال طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الاول) بطول ٢ كم مركز ابوقرقاص
محافظة المنيا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة

عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣

قامت باستخدام معامل الهيئة ومعمل الشركة في اجراء التجارب المعملية منذ بداية المشروع وحتى
المستخلص الختامي .

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط و المنيا)

مهندس /

م/ اسلام محمد فوزي





شهادة العملية

اسم العملية :- اعمال طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الاول) بطول ٢ كم مركز ابوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة .

الشركة المنفذة :- شركة لبيانا للمقاولات والتوريدات .

رقم عقد العملية : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣ بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ م .

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢١/١٢/٠١ م

مدة تنفيذ العملية : ٨ شهور

تاريخ انتهاء العملية طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٧/٣١ م

تاريخ انتهاء العملية لأخر مد مدة معتمدة : ٢٠٢٢/١٠/٢٥ م

قيمة العملية حسب العقد : ٥,٧ مليون

قيمة العملية حسب المقايضة الختامية : ٥١٨١٣١٨,٣٠ جنية

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسسوط و المنيا)

مهندس /

م / اسلام محمد فوزي





مقايضة ختامية

اسم العملية :- اعمال طريق أبوقرقاص / ملوي الزراعي الغربى (القطاع الاول) بطول ٢ كم مركز أبوقرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة .

الشركة المنفذة :- شركة لبيانا للمقاولات والتوريدات .

رقم عقد العملية : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٦٣ بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١ م .

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢١/١٢/٠١ م

مدة تنفيذ العملية : ٨ شهور

تاريخ انتهاء العملية طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٧/٣١ م

تاريخ انتهاء العملية لأخر مد مدة معتمدة : ٢٥/١٠/٢٠٢٢ م

قيمة العملية حسب العقد : ٥٧٠٠٠٠٠ جنية

قيمة العملية حسب المقايضة الختامية : ٥٣٦١٢٥٠,٨٤ جنية

قيمة الزيادة عن العقد الاصيلي : صفر

نسبة الزيادة عن العقد الاصيلي : صفر

قيمة النقصان عن العقد الاصيلي : ٣٣٨٧٤٩,١٦ جنية

نسبة النقصان عن العقد الاصيلي : ٥,٩٤ %

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسىوط و المنيا)

مهندس /

م/ اسلام محمد فوزي



٢٧١١٦١١

محضر استلام الموقع

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١ وبناء على العقد رقم ٣٦٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ المسجل
يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥ بين الهيئة العامة للطرق والكباري وبين لبيانا للمقاولات العامة
ورصف الطرق قام كلا من :

- | | |
|--|---|
| ١- المهندس / حسين زين العايدين | مدير عام هندسة المنيا |
| ٢- المهندس / احمد منير كمال عبد العظيم | مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق) |
| ٣- المهندس / عطا زايد عطا | مهندس المشروع (الهيئة العامة للطرق) |
| ٤- المهندس / اسلام على عبد العال | مهندس استشاري (مكتب ا.د صبرى سمعان) |
| ٥- المهندس / صهيب السعيد السعيد | مدير مشروع (شركة لبيانا للمقاولات ورصف الطرق) |
- وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة والمرور على موقع العملية وتبين انه خالي من أي عوائق
تعوق أعمال التشغيل بالعملية وعليه يكون يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/١ تاريخ بدء العملية
وهذا محضرا منا بذلك

اللجنة :-

- | | |
|---|------|
| ١ | ١- ١ |
| ٢ | ٢- ٢ |
| ٣ | ٣- ٣ |
| ٤ | ٤- ٤ |
| ٥ | ٥- ٥ |



رئيس الإدارة المركزية

مصطفى علي مسعود

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة لبيانا للمقاولات والتوريدات

على تنفيذ أعمال كفاءة طريق ابو قرقاص / ملوي الزراعي (القطاع الاول) بطول ٢ كم (محافظة المنيا)
(المنطقة السابعة - اسيوط)

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لاشتراطات للقائمة الموحدة يناير يونيو ٢٠١٩ واسعار السوق ويراعى احتساب فروق الاسعار القائمة الموحدة يناير ٢٠٢٢ للكميات التي تم تنفيذها حين صدور القائمة الموحدة .
- مدة التنفيذ (٨ أشهر)
- مسافة النقل طبقاً لإفادة المنطقة .
- يتم خصم نسبة ١ % من اجمالي قيمة التعاقد .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية طبقاً للقائمة الموحدة في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- يتم احتساب البيتومين بالزيادة او النقصان .
- وعليه أقل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه .

ممثل الشركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس (محمد عبد الحليم)	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب / محمد عبد الرحمن	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب /	التوقيع	السيدة المهندسة /	التوقيع
السيد الأستاذ /	التوقيع	السيدة المهندسة /	التوقيع

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

سامي احمد فرج

أولفك ويحتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب

بسمي موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٣ على المذكرة المعروضة على سيادته بخصوص
 اسناد اعمال كفاءة طريق ابو قرقاص / ملوي الزراعي (القطاع الاول) بطول ٢ كم (محافظة المنيا) لشركة لبيان للمقاولات
 والتوريدات - صيادرة هيئة كرسية (مرحلة اولي)
 وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في / / ٢٠٢٢ على تشكيل
 لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بلود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندسة / جيهان ناجي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / علام اسماعيل ماهر	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / / ٢٠٢٠ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣م٢٠٠	١٧	٣٤٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة والقصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف			
	مسافة نقل ٤٠ كم	٣م٤٠٠	٧٢	٢٨٨٠٠
٣	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣م١٠٠	٦٠	٦٠٠٠
٤	بالمتر المكعب اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكتاف والميول الجانبية والفئة شاملة نظافة وملئ الشروخ ان وجدت بالاسفلت ٧٠/٦٠ والمستحلبات الاسفلتية واعمال تشغيل دمك طبقة الاساس اسفل كشط الاسفلت ان وجدت طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	٣م١٠٠	٢٧٥	٢٧٥٠٠

شلاي

محمد عبد الحفي

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة لجيانا للمقاولات والتوريدات

على تنفيذ أعمال كفاءة طريق ابو قرقاص / ملوي الزراعي (القطاع الاول) بطول ٢ كم (محافظة المنيا)
(المنطقة السابعة - اسبوط)

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اساس مثبت وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٣٠سم في الطريق القائم باستخدام مكنينة (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م٢٣٠٠٠	٦٠	١٣٨٠٠٠٠
٦	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم اعادة التدوير في الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٧١٥ بالطن	١٣٠٠	٩٢٩٥٠٠
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التفلير MC30 بمعدل ١.٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م٢٣٠٠٠	٢٥	٥٧٥٠٠٠
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ ب) بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م٢٣٠٠٠	١٠٩	٢٥٠٧٠٠٠
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (ليوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرر جلاس طبقا للرسومات عل ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٢ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ يتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاثاير (١٦ O ٦) م٠م ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٦٥ م٠ ط	٤٥٠	٢٩٢٥٠
الاجمالي (خمسة مليون واربعمائة وستة وثمانون الف واربعمائة وخمسون جنيها لا غير)				٥٤٨٦٤٥٠

د محمد عبد الحفيظ

علاء



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية
للمشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ...

مرفق طيه أصل موافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الإدارة على المهلة الإضافية
لعمله أعمال طريق قرقاص / ملوي الزراعي الغربي (القطاع الثاني) بطول ٢ كم مركز
أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة ليانا للمقاولات المتكاملة والتوريدات إشراف المنطقة السابعة (أسيوط) .
يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحريره ٢٠٢٣/١٠/١٩

مهندس / محسن محمد زهران

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السابعة (أسيوط)

تحية طيبة وبعد ...

رجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة بما جاء بهاليه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحريره ٢٠٢٣/١٠/١٩

مهندس / محسن محمد زهران

٢٠٢٣/١٠/١٩
محسن محمد زهران

٢٠٢٣/١٠/١٩
محسن محمد زهران

٢٠٢٣/١٠/١٩
محسن محمد زهران

٢٠٢٣/١٠/١٩
محسن محمد زهران



مطلة اضافية

واردة من منطقة المنطقة الصناعية - أسبوط

اسم العملية :- اعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (التطاع الاول) بطول ٢ كم
مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
بالامر المباشر

اسم الشركة المنفذة : لبانا للمقاولات والتوريدات

عدد العملية : (٢٠٢١/٣٦٣ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥

قيمة العملية المستند فى التعاقد : ٥,٧ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/١٢/١

تاريخ نهى العمل : ٢٠٢٢/٧/٣١

آخر مطلة اضافية معتمدة : ٢٠٢٢/٩/٣٠

مد مدة العملية : (٢٥ يوم) ليصبح تاريخ النهى ٢٠٢٢/١٠/٢٥

المحسرات :

- بناءا على كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به طلب الشركة المنفذة مد مدة العملية المذكور
عاليه (٢٥ يوم) وذلك لوجود معوقات وهى :-

١- (٥ يوم) وذلك لوجود عدد (١) غرفة خاصة بالشركة المصرية للاتصالات .

٢- (١٠ أيام) وذلك لوجود عدد (١) غرفة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

- مرفق موافقة رئيس مجلس الادارة على المذكرة المعروضة على سيادته بمد مدة العملية
(٢٥ يوم)

إعداد مهندس

مدير عام الصيانة / التنفيذ :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية

رأى الشئون القانونية :

مهندس

نفس قطاع التنفيذ والمناطق :

لنستد الى تعرض المشروع لمعوقات يعتمد

- الحاجة الى ازالة الشجرة

- الحاجة الى وقف الاعمال واستدعاء

- شركة المظلمة مع عدم تحمل

- ضرر على الاشياء المينة لعدم

حصة : الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

الحماية المالية

١٩ / ٢٠٢٢

١٥ / ٢٠٢٢

التوقيع :

لواء مهندس / هشام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مذلة اضافية

واردة من منطقة : المنطقة السابعة - أسبوط

- اسم العملية :- اعمال طريق أبو قرقاص / ملوى الزراعى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢ كم
- مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
- بالأمر المباشر
- اسم الشركة المنفذة : لبيانا للمقاولات والتوريدات
- عقد العملية : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٣٦٤) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥
- قيمة العملية المسند فى التعاقد : ٥,٧ مليون جنيه
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١/١٢/١
- تاريخ نهاء العمل : ٢٠٢٢/٧/٣١
- أخر مذلة اضافية معتمدة : ٢٠٢٢/٩/٣٠
- مد مدة العملية : (٢٥ يوم) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٢/١٠/٢٥
- المبررات :

- بناءا على كتاب المنطقة المشرفه والمرفق به طلب الشركة المنفذة مد مدة العملية المذكور
- عاليه (٢٥ يوم) وذلك لوجود معوقات وهى :-
- ٣- (٥ يوم) وذلك لوجود عدد (١) غرفة خاصة بالشركة المصرية للاتصالات .
- ٤- (١٠ أيام) وذلك لوجود عدد (١) غرفة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .
- مرفق موافقة رئيس مجلس الادارة على المذكرة المعروضة على سيادته بمد مدة العملية (٢٥ يوم)

إعداد مهندس :

مدير عام الصيانة / التنفيذ :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية :

رأى الشئون القانونية :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

المشروع طعوقات (شباب) يعتمد

حار جبة عن ارادة الشركة -

ارت ال توقعه الاعمال مستمرة -

صحا للمنتج المطلوبة مع عدم -

فصل مقابل تأخير من الاسباب -

المسبة ريدر المطايع المطايع ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢٢/٩/٣٠

التوقيع

نواز مهندس / هشام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

