

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩.٢٠٠ إلى الكم ١٠.٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

يرجاء اللفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم خو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف

لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ١ } مستخلص
عدد { ١ } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { ٥ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } أصل محضر استلام الموقع
١١ / ١٦ - ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ . تنفيذ شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد عدد (١) حاسب ألى بمشتملاته لمركز المعلومات بالهيئة .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح




م

حصر اعمال مستخلص رقم (1)				
عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)				
بطول 57 كم وصلة الطريق الرئيسي للمسافة من (9+200) الي (10+200) بطول 1 كم				
تنفيذ : شركة نخبة للاستثمار والمقاولات والمعامل الطبية				
بنود سيتم تنفيذها طبقا للقائمة بتاريخ 2023 وزيادة البنود من (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)				
م	الرد	الوحدة	العقد	المنفذ
5_1	القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. وطبقا لملاحق 1 الخصائص الفنية لجسر السكة وعادة التراب في كراسة الشروط ومواصفات الفنية الخاصة بسكة حديد مصر	العدد	40	2750
2_2	بمعرفة المكعب اعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام الرافعات) والعمق المطلوب للوصول للتأسيس السليم أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديدي طبقا لما ورد في تقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الى المشاؤون التي تحددها الهرة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والارتكاز لجوانب الحفر وتشغيل فاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التنفيذية المعتمدة والقياس طبقا لارامد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهرة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م	138233	26.7
	علاوة مسافة النقل لمسافة 11 كيلو = 10.5 * 1.05 = 11.025 ج.م.		138233	11.025
	علاوة 2 جنيه / 3م لكل 5 متر عمق - على عمق 5 متر = 2 ج.م.		56675	2
	علاوة 2 جنيه / 3م لكل 5 متر عمق - على عمق 10 متر = 4 ج.م.		62500	4
	علاوة 2 جنيه / 3م لكل 5 متر عمق - على عمق 15 متر = 6 ج.م.		19058	6
3_1	بالمعرفة المكعب اعمال استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على ان تكون نسبة تسيل كاليفورنيا طبقا للهرة القومية لسكة حديد مصر) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والردم بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	3م	21600	34
	السعر لا يشمل قيمة المادة المحبيرة ، على ان يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتعبين وادارة واستغلال الحاجر والملاحات بمعرفة الهرة القومية لسكة حديد مصر.			
	- مسافة النقل حتى 2 كم.			
3_2	بالمعرفة المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والردم بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	3م	13400	0
	- السعر لا يشمل قيمة المادة المحبيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.			
	- مسافة النقل حتى 2 كم			
	- يتم تشغيل الفرمة - اعلى طريقة الردم العالوية بمسافة لا تقل عن 50 سم - باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم			
	- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من فاع الفرمة - باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم ،			
	- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم			
	(على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 %) للجزء الفرمة			
9932			13400	44.6

مهندس المنطقة

مهندس المنطقة

1

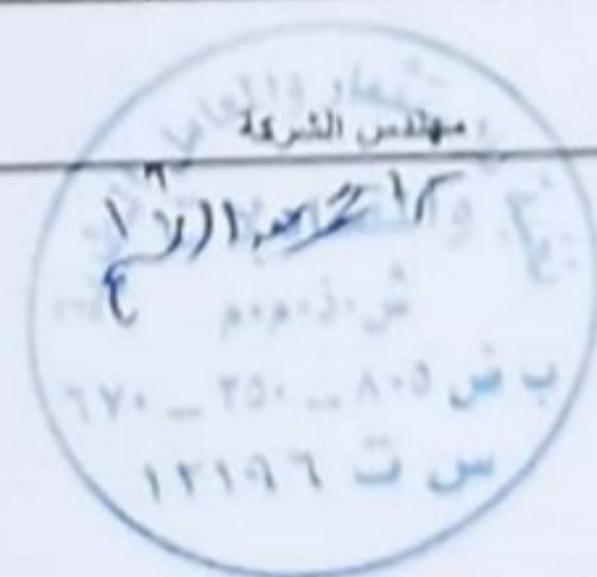


حصر اعمال مستخلص رقم (1)				
عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الرويني / العاشر من رمضان / بلبس)				
بطول 57 كم وصلة الطريق الرئيسي للمسافة من (9+200) الي (10+200) بطول 1 كم				
تنفيذ : شركة نخبة للاستثمار والمقاولات والمعامل الطبية				
بنود سيتم تنفيذها طبقا لقائمة يناير 2023 وزيادة البنود من (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)				
المنفذ	الكمية	العدد	الوحدة	الملاحظات
2750	280	2750	3م	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجار الصلبة المسترجة من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكة الحديد والقسي حجم الحبيبات ما بين 31.5 مم الي 50 مم والا يزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كالمقويات لتقل عن 80 % ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس التحلوس عن 30 % ولا يزيد الامتصاص عن 10 % والفترة تشمل اعمال الفرش الخلط الجيد وايضا عماء المظلمة للوصول الى الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والتمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميمية والاحذارات والقطاعات الطولية والعرضية باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول الى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 98 % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف.
2750	131.3	2750		مسافة النقل 20 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجزة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل 50 متر طولي
				علاوة مسافة النقل لمسافة 126 كيلو = 1.25 * 100 = 125 ج.م. + 6 * 1.05 = 6.30 ج.م. 125 + 6.3 = 131.1 ج.م.

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

(Signature)

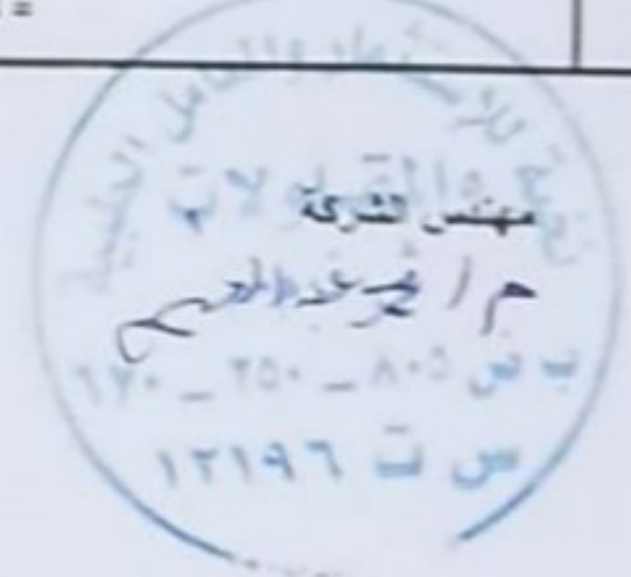


محضر اعتماد حصر كميات للقطاع عقد أستكمال 1(426/2023/2024)

تاريخ	10/9/2023	الموافق يوم الاثنين
اسم المشروع	اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)	
قطاع	9200-10200	اتجاه
	بلبيس	اسم الشركة المنفذة :
		نخبة للمعامل والمقاولات

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة الكميات المنفذة الخاصة بشركة (نخبة للمعامل و المقاولات) , واعتمادها من الاستشاري العام للهيئة القومية للسكة حديد مصر (خط الروبيكي) .

م	البند	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
1- اعمال الزالة والتطهير			
5_1	القيام باختبار plat load test	40	
2- بند الحفر			
3_2	حفر في تربة متماسكة	125795	
	اجمالي كميات الحفر	125795	
3- بند الردم			
1_3	استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم	6366	
2_3	توريد تربة في اعمال الردم	9932	
	اجمالي كميات الردم	16298	
5- بند طبقة الاساس			
1_5	توريد وتشغيل طبقة اساس السكة	2750	
	اجمالي كميات الحفر	2750	

مدير المشروع

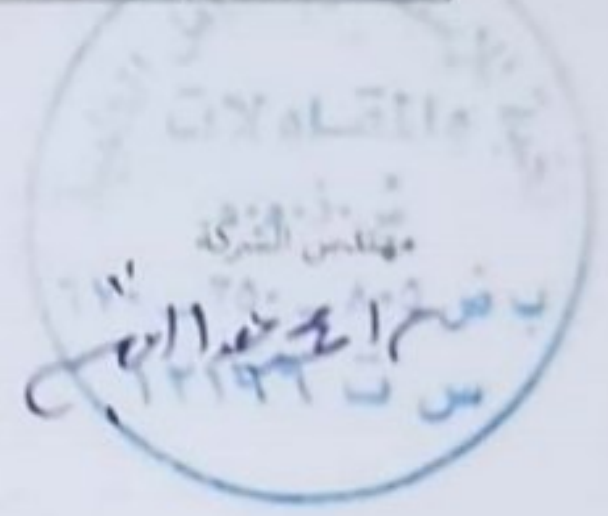

مدير عام المشروعات

مهندس المشرف

يوافق ويعتمد
الاستشاري العام للمشروع


د. محمد


د. محمد

اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) قطاع الخط الرئيسي اتجاة بلبيس تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والاستثمار و
المقاولات
بيان الاعمال التي تمت في العقد الي تاريخه

م	البند	عقد أستكمال 1			
		كراصة الكميات	جاري 1	مقايضة معدلة (1)	ختامي
1	بند اعمال الازالة والتطهير				اجمالي
5_1	القيام باختبار plat load test	40	40	40	
2	بند الحفر				
3_2	حفر في تربة متماسكة	152517.54	125795	138233	
3	بند الردم				
1_3	استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم	25000	6366	21600	
2_3	توريد تربة في اعمال الردم	0	9932	13400	
5	بند تربة الاساس				
1_5	توريد وتشغيل طبقة اساس السكة	0	2750	2750	

مهندس المشرف



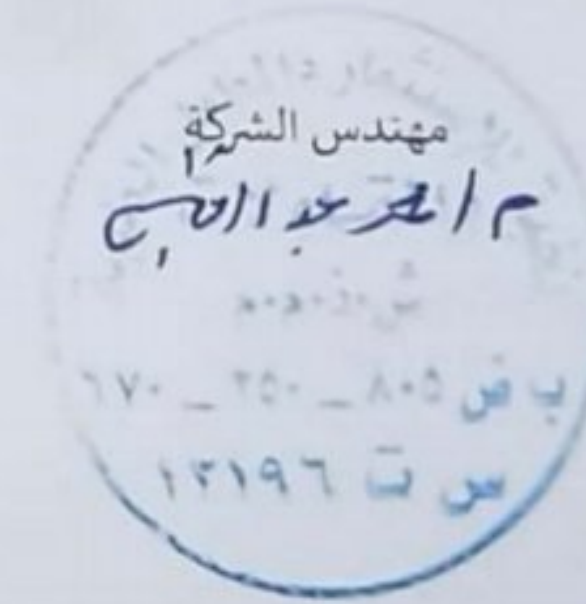


اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) قطاع الخط الرئيسي اتجاه بلبيس تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية والاستثمار والمقاولات

بيان باجمالي الاعمال التي تمت صرفها من بداية العمل حتي تاريخه حتي تاريخ 9/10/2023


م	البيد	عقد عملية (155-2023-2024)			عقد استكمال 1 (426/2023/2024)			عقد استكمال 2 (رقم العقد)			اجمالي الكمية المتصرفه للقطاع
		اجمالي	جاري 1	ختامي 2	اجمالي	جاري 1	ختامي 2	اجمالي	جاري 1	ختامي 2	
1	بيد اعمال الازالة والتطهير				40						40
5 1	القيام باختبار plat load test					40					
2	بيد الحفر				0						0
	حفر في تربة عادية	26700	0		125795	0					228202
3 2	حفر في تربة متماسكة	100400	2007		102407	125795					
3	بيد الردم				6366						6366
1 3	استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم				9932						9932
2 3	توريد تربة في اعمال الردم										
5	بيد تربة الاساس				2750						2750
1 5	توريد وتشغيل طبقة اساس السكة					2750					

مهندس المشرف



مدير المشروع



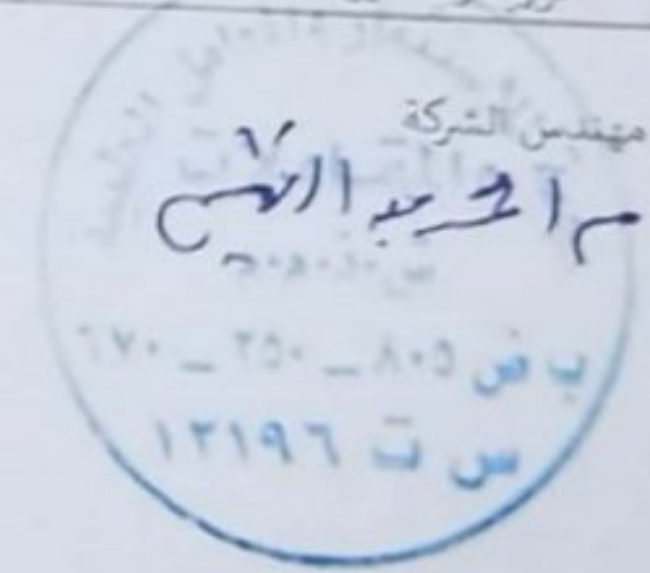

الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

محضر استلام موقع

عملية : استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد

{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبس }

المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم اتجاه بلبس بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

بناءً على العقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندسة / نانسى فرج عبد العزيز
- المهندس / محمد أحمد عبد العظيم
- مهندس المشروع
- شركة نخبة للاستثمار

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المنوه عنها بعلية وقد أضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتمرر هذا محضرنا بذكرى ،،،

الوقوعات

محمد عبد العظيم

المهندس / محمد أحمد عبد العظيم

نانسى فرج عبد العزيز

المهندسة / نانسى فرج عبد العزيز

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

