

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩.٢٠٠ إلى الكم ١٠.٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

يرجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والمصرف وموافقاتنا برقم ولاربع السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ١ } مستخلص

عدد { ١ } تقرير معمل المنطقة

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح

عدد { ٥ } حصر للأعمال المنفذة

عدد { ١ } أصل محضر استلام الموقع

١١٥ - ٢١٩ - ٢١٩

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ..

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة
من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد عدد
(١) حاسب ألى بمشتملاته لمركز المعلومات بالهيئة .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحرير أفى : ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



م. ك. م.

حصر اعمال مستخلص رقم (1)				
عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)				
بطول 57 كم وصلة الطريق الرئيسي للمسافة من (9+200) الي (10+200) بطول 1 كم				
تدفيل : شركة نخبة للاستثمار والمقاولات والمعامل الطبية				
بنود سيتم تدفيلها طبقا لقائمة يناير 2023 وزيادة البنود من (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)				
م	الرقم	الوصف	الوحدة	العدد
5_1		القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقا لملاحق 1 الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التراب في كراسة الشروط ومواصفات الفنية الخاصة بسكة حديد مصر	العدد	40
2_2		بمصر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية (استخدام الرافعات) والعمق المطلوب للوصول للمستوى النهائي للأساس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديدي طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناحيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددها الهرة لاعادة تدفيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والارتكاز لحواسب الحفر وتشغيل فاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التنفيذية المعتمدة والقياس طبقا لارامد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاسول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهرة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م	125795
		علاوة مسافة النقل لمسافة 11 كيلو = 10.5 * 1.05 = 11.025 ج.م.		119429
		علاوة 2 جنيه / 3م لكل 5 متر عمق - على عمق 5 متر = 2 ج.م.		55675
		علاوة 2 جنيه / 3م لكل 5 متر عمق - على عمق 10 متر = 4 ج.م.		62337
		علاوة 2 جنيه / 3م لكل 5 متر عمق - على عمق 15 متر = 6 ج.م.		7783
3_1		بالمصر المكعب اعمال استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على ان تكون نسبة تسيل كاليفورنيا طبقا للهرة القومية لسكة حديد مصر) ورشها بالمياه الاسوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التدفيل طبقا للمناحيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والهندسة بجمع مشتعلاته طبقا لاسول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	3م	6366
		السعر لا يشمل قيمة العادة المحجورة ، على ان يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتعبين وادارة واستغلال الساجر والملاحات بمعرفة الهرة القومية لسكة حديد مصر.		
		- مسافة النقل حتى 2 كم.		
3_2		بالمصر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاسوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التدفيل طبقا للمناحيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والهندسة بجمع مشتعلاته طبقا لاسول الصناعة والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	3م	9932
		- السعر لا يشمل قيمة العادة المحجورة مع قيام الشركة المتفلة بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.		
		- مسافة النقل حتى 2 كم		
		- يتم تدفيل الفرمة - اعلى طريقة الردم المعاوية بمسافة لا تقل عن 50 سم - باستخدام الات التسوية بمسك لا يزيد عن 25 سم		
		- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسوية بمسك لا يزيد عن 25 سم ،		
		- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسوية بمسك لا يزيد عن 50 سم		
		(على الاقل نسبة تسيل كاليفورنيا عن 25 %) للجزء الفرمة		
9932	44.6	13400		

مهندس المنطقة

مهندس الشركة

1



حصر اعمال مستخلص رقم (1)				
عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الرويني / العاشر من رمضان / بلبس)				
بطول 57 كم وصلة الطريق الرئيسي للمسافة من (9+200) الي (10+200) بطول 1 كم				
تنفيذ : شركة نخبة للاستثمار والمقاولات والمعامل الطبية				
بنود سيتم تنفيذها طبقا لقائمة بنابر 2023 وزياده البنود من (2023/3/6) وزياده السولار (2023/5/4)				
المنفذ	الكمية	العدد	الوحدة	الملاحظات
2750	280	2750	3م	بالمر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجار الصلبة المسترجة من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكة الحديد والقسي حجم الحبيبات ما بين 31.5 مم الي 50 مم والا يوزن نسبة العار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كالمقوياتها لتقل عن 80 % ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يوزن نسبة الفاقد بجهاز لوس تجلوس عن 30 % ولا يوزن الامتصاص عن 10 % والفئة تشمل اعمال الفرش الخلط الجيد وايضا عماء المظلمة للوصول الى الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والتمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميمية والاحذارات والقطاعات الطولية والعرضية باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول الى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 98 % من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وطبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف.
2750	131.3	2750		مسافة النقل 20 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجزة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل 50 متر طولي
				علاوة مسافة النقل لمسافة 126 كيلو = 1.25 * 100 = 125 ج.م. + 6 * 1.05 = 6.30 ج.م. = 125 + 6.3 = 131.1 ج.م.

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

مهندس المنطقة




محضر اعتماد حصر كميات للقطاع عقد أستكمال 1 (426/2023/2024)

تاريخ	10/9/2023	الموافق يوم الاثنين
اسم المشروع	اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبس)	
قطاع	9200-10200	اتحاد
	بلبس	اسم الشركة المنفذة : نخبة للمعامل والمقاولات

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة الكميات المنفذة الخاصة بشركة (نخبة للمعامل والمقاولات) , واعتمادها من الاستشاري العام للهيئة القومية للسكة حديد مصر (خط الروبيكي) .

م	البند	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
	1- اعمال الزالة والتطهير		
5_1	القيام باختبار plat load test	40	
	2- بند الحفر		
3_2	حفر في تربة متماسكة	125795	
	اجمالي كميات الحفر	125795	
	3- بند الردم		
1_3	استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم	6366	
2_3	توريد تربة في اعمال الردم	9932	
	اجمالي كميات الردم	16298	
	5- بند طبقة الاساس		
1_5	توريد وتشغيل طبقة اساس السكة	2750	
	اجمالي كميات الحفر	2750	

مدير المشروع

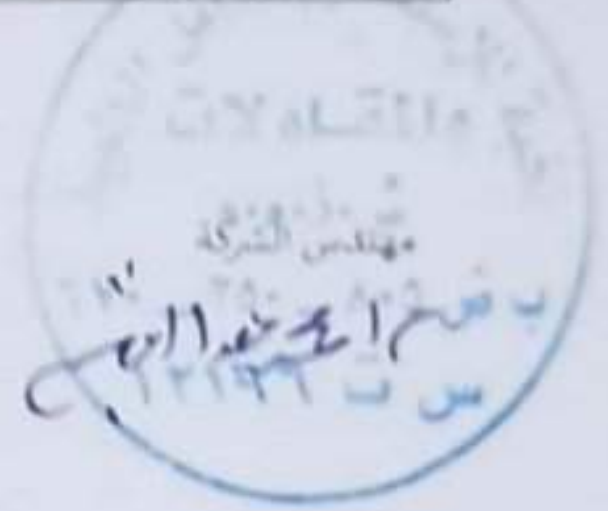

مدير عام المشروعات

مهندس المشرف

Handwritten signature of the Project Manager.


Handwritten signature of the Supervising Engineer.


يوافق ويعتمد
الاستشاري العام للمشروع

اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) قطاع الخط الرئيسي اتجاة بلبيس تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية و الاستثمار و
المقاولات
بيان الاعمال التي تمت في العقد الي تاريخه

م	البند	عقد أستكمال 1			
		كراصة الكميات	جاري 1	مقايضة معدلة (1)	اجمالي
1	بند اعمال الازالة والتطهير				
5_1	القيام باختبار plat load test	40	40	40	
2	بند الحفر				
3_2	حفر في تربة متماسكة	152517.54	125795	138233	
3	بند الردم				
1_3	استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم	25000	6366	21600	
2_3	توريد تربة في اعمال الردم	0	9932	13400	
5	بند تربة الاساس				
1_5	توريد وتشغيل طبقة اساس السكة	0	2750	2750	

مهندس المشرف



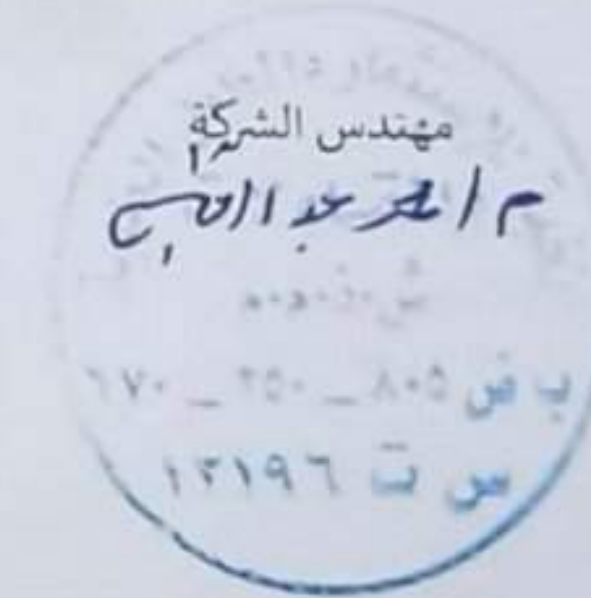

اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) قطاع الخط الرئيسي اتجاه بلبيس تنفيذ شركة نخبة للمعامل الطبية و الاستثمار والمقاولات.

بيان باجمالي الاعمال التي تمت صرفها من بداية العمل حتي تاريخه حتي تاريخ 9/10/2023

م	البند	عقد عملية (155-2023-2024)			عقد استكمال 1 (426/2023/2024)			عقد استكمال 2 (رقم العقد)			احمال الكمية المنصوفة للقطاع
		اجمالي	جاري 1	ختامي 2	اجمالي	جاري 1	ختامي 2	اجمالي	جاري 1	ختامي 2	
1	بند اعمال الازالة والتطهير										
5 1	القيام باختبار plat load test				40			40			40
2	بند الحفر										
	حفر في تربة عادية	26700	0		0						228202
3 2	حفر في تربة متماسكة	100400	2007		125795			125795			
3	بند الردم										
1 3	استخدام ناتج الحفر في اعمال الردم				6366			6366			6366
2 3	توريد تربة في اعمال الردم				9932			9932			9932
5	بند تربة الاساس										
1 5	توريد وتشغيل طبقة اساس السكة				2750			2750			2750

مهندس المشرف

مدير المشروع

مهندس الشركة

مهندس الشركة
م. محمد النسي
ب. ٨٠٥ - ٢٥٠ - ٢٧٠
س. ١٢١٩٦

الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

محضر استلام موقع

عملية : استكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد

{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبس }

المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم اتجاه بلبس بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

بناءً على العقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندسة / نانسى فرج عبد العزيز
- المهندس / محمد أحمد عبد العظيم
- مهندس المشروع
- شركة نخبة للاستثمار

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتمرر هذا محضرنا بذكرى ،،،

الوقيعات

محمد عبد العظيم

المهندس / محمد أحمد عبد العظيم

نانسى فرج عبد العزيز

المهندسة / نانسى فرج عبد العزيز

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح



نخبة للمقاولات والطرق



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



محضر مسافة مقلب

التاريخ / ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢٠

مشروع وصلة السكك الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس) - شركة نخبة - من المحطة 9+000 الي محطة 10+000

الخطا

قام مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) برصد مسافة نقل تربة القطع من القطاع الخاص بشركة نخبة الي المقلب المحدد عن طرق مهندس الهيئة ..

وذلك بحضور كلا من :

- | | |
|--|------------------------|
| مهندس الشركة المنفذه | 1- م / محمد عبد الحفيظ |
| مهندس استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري | 2- م / محمد حيدر |
| مهندس الاستشاري العام | 3- م / محمد يحيى |

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل الي موقع المقلب هي ١١ كم

مهندس الاستشاري العام

م / سولي سبي

مهندس استشاري الهيئة العامة

م / محمد حيدر

مهندس الشركة المنفذه

م / محمد عبد الحفيظ
نخبة للمقاولات والطرق
ش.م.د.م
س.ت. ١٢٩٩٦ ب.ف. ٨٠٠ - ١٢٩٩٦

م / محمد حيدر

محضر مسافة

التاريخ	نخبة للمقاولات و الطرق
اسم الشركة	قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس
اسم المشروع	نطاق العمل
	١٠+٢٠٠ الى ٩+٢٠٠

قام مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) برصد مسافة توريد طبقة اساس من ناتج كسارة
الساكن من اكتوبر عتاقة الي القطاع الخاص بشركة نخبة للمقاولات و الطرق عن طريق مهندس الهيئة
و تلك بحضور كل من :

مهندس الشركة المنفذة

م. ا. محمد عبد العظيم

مهندس استشاري الهيئة العامة للطرق و الكباري

م. ا. راسم صالح شمر

مهندس الاستشاري العام

م. ا. محمد حسن

و ثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل الي موقع المشون هي ١٢٦ كم - مائة و ستة و عشرون كم فقط لاغير

مهندس الاستشاري العام

م. ا. محمد حسن

مهندس الاستشاري

م. ا. راسم صالح شمر

مهندس الشركة المنفذة

م. ا. محمد عبد العظيم
