

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة B1 القطاع الرابع
تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضي .

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٩ وبناء علي عقد العملية رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٦٣

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / كارم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| ٢- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| ٣- السيد المهندس / مصطفى علي السيد | سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| ٤- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| ٥- السيد المهندس / احمد هشام | مكتب XYZ استشاري المساحة |
| ٦- السيد المهندس / محمد جمال بكر | مكتب عادل جمال حامد راضي |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٩ هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

- | | |
|----|-----------|
| ٦- | |
| ٥- | عادل جمال |
| ٤- | |
| ٣- | |
| ٢- | ١٩/٩/٢٠٢٣ |
| ١- | |

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس /



عن عملية : تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (B1) القطاع الرابع بالامر المباشر



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
					قرش / جنيه
٣	التمشيد المعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتناسكة (طاقة متجمدة) عدا التربة الصخرية (استخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالحماء الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمشيد الجيد بغير أدوات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على التربة لتحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتربة بجميع مشتلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة ١ جنيه لكل لمسافة تقل نتائج الحفر . - يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠م من منسوب الأرض الطبيعية . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل نتائج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه / كم ابتداءً من ٤/٥/٢٠٢٣	٣٠,٠٠	م	٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر يناير				
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر فبراير				
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر مارس				
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر ٥٠٠ متر)				
٤	التمشيد المعب أصل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومعمل على البند الآتي : ١- تمهيد ونقل نتائج الحفر لمسافة النقل عن ٥٠٠ متر . ٢- إزالة التربة منطقتي التماسك باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتقال (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالحماء الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمشيد الجيد بغير أدوات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والتربة بجميع مشتلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠م من منسوب الأرض الطبيعية . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل نتائج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه / كم ابتداءً من ٤/٥/٢٠٢٣	٧٥,٦٠	م	٦٨٠,٥٠	٥١٤٤٥,٨٠
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - شهر فبراير				
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - شهر مارس				
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر ٥٠٠ متر)				
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - شهر فبراير				
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - شهر مارس				
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر ٥٠٠ متر)				
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - شهر فبراير				
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - شهر مارس				
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر ٥٠٠ متر)				
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة				٦٥٨٢٨٥١,٣٩

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
مهندس طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م/ أسماء علي

مهندس المشروع
م/ اسلام محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انتر كونسولنج

مكتب عادل جمال حامد راضي

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب عادل جمال حامد راضي

٥٠٠-١٢٦٩-٤١٥
٢٠٢٣-٠٩-١٢

عن عملية : تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B1) القطاع الرابع بالامر المباشر



مع مكتب عادل جمال حامد راضي

بتاريخ : ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٣

لعدد رقم ب (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٦٣)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة
	المتر المتعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتانة (طبقة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام المطووز) وتسوية السطح بآلات التسمية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بغيراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التقليل طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم تحديد نوع التربة لمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التقليل باستخدام المطووز . - علاوة ١ جنيه لكل لمسافة تقل نتائج الحفر . - يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠م من منسوب الأرض الطبيعية - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل نتائج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه / كم ابتداء من ١٥/٥/٢٠٢٣	م	٥٠٠٠٠,٠٠
٣	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر يناير	م	٤١٦٨٧,٣٢١٥
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر فبراير	م	٤١٦٨٧,٣٢١٥
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر مارس	م	١٣٣٣٧٤,٦٤٣٠
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر ٥٠٠ متر)	م	
	المتر المتعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وحمل على البند الثاني ١- تحميل ونقل نتائج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- إزالة العوثر الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسمية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بغيراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التقليل طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠م من منسوب الأرض الطبيعية - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل نتائج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه / كم ابتداء من ١٥/٥/٢٠٢٣	م	٦٨٠,٥٠
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - شهر فبراير	م	٦٨٠,٥٠
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ - شهر مارس	م	١٣٦١,٠٠
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر ٥٠٠ متر)	م	١٣١٩,٠٠
٤	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ - شهر فبراير	م	١٣١٩,٠٠
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ - شهر مارس	م	٢٦٣٨,٠٠
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر ٥٠٠ متر)	م	٩٩٨٥,٠٠
	ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ - شهر فبراير	م	٩٩٨٥,٠٠
	ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم / سم ٢ - شهر مارس	م	١٩٩٧٠,٠٠
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر ٥٠٠ متر)	م	

يعتمد

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

الشركة المنفذة

مكتب علي جمال حامد راضي

مكتب التراخيص، فواصلتج

م / أسماء علي

م / اسلام محمد


م /

م /

مهندس طارق يوسف الجزار



٥١٢٦٥



محضر استلام ابتدائي

لعملية :- تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B1) القطاع الرابع بالامر المباشر.

عقد رقم :- 363 - 2023 - 2024.

تنفيذ :- مكتب عادل جمال حامد راضى.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاحد الموافق 2024/2/25 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (25) بتاريخ 2024/1/30 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة.

- 1- المهندس / محمد عبدالرؤوف راجح
 - 2- المهندس / كريم محمد زين
 - 3- المهندس / اسلام محمد البهادي
 - 4- المهندس / مصطفى السيد
 - 5- المهندس / تامر شرف الدين
 - 6- المهندس / احمد هشام
 - 7- المهندس / علاء محمد
- رئيساً المنطقة الاولى المركزية - رئيساً
المنطقة الاولى المركزية - عضواً
مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً
ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً.
ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً.
مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً
مندوب الشركة المنفذه - عضواً

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وتم اخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع وترحيل نواتج القطع.

الاعمال مقبولة بصفه عامه كون الاعمال اعمال قطع راسى بدون ميول طبقا للقطاع التصميمى للقطعة عاليه.






توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكوره بالاضافه الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

وعلى هذا جرى التوقيع:-

7- علاء محمد
6- زمر محمد
5- 
4- 
3- 
2- 
1- 



التقييم الفنى

لعملية :- تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B1) القطاع الرابع بالامر المباشر.

عقد رقم :- ٣٦٣ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .

تنفيذ :- مكتب عادل جمال حامد راضى.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٦ وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣٠ ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/٢٥ تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

١- المهندس / محمد عبدالرؤوف راجح

٢- المهندس / كريم محمد زين

٣- المهندس / اسلام محمد البهادي

٤- المهندس / مصطفى السيد

٥- المهندس / تامر شرف الدين

٦- المهندس / احمد هشام

٧- المهندس / علاء

المنطقة الاولى المركزية - رئيساً

المنطقة الاولى المركزية - عضواً

مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً

ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً.

ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً.

مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً

مندوب الشركة المنفذه - عضواً

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائى :- لا يوجد خصم على الاستلام الابتدائى نظراً لقبول الاعمال (اعمال قطع فقط).

الخصم للتجارب العملية :- لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع فقط.

التوقيعات :-

٧- علاء حبه

٦- ذريح

٥- [Signature]

٤- [Signature]

٣- [Signature]

١- [Signature]

٢- [Signature]

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر
ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
منطقة (B1) القطاع الرابع بالامر المباشر عقد رقم (2024/2023/363)
تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضى

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 19 / 09 / 2023

تاريخ النهو المقرر : 18 / 05 / 2024

تاريخ النهو الفعلى : 06 / 02 / 2024

قيمة العملية : 11,500,000

قيمة العملية حسب الختامى : 6,582,851.39

تم الخصم بنسبة ٠,٥٧ نظرا لعدم تنفيذ

المبدا الباقية للقطعة كالتالى وجود تسليم منه الاستشارى العلمى مستمرا

الهيئة العامة للطرق والكبارى


مدير المشروع

مهندس المشروع

مكتب / عادل جمال حامد راضى

م / أسماء علي

م / اسلام محمد



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الاولى المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر
ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

منطقة (B1) القطاع الرابع بالامر المباشر عقد رقم (2024/2023/363)

تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضى

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه:

لا يوجد كميات للمحاجر مستخدمة بالمشروع كونه الاعمال اعمال حفر فقط. م/ع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م / أسماء علي

مهندس المشروع

م / اسلام محمد

مكتب / عادل جمال حامد راضى

مهندس / عادل جمال حامد راضى
ب. ق. ١٢٩ - ٩١٠ - ٢٩٠ س. ت: ١٢٩٩٨
م. ق. ١٠ - ٤١٠ - ١٢٦٩ - ٥

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر
ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

منطقة (B1) القطاع الرابع بالامر المباشر عقد رقم (2024/2023/363)

تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضى

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية على العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط.


الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع




م / أسماء علي

مهندس المشروع



م / اسلام محمد

مكتب / عادل جمال حامد راضى



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



مدير عام المشروعات



م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر
ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

منطقة (B1) القطاع الرابع بالامر المباشر عقد رقم (2024/2023/363)

تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضي

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد سمير احمد السيد

بكالوريوس هندسة مدني : جامعة بنها

المستوى الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 26/4001578/2010/3

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / أسماء علي

مهندس المشروع

م / اسلام محمد

مكتب / عادل جمال حامد راضي



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار



مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

نموذج رقم 2

القيد:..... /..... /..... المنطقة المركزية الاولى

بشأن: حصر المواد المحجوبة الواردة بالمستخلص

التاريخ:..... /..... /.....

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (B1) القطاع الرابع بالامر المباشر عقد رقم (2024/2023/363) تنفيذ مكتب عادل جمال حامد راضي .

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجوبة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه كونه الاعمال اكتملت حقا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس المشروع

الاستشاري

الشركة المنفذة






م / أسماء علي

م / اسلام محمد

مكتب انترانس كونسلتنج

مكتب / عادل جمال حامد راضي



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية



مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات



م / جهاد محمد سعد

الشركة المنفذة

عادل جمال عادل جمال
مكتب عادل جمال راضي

ب. ف. ١٢٩ - ١١٠ - ١٥٠ - ١٤٠ - ١٣٠ - ١٢٠ - ١١٠ - ١٠٠ - ٩٠ - ٨٠ - ٧٠ - ٦٠ - ٥٠ - ٤٠ - ٣٠ - ٢٠ - ١٠ - ٥ - ٠

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب عادل جمال حامد راضي بشأن تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

منطقة (B1) (القطاع الرابع) عقد رقم 2024/2023/363

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/12

بحضور كلاً من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل سيسترا للاستشارات الهندسية
ممثل مكتب انترانس كونسولتنج استشاري الهيئة
ممثل مكتب XYZ
ممثل مكتب عادل جمال حامد راضي

1. م/ اسلام محمد
2. م/ عادل راضي
3. م/ احمد قيس
4. م/ علي ربيع
5. م/ محمد جمال الدين

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحه من نواتج الحفر من القطاع الى المقالب المحدده من جهة الاشراف على الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (1000) م عن مكان المقلب المعتمد واقفل المحضر على ذلك.

التوقيعات


التوقيع:

عادل جمال
عادل راضي
عادل راضي
عادل راضي


الاسم:
5- محمد جمال الدين
4- علي ربيع
3- احمد قيس
2- عادل راضي
1- اسلام محمد

احداثيات المشاون ومسافة النقل لقطاع القطع

شركة السعادة (مكتب عادي بمال عامر افني)

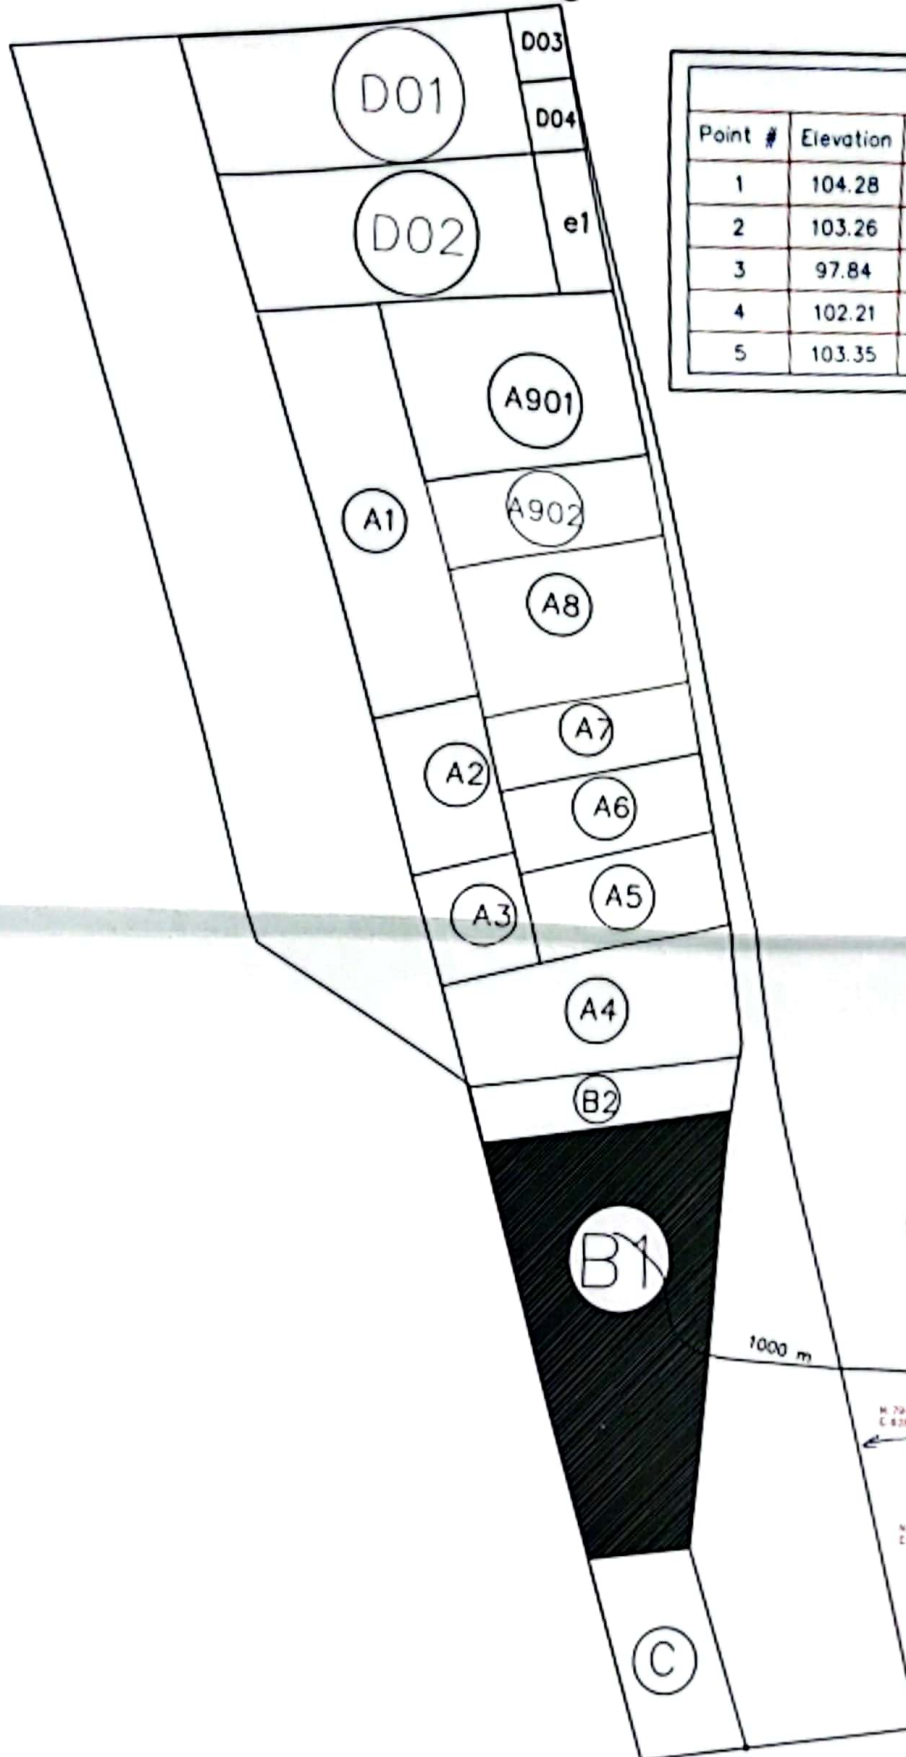

Point #	Elevation	Northing	Easting	Description
1	104.28	794963.29	629130.28	mashwan
2	103.26	794963.38	629032.17	mashwan
3	97.84	794777.24	628945.04	mashwan
4	102.21	794626.32	628953.28	mashwan
5	103.35	794746.00	629101.16	mashwan

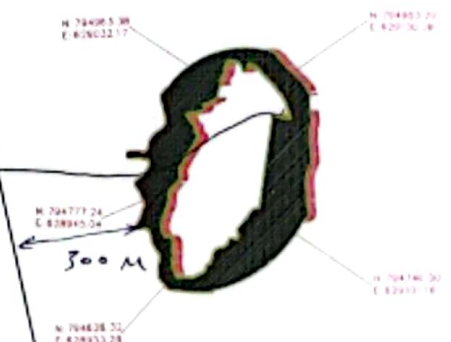

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) القطاع الرابع .
عقد رقم : (363 / 2023 / 2024) بتاريخ : 12 / 09 / 2023

منطقة (B 1)

شركة : عادل جمال حامد راضي

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	سيارة ملاكي	5
2	سيارة نصف نقل	4
3	سيارة جامبو 10 طن	3
4	لودر كاتربيلر 980	8
5	تانك مياه	2
6	عربية نقل 20 م	35
7	بلدوزر D11	1
8	بلدوزر D10	3
9	حفار	35

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع
القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) القطاع الرابع .
عقد رقم : (2024 / 2023 / 363) بتاريخ : 12 / 09 / 2023

منطقة (B 1)

شركة : عادل جمال حامد راضي

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	10
2	مهندس تنفيذ	1	6
3	مهندس مكتب الفنى	1	6
4	مساح	3	4
5	مساعد مساح	6	1
6	مشرف	5	4
7	ميكانيكي	4	10
8	سائق حفار	35	5
9	سائق	60	3

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة

شركة / عادل جمال حامد راضي



