

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتفويض المسافة من الكم 212+000 الى الكم 213+000 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
عدد رقم : (2022 / 2021 / 990) بتاريخ : 2022 / 4 / 17

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الى				
3	212+500	212+850	(تطهير) NGL Stripping		350	2021-10-11
5	211+800	212+300	(تطهير) NGL Stripping		500	2021-11-14
6	212+300	212+500	(تطهير) NGL Stripping		200	2021-11-14
9	212+720	212+940	(قاع احلال) Replacement		220	2021-11-30
26	212+850	213+000	(تطهير) NGL Stripping		150	2021-12-27
27	212+020	212+060	(استبدال) preparation	-5.00	40	2022-01-01
28	212+060.00	212+080	(استبدال) preparation	-5.50	20.00	2022-01-01
29	212+080	212+100	(استبدال) preparation	-5.75	20	2022-01-01
30	212+100	212+120	(استبدال) preparation	-6.25	20	2022-01-01
31	212+120	212+140	(استبدال) preparation	-6.50	20	2022-01-01
33	212+280	212+320	(استبدال) preparation	-9.75	40	2022-10-01
34	212+320	212+360	(استبدال) preparation	-11.00	40	2022-10-01
35	212+360	212+400	(استبدال) preparation	-11.75	40	2022-10-01
36	212+400	212+500	(استبدال) preparation	-12.00	100	2022-10-01
38	212+140	212+180	(استبدال) preparation	-6.75	40	2022-12-01
39	212+180	212+220	(استبدال) preparation	-8.00	40	2022-12-01
40	212+220	212+280	(استبدال) preparation	-8.75	60	2022-12-01
45	212+020	212+060	EMBANKMENT	-4.50	40	2022-01-25
55	212+740	212+840	ردم طبقة احلال في منطقه ردم	-14.75	100	2022-02-14
57	212+380	212+500	EMBANKMENT	-11.50	120	2022-02-17
61	212+500	212+720	EMBANKMENT	-12.00	220	2022-03-08
62	212+840	212+940	ردم طبقة احلال في منطقه ردم	-14.75	100	2022-03-13
63	212+360	212+500	EMBANKMENT	-11.00	140	2022-03-13
67	212+940	213+000	EMBANKMENT	-14.75	60	2022-04-04
69	212+500	212+720	EMBANKMENT	-11.50	220	2022-04-12
77	212+740	213+000	EMBANKMENT	-14.25	260	2022-05-17
85	212+320	212+500	EMBANKMENT	-10.50	180	2022-06-13
88	212+320	212+500	EMBANKMENT	-10.00	180	2022-06-18
89	212+500	212+720	EMBANKMENT	-11.00	220	2022-06-20
92	212+500	212+720	EMBANKMENT	-10.50	220	2022-06-26
97	212+280	212+500	EMBANKMENT	-9.50	220	2022-07-17

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 212+000 الى الكم 213+000 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
عقد رقم : (2022 / 2021 / 990) بتاريخ : 2022 / 4 / 17

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الى				
104	212+500	212+720	EMBANKMENT	-10.00	220	2022-08-10
105	212+720	213+000	EMBANKMENT	-13.25	280	2022-08-15
106	212+280	212+500	EMBANKMENT	-9.00	220	2022-08-16
107	212+280	212+500	EMBANKMENT	-4.50	220	2022-08-20
108	212+720	213+000	EMBANKMENT	-8.75	280	2022-08-22
109	212+500	212+720	EMBANKMENT	5.50	220	2022-08-24
110	212+720	213+000	EMBANKMENT	8.25	280	2022-08-25
111	212+500	212+720	EMBANKMENT	-5.00	220	2022-08-25
112	212+220	212+500	EMBANKMENT	-4.00	280	2022-08-29
113	212+720	213+000	EMBANKMENT	-7.75	280	2022-08-30
114	212+500	212+720	EMBANKMENT	-4.50	220	2022-09-12
115	212+720	213+000	EMBANKMENT	7.25	280	2022-09-04
116	212+180	212+500	EMBANKMENT	-3.50	320	2022-09-19
118	212+500	212+720	EMBANKMENT	-4.00	220	2022-09-15
119	212+720	213+000	EMBANKMENT	-6.75	280	2022-09-17
120	212+180	212+500	EMBANKMENT	-3.00	320	2022-09-20
121	212+720	213+000	EMBANKMENT	-6.25	280	2022-09-22
122	212+500	212+720	EMBANKMENT	-3.50	220	2022-09-25
125	212+100	212+500	EMBANKMENT	-2.50	400	2022-10-03
126	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.75	280	2022-09-29
127	212+500	212+720	EMBANKMENT	-3.00	220	2022-10-01
129	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.25	280	2022-10-04
130	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.00	280	2022-10-08
132	212+500	212+720	EMBANKMENT	-2.50	220	2022-10-10
136	212+100	212+500	EMBANKMENT	-2.00	400	2022-10-18
138	212+500	212+720	EMBANKMENT	-2.00	220	2022-10-19
140	212+720	213+000	EMBANKMENT	-4.50	280	2022-10-22
142	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.75	220	2022-10-25
143	212+080	212+500	EMBANKMENT	-1.75	420	2022-10-23
145	212+060	212+500	EMBANKMENT	-1.50	440	2022-10-25
146	212+720	213+000	EMBANKMENT	-4.00	280	2022-10-25

شركة محمد كمال كامل للملازمات

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 212+000 الى الكم 213+000 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
عقد رقم : (2022 / 2021 / 990) بتاريخ : 2022 / 4 / 17

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الى				
149	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.50	220	2022-10-31
152	212+060	212+280	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-01
153	212+280	212+500	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-02
155	212+720	213+000	EMBANKMENT	-3.50	280	2022-11-02
160	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-06
161	212+340	212+500	EMBANKMENT	-1.00	160	2022-11-08
167	212+020	212+340	EMBANKMENT	-1.00	320	2022-11-15
168	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.00	220	2022-11-16
171	212+720	213+000	EMBANKMENT	-3.00	280	2022-11-24
172	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.75	200	2022-11-22
173	212+020	212+300	EMBANKMENT	-0.75	280	2022-11-22
174	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.75	220	2022-11-23
176	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.50	200	2022-11-26
177	212+020	212+300	EMBANKMENT	-0.50	280	2022-11-27
178	212+720	213+000	EMBANKMENT	-2.50	280	2022-11-27
179	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.50	220	2022-11-29
182	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.25	200	2022-11-29
187	212+000	212+300	EMBANKMENT	-0.25	300	2022-11-30
188	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.25	220	2022-12-05
189	212+300	212+500	EMBANKMENT	FERMA	200	2022-12-06
190	212+000	212+300	EMBANKMENT	FERMA	300	2022-12-07

شركة محمد كامل كمال
للتقنيات المعمارية والهندسة
البيئية
٢٠٨٠٠٩٦/٢٨٢
٥٠٥/٢٨١٢/٢٠٢٢

شركة محمد كامل كمال للتقنيات

الاستشاري المشرف اترانس كولسنج

الاستشاري العام سبيرا للاستشارات الهندسية



يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري.

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢١٢+٠٠٠ الى الكم ٢١٣+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)

مع شركة محمد كمال كامل للمقاولات العمومية وأعمال الطرق

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٥ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٥	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٥ حتى ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠٦	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠٦ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٥	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٥ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٧	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٧
			جاري (١)	جاري (٢)	جاري (٣)	ختامي (٤)	
١.١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ م علي ان يتم صرف علاوة ٢٥٠ قرش للكم الزيادة..	٢م	١٥,٦١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦١٢,٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	٢م					
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	٢م	٤,٤٦٠,٠٠				٤,٤٦٠,٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	٢م	٦,٠٨٣,٠٠				٦,٠٨٣,٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٢م	٥,٠٦٩,٠٠				٥,٠٦٩,٠٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	٢م					
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٢م					
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٢م					
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٢م					
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٢م					

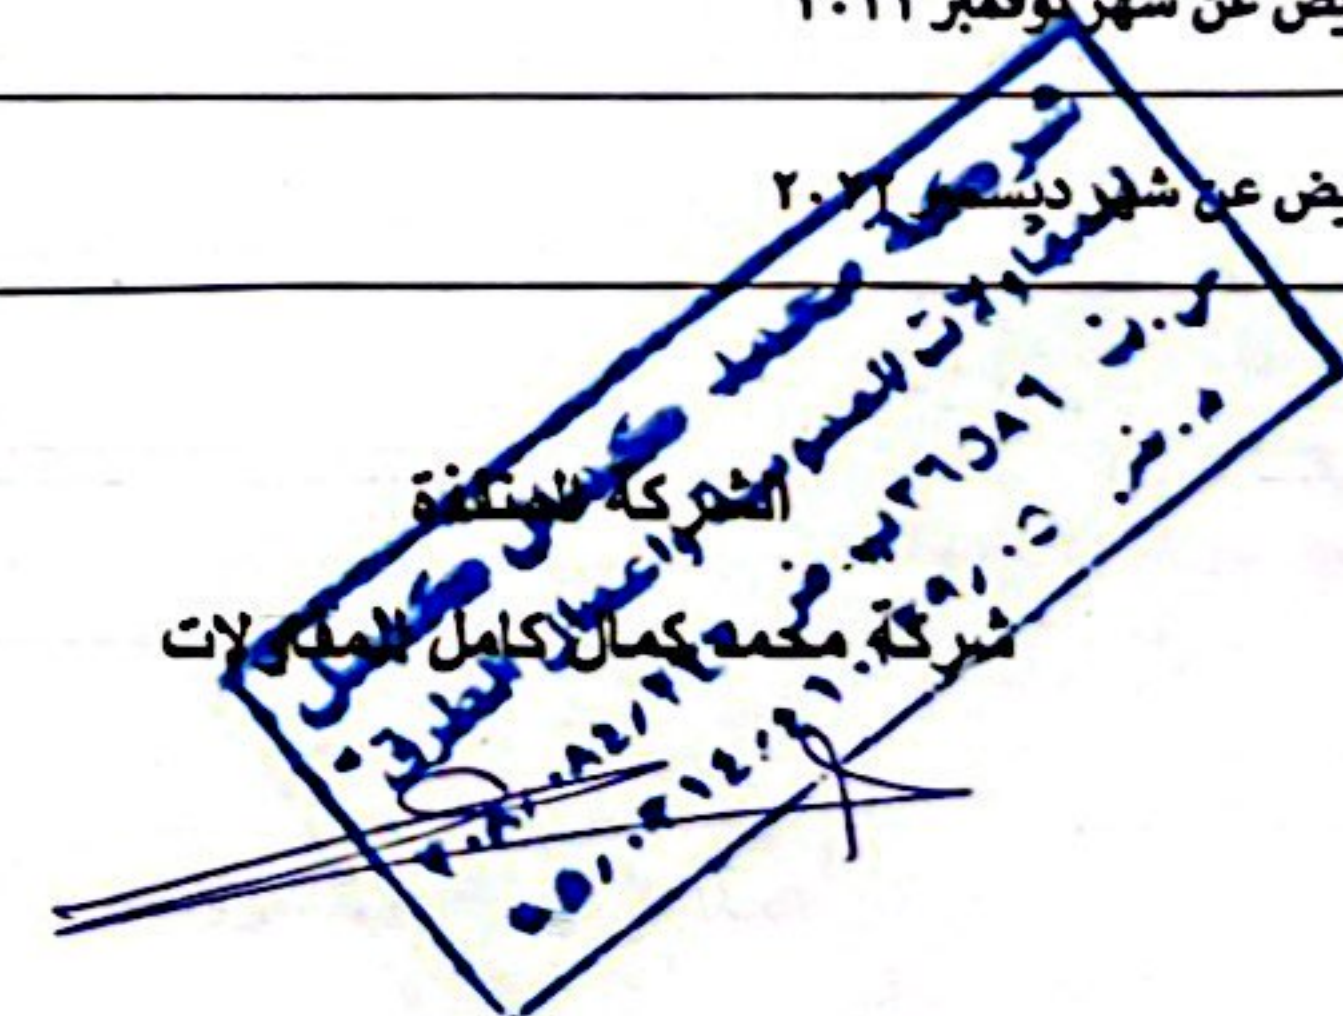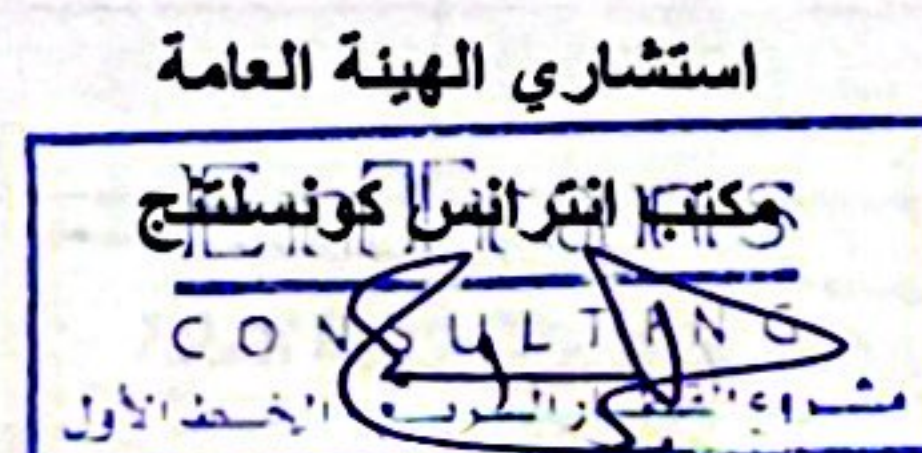

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢١٢+٠٠٠ الى الكم ٢١٣+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٥ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٥	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٥ حتى ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠٦	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠٦ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٥	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٥ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٧	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ٠٧
			جاري (١)	جاري (٢)	جاري (٣)	ختامي (٤)	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجيرة.	٣م	٢٦,٢٢٢,٠٠	٦٣,٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٩,٨٦٠,٥٠	٩٩,٣٩٨,٥٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	٣م					
١.٣	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	٣م	٧,٤٩٢,٠٠				٧,٤٩٢,٠٠
	تعويض عن شهر يونيه ٢٠٢٢	٣م	١٠,٢١٦,٠٠				١٠,٢١٦,٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	٣م	٨,٥١٤,٠٠	٨,٨٣٥,٠٠			١٧,٣٤٩,٠٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	٣م		٤٥,٦٤٦,٠٠			٤٥,٦٤٦,٠٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	٣م		٨,٨٣٥,٠٠			٨,٨٣٥,٠٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	٣م					
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٣م					
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	٣م					
	تعويض عن شهر كانون الثاني ٢٠٢٣	٣م				٩,٨٦٠,٥٠	٩,٨٦٠,٥٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب الدراسات والبحوث
١٥١

استشاري الهيئة العامة
مكتب انترانس كونسولتنج
مشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ
مشروع القطار الكهربائي السريع
ب من ٢٠٢٢ / ٠٥ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٥

شركة محمد كمال كامل للمقاولات
٩٥٠
